



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427,
číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.:
SOD00105919, ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 01. 12. 2016

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (vedoucí účastník Sdružení zadavatelů)

se sídlem: Dlážďená 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň
zastoupené: **Ing. Pavlem Grisníkem**, vedoucím OI MMP

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

Projekt Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu
Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva,

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocúrkem**, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(dále také jako „společník“)

SPOLEČNOST: „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.06.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 21.06.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a aktualizace Rozpisu Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy. Důvodem úpravy Rozpisu Ceny Díla a aktualizace Rozpisu Ceny Díla dle SO a PS je zaokrouhlování cen podle datového předpisu XC4 po vložení odsouhlasených ZBV. Tyto schválené ZBV se po podepsání dodatku přičítají k jednotlivým položkám dodatkových SO a PS v datovém formátu XML a tím vznikají haléřové rozdíly. Vzhledem k zaokrouhlování dle shora uvedeného datového předpisu a v souladu s 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále také jen „ZZVZ“, dochází k úpravě Celkové ceny Díla.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 15,94 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 9. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 8 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy.
3. Úprava Harmonogramu postupu prací a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy. Důvodem je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací u 44 stavebních objektů a 13 provozních souborů. Důvodem prodloužení jsou dodatečně požadované práce nad rámec původní projektové dokumentace, související zejména s úpravou orientačního a informačního systému dle nové směrnice SŽDC č. 118, s doplněním stavbou přemístěného pracoviště výpravčích a požadavkem na změnu technologie úpravy ploch po objektech „Rychlozboží“, vybudováním kanálu pro horkovod v již realizovaném zavazadlovém tunelu a dalšími Objednatel požadovaných prací, obsažených ve změnových listech, včetně prací spojených s náhradní a dodatečně požadovanou výsadbou zeleně. Současně byla nutnost prodloužení vyvolána i změnou způsobu rekonstrukce balkonu výpravní budovy, kdy po odhalení nosníků bylo zjištěno jejich rozsáhlé poškození, nevyhovující statickým požadavkům nosné konstrukce. V souvislosti se všemi výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.12 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a Příloha č. 5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 8 **1 099 074 958,75 Kč**

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 9 (haléřové vypořádání) **+ 2,78 Kč**

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 9 **1 099 074 961,53 Kč**

slovy: **jedna miliarda devadesát devět milionů sedmdesát čtyři tisíc devět set šedesát jedna korun českých padesát tři haléře**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9).

b) ruší se stávající znění odst. 3.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.12 Zprůjezdnění Mikulášské a Slovanské třídy pro automobilovou a tramvajovou dopravu obousměrně: **nejpozději do 31.08.2018.**

V případě, že dojde ke zpoždění zahájení stavebních prací na stavebním objektu SO 34-38-12 (severní viadukt) z důvodů prokazatelně nezaviněných Zhotovitelem, bude tento časový milník stanovený v Harmonogramu postupu prací přiměřeně posunut.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **36 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **30 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla), s **výjimkou provozních souborů PS 34-22-28.2, PS 34-22-25.2, PS 34-22-02.2, PS 34-22-29.2, PS 02-22-04.2, PS 02-22-02.2, PS 34-22-26.2, PS 34-22-50.2, PS 34-22-51.2, PS 34-22-55.2, PS 34-22-56.2, PS 34-24-01, PS 34-24-04 a stavebních objektů SO 34-33-01.2, SO 34-33-20.2, SO 34-33-25.2, SO 34-33-25.21, SO 34-33-25.22, SO 34-33-26, SO 34-38-08, SO 34-38-08.21, SO 34-38-10.21, SO 34-38-12-DO, SO 34-38-53, SO 198-38-01, SO 198-38-01.2, SO 34-37-03, SO 34-37-04, SO 34-37-04.1, SO 34-37-21.2, SO 34-37-25, SO 34-37-27.1, SO 34-37-27.2, SO 34-37-27.3, SO 34-37-28.2, SO 34-37-42, SO 198-32-01.2, SO 198-32-01.21, SO 34-33-61.2, SO 34-31-41.2, SO 34-31-71.2, SO 34-31-71.21, SO 35-34-01.2, SO 34-34-30.2, SO 34-34-31.2, SO 34-34-31.21, SO 34-34-32.2, SO 198-34-01, SO 34-34-20.2, SO 34-34-60.2, SO 34-36-09.2, SO 34-36-02.2, SO 34-36-21.1, SO 34-38-52.21, SO 34-33-23.2, SO 99-89-82 a SO 99-89-92**, u nichž lhůta pro dokončení stavebních prací včetně předání dokladové části dle následujícího odstavce bude shodná s celkovou lhůtou pro dokončení Díla, tj. **nejpozději do 36 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací.**

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla, s výjimkou SO a PS uvedených v předchozím odstavci, pro které platí lhůta tam uvedená.

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/06/15 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty

<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

3) **Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 9 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 9 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 9 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, nedotčené tímto dodatkem č. 9 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **osm (8)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram postupu prací

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9

V Praze dne 07-06-2019
Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 04.06.2019
Za Zhotovitele Metrostav a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

V Plzni dne 05.06.2019
Za Objednatele č. 2

V Brně dne 03.06.2019
Za Zhotovitele OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic
Magistrátu města Plzně


.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.


.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.


Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla


- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

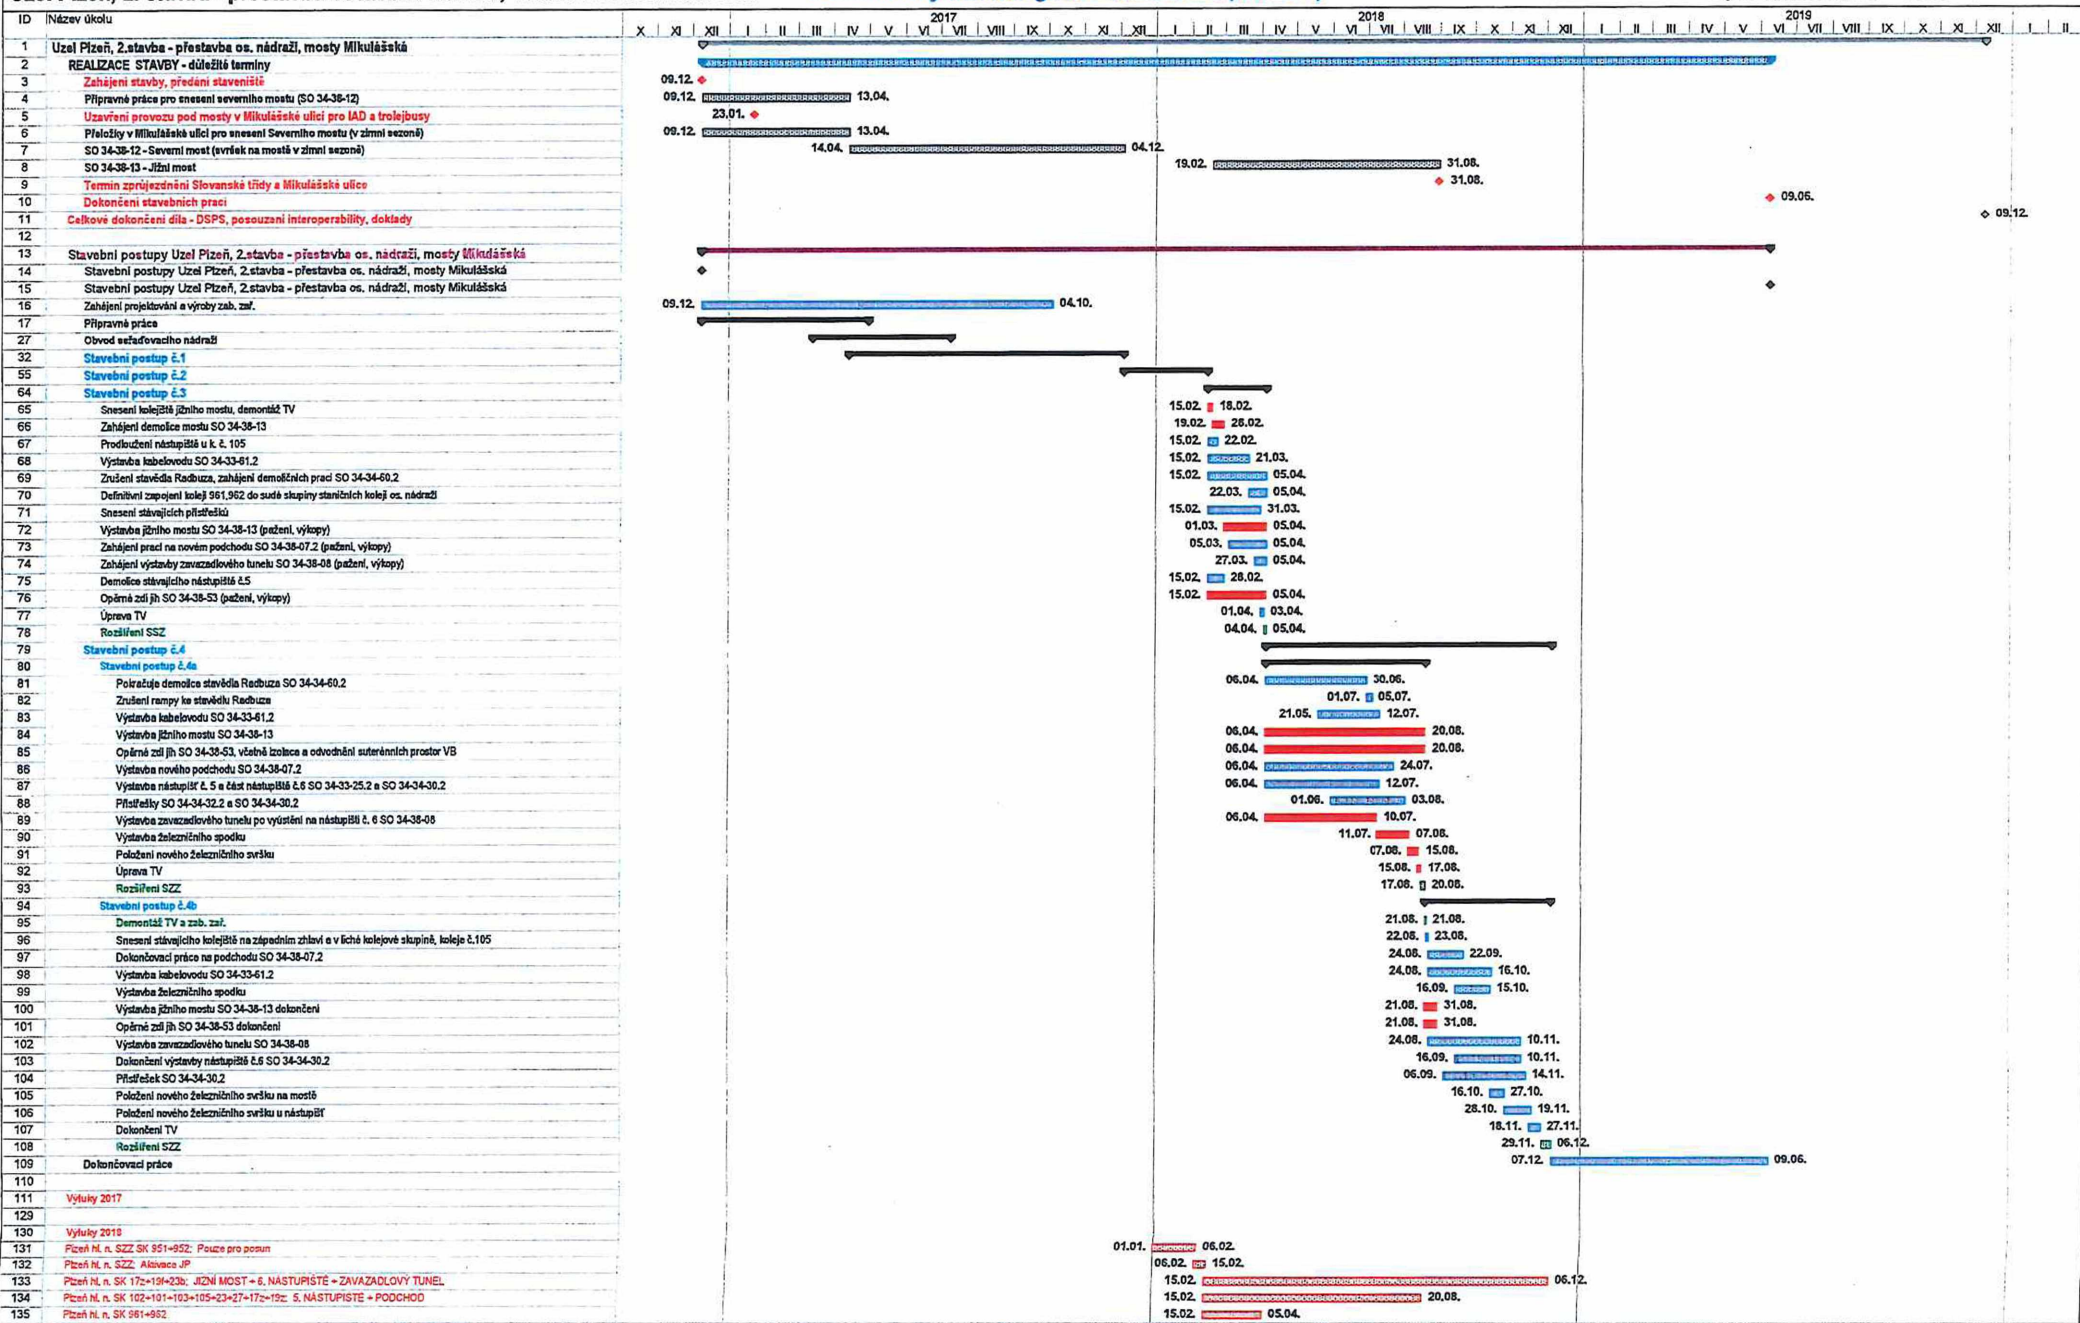

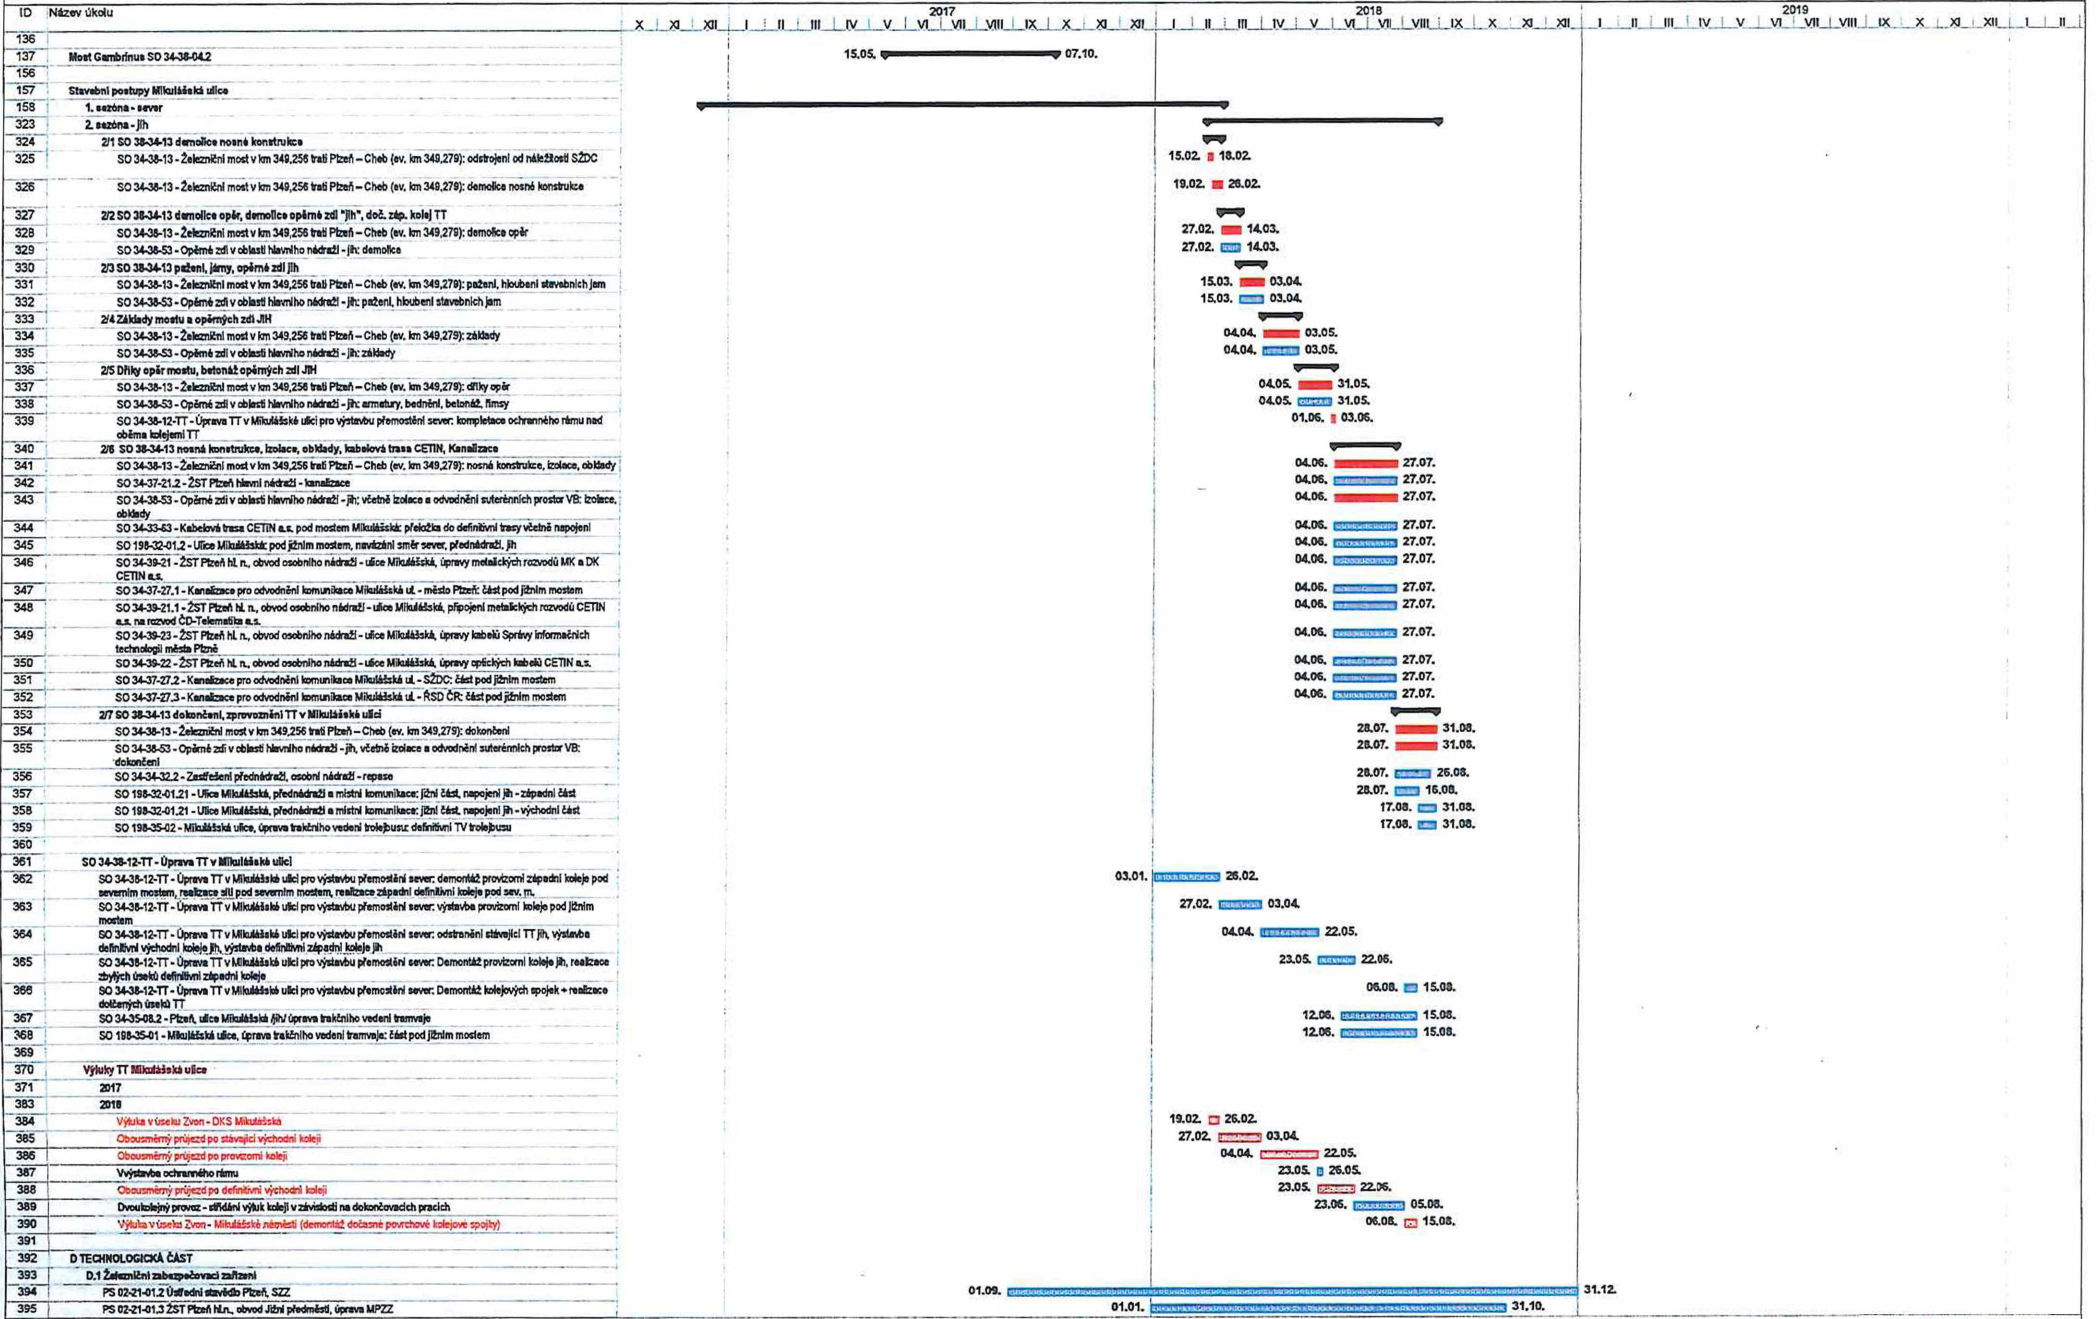

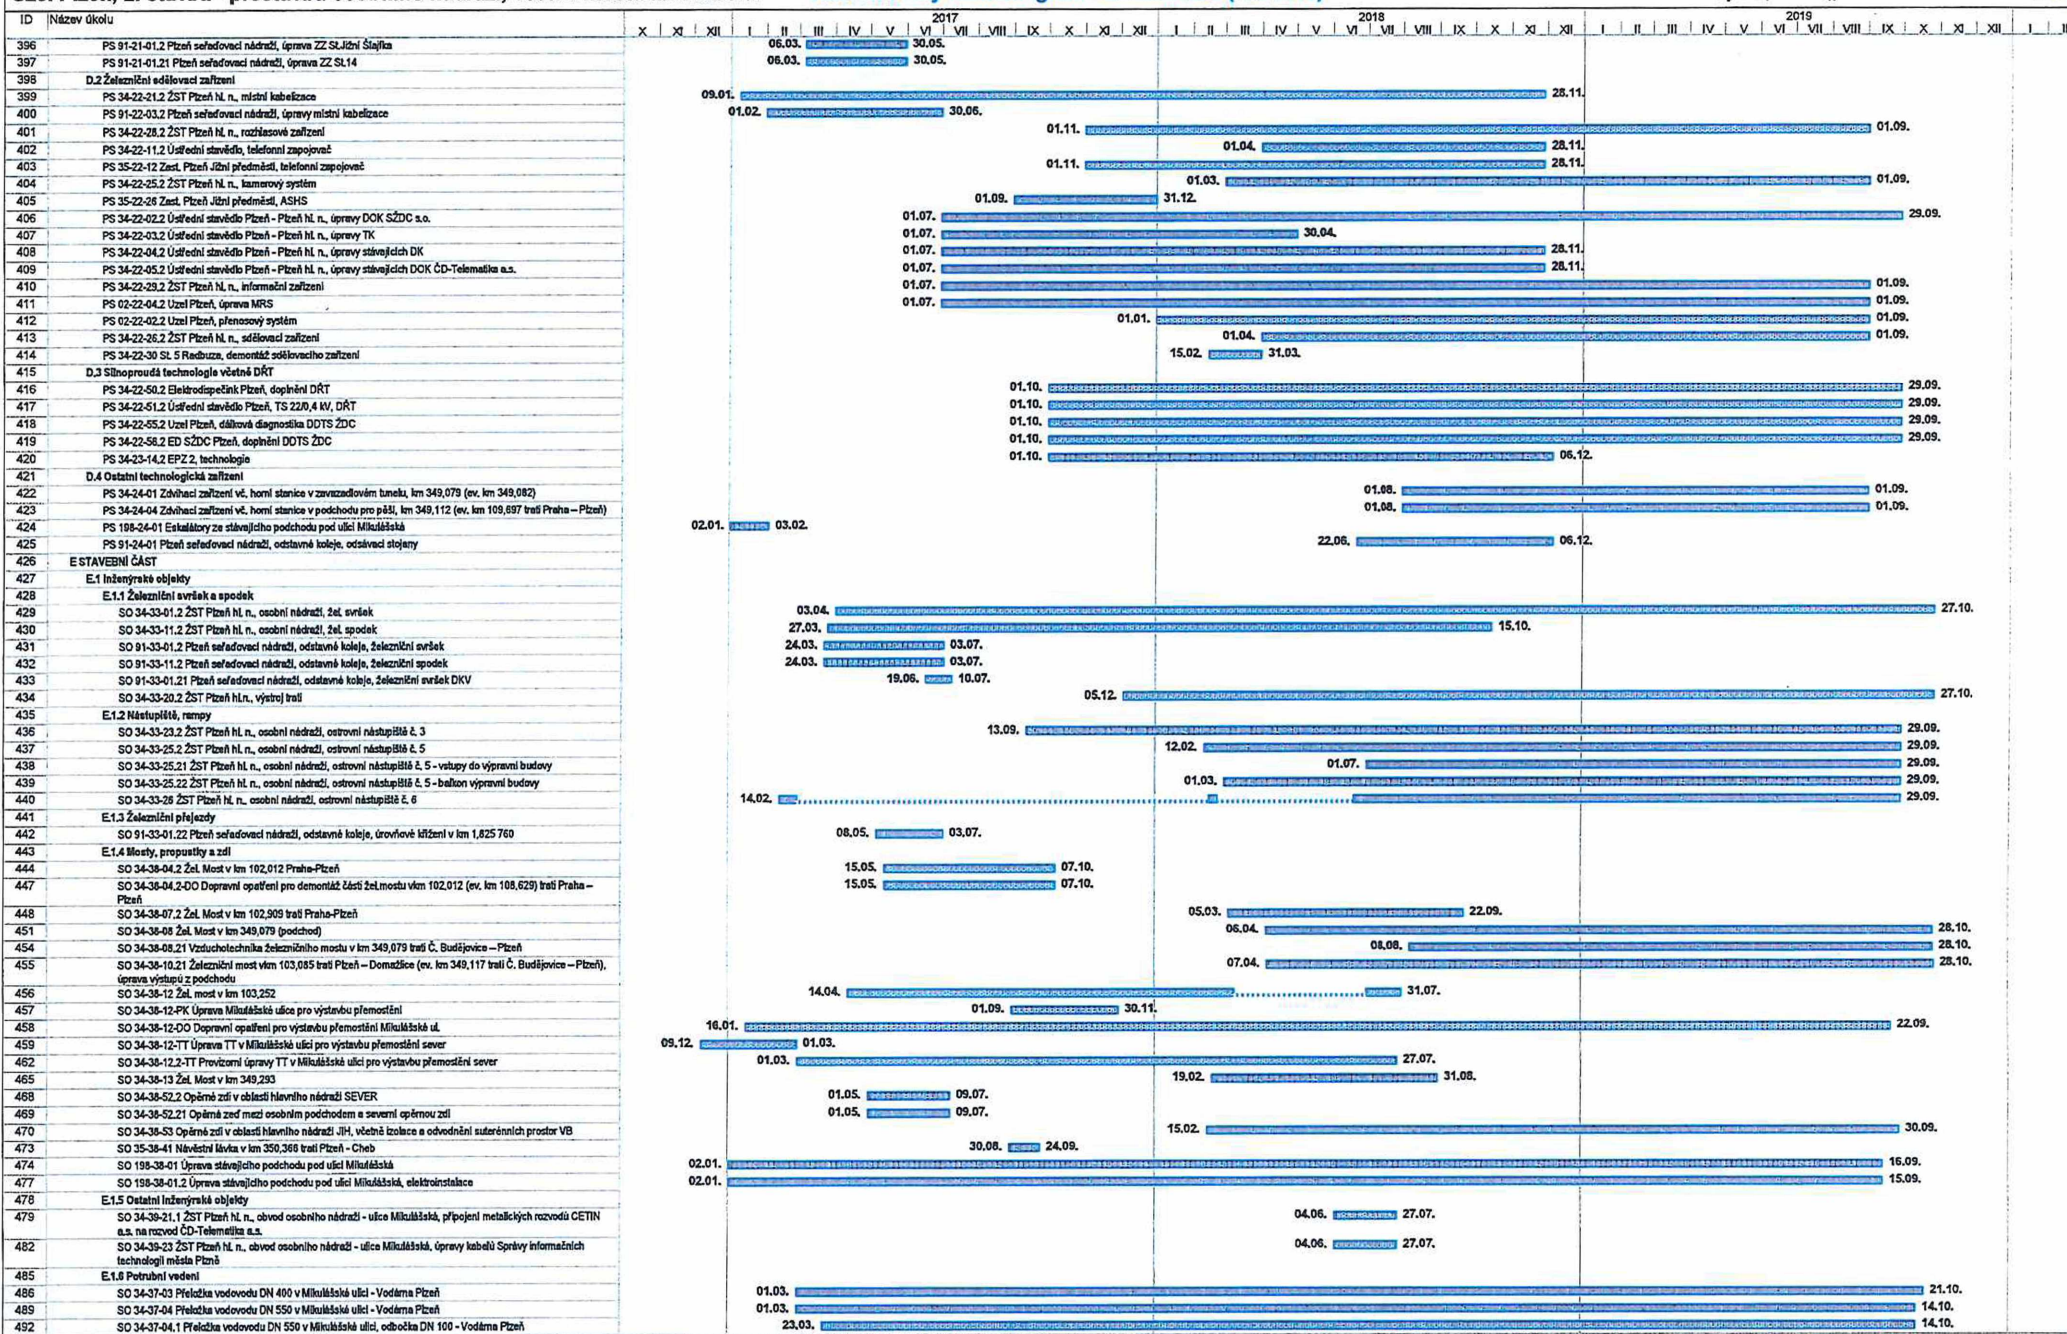

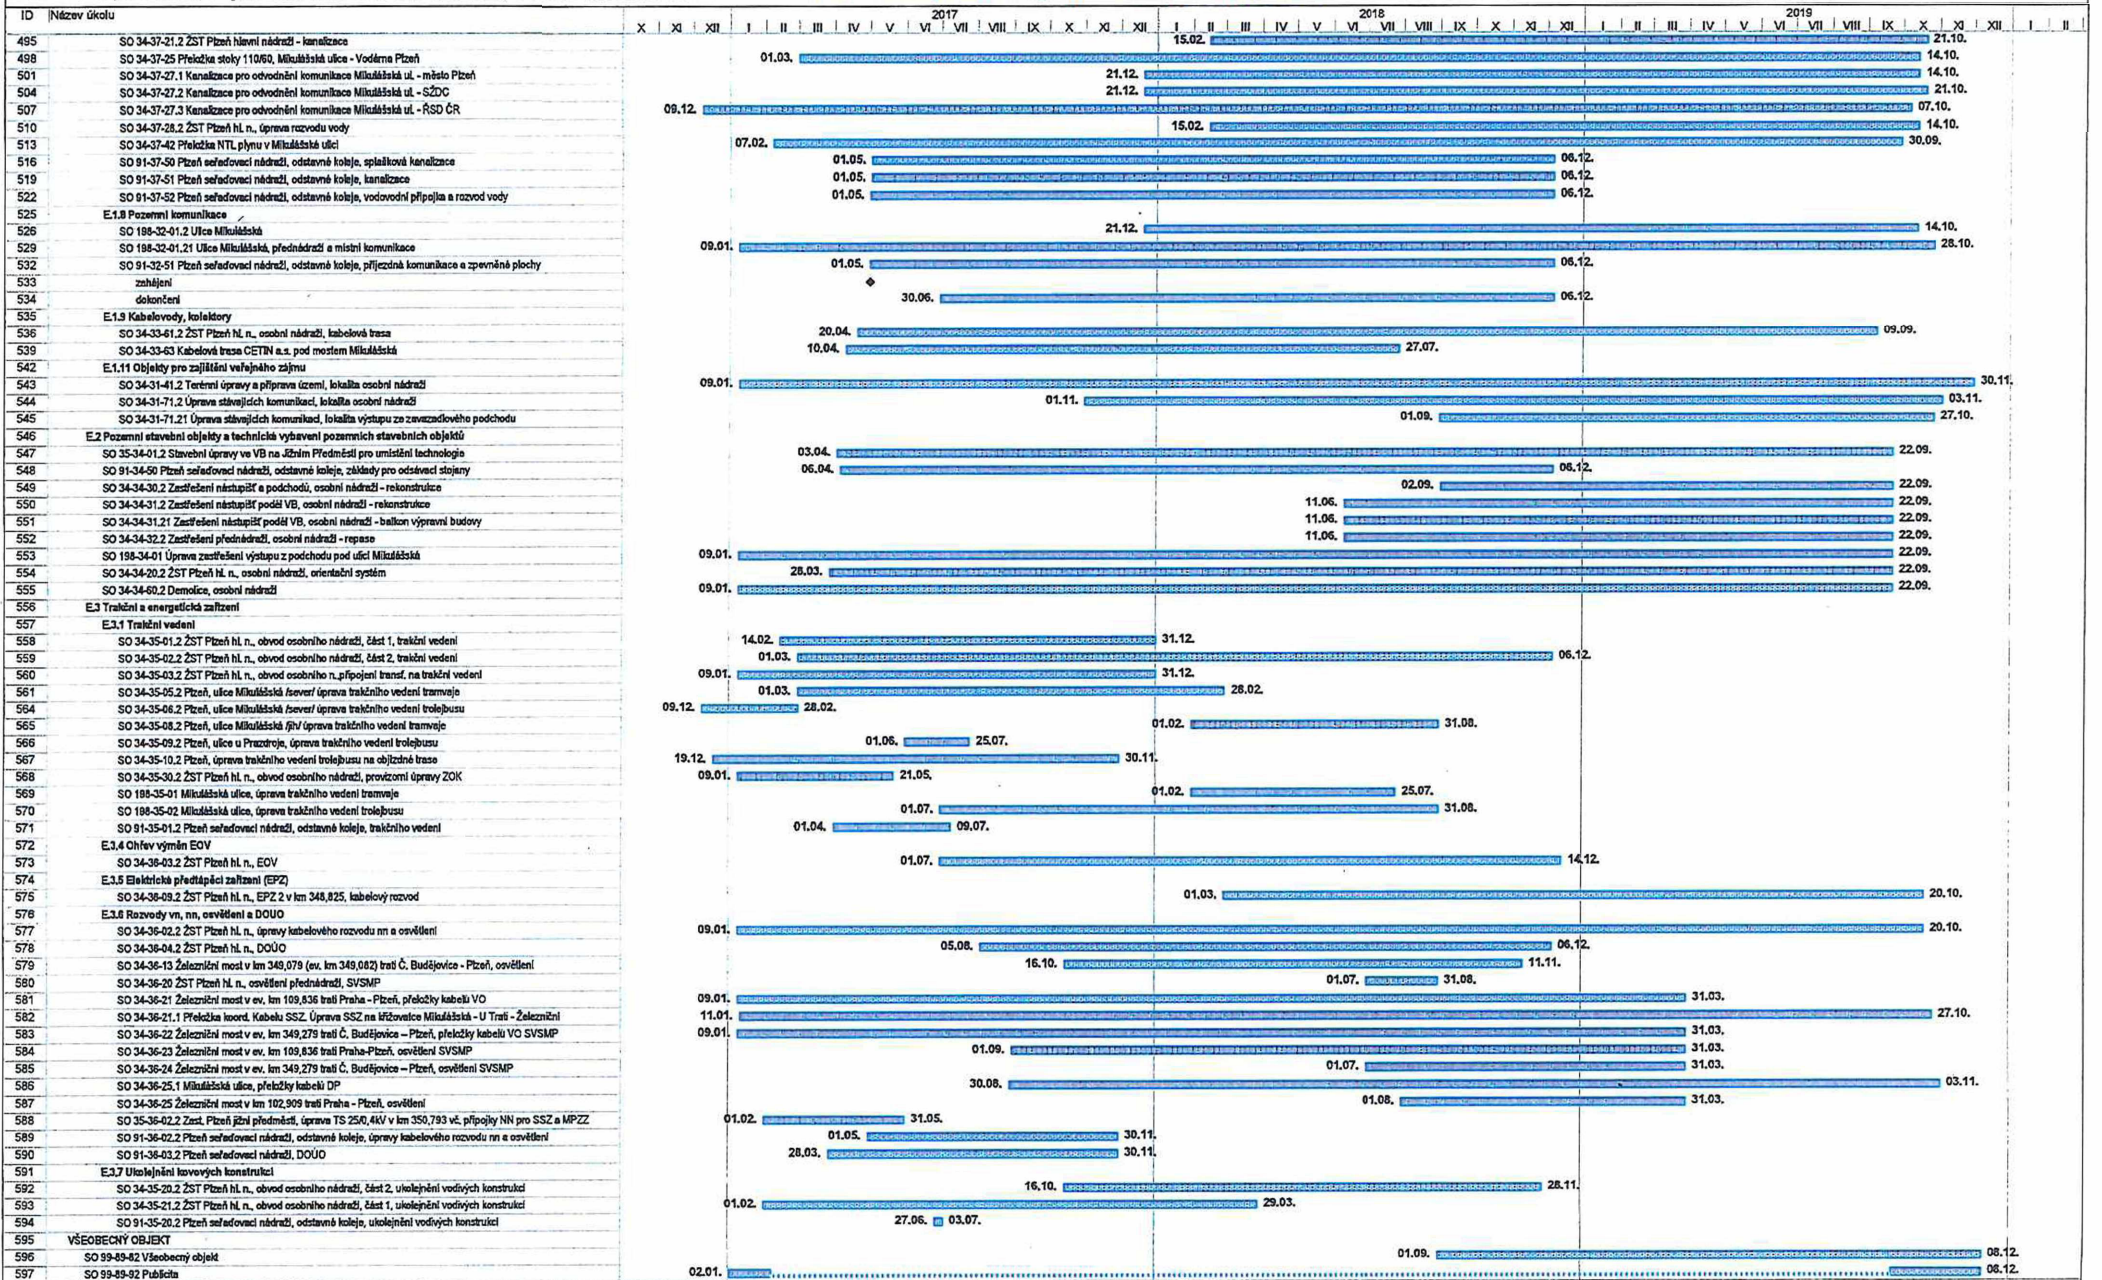

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 319446

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: db07ad04-89bd-4e00-b830-a1484926a4a9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.06.2019 10:24:05



065f9aaf-0ed9-4796-b1a4-deb919eacf3d
