



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Smlouva číslo: 2018/ŠaK/000161/SML/4

## Dodatek č. 4

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/ŠaK/000161/SML

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP budovy“**

uzavřené dne 22.05.2018 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b>
se sídlem:	Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupen:	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
Identifikační číslo:	00296651
DIČ:	CZ00296651
Bankovní spojení:	██████████ ██████████ ██████████
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná ve věcech technických:	██████████ ██████████ ██████████ odbor školství a kultury

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>BYSTROŇ Group a.s.</b>
se sídlem	Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupený	Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO	27800466
DIČ	CZ 27800466
Bankovní spojení	██████████ ██████████ ██████████
Číslo účtu	██████████
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3238	
Spojení (telefon, email)	██████████ ██████████

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

## I.

### Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22.05.2018 Smlouvu o dílo č. **2018/ŠaK/000161/SML**, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP budovy“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 13.07.2018.
- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku.

## II.

### Předmět smlouvy

- 1) Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech stavby č. 11 - 17, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.
- 2) Článek III. Smlouvy – Místo a doba provedení díla, odstavec 4 se mění tímto dodatkem tak, že nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 360 kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 15. 07. 2019**. Zhotovitel se dále zavazuje, že při provádění prací bude postupovat dle orientačního časového harmonogramu stavebních prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a který zhotovitel vytvořil v rámci zadávacího řízení, a dle orientačního časového harmonogramu stavebních prací, který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 4 k této smlouvě.“*

## III.

### Cena víceprací, cena díla

1)	
Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):	<b>26 722 089,93 Kč</b>
Cena za dílo dle dodatku č. 1 (bez DPH)	<b>27 159 754,98 Kč</b>
Cena za dílo dle dodatku č. 2 (bez DPH)	<b>27 541 411,52 Kč</b>
Cena za dílo dle dodatku č. 3 (bez DPH)	<b>28 004 772,50 Kč</b>

Cena sjednaných víceprací (bez DPH):	<b>784 689,35 Kč</b>
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):	<b>-334 498,01 Kč</b>

- 2) Cena za dílo sjednaná v čl. II. odst. 1 Smlouvy a dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3 ke Smlouvě, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, ponižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

<b>cena díla celkem (bez DPH):</b>	<b>28 454 963,84 Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>4 268 244,57 Kč</b>
<b>Cena díla celkem včetně DPH:</b>	<b>32 723 208,41 Kč</b>

## IV.

### Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento

dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

2) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

3) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 06.06.2019, č. usnesení 14/5.2.

Přílohy: Příloha č. 1 – změnové listy č. 11-17 vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 2 – harmonogram prací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 26.06.2019

V Ostravě dne 25.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

---

Michal Bystroň  
člen představenstva

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – Prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP"</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">11</span>
--	---------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.5.2018 č.smlouvy 2018/ŠaK/000161/SML

**Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí**

**Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava**

**TDS: K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, [REDACTED]**

Přílohy:  1) Položkový rozpočet - PROSTUPY STŘECHOU 2) Samostatný rozpočet VZT - MNP/VCP 3) Zákres změny VZT	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>ARPIK OSTRAVA s.r.o.</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	2 x	ARPIK OSTRAVA s.r.o.
Počet paré:	Vyhotovil:								
1 x	BYSTROŇ Group a.s.								
1 x	BYSTROŇ Group a.s.								
2 x	ARPIK OSTRAVA s.r.o.								

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 V projektové dokumentaci jsou řešeny prostupy střechou pro vzduchotechniku a zdravotnickou. Stavební rozpočet neobsahoval provedení prostupů. Celkem se jedná o tři prostupy pro zdravotnickou a čtyři prostupy pro vzduchotechniku. Generální projektant nemohl předpokládat, že střecha neobsahuje záchranný systém proti pádu osob, za který by se šlo uvázat v době provádění prostupů. S ohledem na tuto skutečnost budou prostupy střechou provedeny z plošiny.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Mění prací řešeného ZL	Procentuální podíl Mění prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Mění prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-40 185,00</b>	<b>-0,15%</b>	<b>135 690,36</b>	<b>0,51%</b>	<b>95 505,36</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno [REDACTED]	datum <i>28.5.2019</i>	podpis [REDACTED]
TDS:	jméno [REDACTED]	datum <i>28.5.2019</i>	podpis [REDACTED]
Zhotovitel:	jméno [REDACTED]	datum <i>28.5.2019</i>	podpis [REDACTED]
Objednatel:	jméno [REDACTED]	datum <i>28.5.2019</i>	podpis [REDACTED]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>5</b>
---------------------------------	----------------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSS PŘYDLANĚ NAD OSTRAVICÍ

Objekt:

**ZL 11 - prostupy střechou**

KSO:

CC-CZ

Místo:

Datum:

4. 2. 2019

Žadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**95 505,36**

DPH základní  
sazba

Základ daně  
0,00  
99 507,36

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
14 926,10

**Cena s DPH**

**110 431,46**

**CZK**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSS FRYDLANT NAD OSINAVICÍ

Objekt: ZL 11 - prostupy střechou

Misc:

Datum: 4. 2. 2019

Zasavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 440,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 440,00	
1	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	30,000	1 648,00	49 440,00	CS ÚRS 2018 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				46 065,36	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-8 472,00	
16	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-6,000	667,00	-4 002,00	
18	K	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	-10,000	447,00	-4 470,00	
					-10,000			
D	751		Vzduchotechnika				19 737,36	
19	K	751	VZT samostatný rozpočet	kpl	1,000	19 737,36	19 737,36	
D	764		Konstrukce klempířské				34 800,00	
2	K	R1	Lemování prostupů sítích	ks	8,000	3 600,00	28 800,00	
			VZT 5		5,000			
			ZT 3		3,000			
			Součet		8,000			
7	K	R2	Nezměřitelné stavební práce - bourání prostupů sítěšního pláště	hod	24,000	250,00	6 000,00	
					24,000			




Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
<b>Základní náklady</b>			
Zařízení: Dodávka, Montáž	15 209,40	1 764,00	
Nátěry			
<b>Vzduchotechnická zařízení celkem</b>	<b>15 209,40</b>	<b>1 764,00</b>	
Doprava 3,60% z dodávky zařízení	547,54		
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		0,00	0,00
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		88,20	
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení		28,22	
<b>Dodávka celkem, Montážní náklady</b>	<b>15 756,94</b>	<b>1 880,42</b>	
Hodinové zúčtovací sazby		0,00	
<b>Montáž celkem</b>		<b>1 880,42</b>	
Lešení		0,00	
Izolace tepelné		0,00	
Izolace protipožární		2 100,00	
Izolace protihlukové		0,00	
<b>Základní náklady celkem</b>	<b>15 756,94</b>	<b>3 980,42</b>	
<b>Vedlejší náklady</b>			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů			
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00	
Kompletační činnost			
<b>Náklady celkem</b>		<b>19 737,36</b>	
Základ a hodnota DPH 15%	19 737,36	2 960,60	
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00	
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>22 697,97</b>	


Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
		<b>Zařízení 1</b>								
1008-6364		HLAVICE ČTYŘHRANNÁ								
1008-6365	1.3.1	VÝFUKOVÁ 200 x 100, pozink	ks	-6,00	798,00	-4 788,00	600,00	-3 600,00	1 398,00	-8 388,00
1020-1		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.								
1020-4		MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 650 10% tvarovek	bm	-10,00	375,00	-3 750,00	150,00	-1 500,00	525,00	-5 250,00
		<b>6*2</b>								
1021-1206		KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO								
1021-1234		do průměru 200 50% tvarovek	bm	-15,00	325,00	-4 875,00	175,00	-2 625,00	500,00	-7 500,00
		<b>4*2</b>								
1008-5801		HLAVICE KRUHOVÁ								
1008-5802	1.3.2	VÝFUKOVÁ 200, POZINK	ks	-3,00	1 285,00	-3 855,00	300,00	-900,00	1 585,00	-4 755,00
1008-5802	1.3.3	VÝFUKOVÁ 140, POZINK	ks	-2,00	1 110,00	-2 220,00	150,00	-300,00	1 260,00	-2 520,00
						<b>-19 488,00</b>		<b>-8 925,00</b>		<b>-28 413,00</b>
		<b>Izolace protipožární</b>								
		PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN. PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ								
1101-85		odolnost EI 30	m2	-11,00	150,00	-1 650,00	150,00	-1 650,00	300,00	-3 300,00
1101-89										
		<b>Izolace protipožární - celkem</b>				<b>-1 650,00</b>		<b>-1 650,00</b>		<b>-3 300,00</b>



28.3.2019  
POHLED P

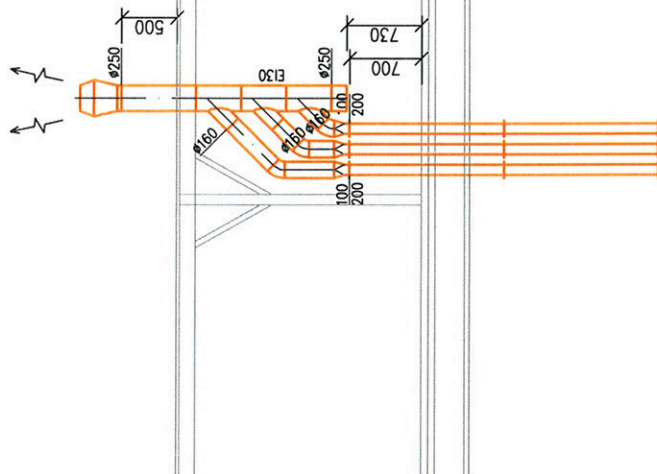


28.3.2019

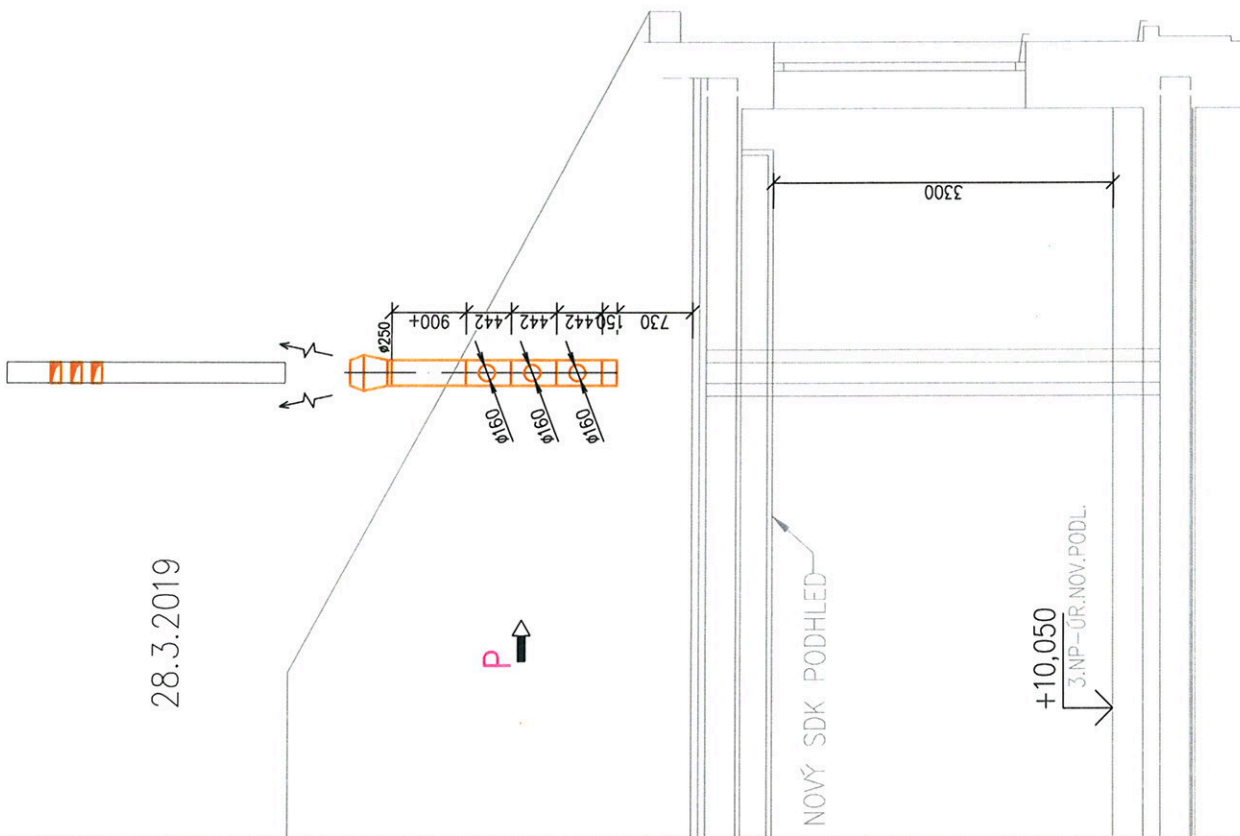


26.2.2019

PŮDA

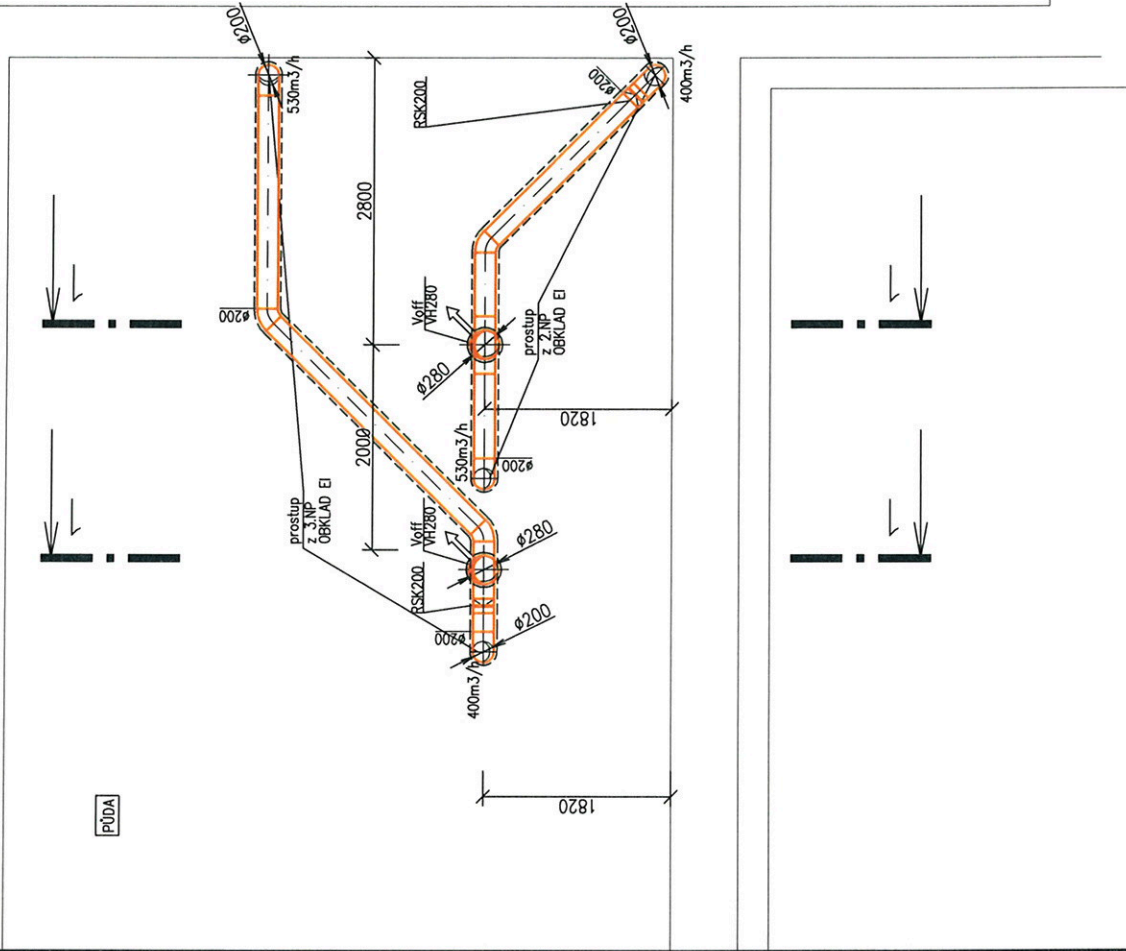

1-1

28.3.2019

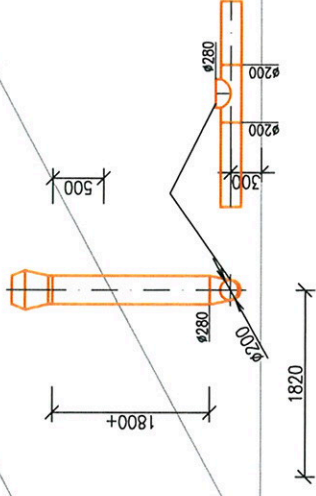

+10,050  
3.NP-ÚR. PŮV. PODL.

SDK PODHLED

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – Prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP"</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24px; color: green;">12</span>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.5.2018 č.smlouvy 2018/ŠaK/000161/SML

**Objednavatel:** Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

**Zhotovitel:** BYSTRON group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, [redacted]

Přílohy:  1) Položkový rozpočet - BOURÁNÍ PODLAHY	Počet paré:      Vyhotovil:  1 x      BYSTRON Group a.s.
---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

V projektové dokumentaci byla řešena výměna teracové dlažby včetně maltového lóže na chodbě v 2.NP. Pod maltovým ložem byla předpokládána betonová mazanina, která bude dostatečně únosná. Po odbourání teracové dlažby a jejího maltového lože bylo zjištěno, že je betonová mazanina nevykazuje dostatečnou pevnost a soudržnost pro položení nové teracové dlažby. Bylo dohodnuto za účasti investora, technického a autorského dozora její odbourání a nahrazení novým cementovým potěrem. Vzhledem k dodržení technologického postupu má tato změna vliv na termín provádění díla.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA O 15 DNÍ.**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Mění prací řešeného ZL	Procentuální podíl Mění prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Mění prací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>73 696,73</b>	<b>0,28%</b>	<b>73 696,73</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno [redacted]	datum <b>28-05-2019</b>	podpis [redacted]
TDS:	jméno [redacted]	datum <b>28-05-2019</b>	podpis [redacted]
Zhotovitel:	jméno [redacted]	datum <b>28.5.2019</b>	podpis [redacted]
Objednatel:	jméno [redacted]	datum <b>28-05-2019</b>	podpis [redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

SSS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Objekt:

ZL 12 - bourání podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 4. 2. 2019  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**73 696,73**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
0,00  
73 696,73

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
11 054,51

**Cena s DPH**

**v CZK**

**84 751,24**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Objekt:

ZL 12 - bourání podlahy

Místo:

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>73 696,73</b>
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				62 491,35
13	K	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	1,749	590,40	1 032,61
			58,31*0,03		1,749		
11	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	58,310	1 054,00	61 458,74
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 952,74
12	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,749	2 260,00	3 952,74
			58,31*0,03		1,749		
D	997		Přesun sutě				6 387,68
2	K	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,848	850,00	3 270,80
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	11,544	20,00	230,88
			3,848*3		11,544		
4	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,848	150,00	577,20
			3,848		3,848		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,960	5,00	384,80
			3,848*20		76,960		
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,848	500,00	1 924,00
D	998		Přesun hmot				864,96
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,604	160,00	576,64
8	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	3,604	50,00	180,20
9	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	10,812	10,00	108,12



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		3.604*3			10,812		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – Prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24px; color: green;"><b>13</b></span>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.5.2018 č.smlouvy 2018/ŠaK/000161/SML

**Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí**

**Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava**

**TDS: K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, [redacted]**

Přílohy:  1) Položkový rozpočet - NADSPOTŘEBA OMÍTEK	Počet paré:      Vyhotožil:  1 x      BYSTROŇ Group a.s.
--	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

V projektové dokumentaci bylo řešeno oklepaní původních omítek až na cihelné zdivo a provedení omítek nových. Nové omítky budou vykazovat příslušnou pevnost a rovinatost s ohledem na interiér. Stavební rozpočet počítal s křivostí stávajícího podkladu v tloušťce 20 mm. Po oklepaní omítek a změření křivosti zdi bylo nutné provést vyrovnání podkladu o dalších 30 mm. Tuto skutečnost nemohl Generální projektant v průběhu zpracování projektu předpokládat.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>430 466,56</b>	<b>1,61%</b>	<b>430 466,56</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno [redacted]	datum	2 8 -05- 2019	podpis	[redacted]
TDS:	jméno [redacted]	datum	2 8 -05- 2019	podpis	[redacted]
Zhotovitel:	jméno [redacted]	datum	28.5.2019	podpis	[redacted]
Objednatel:	jméno [redacted]	datum	2 8 -05- 2019	podpis	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>3</b>
---------------------------------	----------------------

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

SSS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Objekt:

**ZL 13 - Nadspotřeba omítek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**430 466,56**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**430 466,56**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSS FRYDLANT NAD OSTRAVICÍ

Objekt:

ZL 13 - Nadspotřeba omítek

Místo:

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
0	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>430 466,56</b>	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				25 386,48	
2	K	346/481112	Zepletování rýh, potrubí, vyklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	65.700	386.40	25 386,48	CS ÚRS 2019 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				405 080,08	
1	K	612321391	Příplatek k vápencementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	9 756.264	41.52	405 080,08	CS ÚRS 2019 01
	W		"Dle ceníku 6,8 kg/m2 pro vrstvu 5 mm"					
	W		"Pro výměru 1626,044 m2 dle výkazu výměr"					
	W		"Celková nadspotřeba 64 800 kg / 1626,044 m2 = 39,85 kg/m2 nadspotřeby"					
	W		"39,85 kg/m2 / spotřeba 6,8 kg/m2 = 5,86 -> 6 * 5 mm = 30 mm navíc"					
	W		1626,044*6		9 756.264			

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – Prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt; color: green;"><b>14</b></span>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.5.2018 č.smlouvy 2018/ŠaK/000161/SML

**Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí**

**Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava**

**TDS: K+H správci staveb s.r.o., V Zátíši 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, [REDACTED]**

Přílohy:  1) Položkový rozpočet - PŘEŠTUKOVÁNÍ SCHODIŠTĚ	Počet paré:      Vyhotovil:  1 x      BYSTROŇ Group a.s.
--	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

V projektové dokumentaci byly řešeny pohledové části dvouramenného schodiště (spodní strany) vedoucího z 1.NP do 3.NP výmalbou stávajících omítek. Na stavbě bylo dohodnuto za účasti investora, technického a autorského dozora, že stávající povrch omítek bude opatřen novou omítkou. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na sjednocení povrchu s novými omítkami, které byly provedeny na stěnách.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
	<b>0,00%</b>	<b>15 137,80</b>	<b>0,06%</b>	<b>15 137,80</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	28.5.2019	podpis
TDS:	jméno		datum	28.5.2019	podpis
Zhotovitel:	jméno		datum	28.5.2019	podpis
Objednatel:	jméno		datum	28-05-2019	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>4</b>
---------------------------------	----------------------



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

SSS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Objekt:

**ZL 14 - Přestukování schodiště**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**15 137,80**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 137,80**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Objekt: ZL 14 - Přestukování schodiště

Místo: Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>15 137,80</b>	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<b>10 705,50</b>	
1	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	32.500	126,40	4 108,00	CS ÚRS 2019 01
		VV	"rovná podesta" 6,3*1,6		10,080			
		VV	"šikmé podesty" 2*5,2*1,6		16,640			
		VV	"mezipodesta" 1,7*3,4		5,780			
		VV	Součet		32,500			
18	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32.500	43,00	1 397,50	
		VV	"rovná podesta" 6,3*1,6		10,080			
		VV	"šikmé podesty" 2*5,2*1,6		16,640			
		VV	"mezipodesta" 1,7*3,4		5,780			
		VV	Součet		32,500			
19	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32.500	160,00	5 200,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				<b>4 372,54</b>	
22	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	88.156	24,32	2 143,95	CS ÚRS 2019 01
		VV	3,25*7,75*1,75*2		88,156			
23	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	440.780	1,20	528,94	CS ÚRS 2019 01
		VV	88,156*5		440,780			
24	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	88.156	19,28	1 699,65	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				<b>59,76</b>	
54	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0.249	160,00	39,84	
55	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0.249	50,00	12,45	
56	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0.747	10,00	7,47	
		VV	0,249*3 "prepočtené koeficientem množství		0,747			

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**"Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – Prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP"**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

15

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 01**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.5.2018 č.smlouvy 2018/ŠaK/000161/SML

**Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí**

**Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava**

**TDS: K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Jiří Kukulka**

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet - TERACO
- 2) fotodokumentace

Počet paré: Vyhotovil:

1 x	BYSTROŇ Group a.s.
1 x	BYSTROŇ Group a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Schodiště vedoucí z 2.NP do 3.NP obsahuje dekorativní římsu z teracového betonu, do které bylo nakotveno původní zábradlí. V projektové dokumentaci bylo řešeno vybroušení a vyleštění teracového betonu včetně demontáže zábradlí. Po provedení vybroušení se objevily původní opravy, které se historicky na římsu prováděly viz. fotodokumentace zhotovitele z průběhu provádění prací. Generální projektant tuto skutečnost nemohl předpokládat. Římsu i další výtlučky na schodišti bude nutné opravit a povrch pohledově sjednotit.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00%	52 005,00	0,19%	52 005,00	

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	28.5.2019	podpis	
TDS:	jméno		datum	28-05-2019	podpis	
Zhotovitel:	jméno		datum	28.5.2019	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	28-05-2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SSS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ  
Objekt:

## ZL 15 - TERACO

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 4. 2. 2019  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Uchazeč: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka: IČ: DIČ:

**Cena bez DPH**

**52 005,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
0,00  
52 005,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
7 800,75

**Cena s DPH**

**v CZK**

**59 805,75**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Objekt: ZL 15 - TERACO



Místo: Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>52 005,00</b>
D	PSV					52 005,00	
Práce a dodávky PSV							
D	773					52 005,00	
1	K	R04	m	16,300	1 350,00	22 005,00	
2	K	R05	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
W							
W							
W							
W							
				1,000			

"urážení kus římsy ve 3.NP"  
"oprava po demontáži zábradlí"  
"oprava stupňů mezipodestí"  
1



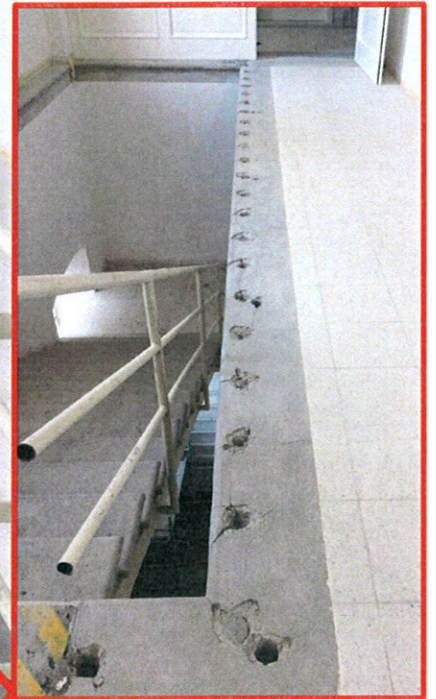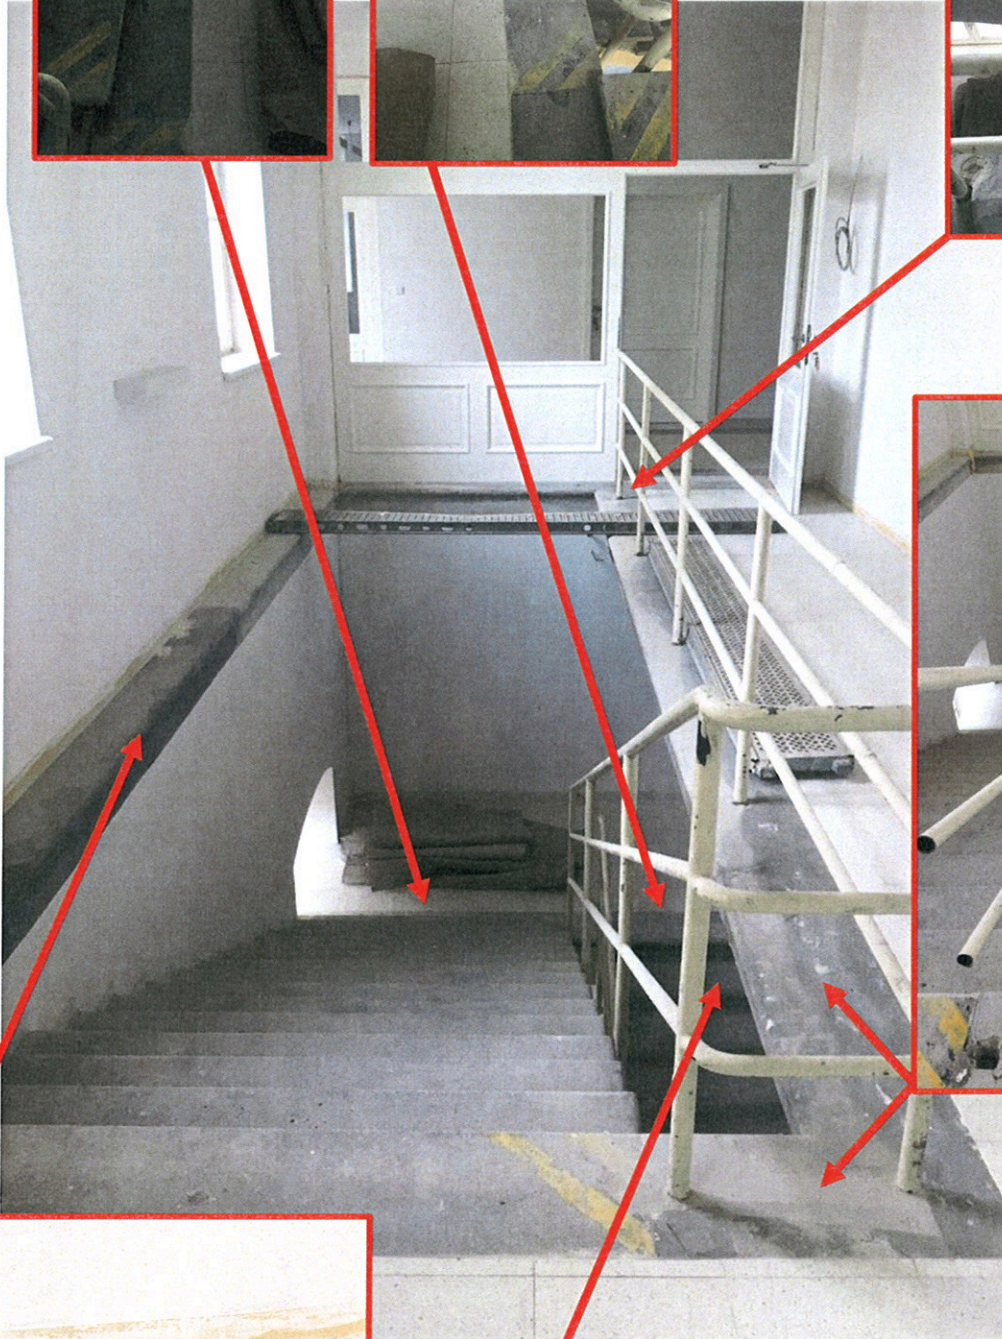



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – Prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP"</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt; color: green;"><b>16</b></span>
--	---------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.5.2018 č.smlouvy 2018/ŠaK/000161/SML

**Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí**

**Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava**

**TDS: K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, [redacted]**

Přílohy:  1) Položkový rozpočet - ODPOČTY DLE SKUTEČNOSTI	Počet paré:      Vyhotovil:  1 x      BYSTROŇ Group a.s.
---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

V projektové dokumentaci byly řešeny přechody keramické dlažby a obkladů z podlahy na stěnu a v rozích pomocí systémových profilů. Tyto profily nebyly na stavbě použity z provozních důvodů (údržba, čištění). Napojení obkladů bylo provedeno klasickým způsobem a spáry byly zasilikovány. Další úsporou ve stavebním rozpočtu byl příplatek k maliřskému nátěru v tónovacích automatech, protože se provozovatel rozhodl pro bílou výmalbu, která je bez příplatku.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

--

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-227 813,01</b>	<b>-0,85%</b>	<b>18 695,10</b>	<b>0,07%</b>	<b>-209 117,91</b>

<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor):	jméno [redacted]	datum <i>28.5.2019</i>	podpis [redacted]
TDS:	jméno [redacted]	datum <i>28.5.2019</i>	podpis [redacted]
Zhotovitel:	jméno [redacted]	datum <i>24.5.2019</i>	podpis [redacted]
Objednatel:	jméno [redacted]	datum <i>28-05-2019</i>	podpis [redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>5</b>
---------------------------------	----------------------

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

SSS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Objekt:

**ZL 16 - Odpočty dle skutečného stavu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-209 117,91**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

-209 117,91

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-31 367,69

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-240 485,60**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Objekt:

ZL 16 - Odpočty dle skutečného stavu

Místo:

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>-209 117,91</b>	
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				-983,33	
1	K	211207012	Svítilno montáž	kpl	-1,000	983,33	-983,33	
	VV		"počet svítidel 4ks"					
	VV		"jednotková cena 59,-Kč/ks"					
	VV		"časový fond 250,-Kč/hod"					
	VV		"4*59/60*250 = 983,33 Kč/kpl" 1		1,000			
D	771		Podlahy z dlaždic				-106 873,20	
183	K	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	-50,000	16,90	-845,00	
	VV		-50		-50,000			
184	M	590541520	profil dilatační, hliník, AKSM 80 ...* (8 x 2500 mm)	m	-55,000	439,00	-24 145,00	
	VV		50*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		55,000			
	VV		55*1 "Přepočtené koeficientem množství"		-55,000			
185	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	-336,000	18,70	-6 283,20	
	VV		-336		-336,000			
186	M	781M1	Dutý pozálabek pro přechod dlažby z podlahy na stěnu	m	-336,000	225,00	-75 600,00	
	VV		336		336,000			
	VV		336*1 "Přepočtené koeficientem množství"		-336,000			
D	781		Dokončovací práce - obklady				<b>-49 897,00</b>	
206	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních porýpnových za spárování silikonem	m	617,000	30,30	18 695,10	
	VV		"vnitřní kouty" 281		281,000			
	VV		"z podlahy na stěnu" 336		336,000			
	VV		Součet		617,000			
208	K	781495161	Montáž profilu obkladu v rovině bez izolace	m	-281,000	19,10	-5 367,10	
	VV		"Vnitřní kout" -281		-281,000			
	VV		Součet		-281,000			
209	M	781M2	Dutý pozálabek pro vnitřní kouty stěn	m	-281,000	225,00	-63 225,00	
	VV		281		281,000			
	VV		281*1 "Přepočtené koeficientem množství"		-281,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	784		Dokončovací práce - malby				-51 364,38	
218	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu syém	m2	-4 109,150	12,50	-51 364,38	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**"Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – Prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP"**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

**17**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 01**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.5.2018 č.smlouvy 2018/ŠaK/000161/SML

**Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí**

**Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava**

TDS: K+H správci staveb s.r.o., V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, [REDACTED]

Přílohy:

1) Položkový rozpočet - VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

Počet paré:

Vyhotovil:

1 x

BYSTROŇ Group a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci byly navrženy vertikální žaluzie v délce až po zem. Na žádost uživatele byly upraveny tyto rozměry tak, aby nedošlo k jejich poškození náročným provozem a imobilními obyvateli střediska. Taktéž bylo změněno kotvení žaluzií, resp. délka kolejnic podle technických možností montáže.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-66 500,00</b>	<b>-0,25%</b>	<b>58 997,80</b>	<b>0,22%</b>	<b>-7 502,20</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno	[REDACTED]	datum	<b>28-05-2019</b>	podpis	[REDACTED]
TDS:	jméno	[REDACTED]	datum	<b>28-05-2019</b>	podpis	[REDACTED]
Zhotovitel:	jméno	[REDACTED]	datum	<b>28.5.2019</b>	podpis	[REDACTED]
Objednatel:	jméno	[REDACTED]	datum	<b>28-05-2019</b>	podpis	[REDACTED]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**5**



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:  
SSS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ  
Objekt:

## ZL 17 - Vertikální žaluzie

KSO:  
Místo: CC-CZ: 4. 2. 2019  
Datum:  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka: IČ:  
DIČ:

### Cena bez DPH

-7 502,20

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
-6 417,60

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
-962,64

### Cena s DPH

v CZK

-8 464,84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSS FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Objekt:

ZL 17 - Vertikální žaluzie

Místo:

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
0	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 502,20	
D	767		Konstrukce zámečnické				-7 502,20	
157	K	767V1	O01 Vertikální textilní žaluzie 2x3,55 m dod.+mont.	kus	-10,000	3 100,00	-31 000,00	
1	K	767V1 - a	O01 Vertikální textilní žaluzie 1,7x2,8 m dod.+mont.	kus	8,000	3 072,80	24 582,40	

