

**Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2019, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**„III-508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503-3,702“**

**Číslo smlouvy objednatele: 436/00066001/2019**

**č. smlouvy zhotovitele : 7-0021A19**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ : 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

**PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006  
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci), a Ing. František Buršík, vedoucí technického úseku  
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed.  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů,  
a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na základě změny dopravně inženýrského opatření oproti zadávací dokumentaci, která byla projednána a odsouhlasena zástupci jednotlivých organizací na uzavírkové komisi, včetně vydání rozhodnutí. Jedná se o změnu úplného omezení celého prostoru výstavby, tj, s vyloučenou dopravou, na realizaci stavby ve čtyřech etapách s výstavbou pouze v jednom jízdním pruhu.

2. Opravený harmonogram je přílohou tohoto dodatku.
3. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě článku č. 4.1 Smlouvy a to následovně:

#### **Článek 4. Doba a místo plnění**

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 5 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.
4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

V Praze dne \_\_\_\_\_

**Pavel  
Hirsch**

Digitálně podepsal  
Pavel Hirsch  
Datum: 2019.07.03  
13:41:09 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Hirsch  
ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb  
PORR a.s., Oblast Čechy- Střed  
na základě plné moci

**František  
Buršík**

Digitálně podepsal  
František Buršík  
Datum: 2019.07.03  
10:09:10 +02'00'


\_\_\_\_\_  
Ing. František Buršík  
vedoucí technického úseku Dopravních a  
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed  
na základě plné moci


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	duben 2019			květen 2019					červen 2019					červenec 2019					srpen 2019					září							
					3.	8.	13.	18.	23.	28.	3.	8.	13.	18.	23.	28.	2.	7.	12.	17.	22.	27.	2.	7.	12.	17.	22.		27.	1.	6.	11.	16.	21.	26.
1	<b>II-508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503-3,702</b>	<b>147 dny</b>	<b>8.4. 19</b>	<b>1.9. 19</b>																															
2	SO 101 - Hlavní trasa	140 dny	8.4. 19	25.8. 19																															
3	Etapa I. - km 1,503 - 2,250	63 dny	8.4. 19	9.6. 19																															
39	Etapa II. - km 2,250 - 2,900	77 dny	10.6. 19	25.8. 19																															
71	Etapa III. - km 2,900 - 3,060	35 dny	22.7. 19	25.8. 19																															
88	Etapa IV. - km 3,060 - 3,703	89 dny	10.4. 19	7.7. 19																															
123	SO 182 - DIO	140 dny	8.4. 19	25.8. 19																															
124	Etapa I. - km 1,503 - 2,250	63 dny	8.4. 19	9.6. 19																															
125	Etapa II. - km 2,250 - 2,900	77 dny	10.6. 19	25.8. 19																															
126	Etapa III. - km 2,900 - 3,060	35 dny	22.7. 19	25.8. 19																															
127	Etapa IV. - km 3,060 - 3,703	89 dny	10.4. 19	7.7. 19																															
128	SO 193 - SDZ, VDZ	21 dny	12.8. 19	1.9. 19																															
129	Realizace SDZ	14 dny	12.8. 19	25.8. 19																															
130	Realizace VDZ	7 dny	26.8. 19	1.9. 19																															

Projekt: II-508, Mirošovice - Mn Datum: 21.3. 19	Úkol		Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník	Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn	Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol	Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly			


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	duben 2019		květen 2019					červen 2019					červenec 2019					srpen 2019					září			
					3.	8.	13.	18.	23.	28.	3.	8.	13.	18.	23.	28.	2.	7.	12.	17.	22.	27.	2.	7.	12.	17.		22.	27.	1.
1	<b>II-508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení km 1,503-3,702</b>	<b>147 dny</b>	<b>8.4. 19</b>	<b>1.9. 19</b>																										
2	<b>SO 101 - Hlavní trasa</b>	<b>140 dny</b>	<b>8.4. 19</b>	<b>25.8. 19</b>																										
3	<b>Etapa I. - km 1,503 - 2,250</b>	<b>63 dny</b>	<b>8.4. 19</b>	<b>9.6. 19</b>																										
4	<b>SO 101 - levá strana</b>	<b>63 dny</b>	<b>8.4. 19</b>	<b>9.6. 19</b>																										
5	Frézování vozovky	1 den	8.4. 19	8.4. 19																										
6	Demontáž ocelových svodidel v km 1,503 - 1,584 a odstranění směrových sloupků	1 den	8.4. 19	8.4. 19																										
7	Odtěžení svahu v km 1,633 - 1,700 a 1,850 - 2,070 a 2,170 - 2,207	7 dny	9.4. 19	15.4. 19																										
8	Odtěžení drnu na krajnici a pročištění příkopů	7 dny	9.4. 19	15.4. 19																										
9	Výměna čela propustku v km 1,807 s opravou vtokového vývařiště	7 dny	16.4. 19	22.4. 19																										
10	Oprava vtokového vývařiště propustku v km 2,207	7 dny	16.4. 19	22.4. 19																										
11	Realizace propustku na sjezdu DN 300 v km 2,240	14 dny	23.4. 19	6.5. 19																										
12	Rozšíření násypového tělesa a jeho zpevnění geosyntetikou v km 2,170 - 2,207	7 dny	16.4. 19	22.4. 19																										
13	Realizace AZ, k-ční vrstvy z ŠD a Rmat včetně dosypávky zemní krajnice	7 dny	16.4. 19	22.4. 19																										
14	Realizace obrubníku a podkladního betonu v km 1,633 - 1,700 a 1,850 - 2,070	6 dny	14.5. 19	19.5. 19																										
15	Realizace rigolu z kamenných kostek v km 1,633 - 1,700 a 1,850 - 2,070	14 dny	24.5. 19	6.6. 19																										
16	Recyklace za studena a úprava pláně	1 den	13.5. 19	13.5. 19																										
17	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	3 dny	20.5. 19	22.5. 19																										
18	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	23.5. 19	23.5. 19																										
19	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	13 dny	24.5. 19	5.6. 19																										
20	Montáž ocelových svodidel v km 1,503 - 1,584	2 dny	6.6. 19	7.6. 19																										
21	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní geomříží	17 dny	24.5. 19	9.6. 19																										
22	<b>SO 101 - pravá strana</b>	<b>62 dny</b>	<b>9.4. 19</b>	<b>9.6. 19</b>																										
23	Frézování vozovky	1 den	9.4. 19	9.4. 19																										

Projekt: II-508, Mirošovice - Mn Datum: 21.3. 19	Úkol		Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník	Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn	Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol	Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly			

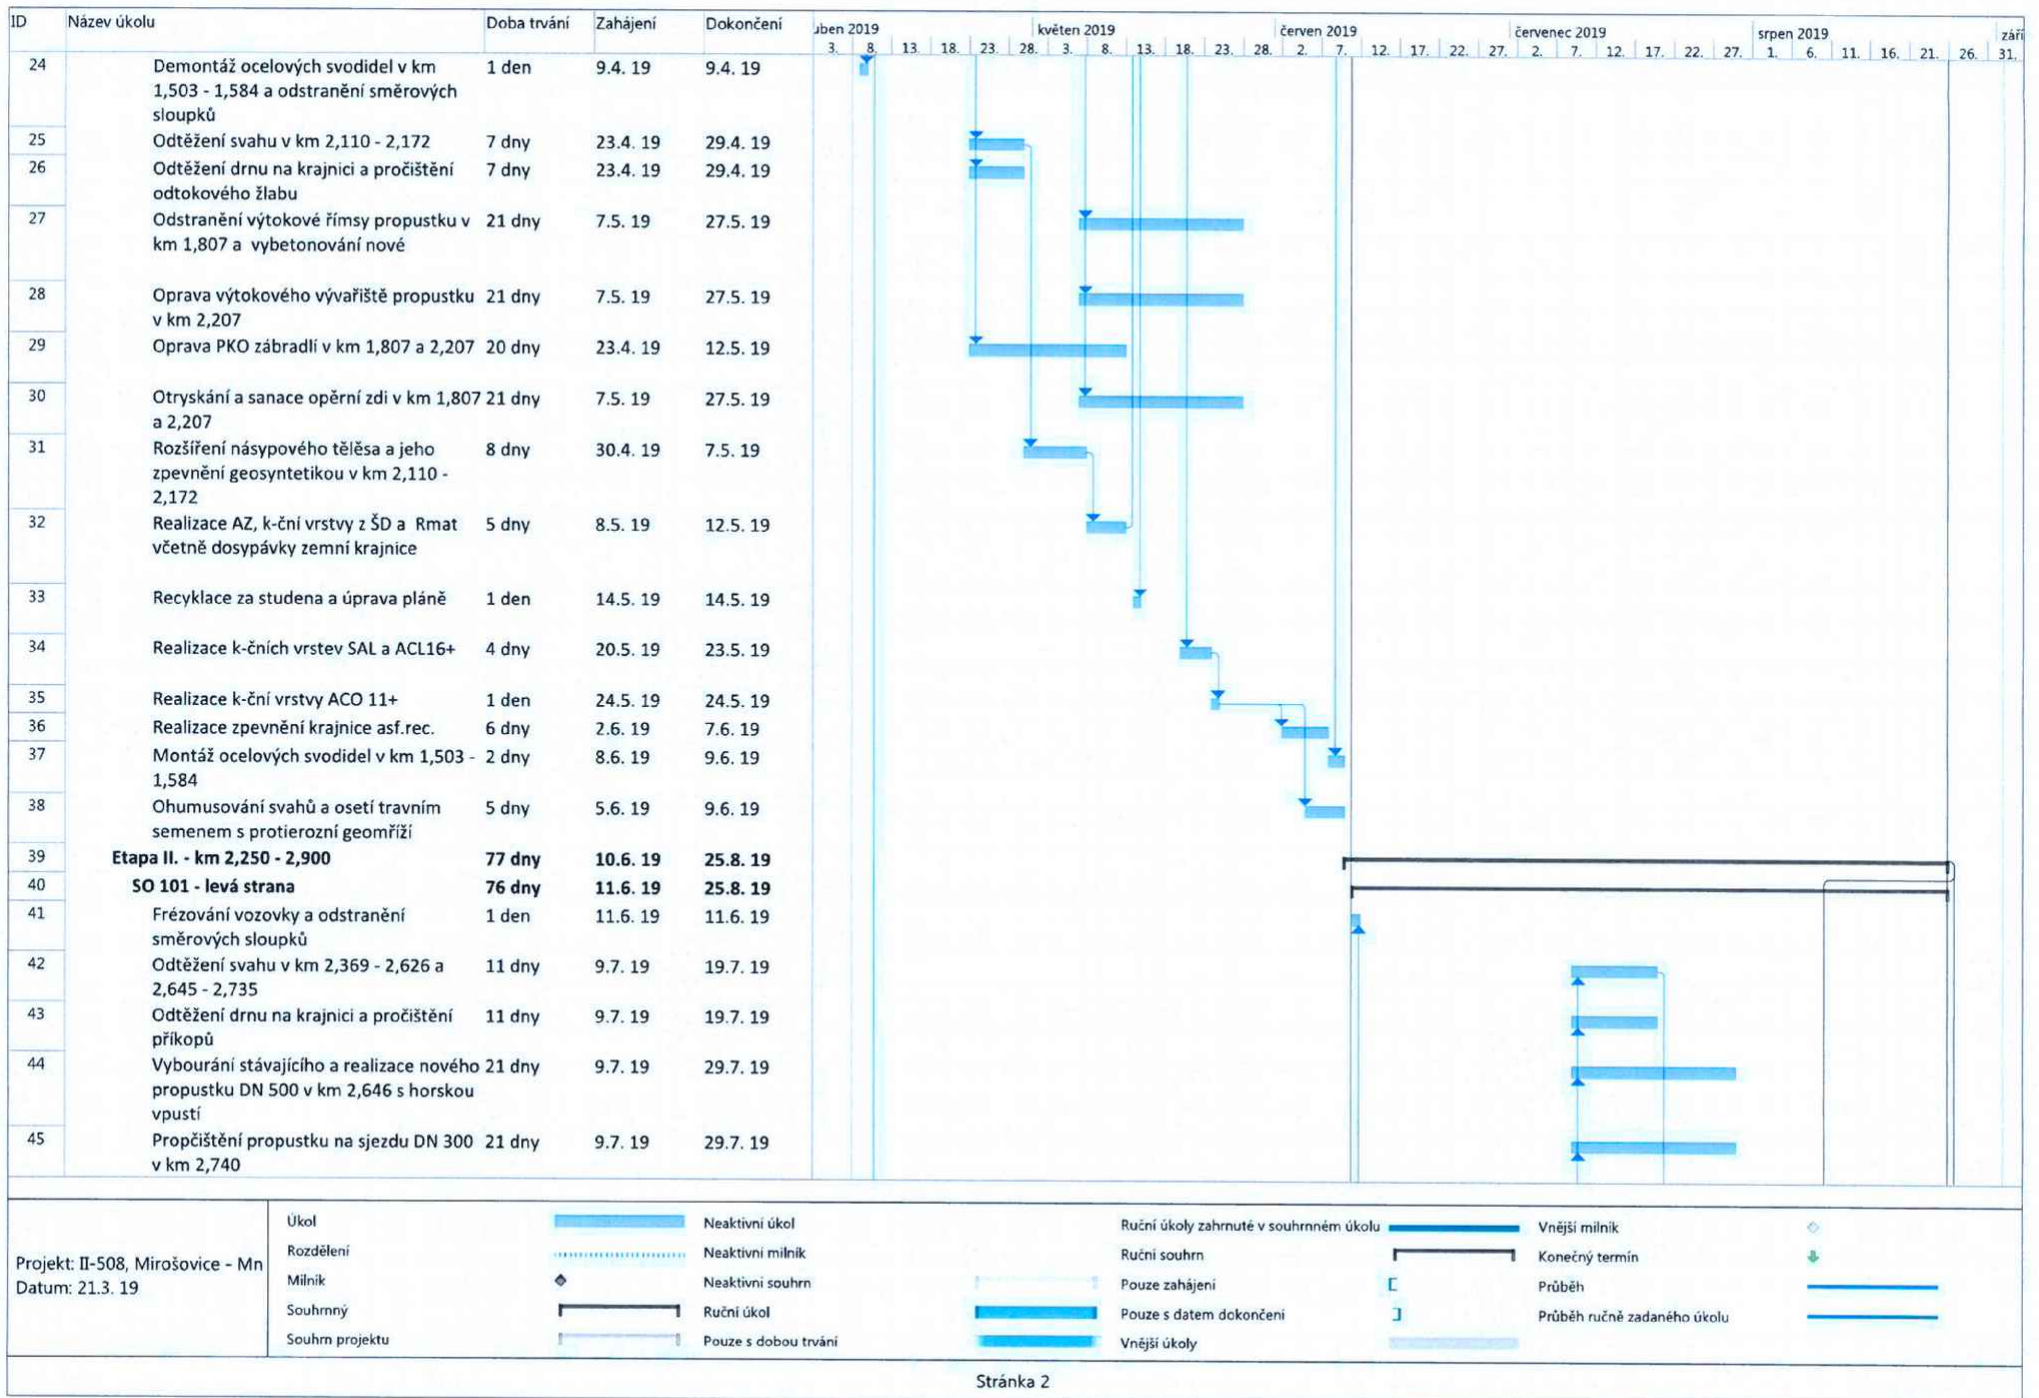

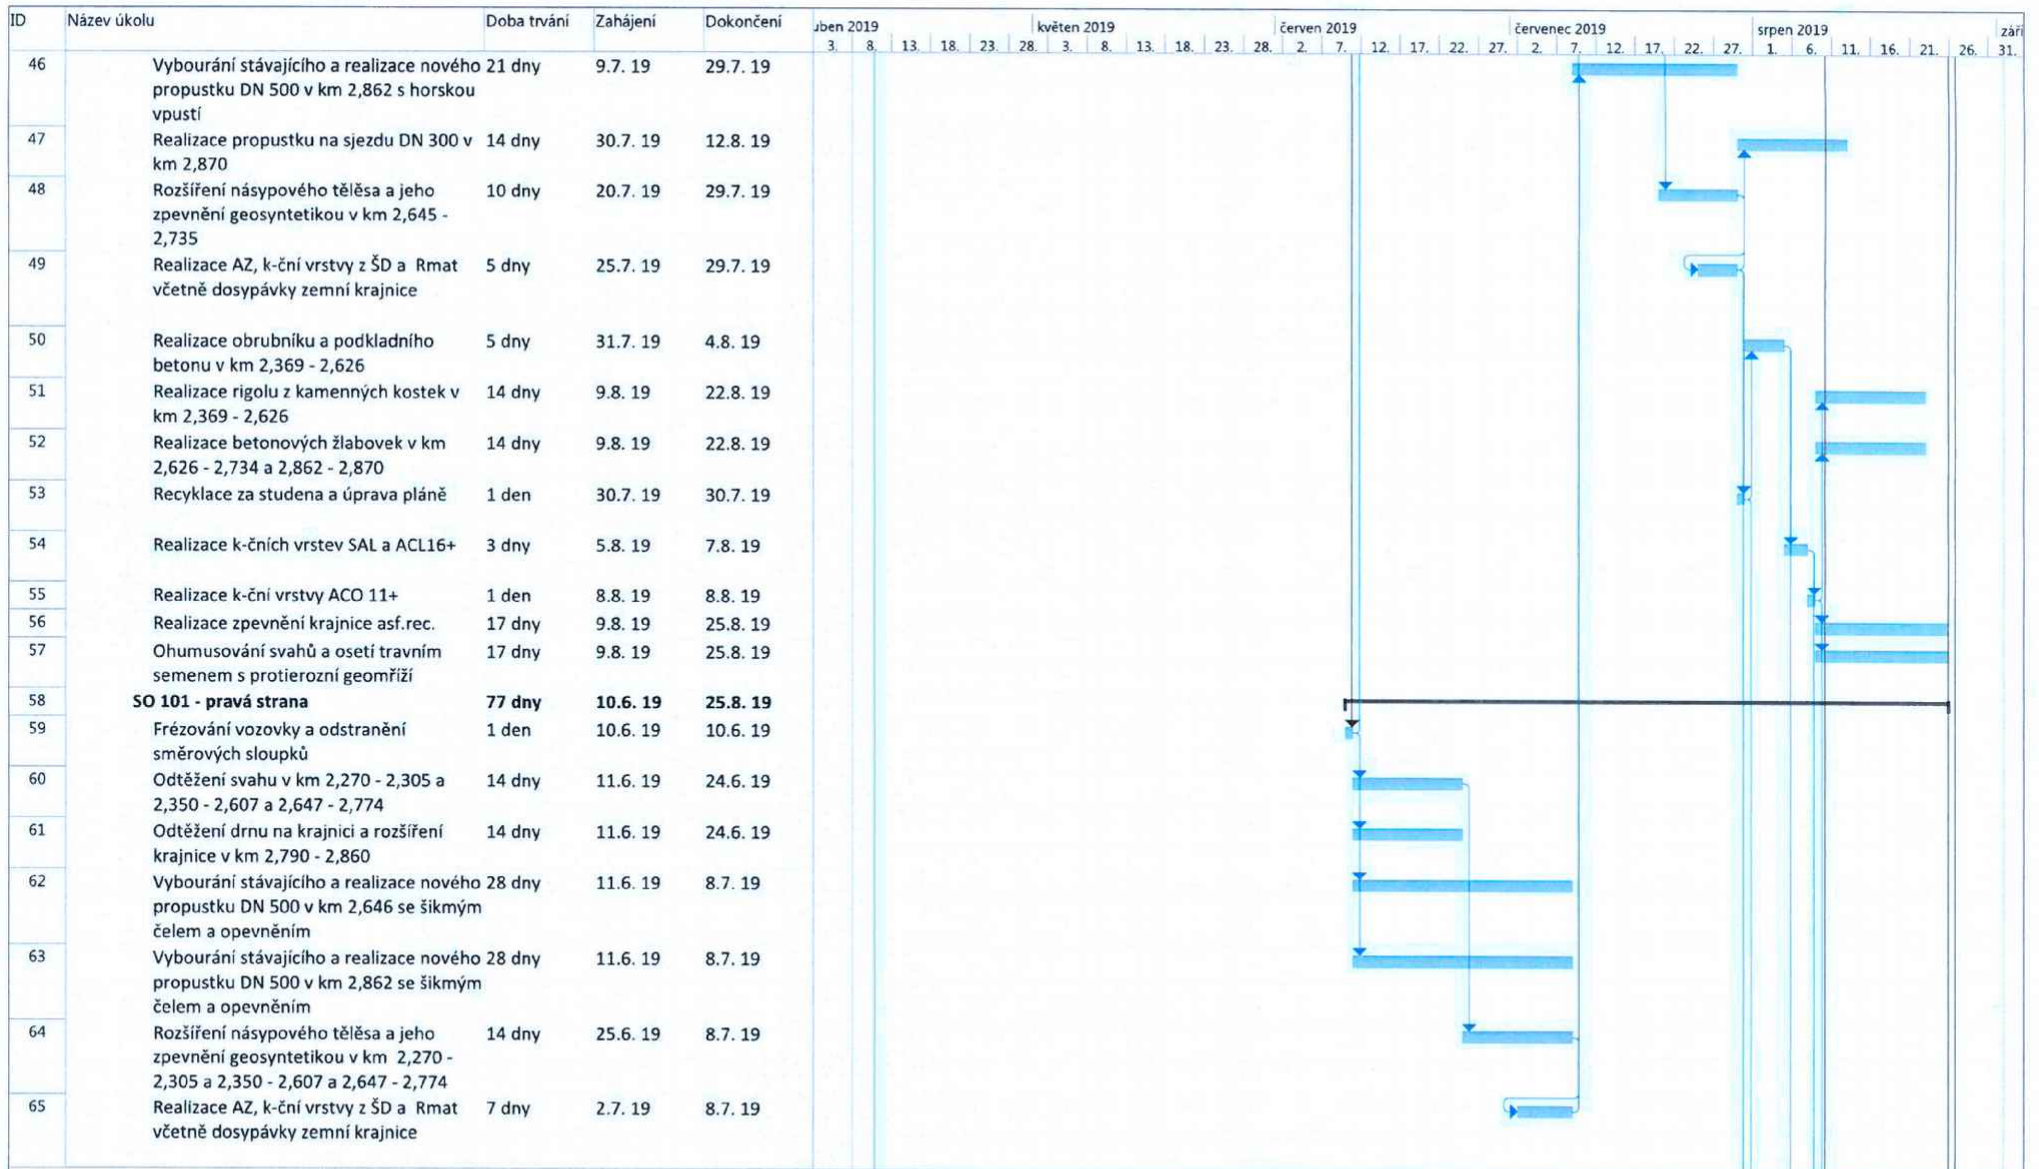

Projekt: II-508, Mirošovice - Mn Datum: 21.3. 19	Úkol		Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník	Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn	Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol	Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly			

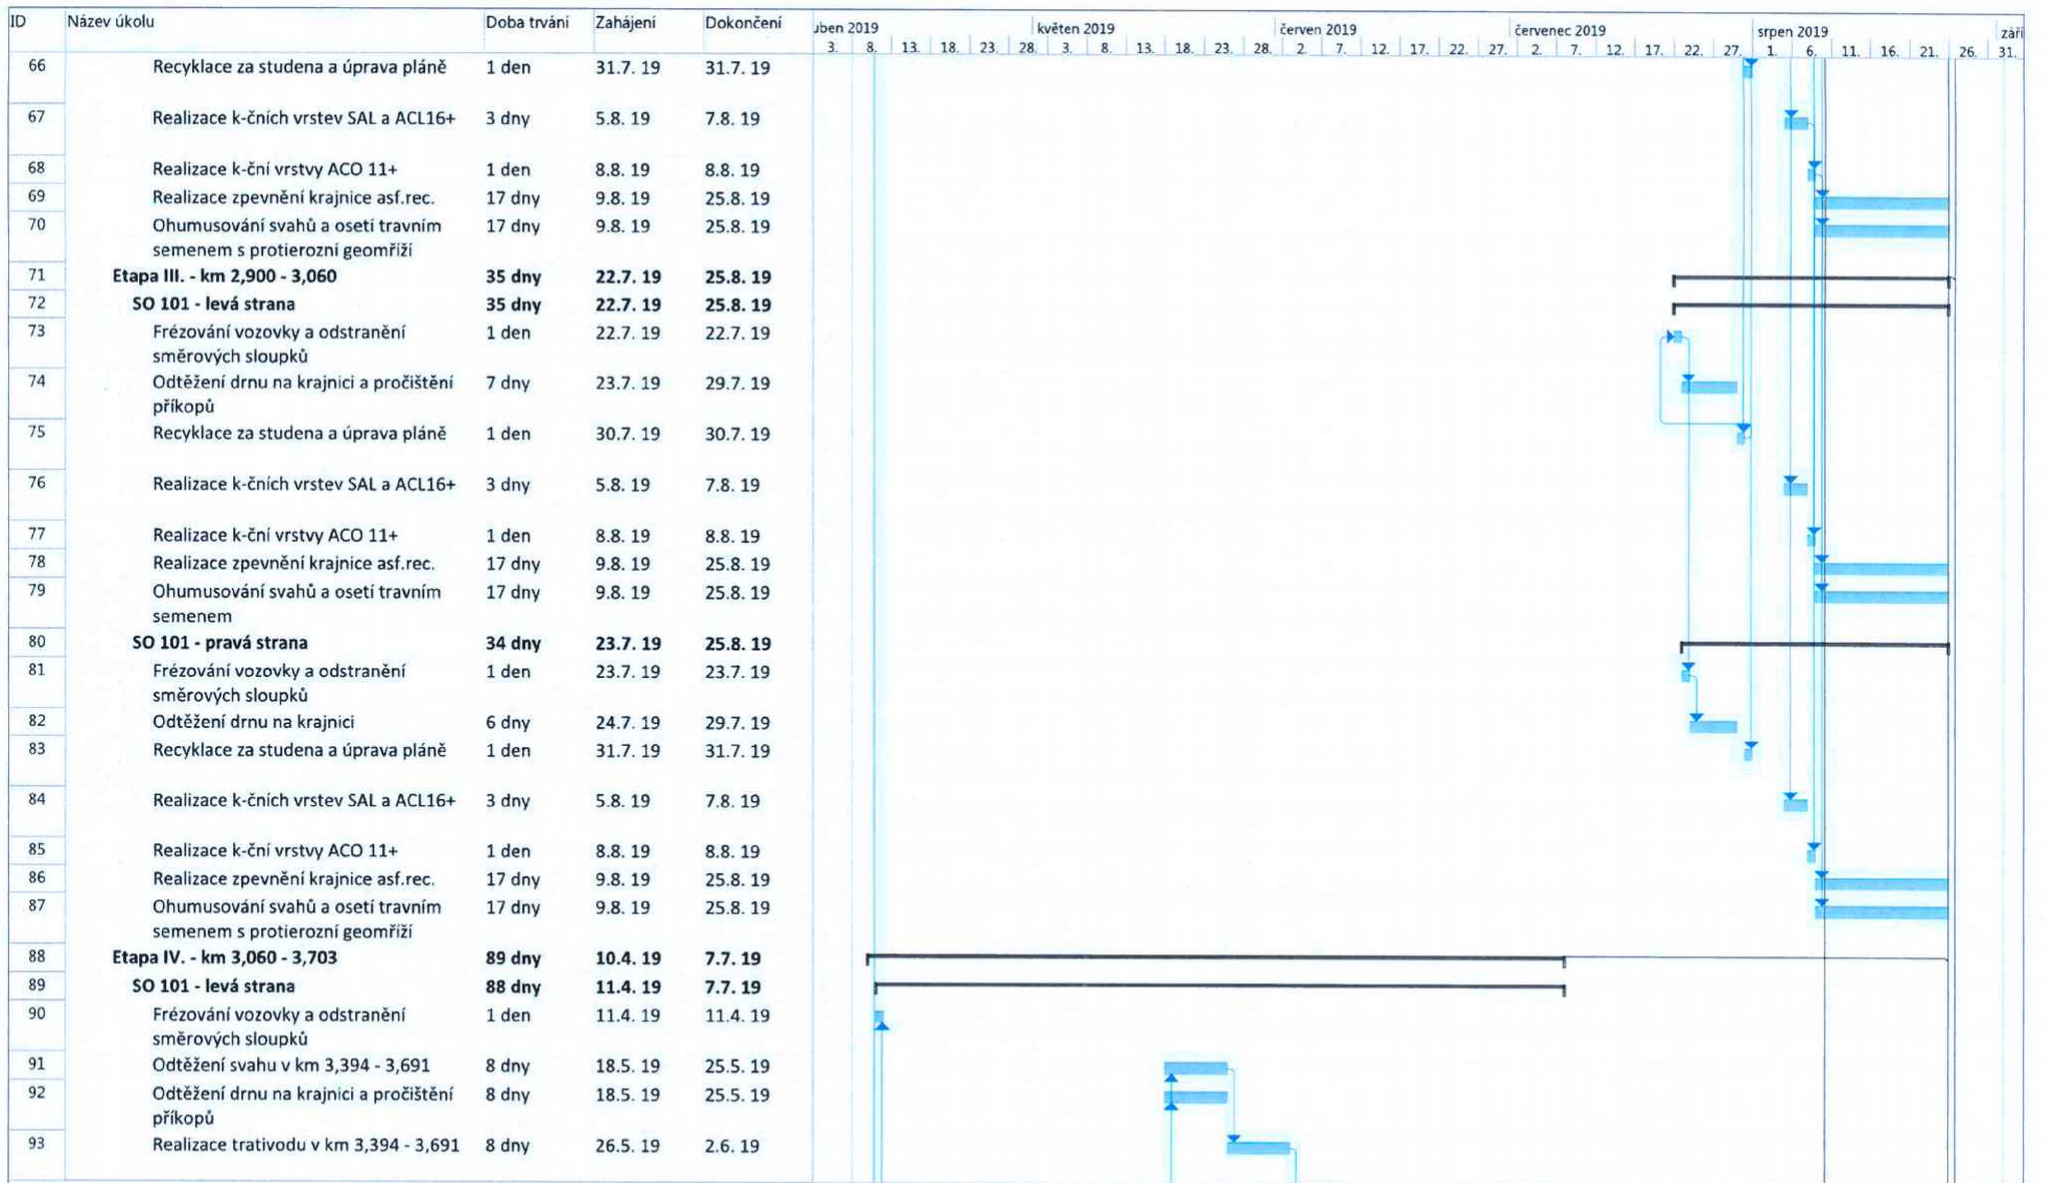

Projekt: II-508, Mirošovice - Mn Datum: 21.3. 19	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadávaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	duben 2019		květen 2019					červen 2019					červenec 2019					srpen 2019					září								
					3.	8.	13.	18.	23.	28.	3.	8.	13.	18.	23.	28.	2.	7.	12.	17.	22.	27.	2.	7.	12.	17.		22.	27.	1.	6.	11.	16.	21.	26.
94	Vybourání stávajícího a realizace nového propustku DN 600 v km 3,161 s šikmým čelem a vývařišťem	23 dny	18.5. 19	9.6. 19																															
95	Vybourání stávajícího a realizace nového propustku DN 500 v km 3,230 s horskou vpustí	23 dny	18.5. 19	9.6. 19																															
96	Vybourání stávajícího a realizace nového propustku DN 500 v km 3,394 s horskou vpustí	23 dny	18.5. 19	9.6. 19																															
97	Vybourání stávajícího a realizace nového propustku DN 500 v km 3,529 s horskou vpustí	23 dny	18.5. 19	9.6. 19																															
98	Realizace AZ, k-čnÍ vrstvy z ŠD a Rmat včetně dosypávky zemní krajnice	7 dny	3.6. 19	9.6. 19																															
99	Realizace obrubníku a podkladního betonu v km 3,394 - 3,691	7 dny	12.6. 19	18.6. 19																															
100	Realizace rigolu z kamenných kostek v km 3,394 - 3,691	13 dny	25.6. 19	7.7. 19																															
101	Recyklace za studena a úprava pláně	1 den	10.6. 19	10.6. 19																															
102	Realizace k-čnÍch vrstev SAL a ACL16+	5 dny	19.6. 19	23.6. 19																															
103	Realizace k-čnÍ vrstvy ACO 11+	1 den	24.6. 19	24.6. 19																															
104	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	13 dny	25.6. 19	7.7. 19																															
105	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní geomříží	13 dny	25.6. 19	7.7. 19																															
106	<b>SO 101 - pravá strana</b>	<b>89 dny</b>	<b>10.4. 19</b>	<b>7.7. 19</b>	[Konečný termín]																														
107	Frézování vozovky a odstranění směrových sloupků	1 den	10.4. 19	10.4. 19																															
108	Odtěžení svahu v km 3,164 - 3,507 a 3,507 - 3,551	15 dny	11.4. 19	25.4. 19																															
109	Odtěžení drnu na krajnici	15 dny	11.4. 19	25.4. 19																															
110	Vybourání stávajícího a realizace nového propustku DN 600 v km 3,161 s šikmým čelem a vývařišťem	30 dny	11.4. 19	10.5. 19																															
111	Vybourání stávajícího a realizace nového propustku DN 500 v km 3,230 se šikmým čelem a opevněním	30 dny	11.4. 19	10.5. 19																															
112	Vybourání stávajícího a realizace nového propustku DN 500 v km 3,394 se šikmým čelem a opevněním	30 dny	11.4. 19	10.5. 19																															
113	Vybourání stávajícího a realizace nového propustku DN 500 v km 3,529 se šikmým čelem a opevněním	30 dny	11.4. 19	10.5. 19																															

**Projekt:** II-508, Mirošovice - Mn  
**Datum:** 21.3. 19

Úkol		Neaktivní úkol		Neaktivní milník		Neaktivní souhrn		Ruční úkol		Pouze s dobou trvání		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Konečný termín		Průběh		Průběh ručně zadaného úkolu	
Rozdělení																					
Milník																					
Souhrnný																					
Souhrn projektu																					



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	úben 2019	květen 2019	červen 2019	červenec 2019	srpen 2019	září
					3. 8. 13. 18. 23. 28.	3. 8. 13. 18. 23. 28.	2. 7. 12. 17. 22. 27.	2. 7. 12. 17. 22. 27.	1. 6. 11. 16. 21. 26. 31.	
114	Rozšíření násypového tělesa a jeho zpevnění geosyntetikou v km 3,164 - 3,507	15 dny	26.4. 19	10.5. 19						
115	Rozšíření násypového o tělesa a jeho zpevnění gabionem a geosyntetikou v km 3,507 - 3,551	15 dny	26.4. 19	10.5. 19						
116	Realizace AZ, k-ční vrstvy z ŠD a Rmat včetně dosypávky zemní krajnice	7 dny	11.5. 19	17.5. 19						
117	Recyklace za studena a úprava pláně	1 den	11.6. 19	11.6. 19						
118	Realizace k-čních vrstev SAL a ACL16+	5 dny	19.6. 19	23.6. 19						
119	Realizace k-ční vrstvy ACO 11+	1 den	24.6. 19	24.6. 19						
120	Realizace zpevnění krajnice asf.rec.	11 dny	25.6. 19	5.7. 19						
121	Montáž ocelových svodidel v km 3,507 - 3,551	2 dny	6.7. 19	7.7. 19						
122	Ohumusování svahů a osetí travním semenem s protierozní a zatravnovací geomříží	13 dny	25.6. 19	7.7. 19						
123	<b>SO 182 - DIO</b>	<b>140 dny</b>	<b>8.4. 19</b>	<b>25.8. 19</b>						
124	Etapa I. - km 1,503 - 2,250	63 dny	8.4. 19	9.6. 19						
125	Etapa II. - km 2,250 - 2,900	77 dny	10.6. 19	25.8. 19						
126	Etapa III. - km 2,900 - 3,060	35 dny	22.7. 19	25.8. 19						
127	Etapa IV. - km 3,060 - 3,703	89 dny	10.4. 19	7.7. 19						
128	<b>SO 193 - SDZ, VDZ</b>	<b>21 dny</b>	<b>12.8. 19</b>	<b>1.9. 19</b>						
129	Realizace SDZ	14 dny	12.8. 19	25.8. 19						
130	Realizace VDZ	7 dny	26.8. 19	1.9. 19						

Projekt: II-508, Mirošovice - Mn Datum: 21.3. 19	Úkol		Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník	Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn	Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol	Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly			
