



## Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801564  
Evidenční číslo Dodatku č.2: DS201900854  
Agendové číslo Dodatku č.2: DS201801564/2  
na provedení stavebních prací  
projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň  
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“  
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388  
CZ.05.5.18/0.0/0.0./17\_070/0006796  
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

---

### 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem  
IČO: 00262978  
DIČ: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o**  
PSC, sídlo: 460 07 Liberec 3, Hanychovská 832/37  
zastoupený: Ing. Martinem Stašákem, na základě plné moci  
Ing. Jaroslavem Koškem, na základě plné moci  
IČO: 47781874  
DIČ: [REDACTED]  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Holemý, hl. stavbyvedoucí  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C/3922

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## **2. Preambule**

**2.1** Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801564 a dne 11.2.2019 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy:

**a) „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**, jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.

**b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“**, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

## **3. Předmět dodatku č. 2**

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo DS201801564 ze dne 26.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.2.2019.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je aktualizace přílohy č. 3 (Seznam poddodavatelů) a navýšení ceny díla

**3.1** S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

**3.2** S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

**3.3** Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

## **4. Cena díla a platební podmínky**

**4.1** Objednatel a Zhotovitel se dohodli na aktualizaci přílohy smlouvy o dílo Poddodavatelé

**4.1.1** Znění Přílohy č.3 Smlouvy (Poddodavatelé) se celé nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku č. 2, a které se stává nedílnou součástí Smlouvy.

**4.2** Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu

díla o dodatečně nepředvídatelné stavební práce akce „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň – stavební práce“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 2 ve Změnovém listě č. 1 až 20.

#### 4.2.1. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 1 639 971,88 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	1 694 491,03 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	54 519,19 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	1 639 971,88 Kč
1. Původní cena díla projektu IPRÚ:	
Cena díla bez DPH	35 918 924,27 Kč
Cena díla včetně DPH	43 461 898,37 Kč
2. Původní cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	13 088 887,53 Kč
Cena díla včetně DPH	15 837 553,91 Kč
1. Nová cena díla projektu IPRÚ	
Cena díla bez DPH	37 556 738,15 Kč
Cena díla včetně DPH	45 443 653,17 Kč
2. Nová cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	13 091 045,53 Kč
Cena díla včetně DPH	15 840 165,10 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	49 007 811,80 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	59 299 452,28 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>50 647 783,68 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>61 283 818,27 Kč</b>

## 5. Všeobecná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Tento dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 639/2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 20

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne .....

V Liberci dne .....

.....  
Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....  
Ing. Martin Stašák, na základě plné moci  
  
.....  
Ing. Jaroslav Košek, na základě plné moci

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 1**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 8.4.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - špatný počet svítidel - dopočet

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- chyba projektu – výkaz výměr neobsahuje správný počet svítidel

		Výkaz	Výkres	1pp	1np	2np	3np	4np
Přisazené svítidlo s leštěnou mřížkou 2x36W - A	ks	32,0	194			15	90	89
Přisazené LED svítidlo s krytem 36W - B	ks	24,0	42	2			20	20
Přisazené LED svítidlo s krytem LED 35W - C	ks	11,0	36				17	19
Přisazené nástěnné venkovní svítidlo LED 20W IP44 D	ks	3,0	3		3			
Přisaz.zářivkové svít.s leskl.mřížkou 2x58W - E	ks	16,0	6					6
Přisazené LED sv. s krytem prachot. 41W - F	ks	1,0	1					1
Svítidlo nouzového osvětlení LED 3W IP40	ks	66,0	53	4	13	8	13	15
Reflektor venkovní LED IP65 30W	ks	1,0	1		1			



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

## REKAPITULACE:

Vícepráce: + 294 809,04 Kč bez DPH

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>1.1.: Svítidla</b>						<b>294 809,04</b>
<b>740: Silnoproud</b>						<b>294 809,04</b>
64.	R0000064	Přisazené svítidlo s leštěnou mřížkou 2x36W - A	ks	162,0	1 272,52	206 148,24
65.	R0000065	Přisazené LED svítidlo s krytem 36W - B	ks	18,0	2 844,85	51 207,30
66.	R0000066	Přisazené LED svítidlo s krytem LED 35W - C	ks	25,0	1 498,14	37 453,50

VLIV NA CENU: + 294 809,04Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

## VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 22.5.2019



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Robert Koska**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

## POŘADOVÉ Č. 2

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 8.4.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - špatný počet svítidel – odpočty

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- chyba projektu – výkaz výměr neobsahuje správný počet svítidel

		Výkaz	Výkres	1pp	1np	2np	3np	4np
Přisazené svítidlo s leštěnou mřížkou 2x36W - A	ks	32,0	194			15	90	89
Přisazené LED svítidlo s krytem 36W - B	ks	24,0	42	2			20	20
Přisazené LED svítidlo s krytem LED 35W - C	ks	11,0	36				17	19
Přisazené nástěnné venkovní svítidlo LED 20W IP44 D	ks	3,0	3		3			
Přisaz.zářivkové svít.s leskl.mřížkou 2x58W - E	ks	16,0	6					6
Přisazené LED sv. s krytem prachot. 41W - F	ks	1,0	1					1
Svítidlo nouzového osvětlení LED 3W IP40	ks	66,0	53	4	13	8	13	15
Reflektor venkovní LED IP65 30W	ks	1,0	1		1			



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

## REKAPITULACE:

Vícepráce: - 54 418,94 Kč bez DPH

### 1.1.: Svítidla

-51 418,94

#### 740: Silnoproud

-51 418,94

12.	X11	Přisaz.zářivkové svít.s leskl.mřížkou 2x58W - E	ks	- 10,0	1 378,94	-13 789,40
13.	X12	Svítidlo nouzového osvětlení LED 3W IP40	ks	- 13,0	2 894,58	-37 629,54

VLIV NA CENU: -51 418,94 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 22.5.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 22.5.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. David Hájíček

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 22.5.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Robert Koska



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 3.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 8.4.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace a výkazu výměr - demontáž svítidel

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

#### **DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- chyba projektu - výkaz výměr ani projektová dokumentace neobsahuje položky pro demontáž původní elektroinstalace. Ve 3.NP a 4.NP byla demontována svítidla a rozvaděč, včetně slaboproudých a silnoproudých rozvodů.

#### **REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 60 036,84 Kč bez DPH**

#### **1.2.: Demontáž elektroinstalace**

**60 036,84**

#### **740: Silnoproud**

**60 036,84**

2.	X1	Demontáž silnoproud	hod	119,0	379,98	45 217,62
3.	X2	Demontáž rozhlasu	hod	5,0	379,98	1 899,90
4.	X3	Demontáž jednotný čas	hod	6,0	379,98	2 279,88
5.	X4	Demontáž strukturované kabeláže	hod	25,0	379,98	9 499,50
6.	X5	Demontáž interkomu	hod	3,0	379,98	1 139,94



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**


**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

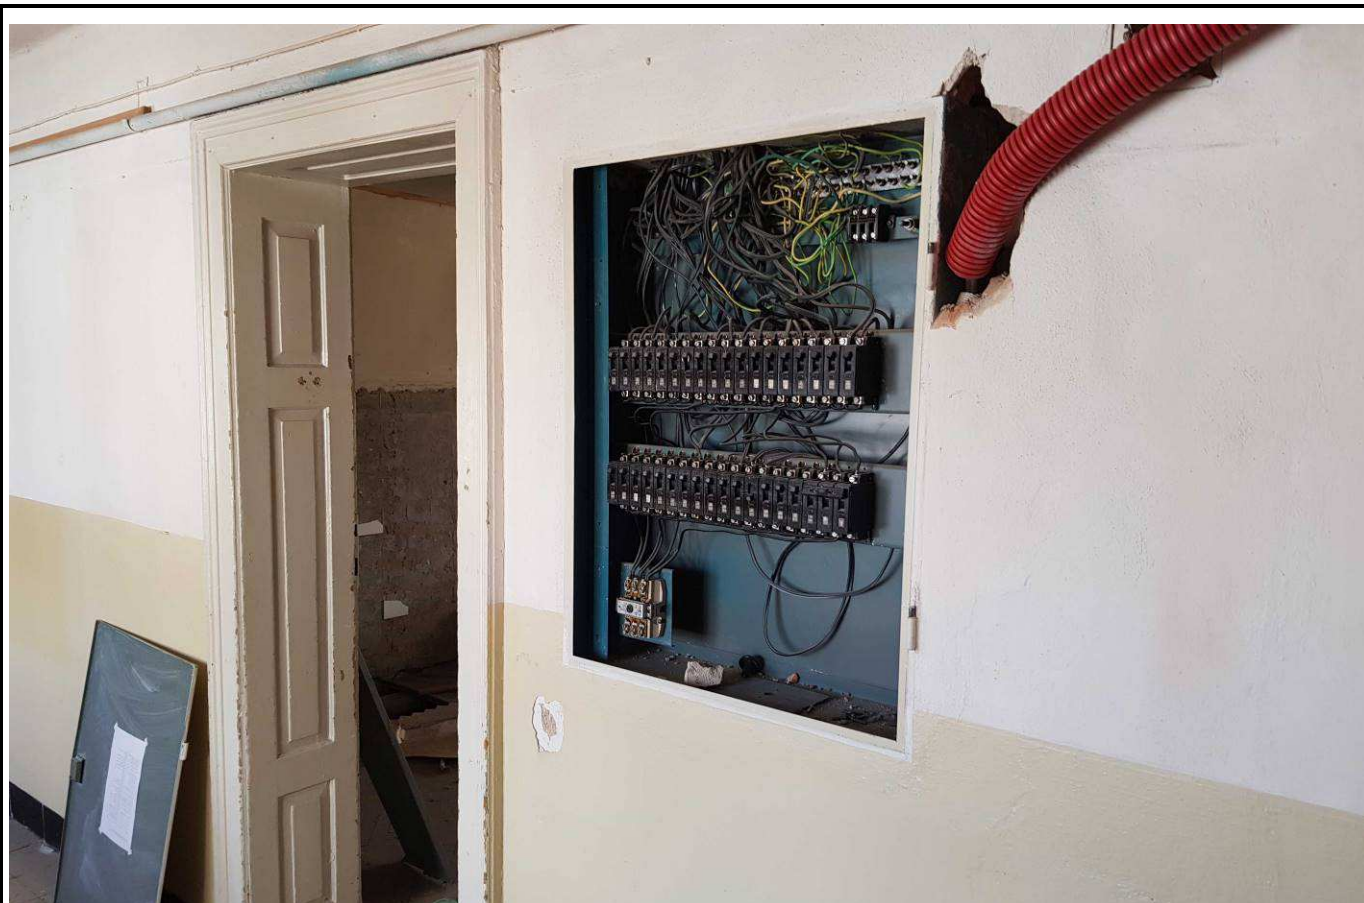

**VLIV NA CENU: + 60 036,84Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

**Časový vliv na dílčí termíny: není**

**Časový vliv na termín dokončení díla: není**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**



**EVROPSKÁ UNIE**

**Evropské strukturální a investiční fondy**

**Operační program Životní prostředí**

**Integrovaný regionální operační program**

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. Robert Koska**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 3.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 8.4.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace a výkazu výměr - demontáž svítidel

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

#### **DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- chyba projektu - výkaz výměr ani projektová dokumentace neobsahuje položky pro demontáž původní elektroinstalace. Ve 3.NP a 4.NP byla demontována svítidla a rozvaděč, včetně slaboproudých a silnoproudých rozvodů.

#### **REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 60 036,84 Kč bez DPH**

#### **1.2.: Demontáž elektroinstalace**

**60 036,84**

#### **740: Silnoproud**

**60 036,84**

2.	X1	Demontáž silnoproud	hod	119,0	379,98	45 217,62
3.	X2	Demontáž rozhlasu	hod	5,0	379,98	1 899,90
4.	X3	Demontáž jednotný čas	hod	6,0	379,98	2 279,88
5.	X4	Demontáž strukturované kabeláže	hod	25,0	379,98	9 499,50
6.	X5	Demontáž interkomu	hod	3,0	379,98	1 139,94



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**


**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

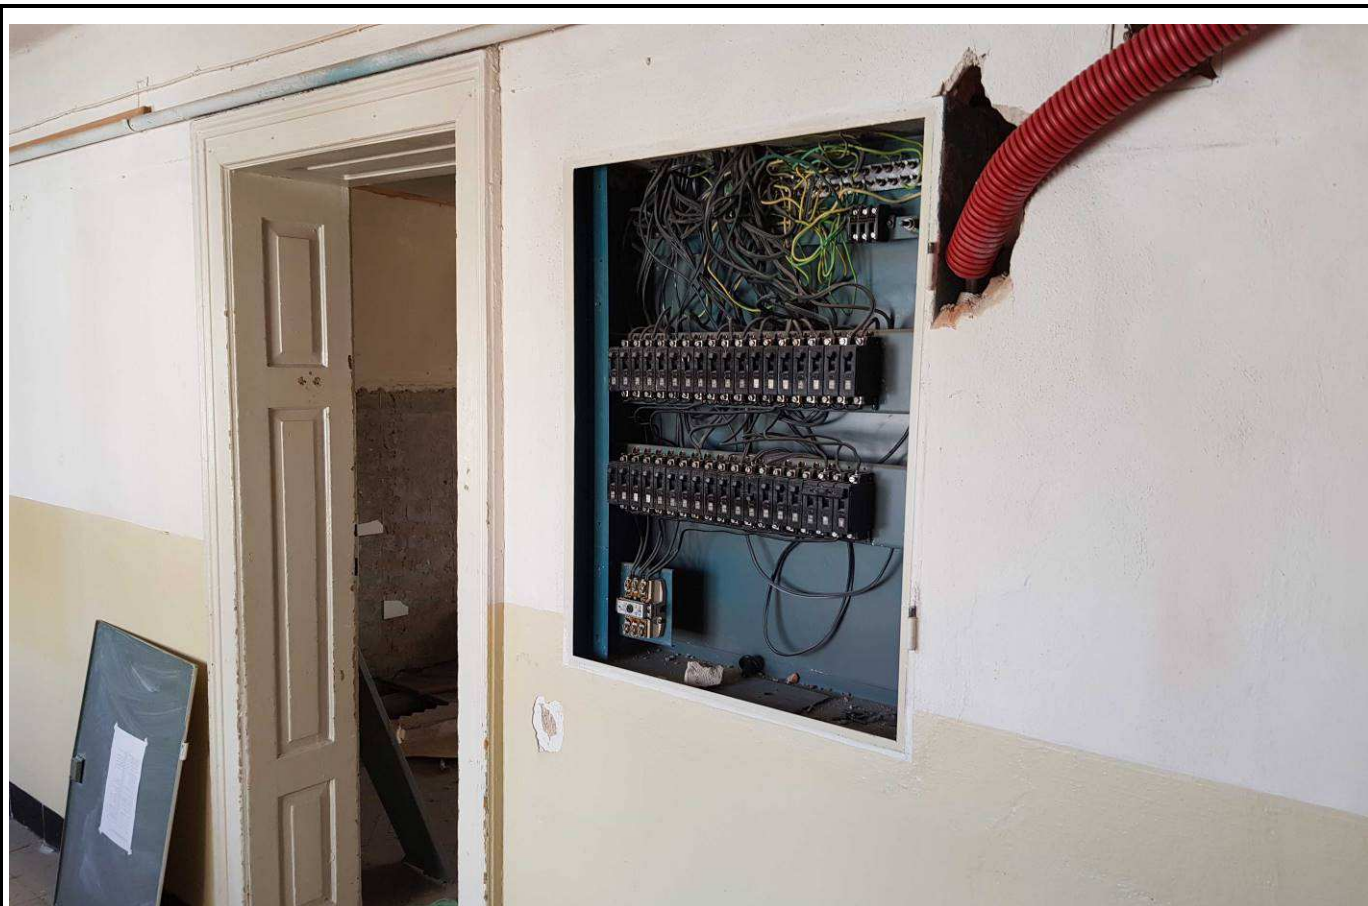

**VLIV NA CENU: + 60 036,84Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

**Časový vliv na dílčí termíny: není**

**Časový vliv na termín dokončení díla: není**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**



**EVROPSKÁ UNIE**

**Evropské strukturální a investiční fondy**

**Operační program Životní prostředí**

**Integrovaný regionální operační program**

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. Robert Koska**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 4.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 8.4.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace – ve výkazu výměr chybí odstranění rákosových omítek a sádkartonové podhledy v místě odstranění omítek

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*


## DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- Na hlavní chodbě ve 4.NP je dle projektové dokumentace skladba stropu C06 – parotěsná fólie a tepelná izolace, ale dle výkresu statiky č.6 se mají části stropu bez cihelných kleneb demontovat (zelené části ve výkresu). Na demontovaných částech by měl být sádkartonový podhled, který ve výkazu výměr chybí. Skladba by měla být stejná, jako skladba C05. Dále ve výkazu výměr chybí demontáž rákosové omítky stropu. Špatná koordinace statické části projektu se stavební částí projektu.

Projektová dokumentace statické části:

### Sanace stropu 4.NP

- Část stropů v chodbě bude ponechána. Jedná se o stropy z cihelných kleneb.
- Tyto stropní konstrukce budou učištěny a penetrovány a následně bude opravena omítka.
- Ostatní konstrukce podhledu, (omítané stropy na rákos) budou zdemontovány.
- Nové konstrukce podhledu jsou navrženy z fošen 60/220 po cca 600-800mm. Fošny budou ukotveny k nosné konstrukci podlahy půdy.
- Po rozkrytí bude statikem navrženo zpevnění prvků podlahy půdy. Předpokládá se zpevnění jak nosných prvků, tak spojů. Napadené dřevěné prvky dřevokaznými škůdci budou vyměněny.

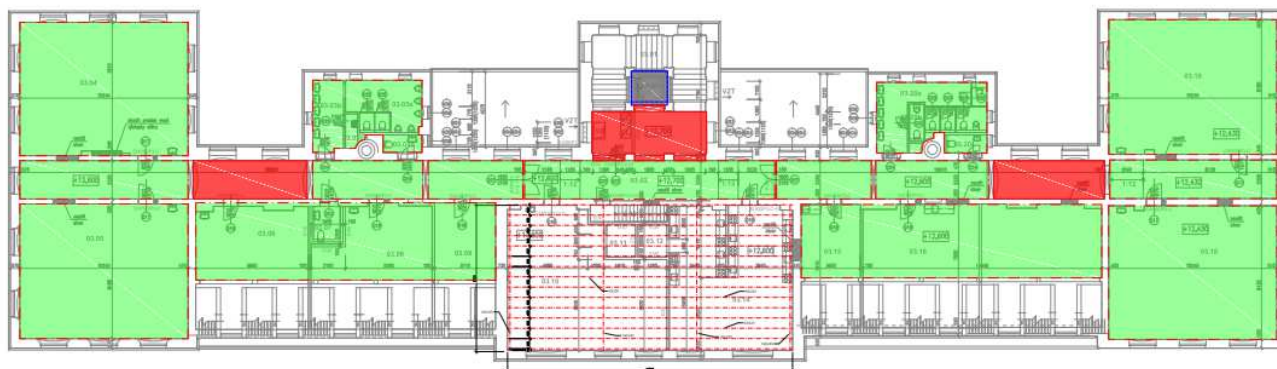

**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

## C05 – ZATEPLENÍ STROPŮ NAD 4NP

TLOUŠŤKA (mm)	MATERIÁLY	
50	ODSTRANIT: OMÍTKA NA RÁKOSOVÉ ROHOŽI 25 mm, PRKENNÝ ZÁKLOP 25 mm, nosná konstrukce stropu AZBEST!!	interiér
15	SDK RASTROVÝ PODHLED	
100	vzduchová mezera	
15	SDK pohled na jednosměrném roštu EI30	
1	parobrzda s proměnnou difúzní délkou	
220	tepelná izolace z minerálních vláken $\lambda d = 0,035$ /fošna dřevěná	
0,5	difúzně otevřená folie kontaktní	
		exteriér

### REKAPITULACE:

Vícepráce: + 267 097,79 Kč bez DPH

#### 1.3.: Sádrokartonové kce

267 096,79

#### 6.1.: Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 714,44

101.	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes - 50 do 100 %	m2	147,308	140,62	20 714,44
------	-----------	--	----	---------	--------	-----------

#### 6.2.: Přesun sutě

14 953,70

106.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	7,365	796,00	5 862,86
109.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,365	213,85	1 575,01
110.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	103,11	9,32	960,99
112.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	7,365	890,00	6 554,85

#### 763: Konstrukce suché výstavby

231 428,66

192.	763131414	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD - jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI	m2	147,079	654,08	96 202,13
204.	763135101	.1 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně - zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	147,079	323,45	47 572,70
205.	590305722	podhled akustický SDK pohltivý 600x600	m2	147,079	565,00	83 099,64
213.	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,518	1 294,49	4 554,18



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 267 096,79 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**JMÉNO: Ing. David Hájiček**

**VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Robert Koska**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 5.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 8.4.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - chybějící ocelová konstrukce výtahové šachty

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

## DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- V technické zprávě v části **č.10 Výtah** je uvedeno, že výtahová šachta bude mít konstrukci svařenou u ocelových jacklů. V projektové dokumentaci i výkazu výměr návrh šachty chybí.

### 10. Výtah

Bude vybudován nový výtah se 4 stanicemi s kabinou dle požadavků pro bezbariérové užívání. Výtah bude umístěn do zrcadla tříramenného schodiště. Šachta

8



Efektivní financování úspor energie

bude tvořena kovovými jackly a deskovým obkladem. Nástupní stanice budou v 1.NP až 4.NP směrem na podestu schodiště. Kabina je navržena s vnitřním rozměrem 1140/1250 mm. Stěny výtahové šachty budou mít požární odolnost dle požadavků PBŘ – EI 30 DP1, dveře EI 15 DP1.

Pro výtah bude vybourán nadjezd – bude vybourána část klenby nad zrcadlem schodiště, prostor bude zastřešen železobetonovou deskou. V přízemí bude vybourána prohlubeň cca 1300 mm hluboká pro dojezd výtahu.

Odbourání zdiva bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu a před zahájením bude přizván statik, aby posoudil na sond způsob bourání a případně navrhne podchyčení a statické zajištění.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

## REKAPITULACE:

Vícepráce: + 587 412,98 Kč bez DPH

### 1.4.: Ocelová konstrukce výtahové šachty

587 412,98

#### 767: Konstrukce zámečnické

587 412,98

279.	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	6 085,065	51,76	314 936,17
282.	1301082-R	ocel profilová	t	6,593	40 000,00	263 736,00
286.	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,593	1 325,77	8 740,81

VLIV NA CENU: + 587 412,98 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

## VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 22.5.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

## VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 22.5.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. David Hájiček

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 22.5.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Robert Koska



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 6**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 8.4.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - špatný počet zařizovacích předmětů a hydrantů

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a Investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

#### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- v projektové dokumentaci je nesoulad v počtu zařizovacích předmětů a hydrantů mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr

#### REKAPITULACE:

Vícepráce: + 55 666,55 Kč bez DPH

#### 1.6.: Chyby ZTI

56 666,55

#### 722: Vnitřní vodovod

41 745,00

380.	722254231R T2	Hydrantový systém, box nerez	kus	2,0	20 872,50	41 745,00
------	------------------	------------------------------	-----	-----	-----------	-----------

#### 725: Zařizovací předměty

9 516,55

407.	725.010	splachovací tlačítko WC/VÝ podomítkových splachovačů	ks	1,0	596,85	596,85
409.	725.051	montážní sada pro umyvadla na stěnu	ks	1,0	27,90	27,90
415.	725014121R T1	Klozet závěsný hlub. splach., bílý	ks	1,0	4 694,30	4 694,30
419.	725017122R0 0	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ks	1,0	1 127,00	1 127,00
440.	725823511R T1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, pro jednu vodu (Keramická kartuš, 40)	kus	1,0	2 070,00	2 070,00
445.	725860213R0 0	Sifon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,0	172,50	172,50
447.	725860216R T1	Připojovací souprava, 5/4 "	kus	1,0	241,50	241,50
448.	725860261R0 0	Výpust' umyvadlová , stále otevřená	kus	1,0	586,50	586,50

#### 726: Instalační prefabrikáty

4 715,00

451.	726211321R0 0	Modul-WC do lehkých stěn, h 112 cm, přední ovládání	ks	1,0	4 715,00	4 715,00
------	------------------	---	----	-----	----------	----------

#### H722: Vnitřní vodovod

276,00

461.	998722103R0 0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,2	1 380,00	276,00
------	------------------	--	---	-----	----------	--------

#### H725: Zařizovací předměty

276,00

464.	998725103R0 0	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,2	1 380,00	276,00
------	------------------	--	---	-----	----------	--------

#### H726: Instalační prefabrikáty

138,00



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a Investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

465.	998726123R0 0	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00
------	------------------	---	---	-----	----------	--------

**VLIV NA CENU: + 55 666,66 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a Investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a Investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.**

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Robert Koska**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a Investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: FS Vision, s.r.o.**

**Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec“**

**Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006796**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 7**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 7.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - špatný počet armatur v kotelně

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor

**DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- byl zjištěn nesoulad v počtu armatur v kotelně mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr

### REKAPITULACE:

**Vícepráce: + 2 158 Kč bez DPH**

**2.1.: Chyby**

**kotelny**

**2 158,00**

**3: Ústřední**

**vytápění -**

**armatury**

**2 158,00**

26.	551243890	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2"	kus	3,0	183,00	549,00
27.	551281380	teploměr s jímkou 1/2" 0°-120°C	kus	2,0	308,00	616,00
28.	551281380 R1	tlakoměr d 100 vč. trojcestného kohoutu a smyčky 1/2"	kus	2,0	308,00	616,00
452.	55114128	kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený	kus	1,0	377,00	377,00



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: FS Vision, s.r.o.**

**Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec“**

**Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006796**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 2 158,- Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 22.5.2019**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: FS Vision, s.r.o.**

**Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec“**

**Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006796**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájiček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Martin Sehnoutka**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 8.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 7.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC


**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - výměna poškozených částí úžlabí X1,X2,X3

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- dle výkresu č.18 Půdorys krovu se bude provádět výměna poškozených částí úžlabí X1, X2, X3. Smluvní výkaz výměr počítá s výměnou kroků, vaznic a pozednice. Pro výměnu těchto konstrukcí bude nutné v těchto částech střechy rozebrat celou střechu vč. bednění a krytiny – chybí ve výkazu výměr

Projektová dokumentace stavební části:

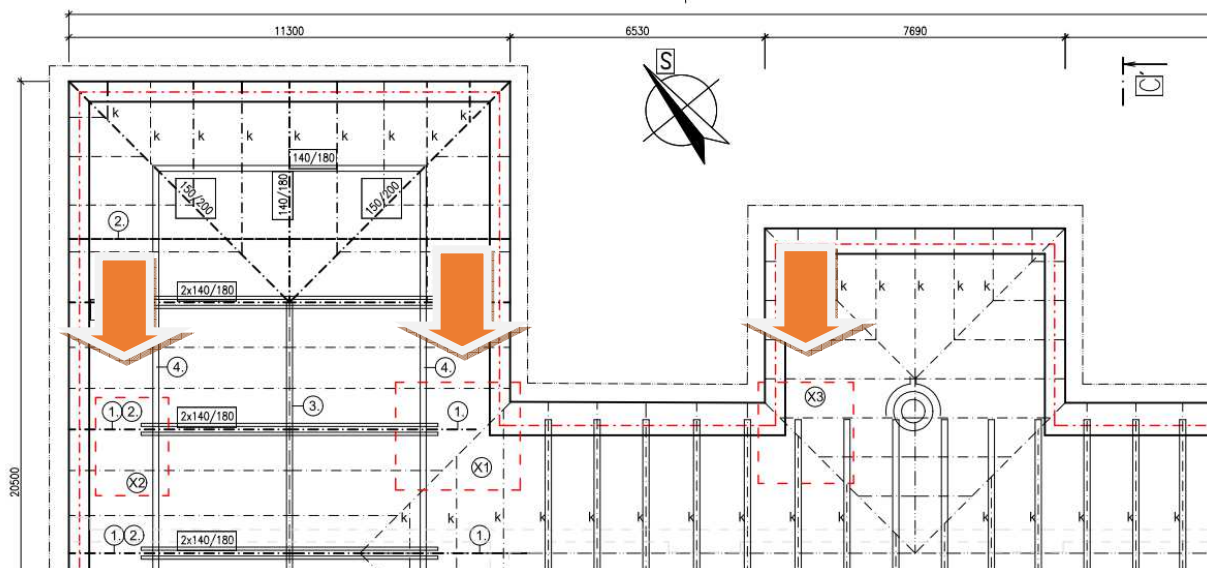

**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## REKAPITULACE:

**Vícepráce: + 35 428,01 Kč bez DPH**

### 2.2.: Chybějící položky v místech výměny krokví a vaznic X1 -3

**35 428,01**

#### 712: Povlakové krytiny

**966,20**

119.	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP	m 2	21,76	16,00	348,16
120.	628111200	pás asfaltovaný A330 H	m 2	25,02 4	24,00	600,58
121.	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,015	1 136,14	17,47

#### 762: Konstrukce tesařské

**6 898,74**

163.	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z - prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m 2	21,76	115,00	2 502,40
164.	605151110.1	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m 3	0,5	6 600,00	3 303,17
183.	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,275	1 455,55	400,28
455.	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m 2	21,76	31,84	692,90

#### 764: Konstrukce klempířské

**27 563,06**

220.	764121452	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 4 do - 10 ks/m <sup>2</sup> do 30 st.	m 2	21,76	1 125,23	24 485,00
227.	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,065	1 949,72	126,85
454.	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m 2	21,76	135,63	2 951,20



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 35 428,01 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 22.5.2019**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájiček**

**VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 9.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 7.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - výměna výlezů střech

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

#### **DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

V projektové dokumentaci je zakreslena výměna všech střešních výleží. Ve smluvním rozpočtu je jejich demontáž a montáž. Vzhledem k prováděným výměnám výleží je nutno provést okolo nich výměnu střešní krytiny – tato položka chybí ve výkazu výměr.

#### **REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 38 895,87 Kč bez DPH**

#### **2.3.: Chybějící položky na opravě střechy při výměně výleží**

**38 895,87**

##### **712: Povlakové krytiny**

**1 287,76**

119.	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP	m 2	28,98	16,00	463,68
120.	628111200	pás asfaltovaný A330 H	m 2	33,32 7	24,00	799,85
121.	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,021	1 136,14	24,23

##### **764: Konstrukce klempířské**

**37 608,11**

214.	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m	96,6	50,00	4 830,00
220.	764121452	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 4 do - 10 ks/m <sup>2</sup> do 30 st.	m 2	28,98	1 125,23	32 609,17
227.	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,087	1 949,72	168,94



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 38 895,87 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 10**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 7.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - zaslepení potrubí ZTI a ÚT, zjišťování tras potrubí ZTI a ÚT – nebyl provedený dostatečně podrobný stavebně-technický průzkum

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

#### **DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- v projektové dokumentaci bylo uvedené jiné trasování ÚT a ZTI, bylo nutné najít stávající rozvody. Stávající potrubí zaslepit vč. sekání a provést novou tlakovou zkoušku potrubí. Výkaz výměr obsahuje jen demontáže potrubí a zařizovacích předmětů. Položky na zaslepení potrubí a další tlakové zkoušky chybí.

#### **REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 43 000 Kč bez DPH**

#### **2.4.: Chybějící položky v ÚT a vody**

**43 000,00**

#### **7: Ostatní**

**43 000,00**

34.	R000000034	Tlaková zkouška dle ČSN 060310	ks	2,0	5 000,00	10 000,00
457.	X1	Zjišťování skutečného stavu rozvodu vody 4.NP neodpovídající PD	hod	27,0	440,00	11 880,00
458.	X2	Zjišťování tras stávající vody neodpovídající PD 3.NP	hod	14,0	440,00	6 160,00
459.	X3	Zaslepení potrubí PB 03.20 C vč.sekání	hod	16,0	440,00	7 040,00
460.	X4	Zaslepení potrubí FE 03.16 vč.sekání	hod	8,0	440,00	3 520,00
461.	X5	Zaslepení potrubí FE 03.03. B	hod	3,0	440,00	1 320,00
462.	X6	Zaslepení potrubí 03.08	hod	3,0	440,00	1 320,00
463.	X8	Zaslepení potrubí 03.03 A	hod	4,0	440,00	1 760,00

**VLIV NA CENU: + 43 000 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

#### **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Projektant:** ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.  
**Projekt:** „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního a sociální inkluze“  
**Reg. číslo projektu:** CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388  
**Umístění:** Liberec  
*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*  
*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 11.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM:** 7.5.2019

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** nepředvídatelné okolnosti - doplnění věnce pod pozednice v místě vikýřů, stav zjištěn při odkrytí

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- bude provedena kompletní demontáž vikýře vč. pozednic. Stávající zdivo v místě pozednic je ve špatném stavu, proto je nutné v místech pozednic udělat nové věnce, se kterými rozpočet nepočítal.

**REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 53 679,09 Kč bez DPH**

**2.5.: Chybějící věnce pod pozednice v místě vikýřů**

**53 679,09**

**004.: Vodorovné konstrukce**

**50 226,07**

464.	41732141 4	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,689	3 043,11	14 269,47
465.	41735111 5	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	18,035	304,29	5 487,84
466.	41735111 6	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	18,035	71,51	1 289,62
467.	41736122 1	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,7	41 684,50	29 179,15

**6.3.: Přesun hmot**

**3 453,03**

113.	99801100 3	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	12,334	279,96	3 453,03
------	---------------	--	---	--------	--------	----------



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 53 679,09 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 12.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 7.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** nepředvídatelná okolnost - chybějící nosná zeď mezi místnostmi 2.07-2.08

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388


Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

#### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- po odkrytí a demontáži stávajících konstrukcí došlo ke zjištění, že zeď mezi třídami 2.07 – 2.08 není nosná. Jsou to dvě příčky se vzduchovou mezerou. Statik proto navrhl nový betonový věnec a ocelové profily.

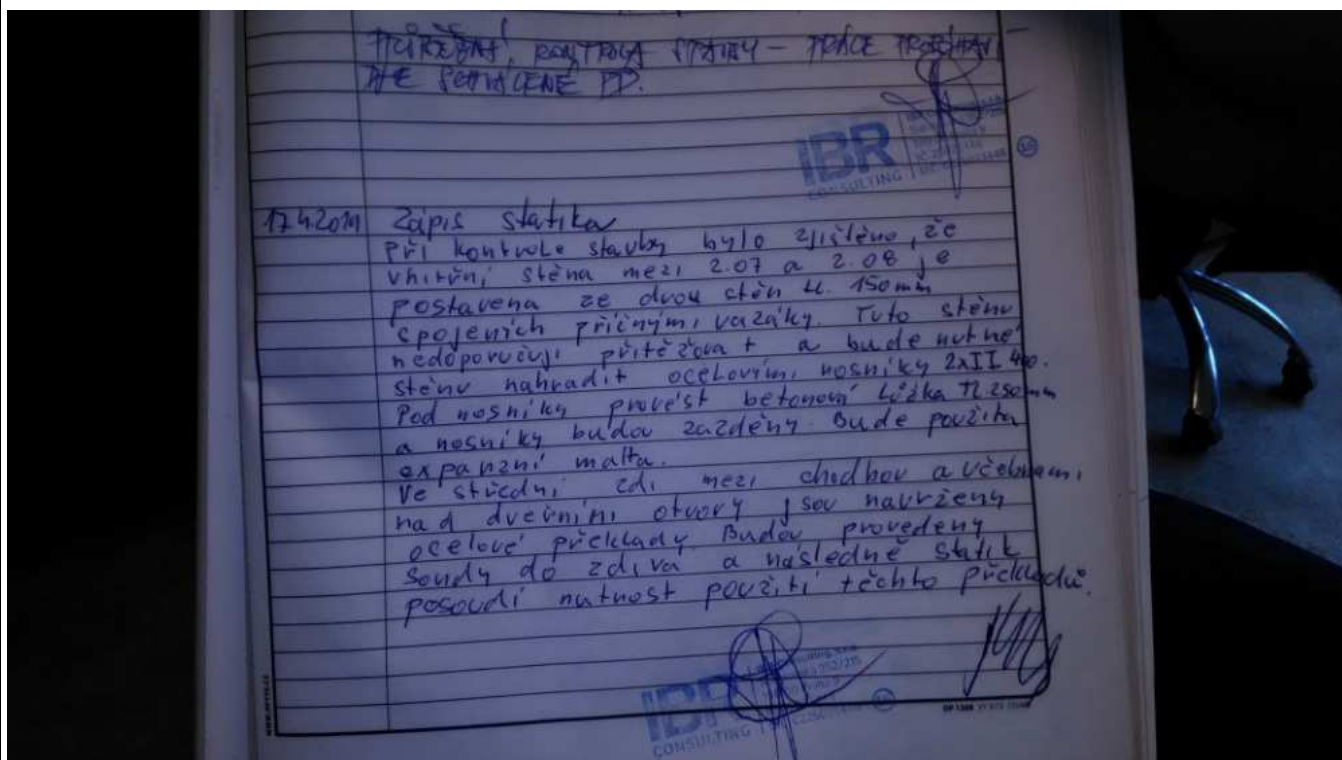

#### REKAPITULACE:

Vícepráce: + 27 554,21 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**2.6.: Chybějící nosná zeď mezi  
2.07-2.08**

**27 554,21**

**004: Vodorovné konstrukce**

**4 295,28**

464.	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,209	3 043,11	637,23
465.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,188	304,29	1 274,36
466.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,188	71,51	299,47
467.	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,05	41 684,50	2 084,22

**6.3.: Přesun hmot**

**164,62**

113.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	0,588	279,96	164,62
------	-----------	--	---	-------	--------	--------

**767: Konstrukce zámečnické**

**18 914,32**

279.	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	193,48 6	51,76	10 013,96
280.	130108200	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,223	40 000,00	8 900,36

**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**

**4 180,00**

476.	X20	Statický návrh	Kč	1,0	4 180,00	4 180,00
------	-----	----------------	----	-----	----------	----------

**VLIV NA CENU: + 27 554,21 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 22.5.2019**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE:** 22.5.2019

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** Ing. David Hájiček

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 13**

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 7.5.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: nepředvídatelná změna - nová elektroinstalace v prostoru schodiště

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- dle revizní zprávy, které je přílohou tohoto změnového listu, je nutno provést novou kabeláž elektroinstalace v prostoru schodiště, protože stávající elektroinstalace je v havarijním stavu

**REKAPITULACE:**

Vícepráce: + 138 834,69 Kč bez DPH

**2.7.: Nové kabeláž v schodišťovém prostoru**

**138 834,69**

**6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**90 675,00**

39.	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	251,875	155,00	39 040,63
47.	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do - tmelu stěn	m2	251,875	205,00	51 634,38

**740: Silnoproud**

**34 092,47**

18.	R0000018	Dtto 3x1,5	m	301,0	34,30	10 324,30
32.	R0000032	Odbočná krabice se svorkovnicí do stěny	ks	12,0	164,84	1 978,08
44.	R0000044	Jednopolový vypínač pod omítku	ks	8,0	187,10	1 496,80
65.	R0000065	Přisazené LED svítidlo s krytem 36W - B	ks	3,0	2 844,85	8 534,55
66.	R0000066	Přisazené LED svítidlo s krytem LED 35W - C	ks	6,0	1 498,14	8 988,84
468.	X9	Jistič B10/1	kus	1,0	130,00	130,00
469.	X10	Jistič B6/1	ks	1,0	130,00	130,00
470.	X11	Impulsní relé	ks	1,0	610,00	610,00
471.	X12	Montáž doplnění rozvaděče R1B	Nhod	5,0	379,98	1 899,90

**784: Dokončovací práce - malby a tapety**

**14 067,22**

314.	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,875	20,97	5 281,82
315.	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v - místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,875	34,88	8 785,40



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 138 834,69,- Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 22.5.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájiček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Posudek zpráva o revizi elektrického zařízení***podle ČSN 331500, ČSN 33 2000-6, ČSN EN 60849, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a norem souvisejících*

<b>Druh revize:</b>	<b>Dílčí posudek</b>	<b>Číslo zakázky:</b>	<b>041 S 19</b>
---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

<b>Datum zahájení:</b>	10.5.2019	<b>Datum vypracování RZ:</b>	10.5.2019
<b>Datum ukončení:</b>	10.5.2019	<b>Datum předání RZ:</b>	13.5.2019

<b>Revizní technik:</b>	<b>Objednatel:</b>	<b>Revidovaný objekt:</b>
Josef Salaba ev. číslo RT: 3646/6/11/R-EZ-E2A ev. číslo opr.: 12413/6/09/EZ-M,O,R-E2/A ESRAM. spol. s r.o. Pražská 2197/94, Jablonec nad Nisou IČO: 2596780, DIČ: CZ2596780 Pobočka Jablonec nad Nisou	První podještědská stavební spol. s r.o. Hanychovská 832/37 460 07 Liberec  tel.: IČO: DIČ:	ZŠ 5.květena Liberec Osvětlení schodiště .

**Rozsah revidovaného zařízení:**

Světelné rozvody schodiště.

**Zdroje elektrického proudu:**

Primární napěťová soustava:	1+NPE 400/230V TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem:	Automatickým odpojením od zdroje napětí v síti TN.
Záložní zdroje:	není
Ochrana před úrazem el. proudem:	

**Měření provedeno přístroji:**

SMART MI2 120, Megaohm 500L, PU 180 použitý měřicí přístroj má v době měření platnou kalibraci.

<b>Při revizi odpojeno vadné zařízení v:</b>	nebylo odpojeno
--	-----------------

<b>Celkový posudek:</b>	<b>nevyhovuje</b>
-------------------------	-------------------

**Revidované elektrické zařízení není schopné bezpečného provozu.****Podpis uživatele**

Rozdělovník:

2x objednatel	Tato zpráva má 3 strany
1x revizní technik	Počet vyhotovení: 3x
1x ESRAM s.r.o..	Počet příloh: 1x

Provozovna, kores  
Te

## 1. Celkové informace

Dle projektu elektroinstalace není do rekonstrukce zahrnuto osvětlení a ovládání světel schodiště. Tyto rozvody jsou provedeny kabely AYKY 2x2,5. Tyto rozvody jsou značně zastaralé. Kabeláže jsou za hranici životnosti.

Izolace vodičů je vyhrátá a při manipulaci se lámou AL žíly. Zásadní problém je že nové rozvody chodeb a tříd jsou provedeny v soustavě TN-S a rozvody schodiště TN-C. Při zachování starých rozvodů dojde k jejich poruchám.

Zásadní problém je napojení na novou síť, které neodpovídá ČSN. Doporučuji provést rekonstrukci světelných rozvodů schodiště.

<b>Dodavatel zařízení:</b>	ESRAM s.r.o. ,Pražská 94 , Jablonec nad Nisou
<b>Dodavatel projektu:</b>	
<b>Dokumentace:</b>	
<b>Protokoly o určení vnějších vlivů:</b>	
<b>Výchozí revize částí:</b>	
<b>Záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních, provedených na el. zařízeních před jeho uvedením do provozu:</b>	Nebylo nutné
<b>Doklady stanovené příslušným předpisem:</b>	

## 2. Rozsah revidovaného zařízení

Osvětlení schodiště	1ks	Přívody ke svítidlům a vypínačům.

## 3. Prohlídka

Byla provedena prohlídka zařízení, při které bylo zjišťováno nedodržení požadavků platných norem.


## 7. Závady a nedodělky

Na revidovaném elektrickém zařízení byly zjištěny závady , které by ohrožovaly bezpečnost provozu zařízení.

## 8. Závěr

Po provedeném měření a zkouškách je možno konstatovat, že revidované zařízení ohrožuje bezpečnost osob, a není schopno trvalého a bezpečného provozu.

**Doporučuji provést rekonstrukci světelných rozvodů schodiště.**

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 14**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 7.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - doplnění rozvaděčů R2B a R3B

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

#### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- rozvaděče R2B a R3B nelze doplnit z důvodů malé rezervy. Proto je nutné vedle stávajících rozvaděčů nainstalovat nový rozvaděč doplněný dle nové PD

#### REKAPITULACE:

Vícepráce: + 14 950 Kč bez DPH

**2.8.: Přidání nového rozvaděče vedle R2Ba R3B 14 950,00**

**740: Silnoproud 14 950,00**

472.	X13	Nový rozvaděč vedle stávající vč. montáž	ks	2,0	7 475,00	14 950,00
------	-----	--	----	-----	----------	-----------

VLIV NA CENU: + 14 950 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

#### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.**

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 15**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 7.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - přemístění ústředny EZS

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

#### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- stávající ústředna se nacházela na příčce, která byla v projektu určena ke zbourání, proto bude přesunuta.

#### REKAPITULACE:

Vícepráce: + 2 860 Kč bez DPH

**2.9.: Přemístění ústředny EZS**

**2 860,00**

**740: Silnoproud**

**2 860,00**

474.	X15	Přemístění úschovny	hod	6,0	440,00	2 640,00
475.	X16	Doprava	kpl	1,0	220,00	220,00

VLIV NA CENU: + 2 860 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

#### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.**

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 16.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 7.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** nepředvídatelná okolnost - bourání stávajícího zdiva ve 4.NP

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

#### **DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- při bourání stropu nad 3.NP byl odhalen sokl z cihelného zdiva, který bylo nutno odbourat viz. foto



#### **REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 34 374,84 Kč bez DPH**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

**2.91.: Bourání stávajícího zdiva ve 4.NP**

**34 374,84**

**003: Svislé konstrukce**

**5 637,92**

477	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	21,12	267,00	5 637,92
-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

**6.1.: Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**5 416,25**

76	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu - vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	6,33	855,00	5 416,25
----	-----------	--	----	------	--------	----------

**6.2.: Přesun sutě**

**23 151,85**

106	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	11,40	796,00	9 076,79
109	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,40	213,85	2 438,53
110	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	159,64	9,32	1 487,86
112	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	11,40	890,00	10 148,67

**6.3.: Přesun hmot**

**168,82**

113	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	0,60	279,96	168,82
-----	-----------	--	---	------	--------	--------

**VLIV NA CENU: + 34 374,84 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**dokumentaci a smluvních dokumentech.**

**DNE: 22.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 17.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 24.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace – chybějící sádrokarton pro obklad římsy a pozednice

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388


Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

## DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- dle výkresu detailu č.01 musí být římsa vč. pozednice zakryta sádkokartonem, ve výkazu výměr zakrytí chybí. Projektová dokumentace uvádí jinou výšku, protože i na této straně je cihelný sokl, bude mít zakrytí výšku 1,3m.

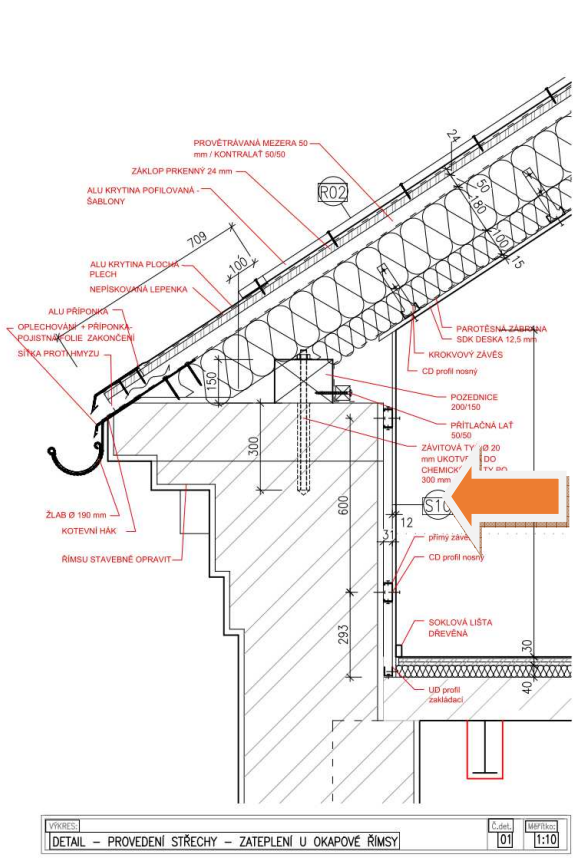

## REKAPITULACE:

Vícepráce: + 29 536,32 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**17: Obklad SDK římsy  
a pozednice  
763: Konstrukce suché  
výstavby**

**29 536,32**

**29 536,32**

189.	763121421	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše - opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	46,722	555,87	25 971,36
190.	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze - sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	46,722	22,39	1 045,88
191.	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení - [Q3]	m2	46,722	32,61	1 523,62
213.	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,769	1 294,49	995,46

**VLIV NA CENU: + 29 536,32 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

**S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**dokončení díla.**

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 18.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 28.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Zrušení úpravy rozvaděče R-1A a napojení kabeláže k nouzové signalizaci

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor

**DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- cenová úprava napojení signalizace WC 1.NP a změna napojovacího bodu pro nouzové svítidlo v místnosti č.0.30

**REKAPITULACE:**

**Vícepráce: - 3 100,21 Kč bez DPH**

**18: Změna napojení nouzového signalizace v 1.NP**

**Zn. 00: POLOŽKA**

**-3 100,21**

3.	R0000003	Doplnění rozvaděče R1A dle v.č.E3	ks	- 1,0	2 087,11	<b>-2 087,11</b>
17.	R0000017	Kabel CYKY 2x1,5	m	- 33,0	30,70	<b>-1 013,10</b>



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: - 3 100,21 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 19.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 28.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - elektroinstalace a zdroje pro pisoáry

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor

**DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- počet automatických pisoárů nesouhlasí v PD mezi ZTI a elektro, v mč. 2,04 je 5 pisoárů, ale připojené jsou pouze 2

**REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 2 142,72 Kč bez DPH**

**19: Doplnění automatického splachování**

**2 142,72**

**Zn. 00: POLOŽKA**

**2 142,72**

17.	R0000017	Kabel CYKY 2x1,5	m	8,0	30,70	245,60
78.	R0000078	Zdroj pro aut.splachovač pisoáru (vybrat dle dod.zařízení)	ks	1,0	1 897,12	1 897,12



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 2 142,72 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 20.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 28.5.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace - dopočet připojení 2ks sporáků

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- ve výkazu výměr a projektové dokumentaci u rozvaděče R4B je příprava pro instalaci 6ks sporáků, ale v místnosti č.3.14 je zakresleno 8ks sporáků, proto jsou doplněny chybějící 2ks sporákových kombinací, kabel ke sporákům a rozvaděč s dalšími 2 jističi

### REKAPITULACE:

**Vícepráce: + 5 055,08 Kč bez DPH**

**20: Doplnění sporákových přívodů 5 055,08**

**Zn. 00: POLOŽKA 5 055,08**

20.	R0000020	Dtto 5x2,5	m	44,0	45,12	1 985,28
53.	R0000053	Sporáková kombinace pod omítku	ks	2,0	557,40	1 114,80
484.	X1	Doplnění jističů a úprava rozvaděče	kus	1,0	1 955,00	1 955,00



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 5 055,08 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájiček**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 30.5.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program





Příloha č. 4

## Seznam poddodavatelů

v rámci podlimitní zakázky zadávané formou otevřeného řízení:

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň - stavební práce“

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>SAVA spol. s r.o.</b>
IČ:	150 45 111
DIČ:	CZ 150 45 111
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Bitouchovská 473, 513 01 Semily
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Martin Chlupáč, jednatel
Přehled věcného rozsahu plnění:	vnější výplně otvorů

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>Thermica plus spol. s r.o.</b>
IČ:	254 28 616
DIČ:	CZ 254 28 616
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Jablonecká 42/35, 460 05 Liberec
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Martin Berčo, jednatel
Přehled věcného rozsahu plnění:	ZTI, vytápění

<b>Obchodní jméno poddodavatele:</b>	<b>ESRAM S.R.O.</b>
IČ:	257 96 780
DIČ:	CZ 257 96 780
Sídlo (místo podnikání / bydliště) poddodavatele:	Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec nad Nisou
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Josef Salaba, jednatel
Přehled věcného rozsahu plnění:	elektroinstalace

V Liberci dne 8.4.2019

.....  
Ing. Martin Stašák, Ing. Jaroslav Košek,  
oba na základě plné moci
