



## Dodatek č. 4

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801564  
Evidenční číslo Dodatku č.4: DS201900859  
Agendové číslo Dodatku č.4: DS201801564/4  
na provedení stavebních prací  
projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň  
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“  
reg. číslo projektu: **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**  
**CZ.05.5.18/0.0/0.0./17\_070/0006796**  
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

---

### 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o**  
PSC, sídlo: 460 07 Liberec 3, Hanychovská 832/37  
zastoupený: Ing. Martinem Stašákem, na základě plné moci  
Ing. Jaroslavem Koškem, na základě plné moci  
IČO: 47781874  
DIČ: CZ47781874  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Holemý, hl. stavbyvedoucí  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C/3922

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## **2. Preambule**

**2.1** Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801564 a dne 11.2.2019 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy:

**a) „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**, jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.

**b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“**, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

## **3. Předmět dodatku č. 4**

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo DS201801564 ze dne 26.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.2.2019 a připravovaného dodatku č. 2 a 3.

Předmětem tohoto dodatku č. 4 je navýšení ceny díla, prodloužení termínu realizace a aktualizace příloh Smlouvy o dílo č. 2a a 2b - časového a finančního harmonogramu.

**3.1** S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

**3.2** S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

**3.3** Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

## **4. Cena díla a platební podmínky**

**4.1** Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečně nepředvídatelné stavební práce akce „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň – stavební práce“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 4 ve Změnových listech č. 22 až 26.

#### 4.1.1. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 1 104 608,24 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	<b>1 104 608,24 Kč</b>
1. Původní cena díla projektu IPRÚ:	
Cena díla bez DPH	39 256 021,82 Kč
Cena díla včetně DPH	47 499 786,41 Kč
2. Původní cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	13 091 045,53 Kč
Cena díla včetně DPH	15 840 165,10 Kč
1. Nová cena díla projektu IPRÚ	
Cena díla bez DPH	40 360 630,06 Kč
Cena díla včetně DPH	48 836 362,38 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	<b>52 347 067,35 Kč</b>
Původní celková cena díla včetně DPH:	<b>63 339 951,51 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>53 451 675,59 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>64 676 527,48 Kč</b>

### **5. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla**

- 5.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním článku 4 odst. 4.7 Smlouvy za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu plnění díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 5.2 **Změnou dojde k** prodloužení lhůty výstavby o 21 dní t.j. 6 měsíců a 21 dní. V souladu s odst. 4.5 Smlouvy bude upraven závazný časový harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 2a, resp. finanční plán stavby, který tvoří přílohu č. 2b smlouvy o dílo.

### **6. Všeobecná ustanovení**

- 6.1 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 6.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 4 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6.6 Dodatek č. 4 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 6.8 Tento dodatek č. 4 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 644/2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 22 až 26

Příloha č. 2 – Časový harmonogram prací

Příloha č. 3 - Finanční plán stavby

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne .....

V Liberci dne .....

.....  
Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....  
Ing. Martin Stašák, na základě plné moci

.....  
Ing. Jaroslav Košek, na základě plné moci

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 22.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 4.6.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** nepředvídatelné okolnosti - nová elektroinstalace ve 3.NP

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

#### **DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- osazením nové ocelové konstrukce stropu ve 3.NP dojde k zásahu do páteřních rozvodů elektroinstalace a jejich přerušení, kdy původní elektroinstalace je z hliníku. Nelze jí proto spojit s novou měděnou instalací z důvodu následné revize. Je nutné provést kompletní nové rozvody elektro ve 3.NP.



#### **REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 644 739,92 Kč bez DPH**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**22: Nová elektroinstalace v 3.NP**

**644 739,92**

**VRN1: Vedlejší rozpočtové náklady**

**40 975,00**

475.	01	Zaržení staveniště - Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS	kus	1,0	27 225,00	27 225,00
478.	08	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,0	13 750,00	13 750,00

**Zn. 00: POLOŽKA**

**603 764,92**

16.	R0000016	Kabel CYKY 4x10	m	133,0	134,47	17 884,51
18.	R0000018	Dtto 3x1,5	m	2 600,0	34,30	89 180,00
19.	R0000019	Dtto 3x2,5	m	2 485,0	43,45	107 973,25
20.	R0000020	Dtto 5x2,5	m	20,0	45,12	902,40
32.	R0000032	Odbočná krabice se svorkovnicí do stěny	ks	78,0	164,84	12 857,52
44.	R0000044	Jednopólový vypínač pod omítku	ks	28,0	187,10	5 238,80
45.	R0000045	Seriový vypínač pod omítku	ks	5,0	230,50	1 152,50
46.	R0000046	Střídavý přepínač	ks	4,0	196,97	787,88
59.	R0000059	Zásuvka 230/16A pod omítku	ks	83,0	196,97	16 348,51
63.	R0000063	Svorka pospojování	ks	23,0	114,55	2 634,65
75.	R0000075	Rošt ocelový drátěný 50/100	m	75,0	381,38	28 603,50
76.	R0000076	Trubka pod omítkou 32mm	m	52,0	42,20	2 194,40
77.	R0000077	Ocelová nosná konstrukce do 5kg vč.povrchové úpravy	ks	1,0	697,10	697,10
79.	R0000079	Ukončení kabelu do 4x10	ks	130,0	118,74	15 436,20
82.	R0000082	Ukončení vodiče pospojování	ks	23,0	19,50	448,50
83.	R0000083	Průraz zdívem	ks	18,0	815,84	14 685,12
84.	R0000084	Prostup mezi požárními úseky	ks	12,0	1 933,44	23 201,28
85.	R0000085	Drážka ve zdivu vč. začištění	m	286,0	279,40	79 908,40
87.	R0000087	Pomocné práce, zkušební provoz, kompletace	hod	30,0	379,98	11 399,40
485.	X36	Rozvaděč R3A komplet	kus	1,0	32 835,00	32 835,00
486.	X37	Rozvaděč R3B komplet	kus	1,0	42 317,00	42 317,00
487.	X38	Doplnění rozvaděče RH	kus	1,0	3 960,00	3 960,00
488.	X39	Kabel Cyky 5x1,5	m	110,0	66,00	7 260,00
489.	X40	Krabice přístrojová	kus	128,0	43,00	5 504,00
490.	X41	Rošt drátěný 50/50	m	140,0	240,00	33 600,00
491.	X42	De+mont. stávajícího osvětlení (napojení nových kabelů)	ks	39,0	345,00	13 455,00
492.	X43	Revize	ks	1,0	3 300,00	3 300,00
493.	X44	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,0	5 000,00	5 000,00
510.	X62	Provedení prováděcí dokumentace	ks	1,0	25 000,00	25 000,00



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 644 739,92 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: 21 dní

Časový vliv na termín dokončení díla: 21 dní

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 4.6.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 4.6.2019



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájiček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 4.6.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 23.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 4.6.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: chyba projektové dokumentace – chybí ve výkazu výměr-požadavek provozovatele na doplnění elektrozámek ke dveřím

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- na základě požadavku provozovatele objektu bude doplněn počet elektrozámek

### REKAPITULACE:

Vícepráce: + 30 020 Kč bez DPH

**23: Elektrozámky ke dveřím**

**30 020,00**

**767: Konstrukce zámečnické**

**30 020,00**

494.	X45	D+M Elektrozámek G.U. Secury Automatic ke dveřím D01, D02, D14 a D09	kus	4,0	7 505,00	30 020,00
------	-----	----------------------------------------------------------------------	-----	-----	----------	-----------

VLIV NA CENU: + 30 020 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 4.6.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 4.6.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 4.6.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 24.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 7.6.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Chyba projektové dokumentace - sekání kapes pro traverzy a jejich zazdívání

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

#### **DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- ve výkazu výměr chybí vysekávání kapes pro traverzy a jejich zazdívání a zazdívání kapes po odstranění původních trámů



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## REKAPITULACE:

**Vícepráce: + 246 547,81 Kč bez DPH**

### **24: Sekání kapes nosníků a zabetonování nosníků**

**246 547,81**

#### **003: Svislé konstrukce**

**87 229,08**

480	31023624 1	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	304,0	154,43	46 946,72
481	31023524 1	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	256,0	83,16	21 288,93
512	31235110 1	Zřízení jednostranného bednění zdí výplňových	m2	35,16	372,03	13 080,57
513	31235110 2	Odstranění jednostranného bednění zdí výplňových	m2	35,16	168,17	5 912,86

#### **004: Vodorovné konstrukce**

**38 890,74**

482	41323221 1	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	150,0	101,93	15 289,50
483	41323222 1	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	123,0	191,88	23 601,24

#### **006: Úpravy povrchu**

**5 176,96**

511	63245012 1	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	17,58	294,48	5 176,96
-----	---------------	---------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

#### **009: Ostatní konstrukce a práce**

**66 457,23**

477	97303132 5	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	243,0	230,01	55 892,43
478	97303134 5	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	30,0	352,16	10 564,80

#### **6.1.: Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**19 351,28**

66.	94910111 1	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové - podlahy do 1,9 m	m2	415,978	46,52	19 351,28
-----	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**6.2.: Přesun sutě**

**21 202,74**

106.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	10,443	796,00	8 312,63
109.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,443	213,85	2 233,24
110.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	146,202	9,32	1 362,60
112.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	10,443	890,00	9 294,27

**6.3.: Přesun hmot**

**8 239,78**

113.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	29,432	279,96	8 239,78
------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

**VLIV NA CENU: + 246 547,81 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 7.6.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 7.6.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. David Hájíček

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 7.6.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 25.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 4.6.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Chyba projektové dokumentace – chybí ve výkazu výměr - Ústředna jednotného času

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

#### **DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

25.1. Přesun ústředny jednotného času

- stávající ústředna hodin jednotného času bude přesunuta z místnosti 1.13 do místnosti 1.11., protože z místnosti 1.13 bude vytvořena učebna a místnost 1.13 slouží jako kabinet – ve výkazu výměr je oceněn jen přesun kabeláže a demontáž původní ústředny

25.2. Nová ústředna jednotného času

- zastaralá stávající ústředna bude nahrazena novými řídicími digitálními hodinami s radiovou synchronizací přesného času

25.3.

- ve výkazu výměr je celkem 13ks hodin jednotného času, dle projektové dokumentace je hodin 15ks. 13ks hodin v 4.NP a 2ks hodin v 2.NP, proto je nutné doplnit 2ks hodin.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*


Půdorys 4.NP  
M: 1:100



Výřez půdorysu 2.NP

M: 1:100

VÝŘEZ PŮDORYSU 2.NP

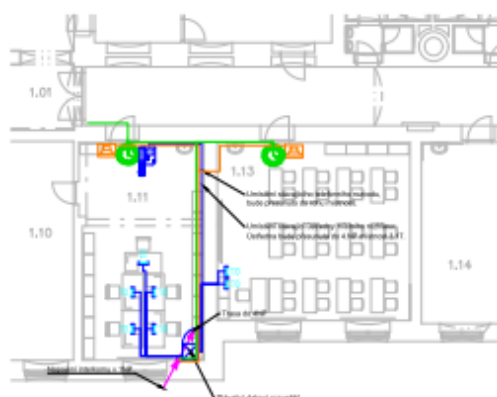

**REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 78 719,76 Kč bez DPH**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**25.1.: Přesun ústředny Jednotného času**

**22 224,04**

**750: Slaboproud**

**22 224,04**

5.	R000000005_01	Kabel 1x2x0,8 LSOH	ks	75,0	18,50	1 387,50
10.	R000000010_02	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 40	m	30,0	31,31	939,30
11.	R000000011_02	Drážkování pro trubky pr. 40 včetně zapravení	m	30,0	48,12	1 443,60
18.	R0000018	Dtto 3x1,5	m	15,0	34,30	514,50
496.	X48	KT 125, včetně svorkovnice	ks	2,0	425,00	850,00
497.	X49	Proměření stávající kabeláže	hod	5,0	379,98	1 899,90
498.	X50	Demontáž ústředny jednotného času a linkového rozvaděče	hod	9,0	379,98	3 419,82
499.	X51	Montáž ústředny jednotného času a linkového rozvaděče	hod	16,0	379,98	6 079,68
500.	X52	Dozbrojování stávajícího rozvaděče	hod	7,0	379,98	2 659,86
501.	X53	Funkční zkouška	hod	6,0	379,98	2 279,88
502.	X54	Drobní instalační a montážní materiál	kus	1,0	750,00	750,00

**25.2.: Nová ústředna jednotného času**

**52 109,48**

**750: Slaboproud**

**52 109,48**

503.	X55	Hlavní ústředna jednotného času a zvonění, možno připojit přijímač DCF	ks	1,0	23 650,00	23 650,00
504.	X56	Přijímač DCF	kus	1,0	4 565,00	4 565,00
505.	X57	Linkový rozvaděč	kus	1,0	13 035,00	13 035,00
506.	X58	Oživení ústředny jednotného času	hod	21,0	379,98	7 979,58
507.	X59	Funkční zkouška	hod	5,0	379,98	1 899,90
508.	X60	Drobný instalační a montážní materiál	kus	1,0	980,00	980,00

**25.3.: Doplnění jednotného času ve 2.NP**

**4 386,24**

**750: Slaboproud**

**4 386,24**

2.	R000000002h	Interiérové analogové hodiny 30	ks	2,0	2 193,12	4 386,24
----	-------------	---------------------------------	----	-----	----------	----------



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 78 719,76 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 4.6.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 4.6.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 4.6.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 26.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 5.6.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Chyba projektové dokumentace – ve výkazu výměr chybí demontáž částí krovu a spojovací prvky

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- ve výkazu výměr chybí demontáž trámů nad 4.NP a spojovací prostředky na nové trámy, je zde započítána pouze demontáž trámů ve 3.NP a spojovací prostředky na vaznice



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## REKAPITULACE:

**Vícepráce: + 104 580,75 Kč bez DPH**

**26: Demontáž trámů ve 4.NP a spojovací prostředky**

**104 580,75**

**6.2.: Přesun sutě**

**44 827,66**

106.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	22,079	796,00	17 574,88
109.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,079	213,85	4 721,59
110.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	309,106	9,32	2 880,87
112.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	22,079	890,00	19 650,31

**762: Konstrukce tesařské**

**59 753,10**

168.	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, - pásová ocel, vruty	m	18,452	843,32	15 560,94
179.	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm <sup>2</sup>	m	490,65	88,79	43 564,81
183.	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,431	1 455,55	627,34



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 104 580,75 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 5.6.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 5.6.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. David Hájíček**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 5.6.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



Stavba : <b>"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň - stavební práce"</b>	<i>Příloha č. 2b ke smlouvě o dílo</i>
------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

**aktualizace!**

## FINANČNÍ PLÁN STAVBY (PLATEBNÍ KALENDÁŘ)

### PARAMETRY (ze smlouvy o dílo)

sazba DPH :	21%
perioda fakturace (období) :	měsíční
splatnost (ve dnech) :	30
zádržné (% z ceny díla bez DPH) :	10% (uplatněné na konci stavby)

	Kč, bez DPH (zaokrouhleno)	Kč, včetně DPH (zaokrouhleno)
<b>CELKEM CENA DÍLA *</b>	<b>49 007 812</b>	<b>59 299 452</b>
PLATBY CELKEM (90%) *	44 107 031	53 369 507
ZÁDRŽNÉ CELKEM (10%) *	4 900 781	5 929 945

#### Poznámky :

- \* částky zaokrouhlené na celé Kč
- \*\* zádržné - bude uvolněno do 15-ti dnů po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převímce (předpoklad - do 4.11.2019, spolu s platbou poslední/konečné faktury)

OBDOBÍ	OBJEMY v tis. Kč (bez DPH)			PLATBY vč. DPH
	Výkony	Fakturace	Zádržné **	
duben 2019	5 163,0	5 163,0	0,0	6 247,2
květen 2019	6 154,0	6 154,0	0,0	7 446,3
červen 2019	8 000,0	8 000,0	0,0	9 680,0
červenec 2019	7 000,0	7 000,0	0,0	8 470,0
srpen 2019	6 900,0	6 900,0	0,0	8 349,0
září 2019	7 300,0	7 300,0	0,0	8 833,0
říjen 2019	3 689,0	3 689,0		4 463,7
listopad 2019			4 902,0	5 931,4
<b>CELKEM</b>	<b>44 206,0</b>	<b>44 206,0</b>	<b>4 902,0</b>	<b>59 420,7</b>

Změnové listy č.1-26	Zádržné	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1 365,0		8 365,0	10 121,7
1 362,0		8 262,0	9 997,0
1 272,7		8 572,7	10 373,0
		3 689,0	4 463,7
	444,3	5 346,3	6 469,0
