

# ČASOVÝ HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Cena bez DPH	019								
						-2	-1	září				5	6	
1	<b>Bertiny lázně - stavební akce 2018/19 - vyhrazená změna závazku</b>	<b>211 dny</b>	<b>02.09. 19</b>	<b>30.03. 20</b>	<b>23 581 838 Kč</b>									
2	Předpokládaný termín zahájení plnění - předání staveniště	1 den	02.09. 19	02.09. 19	0 Kč									
3	Předpokládaný termín zahájení stavebních prací	1 den	03.09. 19	03.09. 19	0 Kč									
4	<b>Sekce SP-A</b>	<b>195 dny</b>	<b>03.09. 19</b>	<b>15.03. 20</b>	<b>5 808 357 Kč</b>									
5	Architektonicko stavební řešení	195 dny	03.09. 19	15.03. 20	2 352 454 Kč									
6	Zdravotní instalace	179 dny	03.09. 19	28.02. 20	1 066 835 Kč									
7	Silnoproudé instalace	179 dny	03.09. 19	28.02. 20	1 070 364 Kč									
8	Slaboproudé instalace	179 dny	03.09. 19	28.02. 20	923 691 Kč									
9	Vytápění	179 dny	03.09. 19	28.02. 20	180 314 Kč									
10	Vzduchotechnika	179 dny	03.09. 19	28.02. 20	214 700 Kč									
11	<b>Sekce SP-C</b>	<b>195 dny</b>	<b>03.09. 19</b>	<b>15.03. 20</b>	<b>17 773 480 Kč</b>									
12	Architektonicko stavební řešení	195 dny	03.09. 19	15.03. 20	9 557 050 Kč									
13	Zdravotní instalace	179 dny	03.09. 19	28.02. 20	2 413 309 Kč									
14	Silnoproudé instalace	179 dny	03.09. 19	28.02. 20	3 197 511 Kč									
15	Slaboproudé instalace	179 dny	03.09. 19	28.02. 20	1 895 066 Kč									
16	Vytápění	179 dny	03.09. 19	28.02. 20	233 395 Kč									
17	Vzduchotechnika	179 dny	03.09. 19	28.02. 20	477 150 Kč									
18	<b>Termín dokončení plnění realizace 4.NP sekce C (1 apartmán) a 3.NP sekce C (16 pokojů + 2 apartmány) v celém rozsahu dispozičního výkresu D-1.02</b>	<b>1 den</b>	<b>28.02. 20</b>	<b>28.02. 20</b>	<b>0 Kč</b>									
19	<b>Termín dokončení plnění realizace 2.NP sekce A (8 pokojů + 1 apartmán) a sekce C (14 pokojů + 1 apartmán + bar) v celém rozsahu dispozičního výkresu D-1.01</b>	<b>1 den</b>	<b>15.03. 20</b>	<b>15.03. 20</b>	<b>0 Kč</b>									
20	<b>Vyklizení staveniště</b>	<b>1 den</b>	<b>30.03. 20</b>	<b>30.03. 20</b>	<b>0 Kč</b>									

Úkol



Milník



Souhrn projektu




Rozdělení

Souhrnný



# OHL ŽS

# ČASOVÝ HARMONOGRAM

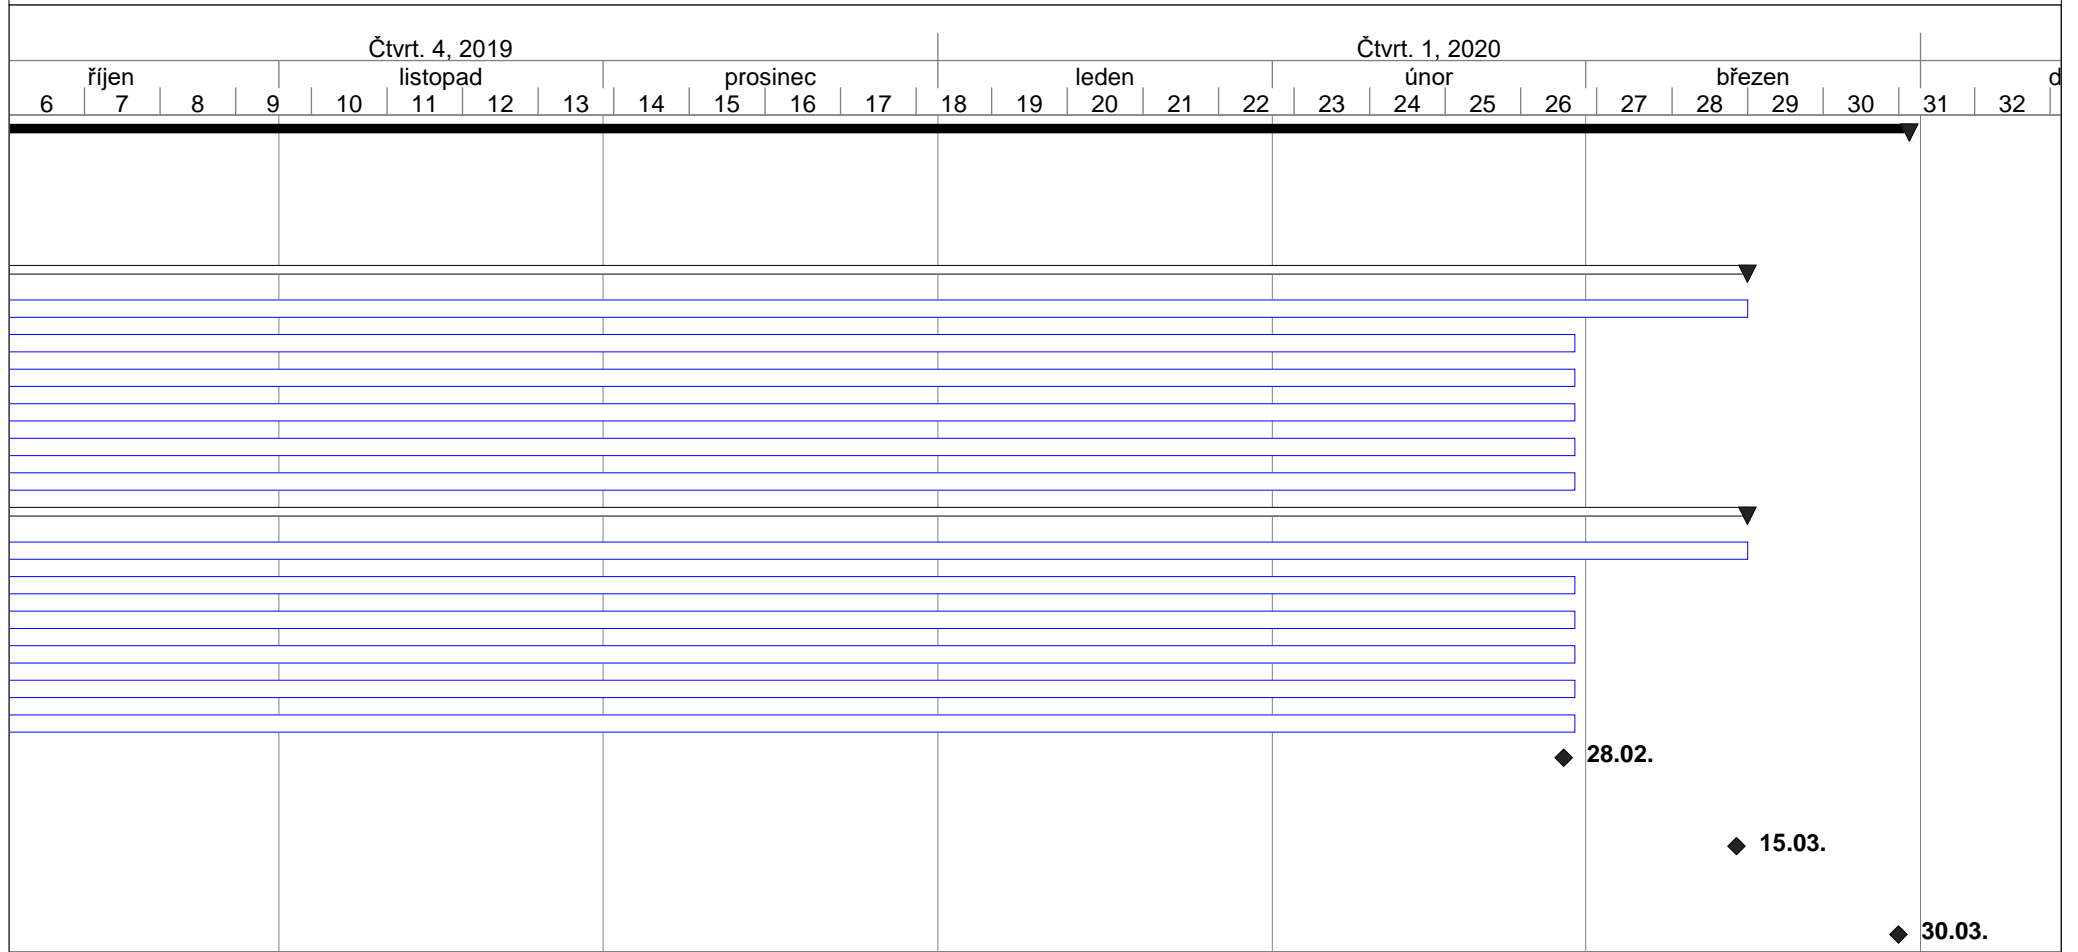

Úkol



Milník



Souhrn projektu



Rozdělení



Souhrnný



# OHL ŽS

	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	Celkem
Bertiny lázně - stavební akce 2018/19 - vyhrazená změna závazku									
Předpokládaný termín zahájení plnění - předání staveniště									
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací									
Sekce SP-A									
Architektonicko stavební řešení	337 788 Kč	373 980 Kč	361 916 Kč	373 980 Kč	373 980 Kč	349 852 Kč	180 958 Kč		2 352 454 Kč
Zdravotní instalace	166 879 Kč	184 759 Kč	178 799 Kč	184 759 Kč	184 759 Kč	166 879 Kč			1 066 835 Kč
Silnoproudé instalace	167 431 Kč	185 370 Kč	179 391 Kč	185 370 Kč	185 370 Kč	167 431 Kč			1 070 364 Kč
Slaboproudé instalace	144 488 Kč	159 969 Kč	154 809 Kč	159 969 Kč	159 969 Kč	144 488 Kč			923 691 Kč
Vytápění	28 206 Kč	31 228 Kč	30 220 Kč	31 228 Kč	31 228 Kč	28 206 Kč			180 314 Kč
Vzduchotechnika	33 584 Kč	37 183 Kč	35 983 Kč	37 183 Kč	37 183 Kč	33 584 Kč			214 700 Kč
Sekce SP-C									
Architektonicko stavební řešení	1 372 294 Kč	1 519 326 Kč	1 470 315 Kč	1 519 326 Kč	1 519 326 Kč	1 421 305 Kč	735 158 Kč		9 557 050 Kč
Zdravotní instalace	377 501 Kč	417 947 Kč	404 465 Kč	417 947 Kč	417 947 Kč	377 501 Kč			2 413 309 Kč
Silnoproudé instalace	500 169 Kč	553 759 Kč	535 896 Kč	553 759 Kč	553 759 Kč	500 169 Kč			3 197 511 Kč
Slaboproudé instalace	296 435 Kč	328 196 Kč	317 609 Kč	328 196 Kč	328 196 Kč	296 435 Kč			1 895 066 Kč
Vytápění	36 509 Kč	40 420 Kč	39 116 Kč	40 420 Kč	40 420 Kč	36 509 Kč			233 395 Kč
Vzduchotechnika	74 638 Kč	82 635 Kč	79 969 Kč	82 635 Kč	82 635 Kč	74 638 Kč			477 150 Kč
Termín dokončení plnění realizace 4.NP sekce C (1 apartmán) a 3.NP sekce C (16 pokojů + 2 apartmány) v celém rozsahu dispozičního výkresu D-1.02									
Termín dokončení plnění realizace 2.NP sekce A (8 pokojů + 1 apartmán) a sekce C (14 pokojů + 1 apartmán + bar) v celém rozsahu dispozičního výkresu D-1.01									
Vykližení staveniště									
Celkem	3 535 923 Kč	3 914 771 Kč	3 788 489 Kč	3 914 771 Kč	3 914 771 Kč	3 596 997 Kč	916 116 Kč		23 581 838 Kč
