

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-165/1073/500/20/2018

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce propustků III/35846 Semanín“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek
Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek
Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
[REDACTED] - vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
Tel: [REDACTED] -mail: [REDACTED]
[REDACTED] – technik
Tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) a

- II. **MADOS MT s.r.o.**, sídlo Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE], výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDAKCE]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.8.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-165/1073/500/20/2018, na zhotovení díla „Rekonstrukce propustků III/35846 Semanín“ (dále jen „Smlouva“) a dne 21.8.2018 dodatek č. 1.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

5.794.709,21 Kč (Slovy:

Pět milionů sedm set devadesát čtyři tisíc sedm set devět korun českých a 21/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.216.888,93 Kč (Slovy: Jeden milion dvě stě šestnáct tisíc osm set osmdesát osm korun českých a 93/100).

Cena včetně DPH činí **7.011.598,14 Kč (Slovy: Sedm milionů jedenáct tisíc pět set devadesát osm korun českých a 14/100).**

Odůvodnění: Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti sousední provozovny firmy MIDAS a nutnosti jejího každodenního vyskladňování zboží, bylo nezbytné osadit dočasné mostní provizorium, vč. souvisejících prací. Úměrně k tomu byla i prodloužena lhůta pro celkové dokončení propustku.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
předání řádně dokončeného díla do **83 kalendářních dnů** z důvodu osazení mostního provizoria pro zajištění DIO.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

IV.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou je ZBV č. 1 a aktualizovaný časový HMG.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 19.6.2019

Lupenice dne: 19.6.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	1801-18-3-Rekonstrukce propustků III-35846 Semanin
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 202 - Mostní provizorium SO 205 Propustek v km 1,199 SO 206 Propustek v km 0,629 SO 207 Propustek v km 0,250
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	202/1; 205/1; 206/1; 207/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Přehled dokladů	1/1	
Krycí list ZBV	1/2	
Změnový list	1/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	4/7	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	5/12	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/13	
Soupis prací	33/46	
Přehled nových položek	31/77	
Projektová dokumentace SO 202	13/90	
RDS		
PDPS		

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: 1801-18-3-Rekonstrukce propustků III-35846 Semanin Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 - Mostní provizorium SO 205 Propustek v km 1,199 SO 206 Propustek v km 0,629 SO 207 Propustek v km 0,250	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202/1 205/1 206/1 207/1	Číslo ZBV: 1
--	---	----------------------------

Objednatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53**

Zhotovitel: **MADOS MT s.r.o, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí**

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-57 511,70	0,00	-57 511,70

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	572 925,61	572 925,61

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-57 511,70	572 925,61	515 413,91

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 1801-18-3-Rekonstrukce propustků III-35846 Semanín Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 - Mostní provizorium SO 205 Propustek v km 1,199 SO 206 Propustek v km 0,629 SO 207 Propustek v km 0,250	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202/1 205/1 206/1 207/1	Číslo ZBV: 1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby (dále jen Smlouva): č. SMLO-165/1073/500/20/2018 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o., sídlo Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí			
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce	
	1	Zhotovitel	
	2	Projektant	
	3	Stavební dozor	
	4	Správce stavby	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:			
<p>SO 202 Vzhledem k zajištění obslužné dostupnosti obcí Semanín, Zádolky a průmyslového provozu společnosti Midas a dále pak v souvislosti s okolními stavbami, na které jsou navázány dopravní omezení a uzavírky, bylo oproti původnímu technologickému postupu (úplné uzavírky) přistoupeno k realizaci mostního provizoria zajišťujícího relativně plynulou dopravní obslužnost.</p> <p>SO 205 V rámci tohoto stavebního objektu se jedná o změnu vyvolanou doměrky, respektive úpravou skutečně provedených prací.</p> <p>SO 206 V rámci tohoto stavebního objektu se jedná o změnu vyvolanou doměrky, respektive úpravou skutečně provedených prací.</p> <p>SO 207 V rámci tohoto stavebního objektu se jedná o změnu vyvolanou doměrky, respektive úpravou skutečně provedených prací.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-57 511,70	572 925,61	515 413,91	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV)			



ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 01

Název Stavby: 1801-18-3 - Rekonstrukce propustků III-35846 Semanin	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 202 / 001	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Mostní provizorium	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	572 925,61	572 925,61	100,00

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	572 925,61	572 925,61	100,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):


Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

souhlasu

souhlasu

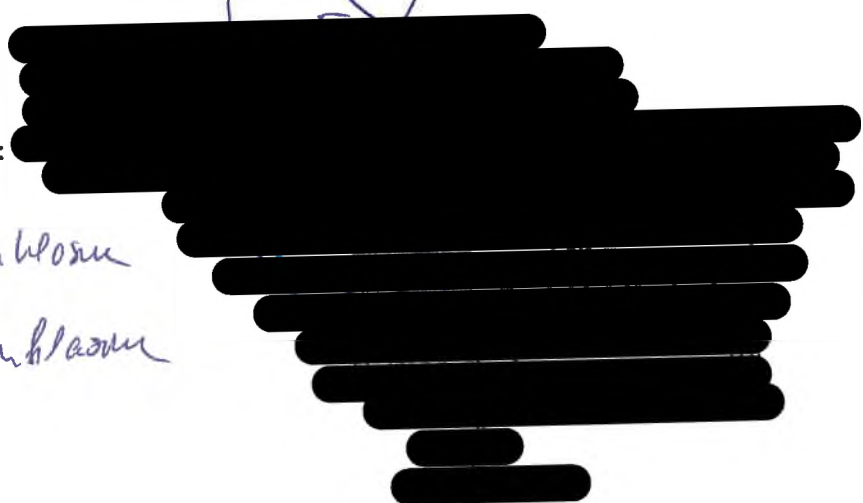

3.6.19.8

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 01_205

Název Stavby: 1801-18-3 - Rekonstrukce propustků III-35846 Semanin
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 205 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustek v km 1,199

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 556 779,89

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 556 779,89	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-37 008,83	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-37 008,83	2 519 771,06	-37 008,83	-1,45

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím

Projektant (autorský dozor): souhlasím

Stavební dozor: souhlasím

Správce stavby: souhlasím

3.6.19.8

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 01_206

Název Stavby: 1801-18-3 - Rekonstrukce propustků III-35846 Semanin
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 206 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustek v km 0,629

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 289 284,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 289 284,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-16 226,07	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-16 226,07	2 273 058,43	-16 226,07	-0,71

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

souhlasím
souhlasím
souhlasím
souhlasím

3.6.19.8

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 01_207

Název Stavby: 1801-18-3 - Rekonstrukce propustků III-35846 Semanin
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 207 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustek v km 0,250

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
433 230,91

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	433 230,91	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-4 276,80	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-4 276,80	428 954,11	-4 276,80	-0,99

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

souhlasím

Správce stavby:

souhlasím



[Redacted]

ZAKÁZKA

1801-18-3

Rekonstrukce propustků
III/35846 Semanín
Cenové posouzení nových
položek v ZBV č. 1

ZPRACOVATEL

[Redacted]

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

ČÍSLO VYDÁNÍ

Čistopis

DATUM VYDÁNÍ

17. 6. 2019

ZPRACOVAL

[Redacted]

[Redacted]
konzultant

Divize cenových expertíz
[Redacted]

Rekonstrukce propustků III-35846 Semanín

1. Cenové posouzení položek v ZBV č.1 – obecně

Ceny nových položek jsou v rámci posouzení porovnávány s expertními cenami OTSKP-SPK a OTSKP-ŽS v aktuální CÚ, vlastními ceníky materiálů zjištěné z veřejně dostupných nabídek jejich výrobců, ceníky ÚRS 2019/I. Předmětem posouzení je pouze výše jednotkových cen položek ve Změnách během výstavby na stavbě Rekonstrukce propustků III-35846 Semanín. Konkrétně jsou změny prováděny na SO 202 – Mostní provizorium v ZBV č.1. Jedná se o zcela nové stavební objekty, který nebyl zahrnut v původním rozpočtu stavby

Množství měrných jednotek v kalkulacích položek není součástí posouzení, správnost nasazení součástí kalkulace je kontrolována Technickým dozorem investora.

Změna během výstavby se týká prací v rámci záměru „Změna situace na staveništi“.

Zhotovitelem kalkulované ceny nových položek vychází z vlastního kalkulačního vzorce zhotovitele, ve kterém jsou nepřímé náklady (výpočtové složky KV = RV, RS, Z) vypočteny na základě jiných sazeb, nežli posuzované expertní ceny OTSKP-SPK. V obecné rovině nelze tento postup zhotoviteli rozporovat, každá stavební společnost stanovuje výši režii a zisků na základě vlastních nákladů.

- Expertní ceny do CÚ 2010 včetně byly oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 13 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 7 % ze základu (H+M+S+O+R).
- Od CÚ 2011 jsou Expertní ceny oceněny na základě výpočtu Režii ve výši 10 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5 % ze základu (H+M+S+O).
- Nové položky stavby zhotovitel oceňuje na základě výpočtu Režii správných ve výši 4,0 % a režii výrobních ve výši 5,0 % ze základu (H+M+S+O) a Zisku ve výši 5,0 % ze základu (H+M+S+O+Rv+Rs).

Pro porovnání nových položek byly použity jednotkové ceny položek dle datových základů OTSKP-SPK, OTSKP-ŽS a ÚRS v cenové úrovni platné pro období provádění prací, tedy OTSKP 2019, potažmo ÚRS 2019/I.

Předmětem posouzení je výše kalkulovaných jednotkových cen položek. Součástí posouzení je i kontrola výskytu posuzovaných položek v jiných objektech stavby. Smlouva o dílo mezi Objednatelem (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) a Zhotovitelem (MADOS MT s.r.o.) je ze dne 7. 8. 2018, kde celková cena díla činí 5 279 295,30 Kč bez DPH.

2. Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č.1 v rámci SO 202

2.1 Pol. č. 1 – 014101 – POPLATKY ZA SKLÁDKU [požadovaná jednotková cena 162,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby. Jelikož se jedná o položka stavebního dílu O - Všeobecné konstrukce a práce, které jsou pro každou stavbu individuální a není pro ně tedy stanovena expertní jednotková cena, nebylo provedeno porovnání. Tato položka se zároveň nachází v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele s nižší jednotkovou cenou, viz níže. Zhotovitel přejal vyšší jednotkové ceny ze SO 205 Propustek v km 1,199.

objekt	rozpočet	stav. díl	název	MJ	množství	jedn. cena
Položka: 014101						
SO 205	SO 205	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	348,960	162,00
SO 206	SO 206	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	320,970	162,00
SO 207	SO 207	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	9,400	162,00
					679,330	

OBR.1... výskyt položky 014101 v nabídkovém rozpočtu stavby

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 162,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.2 Pol. č. 2 – 014111 – POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) [požadovaná jednotková cena 615,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Jelikož se jedná o položka stavebního dílu O - Všeobecné konstrukce a práce, které jsou pro každou stavbu individuální a není pro ně tedy stanovena expertní jednotková cena, nebylo provedeno porovnání. K položce je vhodné doložit kalkulace nebo vysvětlit původ výše jednotkové ceny. K položce byla doložena nabídky od firmy [REDAKCE] s jednotkovou cenou 1230,00 Kč/tuna. Je vhodné poptat více poddodavatelů a vybrat pro Objednatele nevhodnější nabídku. Nebyla doložena bližší specifikace, případně převod na jinou měrnou jednotku nebo připočty od Zhotovitele.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 615,00 Kč/m³ není možno rozporovat.

2.3 Pol. č. 3 – 02720 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY [požadovaná jednotková cena 15 000,00 Kč/KPL]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Jelikož se jedná o položka stavebního dílu O - Všeobecné konstrukce a práce, které jsou pro každou stavbu individuální a není pro ně tedy stanovena expertní jednotková cena, nebylo provedeno porovnání s cenovou soustavou OTSKP. K položce byla doložena individuální kalkulace, které uvádí náklady na mzdy zaměstnanců. V porovnání s náklady v místě a čase obvyklými je možné konstatovat, že požadované náklady jsou nepatrně vyšší. Následně jsou připočteny výrobní režie ve výši 9%, správní režie ve výši 6% a zisk ve výši 10%. Standardně jsou tyto náklady uvažovány ve výši 5% + 5% + 5%, ale jelikož

se jedná o individuální náklady, které jsou rozdílné pro každou stavbu a stavební firmu, není možné jejich výši rozporovat.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 15 000,00 Kč/kpl není možno rozporovat.

2.4 Pol. č. 4 – 027411 – PROVIZORNÍ MOSTY – MONTÁŽ [požadovaná jednotková cena 3 000,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Jelikož se jedná o položka stavebního dílu 0 - Všeobecné konstrukce a práce, které jsou pro každou stavbu individuální a není pro ně tedy stanovena expertní jednotková cena, nebylo provedeno porovnání s cenovou soustavou OTSKP. K položce byla doložena individuální kalkulace, které uvádí náklady na mzdy zaměstnanců, náklady na materiál a náklady na stroje. V porovnání s náklady na mzdy v místě a čase obvyklými je možné konstatovat, že požadované náklady jsou nepatrně vyšší. Náklady na materiál byly porovnávány s dostupnými cenky na internetu a odpovídají svojí výší těmto podkladům. Pro porovnání nákladů na stroje byla využita cenová soustava ÚRS v aktuální cenové soustavě. Požadované náklady nepřevyšují jednotkové ceny dle této cenové soustavy. Následně jsou připočteny výrobní režie ve výši 9%, správní režie ve výši 6% a zisk ve výši 10%. Standardně jsou tyto náklady uvažovány ve výši 5% + 5% + 5%, ale jelikož se jedná o individuální náklady, které jsou rozdílné pro každou stavbu a stavební firmu, není možné jejich výši rozporovat.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 3 000,00 Kč/m² není možné rozporovat.

2.5 Pol. č. 5 – 027412 – PROVIZORNÍ MOSTY – NÁJEMNÉ [požadovaná jednotková cena 35 000,00 Kč/KPLMĚSÍC]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Jelikož se jedná o položka stavebního dílu 0 - Všeobecné konstrukce a práce, které jsou pro každou stavbu individuální a není pro ně tedy stanovena expertní jednotková cena, nebylo provedeno porovnání s cenovou soustavou OTSKP. K položce byla doložena individuální kalkulace, která uvádí náklady na pronájem mostních provizorií. Kalkulace uvádí náklady 0,09 Kč/m²/den v porovnání s cenou obvyklou dle ŘSD ve výši 0,07 Kč/m²/den. Tuto informaci není možné ověřit. Požadovaná jednotková cena je o 28,57% vyšší. Kalkulace tedy uvažuje 2,70 Kč/kg/měsíc.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 35 000,00 Kč/kplměsíc není možno rozporovat

2.6 Pol. č. 6 – 027413 – PROVIZORNÍ MOSTY – DEMONTÁŽ [požadovaná jednotková cena 3 000,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Jelikož se jedná o položka stavebního dílu 0 - Všeobecné konstrukce a práce, které jsou pro každou stavbu individuální a není pro ně tedy stanovena expertní jednotková cena, nebylo provedeno porovnání s cenovou soustavou OTSKP. K položce byla doložena individuální kalkulace, které uvádí náklady na mzdy zaměstnanců, náklady na materiál a náklady na stroje. V porovnání s náklady na mzdy v místě a čase obvyklými je možné konstatovat, že požadované náklady jsou nepatrně vyšší. Náklady na materiál byly porovnávány s dostupnými cenky na internetu a odpovídají svojí výší těmto podkladům. Při

demontáži by však neměly být shodné náklady jako pro montáž, pokud pro montáž je pořizovány do vlastnictví Objednatele hraněné řezivo, následně by mohly být použity při demontáži. Pro porovnání nákladů na stroje byla využita cenová soustava ÚRS v aktuální cenové soustavě. Požadované náklady nepřevyšují jednotkové ceny dle této cenové soustavy. Následně jsou připočteny výrobní režie ve výši 9%, správní režie ve výši 6% a zisk ve výši 10%. Standardně jsou tyto náklady uvažovány ve výši 5% + 5% + 5%, ale jelikož se jedná o individuální náklady, které jsou rozdílné pro každou stavbu a stavební firmu, není možné jejich výši rozporovat.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 3 000,00 Kč/m² není možno rozporovat.

2.7 Pol. č. 7 – 11313 – ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM [požadovaná jednotková cena 562,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy. Tato položka se zároveň nachází v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele s vyšší jednotkovou cenou, viz níže.

Položka: 11313						
SO 205	SO 205	1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	17,600	804,55
SO 206	SO 206	1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	17,600	804,55
					35,200	

OBR.2 ... výskyt položky 11313 v nabídkovém rozpočtu stavby

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 562,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.8 Pol. č. 8 – 11332 – ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO [požadovaná jednotková cena 231,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy. Tato položka se zároveň nachází v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele s vyšší jednotkovou cenou, viz níže.

Položka: 11332						
SO 205	SO 205	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	55,460	359,23
SO 206	SO 206	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	40,400	359,23
					95,860	

OBR.3 ... výskyt položky 11332 v nabídkovém rozpočtu stavby

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 231,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.9 Pol. č. 9 – 113468 - ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ
DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM [požadovaná jednotková cena
617,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 617,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.10 Pol. č. 10 – 131737 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO
16KM [požadovaná jednotková cena 278,65 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Jedná se o novou položku tohoto objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby, jednotková cena položky byla přejata z SO 205 Propustek v km 1,199, kde se shodná položka vyskytuje v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Byla zvolena položka, které má shodu s parametry nové položky, přestože u původní položky není uvedena odvozní vzdálenost.

Položka: 13173						
SO 205	SO 205	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	312,000	278,65
			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I			
SO 206	SO 206	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	299,200	278,65
			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I			
					611,200	

OBR.4 ... výskyt položky 13173 v nabídkovém rozpočtu stavby

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 278,65 Kč/m³ nemáme námitek.

2.11 Pol. č. 11 – 17120 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ
ZHUTNĚNÍ [požadovaná jednotková cena 12,92 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Jedná se o novou položku tohoto objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby, jednotková cena položky byla přejata z SO 205 Propustek v km 1,199, kde se shodná položka vyskytuje v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Byla zvolena položka, které má shodu s parametry nové položky.

Položka: 17120						
SO 205	SO 205	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	361,740	12,92
SO 206	SO 206	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	347,400	12,92
SO 207	SO 207	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12,400	12,92
					721,540	

OBR.5 ... výskyt položky 17120 v nabídkovém rozpočtu stavby

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 12,92 Kč/m³ nemáme námitek.

2.12 Pol. č. 12 – 17481 – ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ [požadovaná jednotková cena 560,66 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Jedná se o novou položku tohoto objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby, jednotková cena položky byla přejata z SO 205 Propustek v km 1,199, kde se shodná položka vyskytuje v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Byla zvolena položka, které má shodu s parametry nové položky.

Položka: 17481						
SO 205	SO 205	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	139,200	560,66
SO 205	SO 206	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	60,500	725,17
					199,700	

OBR.6 ... výskyt položky 17481 v nabídkovém rozpočtu stavby

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 560,66 Kč/m³ nemáme námitek.

2.13 Pol. č. 13 – 333125 – MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 [požadovaná jednotková cena 14 100,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výši jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky je nižší oproti jednotkové ceně dle cenové soustavy. Cenová soustava uvádí jednotkovou cenu ve výši 14 500,- Kč/M3.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 14 100,00 Kč/m³ nemáme námitek.

2.14 Pol. č. 15 – 56330 – VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI [požadovaná jednotková cena 674,83 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnáována s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Jedná se o novou položku tohoto objektu, nejedná se však o novou položku v rámci stavby, jednotková cena položky byla přejata z SO 205 Propustek v km 1,199, kde se shodná položka vyskytuje v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Byla zvolena položka, které má shodu s parametry nové položky.

Položka: 56330						
SO 205	SO 205	5	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	20,445	674,83
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI			
SO 206	SO 206	5	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	18,150	674,83
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI			
					38,595	

OBR.7 ... výskyt položky 56330 v nabídkovém rozpočtu stavby

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 674,83 Kč/m³ nemáme námitek.

2.15 Pol. č. 14 – 574A04 – ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S [požadovaná jednotková cena 7 980,00 Kč/M3]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnáována s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky je výrazně vyšší oproti jednotkové ceně dle cenové soustavy. Cenová soustava uvádí jednotkovou cenu ve výši 5 280,- Kč/M3. V tomto případě pravděpodobně došlo k záměně výměry a jednotkové ceny položky. K položce byla doložena individuální kalkulace, které uvádí náklady na mzdy zaměstnanců, náklady na materiál a náklady na stroje. V porovnání s náklady na mzdy v místě a čase obvyklými je možné konstatovat, že požadované náklady jsou nepatrně vyšší. Náklady na materiál není možné ověřit z důvodu nejednotnosti v kalkulaci. Pro porovnání nákladů na stroje byla využita cenová soustava ÚRS v aktuální cenové soustavě. Požadované náklady nepřevyšují jednotkové ceny dle této cenové soustavy. Následně jsou připočteny výrobní režie ve výši 9%, správní režie ve výši 6% a zisk ve výši 10%. Standardně jsou tyto náklady uvažovány ve výši 5% + 5% + 5%, ale jelikož se jedná o individuální náklady, které jsou rozdílné pro každou stavbu a stavební firmu, není možné jejich výši rozporovat.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 7 980,00 Kč/m³ není možné rozporovat.

2.16 Pol. č. 16 – 58302 – KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM [požadovaná jednotková cena 1 400,00 Kč/M2]

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnáována s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 1 400,00 Kč/m² nemáme námitek.

**2.17 Pol. č. 17 – 9166A1 - DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T1 DOD
A MONTÁŽ [požadovaná jednotková cena 850,00 Kč/M]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky je nižší oproti jednotkové ceně dle cenové soustavy. Cenová soustava uvádí jednotkovou cenu ve výši 3 190,- Kč/M.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 850,00 Kč/m nemáme námitek.

**2.18 Pol. č. 18 – 9166A3 - DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T1
DEMONTÁŽ [požadovaná jednotková cena 850,00 Kč/M]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky je výrazně vyšší oproti jednotkové ceně dle cenové soustavy. Cenová soustava uvádí jednotkovou cenu ve výši 204,- Kč/M. K položce byla doložena individuální kalkulace, které uvádí náklady na mzdy zaměstnanců a náklady na stroje. V porovnání s náklady na mzdy v místě a čase obvyklými je možné konstatovat, že požadované náklady jsou nepatrně vyšší. Pro porovnání nákladů na stroje byla využita cenová soustava ÚRS v aktuální cenové soustavě. Požadované náklady nepřevyšují jednotkové ceny dle této cenové soustavy. Následně jsou připočteny výrobní režie ve výši 9%, správní režie ve výši 6% a zisk ve výši 10%. Standardně jsou tyto náklady uvažovány ve výši 5% + 5% + 5%, ale jelikož se jedná o individuální náklady, které jsou rozdílné pro každou stavbu a stavební firmu, není možné jejich výši rozporovat.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 850,00 Kč/m není možné rozporovat.

**2.19 Pol. č. 19 – 9166A9 - DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T1
NÁJEMNÉ [požadovaná jednotková cena 12,00 Kč/MDEN]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky je vyšší oproti jednotkové ceně dle cenové soustavy. Cenová soustava uvádí jednotkovou cenu ve výši 7,- Kč/MDEN. K položce byla doložena individuální kalkulace, které uvádí náklady dle interního ceníku Zhotovitele. Následně jsou připočten zisk ve výši 10%. Standardně je zisk uvažován ve výši 5%, ale jelikož se jedná o individuální náklady, které jsou rozdílné pro každou stavbu a stavební firmu, není možné jejich výši rozporovat.

Požadovanou jednotkovou cenu ve výši 12,00 Kč/mden není možné rozporovat.

**2.20 Pol. č. 20 – 96611 – BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
[požadovaná jednotková cena 3 600,00 Kč/M3]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 3 600,00 Kč/m³ nemáme námitek.

**2.21 Pol. č. 21 – 96611B – BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ -
DOPRAVA [požadovaná jednotková cena 12,00 Kč/tkm]**

Jedná se o novou položku v rámci stavby. Výše jednotkové ceny byla porovnávána s výší jednotkové ceny položky dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019, cenová úroveň byla použita aktuální z důvodu provádění prací tento rok. Požadovaná jednotková cena položky odpovídá jednotkové ceně dle cenové soustavy.

Proti požadované jednotkové ceně ve výši 12,00 Kč/tkm nemáme námitek.

3. Závěr

V rámci Změn během výstavby č.1 bylo přidáno dvacet jedna nových položek. Jedná se o zcela nový stavební objekt. Jednotkové ceny pro některé z nových položky byly přežaty ve shodné výši dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni aktuální v době provádění prací. V nabídkovém rozpočtu zhotovitele se vyskytují položky vhodné pro ocenění nových položek, které byly použity pro ocenění nových položek.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek jsou u jednotlivých položek doplněny posouzení k jejich výši.

4. Přílohy

4.1 Nabídka poddodavatele

[Redacted text]

**Služby pro investory,
projektanty & stavitele**

[Redacted text]

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 19. února 2018 8:33 [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Předmět: ceník

Dobrý den,

Cena za: 17 09 04: Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01 až 17 09 03: 1 230 Kč/t/bez DPH.

Pokud by jste potřeboval ještě nějaké odpady, prosím kontaktujte mě.

Velice děkuji a přeji pěkný den.

V úctě

[REDACTED]
[REDACTED]
obchodně administrativní pracovnice
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

„Tento e-mail není nabídkou k uzavření smlouvy ani příslibem takového uzavření za společnost Marius Pedersen a.s. ani za žádnou společnost, která tvoří se společností Marius Pedersen a.s. koncern. Jakákoliv smlouva, která má být uzavřena za společnost Marius Pedersen a.s. nebo za společnost, která tvoří se společností Marius Pedersen a.s. koncern, musí mít výhradně písemnou formou s podpisem jednatelů osoby podle § 561 občanského zákoníku. Vylučuje se možnost zachování písemné formy smlouvy podle § 562 občanského zákoníku, ledaže je v konkrétním případě písemnou formou podle § 561 občanského zákoníku sjednáno jinak.“

Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh a celý e-mail vymažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete riziku právního postihu.“
