



DODATEK č. 8

ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotoviteli:

EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 nebo **Správce**, se sídlem: Národní 138/10, Nové Město,
110 00 Praha 1; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva a finančním ředitelem
Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 2, se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3, se sídlem: Mezitřaťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: **Ing. Milanem Koudelkou**, jednatelem společnosti
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

a

S u b t e r r a a.s. - Společník 4, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: **Ing. Ondřejem Fuchsem**, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Beroun**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy **Společníkem 1** nebo **Správcem** je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

na zhotovení stavby o názvu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 jsou:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 13. Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 8. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 7.

U prací obsažených v ZL č. 13 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 6,22 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 7 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.
3. Úprava celkové lhůty pro dokončení prací, lhůty pro dokončení stavebních prací a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. V souvislosti s původně nepředpokládaným rozdělením realizace této stavby do tří etap z důvodů značně problematického získání majetkových práv k části vlečky KD Trans (vyvlastnění a dále z důvodů napadání rozhodnutí Drážního úřadu ve věcech stavebního povolení III. etapy ze strany vlastníka vlečky) dochází k prodloužení celkové lhůty pro dokončení prací a lhůty pro dokončení stavebních prací o dvacet měsíců. Jednotlivé etapy byly na základě dohody smluvních stran vymezeny z hlediska postupu výstavby tak, aby realizace stavby mohla co nejplynuleji pokračovat dle reálných možností získání stavebního povolení pro III. etapu. V rámci ukončení jednotlivých etap výstavby bude zajištěna provozuschopnost jednotlivých stavebních úseků, zejména jejich řízení jako samostatných funkčních celků. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 3, odst. 3.6 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schváleným ZL č. 13, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 13 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)
Snížení dle ZL č. 13 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)
Celková změna nákladů Zhotovitele

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

Změnový list stavby č. 13 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnového listu stavby č. 13.

2) **ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- a) *zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (Smlouvy ve znění dod. č. 7) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 7 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 7 bez DPH 1 930 236 464,24 Kč
Změna ceny dle dod. č. 8 bez DPH + 788 518,12 Kč
Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 8 bez DPH 1 931 024 982,36 Kč

slovy: jedna miliarda devět set třicet jedna milionů dvacet čtyři tisíc devět set osmdesát dva korun českých třicet šest haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 8 Smlouvy.

- b) *zrušuje se stávající text v odst. 3.6 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.6 Zhotovitel se v souladu s nabídkou Zhotovitele zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 8 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **55 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **52 měsíce** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek, se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 7 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/09/16
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8*
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální Cenu Díla (vyplývající ze schváleného ZL č. 13) k datu podpisu dodatku č. 8 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram postupu prací, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 8 a jeho nedílnou součástí. Tento harmonogram postupu prací nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5 Smlouvy.

II.

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 7, nedotčená dodatkem č. 8 se nemění.
4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm (8)** vyhotovení dodatku č. 8.

5. Přílohou dodatku č. 8 jsou jako přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
- příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8
- příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 28-06-2019
Obíednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

V Pardubicích dne 25-06-2019

Zhotovitel:
za EUROVIA CS a.s.

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016
za OHL ŽS, a.s.:

.....
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenst
za GJW Praha spol. s r.o.

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

Ing. Milan Koudelka
jednatel společnosti
za Subterra a.s.:

Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla

(současně příloha č. 4 Smlouvy)

Dodatku č. 8 Smlouvy

č. objednatele: *E618-S-11975/2016*;

č. zhotovitele: *1524.6120388JBA/ SOD00105914*

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Stavba:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

The diagram illustrates a sequence of 12 rows, each with a colored header bar and a corresponding data row. The data rows are filled with black and white blocks, representing a binary or categorical sequence. The diagram is labeled with 'N' and 'n' at the top left.



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 2- Harmonogram postupu prací

(současně příloha č. 5 Smlouvy)

Dodatku č. 8 Smlouvy

č. objednatele: **E618-S-11975/2016;**

č. zhotovitele: **1524.6120388JBA/ SOD00105914**

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“




**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	et V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI
1		Harmonogram stavby															
2		PŘEDÁNÍ STAVENÍSTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ		07.11. 18													
3		REALIZACE STAVBY	1606 dny	07.11. 18	31.03. 21												
4		DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ			31.03. 21												
5		Předání souborného zpracování geodetické části DSPS, předání DSPS v trvalém provedení a digitální formě; Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů		01.04. 21	30.06. 21												
6		FÁZE VÝSTAVBY	1606 dny	07.11. 18	31.03. 21												
7		I. etapa (žst. Beroun - osobní a seřadovací nádraží)	1271 dny?	07.11. 18	30.04. 20												
8		SP 0. Přípravné a stavební práce – demontáže, kabelovody, TO, PTM, SÚ	87 dny	07.11. 18	01.02. 17												
9		sděl.zař. - příprava pro přepojení OK do proviz.polohy	120 dny	15.04. 17	12.08. 17												
10		sděl.zař. - přepojení OK do proviz.polohy (noční výluka)	1 den	12.08. 17	12.08. 17												
11		Zimní technologická přestávka 2016/2017	91 dny	01.12. 16	01.03. 17												
12		SP 4. Pražské zhlaví – kol. č. 2	35 dny	20.04. 17	24.05. 17												
13		SP 5. Pražské zhlaví – lichá skupina	47 dny	25.05. 17	10.07. 17												
14		SP 1a. Střední zhlaví kol. č. 93s	49 dny	11.07. 17	28.08. 17												
15		SP 1b. Střední zhlaví SK č. 95s, 97s; Kol. č. 213-219	49 dny	29.08. 17	16.10. 17												
16		SP 2. Kol. č. 1S	56 dny	17.10. 17	11.12. 17												
17		Zimní technologická přestávka 2017/2018	79 dny	12.12. 17	28.02. 18												
18		SP 3. Kol. č. 2S	49 dny	01.03. 18	18.04. 18												
19		SP 6a. Kol. č. 1S – provizorní napojení vlečky	1 den	01.03. 18	01.03. 18												
20		SP 6. Sudá skupina kolejí vč. nást.1, 2; Střední zhlaví kol. č. 2S	91 dny	19.04. 18	18.07. 18												
21		SP 6b. Kol. č. 2S – definitivní propojení	7 dny	12.07. 18	18.07. 18												
22		aktivace zab.zař. - FÁZE 1a	3 dny	13.07. 18	15.07. 18												
23		aktivace zab.zař. (ES) - FÁZE 1b (2.TK Beroun-Zdice)	3 dny	16.07. 18	18.07. 18												
24		SP 7. Kol. č. 1S vč. nást. 3; Střední zhlaví kol. č. 1S	28 dny	19.07. 18	15.08. 18												
25		aktivace zab.zař. - FÁZE 3	7 dny	19.07. 18	25.07. 18												
26		aktivace zab.zař. - FÁZE 4a (mimo stavební místo)	21 dny	26.07. 18	15.08. 18												
27		SP 8. Kol. č. 1a, 3, 5, 7, 9, 93S, 95S vč. Liché části 3. nástupiště	84 dny	16.08. 18	07.11. 18												
28		SP 8a. Kol. 11-13, 21-27	126 dny	16.08. 18	19.12. 18												
29		aktivace zab.zař. - FÁZE 5	14 dny	08.11. 18	21.11. 18												
30		aktivace zab.zař. - FÁZE 5 (1.TK Beroun-Karlštejn)	7 dny	08.11. 18	14.11. 18												
31		aktivace zab.zař. - FÁZE 6a-I (TZZ v obou TK Beroun-Karlštejn)	1 den	22.11. 18	22.11. 18												
32		aktivace zab.zař. - FÁZE 6a-II-III (SK 2-2a+2. TK Beroun-Karlštejn)	4 dny	23.11. 18	26.11. 18												
33		Zimní technologická přestávka 2018/2019	94 dny	27.11. 18	28.02. 19												
34		SP 8a. Kol. 7, 9 - provizorní 4. nástupiště - zřízení	9 dny	10.01. 19	18.01. 19												
35		Kol. 1a - náhrada výh.č. 9 kolejovým polem	14 dny	01.03. 19	14.03. 19												
36		SP 9. Pražské zhlaví – sudá část 1 vč. nást. 1, 1a	91 dny	15.03. 19	13.06. 19												
37		aktivace SZZ, TZZ 1.+2. TK Karlštejn-Beroun	9 dny	14.03. 19	22.03. 19												
38		TZZ Beroun Závodí-Beroun a Beroun SK 0	59 dny	17.03. 19	14.05. 19												
39		SP 10. Pražské zhlaví – sudá část 2, propojení do trati	31 dny	14.05. 19	13.06. 19												
40		změna SW SSZ Žst. Beroun - noční ZP 8.6./9.6.2019 6 hod, ND	2 dny	08.06. 19	09.06. 19												
41		změna SW TPC Rudenka, výl. ZZ Praha Smícho (mimo)v(mimo)-Rudná- Beroun, odb. Jeneček (mimo)- Rudná-a Hýskov-Beroun Závodí - noční ZP 8.6./9.6.2019 6 hod, ND	2 dny	08.06. 19	09.06. 19												
42		SSZT Žst. Beroun pro změnu SW - noční ZP 12.6./13.6.2019 noční, ND	2 dny	12.06. 19	13.06. 19												
43		demontáž RZZ	30 dny	15.05. 19	13.06. 19												
44		Kol. 7, 9 - demontáž provizorního nástupiště	4 dny	14.06. 19	17.06. 19												

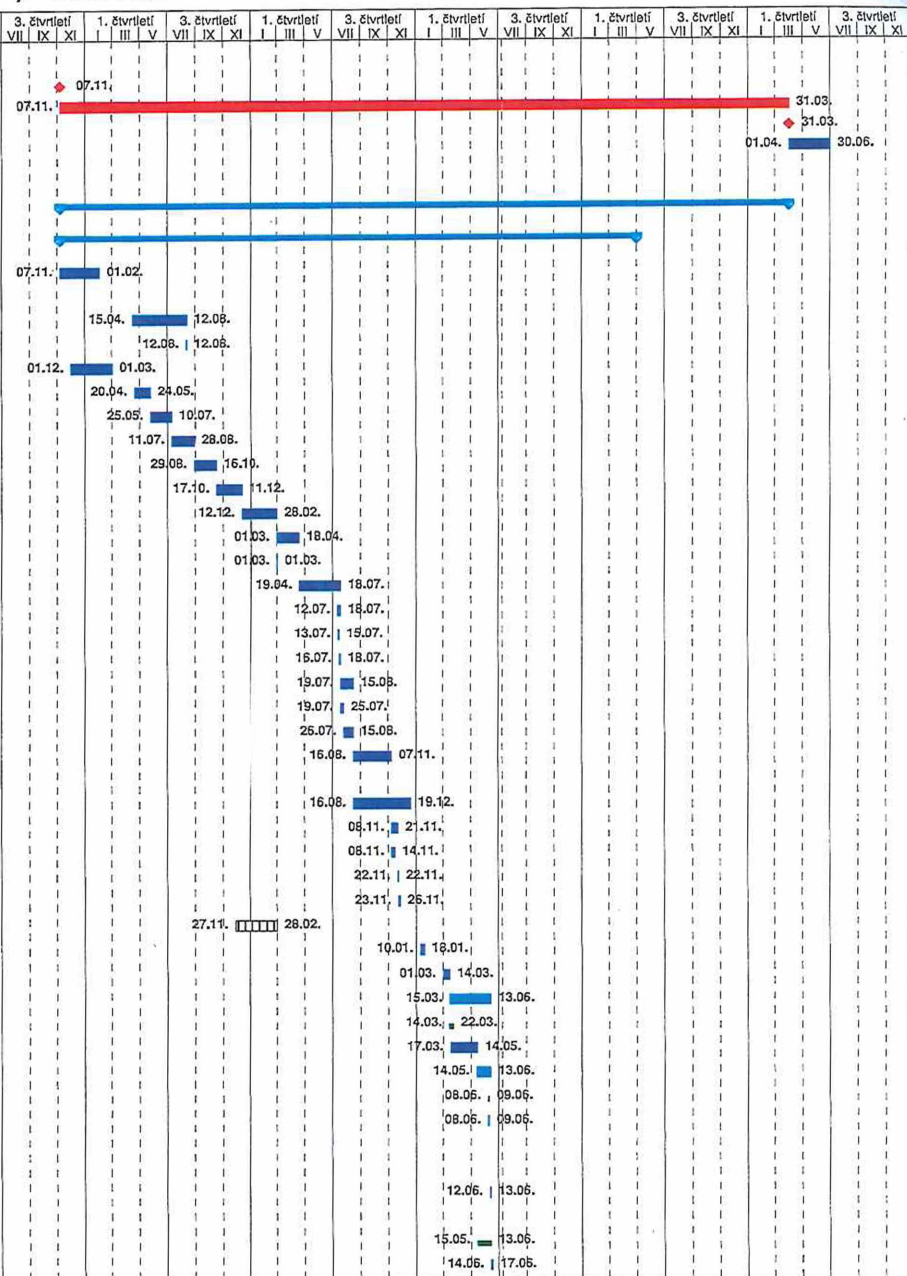

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	et V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI
45		SP 12. Dokončovací práce - etapa I	125 dny	18.06. 19	20.10. 19												
46		závěrečné podbití	182 dny	01.11. 19	30.04. 20												
47		závěrečné úpravy TV, laničkování	30 dny	15.11. 19	14.12. 19												
48		dokončení stezek	21 dny	15.11. 19	05.12. 19												
49		broušení kolejí	58 dny	03.02. 20	31.03. 20												
50		II.etapa (úsek Beroun-Králův Dvůr; od km 41,777 - zast. Králův Dvůr)	390 dny?	01.10. 18	25.10. 19												
51		Přípravné a stavební práce – demontáže, demolice, MPZZ	151 dny	01.10. 18	28.02. 19												
52		aktivace odbočky	7 dny	25.03. 19	31.03. 19												
53		snesení SK 91S a vlečky KD Trans B	16 dny	22.04. 19	07.05. 19												
54		TK 1 - vložení provizorní výh. 2PX	2 dny	01.04. 19	02.04. 19												
55		TK 2 - propojení do TK 2	3 dny	03.04. 19	05.04. 19												
56		SP 8. Kol. č. 2c-2d, 2. TK Beroun-Zdice od km 41,777	84 dny	05.04. 19	27.06. 19												
57		SP 8a. 2. TK Beroun-Zdice - zrušení odb.větvě 2PX a rek. TK 2	11 dny?	17.06. 19	27.06. 19												
58		SP 8b. 1. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 2PX a propojení TK 1	2 dny	28.06. 19	29.06. 19												
59		SP 8c. 2. TK Beroun-Zdice - vložení 3PX	2 dny	30.06. 19	01.07. 19												
60		SP 9a. 1. TK Beroun-Zdice - rekonstrukce TK1 a propojení do 3PX	13 dny	02.07. 19	14.07. 19												
61		SP 9 Kol.č. 1c-1d 1.TK Beroun-Zdice	112 dny	02.07. 19	21.10. 19												
62		SP 10a 1. TK Beroun-Zdice - demont. Odb. větvě a propojení TK 1	2 dny	22.10. 19	23.10. 19												
63		SP 10b 2. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 3PX a propojení TK 2	2 dny	24.10. 19	25.10. 19												
64		III.etapa (úsek Beroun-Králův Dvůr; od km 40,510 do km 41,777 - zast. Králův Dvůr)	548 dny	01.10. 19	31.03. 21												
65		Přípravné a stavební práce – demontáže, demolice	151 dny	01.10. 19	28.02. 20												
66		SP 1a. TK 1 - vložení provizorní výh. 2PX	2 dny	02.03. 20	03.03. 20												
67		SP 1b. TK 2 - propojení odb. větvě do TK 2	2 dny	04.03. 20	05.03. 20												
68		SP 11. Kol. č. 2c-2d, od km 41,390	34 dny	04.03. 20	06.04. 20												
69		Kol.č. 2c-2d a. 2. TK Beroun-Zdice - zrušení odb.větvě 2PX a propojení 2. TK	2 dny	05.04. 20	06.04. 20												
70		SP 1c. Kol.č. 1c-1d a. 1. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 2PX	2 dny	07.04. 20	08.04. 20												
71		SP 1d. 2. TK Beroun-Zdice - vložení 3PX	2 dny	09.04. 20	10.04. 20												
72		SP 1e. 1. TK Beroun-Zdice - propojení 3PX do 1. TK	2 dny	11.04. 20	12.04. 20												
73		SP 9.	77 dny	14.04. 20	29.06. 20												
74		9-I. Etapa propojení 101a do výh. Z4 (pro vl. KD Trans A)	1 den	16.04. 20	16.04. 20												
75		9-II. etapa bypass vlečka Čertovy schody	3 dny	17.04. 20	19.04. 20												
76		9-III. etapa prop. Km 40,587 (1. část); 41,163 (1. část)	18 dny	20.04. 20	07.05. 20												
77		9-IV. etapa zprovoznění vl. Čertovy schody	4 dny	08.05. 20	11.05. 20												
78		9-V. etapa prop.40,587 (2. část); 41,163 (1. část)	18 dny	12.05. 20	29.05. 20												
79		9-VI. Etapa zprovoznění výtažné kol. č. 91 a napojení vl. ČMC II	3 dny	30.05. 20	01.06. 20												
80		9-VII. Etapa napojení vlečky a propojení výtažné koleje 91 do 101a	7 dny	02.06. 20	08.06. 20												
81		SP 10. Kol. č. 101a – napojení Seřaďovacího nádraží	21 dny	30.06. 20	20.07. 20												
82		SP 1f. 1. TK Beroun-Zdice - demont. Odb. větvě a propojení TK 1	2 dny	19.07. 20	20.07. 20												
83		SP 11. Kol. č. 102a	79 dny	21.07. 20	07.10. 20												
84		SP 1g. 2. TK Beroun-Zdice - vyjmutí 3PX a propojení TK 2	2 dny	06.10. 20	07.10. 20												
85		aktivace TZZ a zrušení provizorní odbočky	6 dny	07.10. 20	12.10. 20												
86		SP 12. Dokončovací práce pro etapy II a III	170 dny	13.10. 20	31.03. 21												
87		závěrečné podbití	31 dny?	01.03. 21	31.03. 21												
88		závěrečné úpravy TV, laničkování	31 dny?	01.03. 21	31.03. 21												
89		dokončení stezek	31 dny	01.03. 21	31.03. 21												
90		broušení kolejí	8 dny	22.03. 21	29.03. 21												
91		rychlá pantografová zkouška	2 dny	30.03. 21	31.03. 21												

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	at V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI	1. čtvrtletí I III V	3. čtvrtletí VII IX XI
92		HARMONOGRAM STAVBY	1606 dny	07.11. 16	31.03. 21												
93		D TECHNOLOGICKÁ ČÁST	1436 dny	07.11. 16	12.10. 20												
94		D.1 Železniční zabezpečovací zařízení	1436 dny	07.11. 16	12.10. 20												
95	PS 13-21-01	Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní)	1436 dny	07.11. 16	12.10. 20												
96	PS 13-21-02	Beroun, pracoviště pohotovostního výpravního	440 dny	31.07. 19	12.10. 20												
97	PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání ZZ	440 dny	31.07. 19	12.10. 20												
98		D.2 Železniční sdělovací zařízení	1436 dny	07.11. 16	12.10. 20												
99	PS 13-22-01	žst.Beroun - místní kabelizace	1117 dny	07.11. 16	28.11. 19												
100	PS 13-22-02	žst.Beroun, DOK, TK	1117 dny	07.11. 16	28.11. 19												
101	PS 13-22-03	žst.Beroun - přel.a úpravy stáv.DK	1117 dny	07.11. 16	28.11. 19												
102	PS 13-22-04	žst.Beroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	851 dny	07.11. 16	07.03. 19												
103	PS 13-22-05	žst.Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém	373 dny	01.10. 19	07.10. 20												
104	PS 14-22-01	Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK	540 dny	17.04. 19	07.10. 20												
105	PS 14-22-03	Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika	540 dny	17.04. 19	07.10. 20												
106	PS 13-22-11	Žst. Beroun os.n. telefonní zapojovač	144 dny	22.05. 20	12.10. 20												
107	PS 13-22-14	Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízení	607 dny	14.02. 19	12.10. 20												
108	PS 13-22-15	Žst.Beroun seřadovací n., sdělovací zařízení	753 dny	21.09. 18	12.10. 20												
109	PS 13-22-16	Žst.Beroun os.n. - ASHS	144 dny	18.01. 19	10.06. 19												
110	PS 13-22-17	Žst.Beroun seřadovací n. - ASHS	144 dny	16.03. 18	06.08. 18												
111	PS 13-22-18	Žst.Beroun os.n. - EZS	165 dny	24.09. 18	07.03. 19												
112	PS 13-22-19	Žst.Beroun seřadovací n. - EZS	144 dny	16.03. 18	06.08. 18												
113	PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS	61 dny	01.05. 19	30.06. 19												
114	PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště	141 dny	25.05. 20	12.10. 20												
115	PS 13-22-26	SpS Tetín, EZS	66 dny	01.01. 19	07.03. 19												
116	PS 13-22-21	ŽST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující	189 dny	07.12. 18	13.06. 19												
117	PS 13-22-22	Žst.Beroun os.n. informační systém	189 dny	07.12. 18	13.06. 19												
118	PS 13-22-23	Žst.Beroun os.n. kamerový systém	189 dny	07.12. 18	13.06. 19												
119	PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	65 dny	02.01. 19	07.03. 19												
120	PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	341 dny	02.11. 19	07.10. 20												
121	PS 13-22-31	Žst.Beroun, úprava TRS,MRS	211 dny	16.03. 20	12.10. 20												
122		D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT	957 dny	01.03. 18	12.10. 20												
123	PS 13-23-01	Žst. Beroun os.nádr., DRT	487 dny	01.03. 18	30.06. 19												
124	PS 13-23-02	Žst. Beroun nákl.nádr., DRT	586 dny	01.03. 18	07.10. 19												
125	PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS	487 dny	01.03. 18	30.06. 19												
126	PS 13-23-04	SpS Tetín, DRT	487 dny	01.03. 18	30.06. 19												
127	PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha	455 dny	16.07. 19	12.10. 20												
128	PS 13-23-06	žst. Beroun, DDTS ŽDC	455 dny	16.07. 19	12.10. 20												
129	PS 13-23-07	CDP Praha, úprava DDTS ŽDC	455 dny	16.07. 19	12.10. 20												
130	PS 13-23-20	PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie	418 dny	09.05. 18	30.06. 19												
131	PS 13-23-21	PTM Beroun, trakční transformátory	418 dny	09.05. 18	30.06. 19												
132	PS 13-23-22	PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC	418 dny	09.05. 18	30.06. 19												
133	PS 13-23-23	PTM Beroun, vlastní spotřeba	168 dny	14.01. 19	30.06. 19												
134	PS 13-23-25	PTM Beroun, vazba napáječů	168 dny	14.01. 19	30.06. 19												
135	PS 13-23-31	Spínací zařízení k propojení uzemnění AC - DC trase	547 dny	10.04. 19	07.10. 20												
136	PS 13-23-10	Beroun trafostanice 22/0,4 kV	0 dny	01.10. 18	01.10. 18												
137	PS 13-23-11	Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádraží	0 dny	07.12. 18	07.12. 18												
138	PS 13-23-12	Beroun rozvodna nn	0 dny	01.10. 18	01.10. 18												
139	PS 13-23-14	Spín. ST 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun	168 dny	14.09. 18	28.02. 19												
140	PS 13-23-26	EPZ 3 kV DC Beroun, technologie	123 dny	11.02. 19	13.06. 19												
141	PS 13-23-27	EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba	123 dny	11.02. 19	13.06. 19												
142	PS 13-23-28	EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie	30 dny	15.05. 19	13.06. 19												
143	PS 13-23-15	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. - rozvodna nn	0 dny	07.12. 18	07.12. 18												
144	PS 13-23-13	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)	200 dny	13.08. 18	28.02. 19												
145		D.4 Ostatní technologická zařízení	533 dny	07.05. 18	21.10. 19												
146	PS 13-24-01	Beroun-Výtahy	533 dny	07.05. 18	21.10. 19												
147		E STAVEBNÍ ČÁST	1543 dny	09.01. 17	31.03. 21												
148		E.1 Inženýrské objekty	1422 dny	09.01. 17	30.11. 20												
149		E.1.1 Železniční svršek a spodek	1230 dny	01.06. 17	12.10. 20												
150	SO 13-33-01	Beroun os.nádr.-žel.spodek	90 dny	02.03. 19	30.05. 19												
151	SO 13-33-02	Beroun os.nádr.-žel.svršek	105 dny	01.03. 19	13.06. 19												

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
152		SP 8a - SP 10	105 dny	01.03. 19	13.06. 19																
153	SO 13-33-03	Beroun nákl.nádr. - žel.spodek	218 dny	04.03. 20	07.10. 20																
154		SP 11	218 dny	04.03. 20	07.10. 20																
155		SP 9 - SP 10	98 dny	14.04. 20	20.07. 20																
156	SO 13-33-04	Beroun nákl.nádr. - žel.svršek	218 dny	04.03. 20	07.10. 20																
157		SP 11	218 dny	04.03. 20	07.10. 20																
158		SP 9 - SP 10	98 dny	14.04. 20	20.07. 20																
159	SO 13-33-04.1	Služební přejezd	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																
160	SO 13-33-05	Beroun nákl.nádr. os nádraží - výstroj trati	1225 dny	01.06. 17	07.10. 20																
161	SO 13-33-06	Beroun vlečková kolej - žel.svršek	7 dny	02.06. 20	08.06. 20																
162	SO 14-33-01	Beroun-Králův Dvůr - žel.spodek	552 dny	05.04. 19	07.10. 20																
163	SO 14-33-02	Beroun-Králův Dvůr - žel.svršek	561 dny	01.04. 19	12.10. 20																
164	SO 14-33-04	Beroun-Králův Dvůr - výstroj trati	88 dny	17.07. 20	12.10. 20																
165		E.1.2 Nástupiště, rampy	158 dny	07.01. 19	13.06. 19																
166	SO 13-31-01	Beroun - nástupiště	175 dny	07.01. 19	30.06. 19																
167		SP 9	91 dny	15.03. 19	13.06. 19																
168		provizorní nástupiště 4	175 dny	07.01. 19	30.06. 19																
169	SO 14-31-01	Zastávka Králův Dvůr - nástupiště	452 dny	05.04. 19	29.06. 20																
170		E.1.3 Železniční přejezdy	171 dny	14.04. 20	01.10. 20																
171	SO 13-32-01	Žel.přejezd v km 41,343	171 dny	14.04. 20	01.10. 20																
172		E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi	1182 dny	28.05. 17	21.09. 20																
173	SO 13-38-01	Most - podchod v ev. km 38,831	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																
174	SO 13-38-02	Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																
175	SO 13-38-03	Most v ev. km 39,391	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																
176	SO 13-38-04	Most v ev. km 41,357	161 dny	14.04. 20	21.09. 20																
177	SO 14-38-01	Most - podchod v km 41,879	588 dny	20.11. 18	29.06. 20																
178	SO 14-38-02	Most v ev. km 42,082	182 dny	23.04. 19	21.10. 19																
179	SO 14-38-03	Most v ev. km 42,380	196 dny	09.04. 19	21.10. 19																
180	SO 13-38-10	Propustek v ev. km 37,946	0 dny	28.05. 17	28.05. 17																
181	SO 13-38-11	Propustek v ev. km 39,070	168 dny	14.11. 18	30.04. 19																
182	SO 13-38-12	Propustek v ev. km 39,844	0 dny	06.12. 17	06.12. 17																
183	SO 13-38-13	Propustek v ev. km 40,587	149 dny	20.04. 20	15.09. 20																
184	SO 13-38-14	Propustek v ev. km 41,163	149 dny	20.04. 20	15.09. 20																
185	SO 14-38-10	Propustek v ev. km 42,146 - zrušení	155 dny	09.04. 19	10.09. 19																
186	SO 13-38-30	Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2	558 dny	08.03. 19	15.09. 20																
187	SO 13-38-45	Návěstní krakorec v km 37,290	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																
188	SO 13-38-47	Návěstní krakorec v km 39,300	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																
189	SO 13-38-48	Návěstní krakorec v km 40,370	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																
190		E.1.5 Ostatní inženýrské objekty	1422 dny	09.01. 17	30.11. 20																
191	SO 13-42-01	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba	1422 dny	09.01. 17	30.11. 20																
192		Kácení mimolesní zeleně	812 dny	09.01. 17	31.03. 19																
193		Náhradní výsadba	792 dny	01.10. 18	30.11. 20																
194		E.1.6 Potrubní vedení	790 dny	01.09. 17	30.10. 19																
195	SO 13-37-01	PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																
196	SO 14-37-02	Králův Dvůr-odvodnění nástupiště a podchodu	172 dny	05.04. 19	23.09. 19																
197	SO 13-37-03	Beroun - odvodnění komunikace k PTM	110 dny	13.07. 19	30.10. 19																
198	SO 13-37-04	ŽST Beroun - přípojky tratí vodů	622 dny	01.09. 17	15.05. 19																
199		E.1.8 Pozemní komunikace	570 dny	15.03. 19	04.10. 20																
200	SO 13-34-09	PTM Beroun - komunikace	444 dny	15.03. 19	31.05. 20																
201	SO 14-34-06	Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)	174 dny	14.04. 20	04.10. 20																
202		E.1.9 Kabelovody, kolektory	236 dny	07.12. 18	31.07. 19																
203	SO 13-39-01	Beroun 01 - kabelovod	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																
204	SO 13-39-02	Beroun 02 - kabelovod	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																
205	SO 13-39-03	Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																
206	SO 14-39-01	Králův Dvůr - kabelovod	108 dny	15.04. 19	31.07. 19																
207		E.2 Pozemní stavební objekty	1369 dny	01.02. 17	31.10. 20																
208	SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy	911 dny	01.02. 17	31.07. 19																
209	SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupiště	86 dny	20.03. 19	13.06. 19																
210	SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	etf	3. čtvrtletí	1. čtvrtletí	3. čtvrtletí	1. čtvrtletí	3. čtvrtletí	1. čtvrtletí	3. čtvrtletí	1. čtvrtletí	3. čtvrtletí	1. čtvrtletí	3. čtvrtletí										
							VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX	XI	I	III	V	VII	IX	XI
211	SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																						
212	SO 13-34-06	PTM Beroun - oplocení	364 dny	01.11. 18	30.10. 19																						
213	SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																						
214	SO 13-34-08	Beroun - orientační systém	372 dny	07.06. 18	13.06. 19																						
215	SO 14-34-01	Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice	42 dny	01.10. 18	11.11. 18																						
216	SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení	56 dny	05.05. 20	29.06. 20																						
217	SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení	466 dny	24.07. 19	31.10. 20																						
218	SO 13-34-10	Beroun - demolice	542 dny	06.02. 19	31.07. 20																						
219		stavědla 1, 4, 5	542 dny	06.02. 19	31.07. 20																						
220	SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																						
221	SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																						
222		E.3 Trakční a energetická zařízení	1520 dny	01.02. 17	31.03. 21																						
223		E.3.1 Trakční vedení	1520 dny	01.02. 17	31.03. 21																						
224	SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení	1520 dny	01.02. 17	31.03. 21																						
225		SP celkem	1520 dny	01.02. 17	31.03. 21																						
226	SO 13-35-02	Beroun - převěšení ZOK	650 dny	17.02. 18	28.11. 19																						
227	SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení	250 dny	24.06. 18	28.02. 19																						
228	SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ	7 dny	07.06. 19	13.06. 19																						
229	SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží	1520 dny	01.02. 17	31.03. 21																						
230		SP celkem	1520 dny	01.02. 17	31.03. 21																						
231	SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení	638 dny	01.10. 17	30.06. 19																						
232	SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení	290 dny	14.09. 18	30.06. 19																						
233	SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení	1520 dny	01.02. 17	31.03. 21																						
234		E.3.3 Spínací stanice - stavební část	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																						
235	SO 13-34-14	Beroun stat.měníč 3 kV pro ZZ - stavební část	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																						
236		E.3.4 Ohřev výměn EOY	767 dny	23.10. 17	28.11. 19																						
237	SO 13-40-01	Beroun - e.ohřev výměn	767 dny	23.10. 17	28.11. 19																						
238		E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)	348 dny	01.07. 18	13.06. 19																						
239	SO 13-40-02	EPZ Beroun-přípojka nn	348 dny	01.07. 18	13.06. 19																						
240	SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod	123 dny	11.02. 19	13.06. 19																						
241		E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů	953 dny	20.04. 17	28.11. 19																						
242	SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení	785 dny	20.04. 17	13.06. 19																						
243	SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																						
244	SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO	770 dny	22.05. 17	30.06. 19																						
245	SO 13-36-04	Beroun - přípojka nn ze stat.měníče	342 dny	31.10. 18	07.10. 19																						
246	SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová přípojka nn	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																						
247	SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO	250 dny	24.10. 18	30.06. 19																						
248	SO 13-36-11	PTM Beroun - přípojka 22 kV	0 dny	07.12. 18	07.12. 18																						
249	SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení	295 dny	07.02. 19	28.11. 19																						
250	SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532	242 dny	01.04. 19	28.11. 19																						
251		E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí	1317 dny	01.03. 17	07.10. 20																						
252	SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK	852 dny	01.03. 17	30.06. 19																						
253		SP celkem	852 dny	01.03. 17	30.06. 19																						
254	SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK	1217 dny	01.03. 17	29.06. 20																						
255		SP celkem	1217 dny	01.03. 17	29.06. 20																						
256	SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK	552 dny	05.04. 19	07.10. 20																						
257		E.3.8 Vnější uzemnění	791 dny	01.05. 17	30.06. 19																						
258	SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění	35 dny	10.05. 19	13.06. 19																						
259	SO 13-36-12	PTM Beroun, vnější uzemnění	791 dny	01.05. 17	30.06. 19																						
260		VŠEOBECNÝ OBJEKT	1552 dny	01.04. 17	30.06. 21																						
261	SO 98-98-00	Všeobecný objekt	1552 dny	01.04. 17	30.06. 21																						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 342081

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3e9a4683-f6f4-4360-82ad-f87541c2e922

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.07.2019 10:33:10



75a1a254-4f1c-4d4b-8da4-139102eac9c5
