

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zastoupený	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	VALC, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677	
se sídlem	Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
IČO	45537151
DIČ	CZ45537151
zastoupený	Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu	336268/0300

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále též jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2017 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – stavební práce**“.

II.

Účel dodatku

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 původní Smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle Změnového listu č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, a společně se změnami podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ z Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
1 949 650,39 Kč bez DPH.
5. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
66 207,12 Kč bez DPH.
6. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **1 883 443,27 Kč bez DPH.**

III.

Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 2 Smlouvy se tedy mění tak, že **nově zní:**

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH 44 311 444,15

[čtyřicet čtyři milióny tři sta jedenáct tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři koruny českých patnáct haléřů]

DPH v Kč samostatně 9 305 403,27

[devět miliónů tři sta pět tisíc čtyři sta tři koruny české dvacet sedm haléřů]

Celková cena v Kč včetně DPH 53 616 847,42

[padesát tři milióny šest set šestnáct tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých čtyřicet dva haléře]

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele v Hradci Králové dne 16.7. 2019

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti VALC, s.r.o.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 20 - 28
Příloha č. 2 – Tabulka Změny závazků

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové - stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	36 767 974,37 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	36 767 974,37 Kč bez DPH	
--------------	--------------------------	--

Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 079 198,11 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 1 115 545,79 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 170 055,26 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 6 424,74 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 589 451,87 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 56 708,20 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 949 650,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 66 207,12 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 8 788 355,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 1 244 885,85 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	10 033 241,48 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	27,29 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	36 767 974,37 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 8 788 355,63 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 244 885,85 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		7 543 469,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		20,52 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 7)

– 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 949 650,39 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 66 207,12 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 883 443,27 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	38 731 626,69 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	39 895 257,21 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	42 428 000,88 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	44 311 444,15 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	44 311 444,15 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 20

Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.
Objednatel:	Královehradecký kraj
Změnový list vystavil:	■■■■■■■■■■
Datum:	27.2.2019

Předmět změny: Šínovody – přípojnícový systém

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů dispoziční úpravy jednotlivých dílen, bylo nutné demontovat stávající šínovody. Vzhledem k tomu, že tyto šínovody mají dožitou větší část prvků, zejména rohy, odbočení atd. a k těmto šínovodům již nejsou náhradní díly a z hlediska bezpečnosti nelze většinu stávajících šínovodů použít, je nutné provést celkovou výměnu.

Přílohy změnového listu: rozpočet + cenová nabídka

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 374 656,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1 374 656,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: ZL20 - šínovody

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M	Práce a dodávky M	1 374 656,50
----------	--------------------------	---------------------

21-M	Elektromontáže	1 374 656,50
-------------	-----------------------	---------------------

1	R	R001	D+M Připojnicového systému Canalis 160A Schneider Electric	kpl	1,000	1 374 656,50	1 374 656,50
---	---	------	--	-----	-------	--------------	--------------

Celkem	1 374 656,50
---------------	---------------------

CENOVÁ NABÍDKA-vícepráce

**ELEKTRO MOSEV**

ELEKTROINSTALACE ■ VÝTAHY ■ OCELOVÉ KONSTRUKCE

Stavba: SPŠ strojní, Hradec Králové

Objekt: 17031 – Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – VZ na stavební práce

Přípojnicový systém Canalis 160A Schneider Electric

18.2.2019

číslo míst.	Referenční číslo a katalog.odkaz	Název/Popis	jedn	Kusů	celková cena (CZK)
-------------	----------------------------------	-------------	------	------	--------------------

1.18	KSA160ED4306	Rovná délka distribuční 3M 160 A	ks	3,0	
	KSA160ED4501	Rovná délka distribuční 5M 160 A	ks	4,0	
	KSA250DLC40	Koleno 100-250 A horizontální	ks	4,0	
	KSA250ED4208	Rovná délka distribuční 2M 250 A	ks	3,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA250ABT4	Středová napájecí skříň 100-250 A	ks	1,0	
	KSB400ZF1	Univerzální držák 100-400 A	ks	18,0	
	KSB32CF5	Vývodní skříň 32A pojistková 10X38	ks	13,0	
	Celkem				203 081,6
	Prívod	1-CYKY-J 3x70+50 – uložený pevně	m	4,0	2 545,8

1.19	KSA160ED4501	Rovná délka distribuční 5M 160 A	ks	4,0	
	KSA250DLC40	Koleno 100-250 A horizontální	ks	4,0	
	KSA250ED4208	Rovná délka distribuční 2M 250 A	ks	3,0	
	KSA250ABT4	Středová napájecí skříň 100-250 A	ks	1,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA160ED4306	Rovná délka distribuční 3M 160 A	ks	3,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSB400ZF1	Univerzální držák 100-400 A	ks	17,0	
	KSB32CF5	Vývodní skříň 32A pojistková 10X38	ks	13,0	
	Celkem				202 931,7
	Prívod	1-CYKY-J 3x70+50 – uložený pevně	m	4,0	2 545,8

1.20	KSA160ED4306	Rovná délka distribuční 3M 160 A	ks	4,0	
	KSA160ED4501	Rovná délka distribuční 5M 160 A	ks	2,0	
	KSA250DLC40	Koleno 100-250 A horizontální	ks	4,0	
	KSA250ED4208	Rovná délka distribuční 2M 250 A	ks	3,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA250ABT4	Středová napájecí skříň 100-250 A	ks	1,0	
	KSB400ZF1	Univerzální držák 100-400 A	ks	15,0	
	KSB32CF5	Vývodní skříň 32A pojistková 10X38	ks	14,0	
	Celkem				193 027,1
	Prívod	1-CYKY-J 3x70+50 – uložený pevně	m	4,0	2 545,8

1.12	KSA250ED4208	Rovná délka distribuční 2M 250 A	ks	5,0	
	KSA250ED4501	Rovná délka distribuční 5M 250 A	ks	2,0	
	KSA250DTC40	T – Koleno 250 A	ks	1,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA250DLC40	Koleno 100-250 A horizontální	ks	2,0	
	KSA250AB4	Koncová napájecí skříň 100-250 A	ks	1,0	
	KSA250ED4156	Rovná délka distribuční 1M 50 250 A	ks	1,0	
	KSA250ED4306	Rovná délka distribuční 3M 250 A	ks	2,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA400AF1	Koncový kryt 400 A	ks	1,0	
	KSB400ZF1	Univerzální držák 100-400 A	ks	14,0	

	KSB32CF5	Vývodní skříň 32A pojistková 10X38	ks	13,0	
	Celkem				185 227,6
	Prívod	1-CYKY-J 3x70+50 - uložený pevně	m	4,0	2 545,8

1.11	KSA250ED4208	Rovná délka distribuční 2M 250 A	ks	5,0	
	KSA160ED4501	Rovná délka distribuční 5M 160 A	ks	3,0	
	KSA250DTC40	T - Koleno 250 A	ks	1,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA250DLC40	Koleno 100-250 A horizontální	ks	2,0	
	KSA250AB4	Koncová napájecí skříň 100-250 A	ks	1,0	
	KSA250ED4156	Rovná délka distribuční 1M 50 250 A	ks	1,0	
	KSA160ED4306	Rovná délka distribuční 3M 160 A	ks	2,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA400AF1	Koncový kryt 400 A	ks	1,0	
	KSB400ZF1	Univerzální držák 100-400 A	ks	15,0	
	KSB32CF5	Vývodní skříň 32A pojistková 10X38	ks	13,0	
	Celkem				181 843,4
	Prívod	1-CYKY-J 3x70+50 - uložený pevně	m	4,0	2 545,8

1.10	KSA100ED4306	Rovná délka distribuční 3M 100 A	ks	4,0	
	KSA100ED4501	Rovná délka distribuční 5M 100 A	ks	3,0	
	KSA250DTC40	T - Koleno 250 A	ks	1,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA250DLC40	Koleno 100-250 A horizontální	ks	2,0	
	KSA250ED4208	Rovná délka distribuční 2M 250 A	ks	1,0	
	KSA250AB4	Koncová napájecí skříň 100-250 A	ks	1,0	
	KSA250ED4156	Rovná délka distribuční 1M 50 250 A	ks	1,0	
	KSA250ET4A	Rovná délka na míru 250 A	ks	1,0	
	KSA400AF1	Koncový kryt 400 A	ks	1,0	
	KSB400ZF1	Univerzální držák 100-400 A	ks	15,0	
	KSB32CF5	Vývodní skříň 32A pojistková 10X38	ks	13,0	
	Celkem				181 843,4
	Prívod	1-CYKY-J 3x70+50 - uložený pevně	m	4,0	2 545,8

1.25	KSA250AB4	Koncová napájecí skříň 100-250 A	ks	1,0	
	KSA250ED4306	Rovná délka distribuční 3M 250 A	ks	1,0	
	KSA250ED4502	Rovná délka distribuční 5M 250 A	ks	1,0	
	KSB400ZF1	Univerzální držák 100-400 A	ks	3,0	
	KSB32CF5	Vývodní skříň 32A pojistková 10X38	ks	16,0	
	Celkem				61 727,7

	Celkem materiál	kpl	1,0	1 224 956,9 Kč
	Montáž	kpl	1,0	221 350,0 Kč
	Podružný upevňovací materiál- závitové tyce,pomocné konstrukce, kotvicí materiál.	kpl	1,0	36 748,7 Kč
	Demontáž stávajících šínovodů	m	215,0	64 500,0 Kč
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK			
	Revizní technik	hod	16,0	8 128,0 Kč
	Montážní plošina,lešení	dnů	7,0	6 426,0 Kč

Celkem	1 562 109,6 Kč
Obchodní sleva	12,0%
Celkem bez DPH	1 374 656,5 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	27.2.2019	
Předmět změny: Atiky		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů částečné změny konstrukce střechy, je třeba změnit sílu OSB desek. Původně navržené OSB desky tl. 10mm konstrukčně nevyhovují a je nutné použít OSB desky tl. 22 mm. Dále budou doplněny podkladní plechy na atiku pro uchycení střešní folie.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
31 572,24 Kč	142 764,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
111 192,30 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 25.6.19	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: ZL21 - Atiky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 111 192,30

762 Konstrukce tesařské 69 619,16

1	R	76234101x	Bednění atik z desek OSB tl 10 mm kotvení do betonové konstrukce	m2	-187,930	168,00	-31 572,24
2	762	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm	m2	176,550	573,16	101 191,40
321*0,55 "délka atik x šířka atik"					176,550		

x 0,89

764 Konstrukce klempířské 41 573,14

3	764	764011611.LND	Podkladní plech LINDAB FOP/PLX - plastizol rš 150 mm	m	266,000	156,29	41 573,14
---	-----	---------------	--	---	---------	--------	-----------

x 0,89

Celkem 111 192,30



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	7.3.2019	
Předmět změny: Demontáž dřevěného obložení fasády a nové zateplení podhledu. Popis a zdůvodnění změny: Na východní straně budovy dle PD měl být sundán dřevěný obklad a provedena montáž zateplovacího systému. Po demontáži dřevěného obkladu bylo zjištěno, že prostor je dutý, a proto musela být zvolena jiná technologie provedení zateplení a tvaru fasády. Nové navržené řešení aplikuje s minerální vatou. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	43 575,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
43 575,69 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 24.6.2019	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 24.6.2019	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: ZL22 - KZS po demontáži dřevěného obložení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 27 986,05

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 891,67

1	011	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,072	96,60	1 649,16
			9,7*1,6*1,1		17,072		
			Součet		17,072		
2	011	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	15,520	729,80	11 326,50
			9,7*1,6		15,520		
			Součet		15,520		
3	631	63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\rho=0,036-0,037$ tl 200mm	m2	15,830	746,71	11 820,42
			15,52 * 1,02		15,830		
4	011	621531051	Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	15,520	164,00	2 545,28
			9,7*1,6		15,520		
			Součet		15,520		
5	011	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	11,300	34,00	384,20
			9,7*1,6		11,300		
			Součet		11,300		
6	590	590514820	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	11,865	14,00	166,11
			11,3 * 1,05		11,865		

x 0,89

x 0,89

998 Přesun hmot 94,38

7	012	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	0,605	156,00	94,38
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 15 589,64

766 Konstrukce truhlářské 2 569,47

8	766	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	21,340	119,26	2 545,01
			(9,7*1,6)+(9,7*0,6)		21,340		
			Součet		21,340		

x 0,89

9	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	25,450	0,9612	24,46
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	-------

x 0,89

767 Konstrukce zámečnické 13 020,17

10	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	120,000	106,80	12 816,00
11	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	128,160	1,5931	204,17

x 0,89

x 0,89

Celkem 43 575,69



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	7.3.2019	
Předmět změny: akustický podhled v učebně kovárny Popis a zdůvodnění změny: Projekt uvažoval montáž protihlukového obkladu na strop kovárny. Pro velké množství tras potrubí VZT nebylo možné provést zvukovou izolaci v celé ploše. Jediným možným řešením bylo spustit protihlukovou izolaci pod potrubí VZT a zachytit ho konstrukcí SDK. Přílohy změnového listu: rozpočet + cenová nabídka		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
15.314,88 Kč	77 247,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
61 932,52 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 24.6.2019	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 25.6.19	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: ZL23 - akustický podhled - kovárna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 61 932,52

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 932,52

1	R	62122102x	Montáž akustického obkladu podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	28,980	-250,00	-7 245,00
			28,98		28,980		
2		631515270	deska minerální izolační podélné vlákno tl. 100 mm	m2	29,560	-273,00	-8 069,88
			28,98*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		29,560		
3	R	R001	D+M akustického podhledu včetně minerální izolace	kpl	1,000	77 247,40	77 247,40

Celkem 61 932,52

UNI-GIPS spol. s r. o., Pražská třída 13, 500 04 Hradec Králové
IČO : 60109726 DIČ : CZ60109726 email : obchod@unigips.cz tel: 602 645 115

CENOVÁ NABÍDKA

zakázka : VALC s.r.o. - SPŠ Stojnická HK - KOVÁRNA

		jed	množ	Kč	
1.	D + M akustický podhled Diamant 12,5 mm na závěsné ocelové konstrukci	m2	52	1149	59 748,00 Kč
2.	dodávka minerální izolace 2x 60 mm, 50 kg/m3	m2	52	185	9 620,00 Kč
3.	montáž minerální izolace ve 2 vrstvách	m2	52	135	7 020,00 Kč
4.	přesun hmot	%	5	11,88	59,40 Kč
5.	doprava, likvidace odpadu	kpl	1	800	800,00 Kč
	CENA CELKEM BEZ DPH				77 247,40 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	21.3.2019	
Předmět změny: Nouzové osvětlení Popis a zdůvodnění změny: Projekt uvažoval pouze s výměnou osvětlení, ale pro nevyhovující stav rozvodů, je třeba vyměnit celé rozvody včetně svítidel. Přílohy změnového listu: rozpočet + cenová nabídka		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	32 508,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32 508,80 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 24.6.20	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 25.6.19	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: ZL 24 - nouzové osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M		Práce a dodávky M					32 508,80
21-M		Elektromontáže					32 508,80
1	R	R001	D + M nouzového osvětlení chodby	kpl	1,000	32 508,80	32 508,80
		Celkem					32 508,80



ELEKTRO MOSEV

ELEKTROINSTALACE ■ VÝTAHY ■ OCELOVÉ KONSTRUKCE

CENOVÁ NABÍDKA vícepráce

11.3.2019

Stavba: SPŠ strojní, Hradec Králové

Objekt: 17031 – Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové

Popis	MJ	Počet	JC	Cena celkem
Dodávky				
Doplnění rozvaděče RO1–doplnění	ks	1	446,0	446,0
Doplnění rozvaděče RO2–doplnění	ks	1	446,0	446,0
Elektromontáže				
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, 1–CXKH–V180 3Cx1.5, pevně	m	80	47,8	3 827,2
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm ²	ks	6	14,6	87,6
LIŠTA VČETNĚ KRYTU, SPOJEK, ROHŮ,.. LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	6	48,5	290,7
POŽÁRNĚ ODOLNÝ SYSTÉM VEDENÍ KABELŮ KZ 60x50x1.50 včetně příslušenství, tvarovek,...	m	20	271,8	5 436,3
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ				
P Svítidlo nouzové LED 1,2W ECONOMIC 3h IP65 svítící stále/pri výpa	ks	2	958,8	1 917,5
N Svítidlo nouzové LOVATO 3h LED 3W AT 370lm stále sv./pri výpadku IP41	ks	6	3 043,4	18 260,2
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY			0,0	
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2	270,0	540,0
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI				
S ostatními profesemi	hod	1	310,0	310,0
Ostatní				
Podružný materiál 3%	kpl	1	947,2	947,2
Celkem Kč bez DPH				32 508,8 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	27.3.2019	
Předmět změny: Zděná stěna ze skleněných tvárnic Popis a zdůvodnění změny: Projekt tuto stěnu ze skleněných tvárnic Luxfer ve výkresové části uvažuje, avšak v rozpočtu chybí na tyto práce položka, proto je doplněna tímto změnovým listem. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	12 775,78 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 775,78 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 25.0.19	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: ZL25 - luxfery

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 12 775,78

761 Konstrukce prosvětlovací 12 775,78

1	761	761111114	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén struktura	m2	2,160	5 722,70	12 361,03	x 0,89
			2,4*0,9		2,160			
			Součet		2,160			

2	761	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%	123,610	3,3553	414,75	x 0,89
---	-----	-----------	---	---	---------	--------	--------	--------

Celkem 12 775,78



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	15.4.2019	
Předmět změny: Nový obklad za umyvadly v mistrovnách. Popis a zdůvodnění změny: Během provádění stavby byly stávající odpady zastiženy v dezolátním stavu a byla nutná provést jejich výměna a napojení až do ležaté kanalizace. Práce si vyžádaly demolici stěn i podlahy, a proto je po zazdění vybouraných částí nutné provést nové obklady a doplnit dlažbu. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	16 531,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16 531,68 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum: 25.6.19	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: ZL26 - Obklady v mistrovnách

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 15. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

16 531,68

781

Dokončovací práce - obklady

16 531.68

1	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,720	405,00	7 581,60
			1,0*1,6*8		12,800		
			1,6*1,6*2		5,120		
			0,5*1,6		0,800		
			Součet		18,720		

4	597	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	21,528	393,38	8 468,68
			18,72*1,15		21,528		
			Součet		21,528		

3	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	160,503	2,9993	481,4
---	-----	-----------	---	---	---------	--------	-------

Celkem

16 531,68



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	9.5.2019	
Předmět změny: Nové výdejní okénko a protipožární roleta. Popis a zdůvodnění změny: Stávající výdejní okénko v chodbě 1. NP nesplňuje požadavky a normy PBŘ a bylo nutné navrhnout nový systém včetně doplnění protipožární rolety. Takto provedené výdejní okénko normám PBŘ vyhoví. Přílohy změnového listu: rozpočet + cenové nabídky		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	150 840,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
150 840,00 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: /	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 24.6.2019	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: ZL27 - výdejní okno

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV **Práce a dodávky PSV** **150 840,00**

767 **Konstrukce zámečnické** **150 840,00**

1	R	R001	Výdejní okno	kpl	1,000	47 940,00	47 940,00
2	R	R002	Protipožární roleta	kpl	1,000	102 900,00	102 900,00

Celkem **150 840,00**

CENOVÁ NABÍDKA

TYROS LOADING SYSTEMS CZ s.r.o.

Nad Strouhou 126/6

147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 27119009

Tel: +420 241 767 854

fax: +420 241 772 971

E-mail: r.marek@tyros-loading-systems.cz

Kontaktní osoba: Roman Marek

Mobil: +420 602 341 092

VALC, s.r.o.

Pražská 13

500 04 Hradec Králové

IČ: 45537151

Tel.: +420 495 536 827

fax: +420 495 536 798

E-mail: [REDACTED].cz

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Mobil: +420 774 728 052

Cenová nabídka č. 01-0267B/2018/RM

Datum: 20.6.2019

Akce: SPŠ Hradec Králové


pozice: A

Textilní roletový požární uzávěr Fibreroll

EW30DP1

Popis:

Povrchová úprava ocelových částí je provedena galvanickým zinkováním. Roleta je ze speciální požáru odolné textilie protkané ocelovými drátky, barva stříbrošedá. Pohyb požárního uzávěru je pomocí elektropohonu, případně po uvolnění elektromagnetické brzdy gravitačním způsobem. Ovládání tlačítkem. Napojení na EPS. Napájení uzávěru je 230 V jednofázové. Příkon motoru 350 W. Součástí dodávky je osvědčení o požární odolnosti a prohlášení výrobce o shodě.

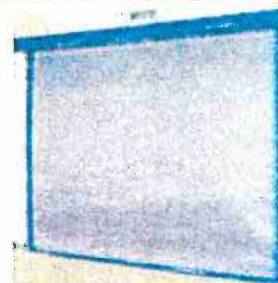

Příslušenství: 1ks teplotní detektor-čidlo

Povrchová úprava: RAL 9010

Světlý rozměr (š x v):	Jednotková cena	Počet ks	Celkem bez DPH
2000 x 1000 mm	102 900,00 Kč	1	102 900,00 Kč
Celková cena bez DPH :			102 900,00 Kč

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Cenovou nabídkou se cítíme být zavázáni po dobu 60 dní.

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslaných podkladů.

Ceny jsou uvedeny včetně montáže, dopravy a bez DPH.

Ceny jsou kalkulovány včetně množstevních slev a dle aktuálního kurzu k datu vyhotovení nabídky.

V případě technických změn si vyhrazujeme právo změny ceny.

V případě montáže požadujeme stavební připravenost v souladu s obchodními podmínkami Tyros LS CZ.

Nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných ocelových konstrukcí.

Záruční podmínky: na dílo poskytujeme záruku v délce 24 měsíců.

Požární vrata - záruka na těsnění 24 měsíců nebo 10 000 cyklů otevřít a zavřít (dle případu, který nastane dříve). Opatřebitelné části 24 měsíců nebo 50 000 cyklů otevřít a zavřít (dle případu, který nastane dříve). Baterie a světelné zdroje záruka 12 měsíců.

Trvání záruční doby je podmíněno prováděním pravidelných servisních podmínek v intervalech 6 měsíců.

Před uplynutím záruční doby Vám bude zaslán návrh servisní smlouvy.

Dodací lhůta: cca 5-6 týdnů po technickém vyjasnění zakázky + montáž.

Platební podmínky: dle konkrétní realizace zakázky (standard 60% záloha + 40% doplatek).

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 97693, ze dne 3.2.2004

Dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost zařízení Vám zajistí naše servisní středisko, které zajišťuje pravidelnou údržbu a opravy, kontakt: service@tyros-loading-systems.cz

Přiložené obrázky jsou pouze informativního charakteru.

Doufáme, že Vás naše nabídka uspokojí a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem

ADV servis s.r.o.

ADV servis s.r.o.

Bieblova 1110/1b
500 03 Hradec Králové
e-mail:adv.servis@seznam.cz
www.advhk.cz

Valc s.r.o.

Pražská třída 13/84
500 04 Hradec Králové
vohralikova@valc-hk.cz

Věc: cenová nabídka

Vážený pane,

na základě našeho zjištění a Vaši žádosti zasíláme cenovou nabídku na dodání a montáž výdejního okénka.

Výdejní okénko

1 ks

- výdejní okénko komplet
- hliníková profilace
- posuvné do boku
- zasklení mléčný connex
- povrchová úprava RAL 9010 bílá
- práce
- podíl dopravy

Cena

47.940,-Kč

Automatizované dveře a vřata - servis a montáže

Uvedené ceny jsou bez DPH

Obchodní podmínky k jednání:

Platební podmínky: fakturace na základě závazné objednávky
Záruka: standardní **24 měsíců** (vyjma cizího zavinění)
Termín dodání: **4-6 týdnů** od písemné objednávky

Platnost nabídky: **1 měsíc**
Splatnost faktury: **14 dní**

Vyhrazujeme si právo změny cenové úrovně v případě podstatné změny technického zadání.

V ceně není počítáno zednické zapravení

S pozdravem

ADV servis s.r.o.
servis-montáž-prodej



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	29.5.2019	
Předmět změny: Nové protipožární vnitřní dveře Popis a zdůvodnění změny: Dle PD se mělo 7 ks stávajících vnitřních protipožárních dveří (T00) zkontrolovat a opravit. Po prověření a kontrole těchto dveří bylo projektantem rozhodnuto o jejich vysazení a nahrazení novými protipožárními tak, aby bylo možné zkolaudovat. Přílohy změnového listu: rozpočet + cenová nabídka		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
19.320,00 Kč	98 750,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
79 430,00 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: [Signature]	Za zhotovitele: [Signature]	
Datum:	Datum: 24	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka: [Signature]	
Datum: 29.5.2019	Datum: [Signature]	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen

Objekt: ZL28 - vnitřní dveře T00

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	79 430,00
------------	----------------------------	------------------

766	Konstrukce truhlářské	79 430,00
------------	------------------------------	------------------

1	R	7667001	D+M ozn T00 prověření, kontrola, oprava stávajících požárních dveří (1kř 2x, 2kř 5x)	kus	7,000	-2 760,00	-19 320,00
2	R	R001	Protipožární vnitřní dřevěné dveře	kpl	1,000	98 750,00	98 750,00

Celkem	79 430,00
---------------	------------------

MOINT s.r.o.

Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové
IČO: 48150878 DIČ: CZ48150878

společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložka 3259

VALC s.r.o.

V Hradci Králové 13.5.2019

Cenová nabídka č. 7640 DPO - A

Akce: Nádstavba dílen SPŠ HK - truhlářské konstrukce

Ceny bez DPH. Současná cenová úroveň výrobků. **Rozměry dveří upraveny dle skutečného stavu při zaměření.**

Předpokládané (ceněné) provedení vnitřních dveří

Provedení shodné s původní zakázkou : dřevěné dveře s povrchem CPL laminát bílý. Vrchní dvevní kování štitové ROSTEX 804 or klika-klika vč. standardní vložky.

Montáž dveří do ocelové zárubně - ocelové zárubně neceněny (ocelová zárubeň s protiplechem pro zámek s roztečí 72 mm)

Samozavírač GEZE TS 2000 V * povrch stříbrný * raménko bez aretace.

U dvoukřídlových požárních dveří budou dle upřesnění osazeny dva samozavírače s koordinátorem, automatické zástrčky nebudou použity.

1)	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197, kování klika-klika	kus	2,000	7 900,00	15 800,00
----	--	-----	-------	----------	-----------

EI30DP3-C	typové dveře plné hladké * CPL laminát bílá * požární EI(EW)30(15)DP3			4550	
-----------	---	--	--	------	--

2 pravé	vrchní dvevní kování klika-klika			550	
	standardní 3-klíčová vložka			200	
	montáž dveří požárních do ocelové požární zárubně			750	
	D+M samozavírače GEZE TS2000 stříbrného			1850	

T00 místnost č.1.01 chodba : 800*1940 ATYP

T00 místnost č.1.08 šatna : 800*1970

příplatek za atypický rozměr dveří 20% ze základní ceny 4.550,- Kč	kus	1,000	910,00	910,00	
--	-----	-------	--------	--------	--

2)	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové 145x197 symetrické, kování klika-klika	kus	4,000	17 900,00	71 600,00
----	--	-----	-------	-----------	-----------

EI30DP3-C	1450*1970 dveře plné hladké * CPL laminát bílá * požární EI(EW)30(15)DP3 * symetrické			10550	
-----------	---	--	--	-------	--

4 levé	vrchní dvevní kování klika-klika			550	
	standardní 3-klíčová vložka			200	
	montáž dveří požárních do ocelové požární zárubně			950	
	D+M 2 x samozavírače GEZE TS2000 stříbrného + koordinátor postupného zavírání dvoukřídlových dveří			5650	

T00 místnost č.1.21 chodba : 1450*1940 ATYP

T00 místnost č.1.21 chodba : 1450*1940 ATYP

T00 místnost č.1.13 chodba : 1450*1940 ATYP

T00 místnost č.1.13 chodba : 1450*2030 ATYP

příplatek za atypický rozměr dveří 20% ze základní ceny 10.550,- Kč	kus	4,000	2 110,00	8 440,00	
---	-----	-------	----------	----------	--

dodávka a montáž celkem 96 750,00 Kč

dopravné, přesuny 2 000,00 Kč

Celkem (bez DPH) 98 750,00 Kč
