

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 105</b>
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>	
Datum:	12.7.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Práce dle deníku víceprací</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Rekonstrukce:</b></p> <p>Pol. 1.1. Protipožární SDK kastlík pro nově vedené rozvody ÚT a kamerový systém pro dvůr.  Pol. 1.2: Na základě rozporu mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem došlo k navýšení počtu kusů oken o 1ks na celkem 25 ks. Jedná se o výrobu šambrán kolem oken.  Pol. 1.3: Z pokynu projektanta, bude provedena profilace na přechodu kamenného soklu a zdiva shodně se šambránami.  Pol. 1.4: Z pokynu restaurátora zrušení provedení antigrafitového nátěru z důvodu technologické nevhodnosti použití nátěru na sanační omítky.  Pol. 1.5: Změna revizních dvířek pro VZT – v projektové dokumentaci nedostatečná velikost pro potřeby servisních zásahů u VZT.  Pol. 2: Zasekání a zaomítání vedení ÚT v místnosti 3.08 z pokynu projektanta  Pol. 3: M.Č. 3.08 doplnění chybějícího sádkartonového podhledu k zakrytí vedení ZTI.  Pol. 4: Doplnění obkladu na sloup mezi místnostmi 2.14 a 2.15 po montáži obložek.  Pol. 5.1: Demontáž a montáž již osazených obložek v místnosti č. 3.23. z důvodu dodání Racku o rozměrech dle projektové dokumentace širším než obložky.  Pol. 5.2: Doplnění spáry mezi schodištěm a dlažbou umělým kamenem ve 3. NP  Pol. 5.4: Oprava pískovcového parapetu z 1. PP do MŠ  Pol. 5.5: Navýšení množství kamene po zaměření skutečného stavu oproti projektové dokumentaci.  Pol. 6: Po zaměření skutečného stavu podlah v 1. PP došlo k navýšení množství oproti ZL 044.  Pol. 7: Montáž zemnicích tyčí rozebrání dlažby, nebylo zohledněno v projektu.  Pol. 8: Doplnění protipožárního podhledu v místnosti 3.23 z důvodu vedení rozvodů EZS, ZTI a jiných, původně v projektu nebylo řešeno.  Pol. 9: Projektová dokumentace specifikovala k mycí lince jeden elektrokabel navíc, z pokynu projektanta nebude rušen, pouze ukončen jako rezerva v dodané elektrokrabici.  Pol. 10: Doplnění chybějícího 1 ks dveří ve výkazu výměr  Pol. 11: Zasekání a zaomítání vedení ÚT v tělocvičně včetně demontáže uvolněné konzoly cvičebního náčiní – kruhy z pokynu projektanta  Pol. 12: Doplnění dodatečné přivětrávací mřížky do dveří č. 13/P mezi místnosti 2.07 a 2.11 z pokynu projektanta  Pol. 13: Doplnění v projektu chybějících revizních dvířek.  Pol. 14: Stěhování školního nábytku a vybavení pro účely simulace budoucí učebny za účelem reálného změření doby dozvuku pro účely Kolaudace.  Pol. 15: Demontáž a opětovná montáž včetně nezbytných revizí 2ks hydrantů s ohledem na nové omítky. Projekt nezohledňoval.</p>		

**Odůvodnění změny:**

Práce z deníku víceprací nutné pro dokončení díla. Období 16.4.2019 – 3.5.2019.

Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 105 - deník víceprací zápisy od 16.4.2019 do 3.5.2019.

Počet připojených listů specifikací: 15

Počet připojených výkresů: ---

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

**-280 783,42 Kč**

**396 323,74 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

**115 540,32 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: \_105  
Stavba: Pernerova - změna dle SD 05

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **115 540,32**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>115 540,32</b>	<b>24 263,47</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **139 803,79**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 105

**Stavba:** Pernerova - změna dle SD 05

Místo:

Datum: 10. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>115 540,32</b>	<b>139 803,79</b>	
<b>105a</b>	<b>Změna č.105a - přípočet</b>	396 323,74	479 551,73	<b>STA</b>
A.a	Rekonstrukce objektu	367 640,47	444 844,97	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	28 683,27	34 706,76	Soupis
<b>105b</b>	<b>Změna č.105b - odpočet</b>	-280 783,42	-339 747,94	<b>STA</b>
A.b	Rekonstrukce objektu	-260 462,18	-315 159,24	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-20 321,24	-24 588,70	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 05

Objekt:

105a - Změna č. 105a - přípočet

Soupis:

## A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**367 640,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	367 640,47	21,00%	77 204,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**444 844,97**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna dle SD 05  
Objekt: 105a - Změna č.105a - přípočet  
Soupis: **A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 10. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**367 640,47**

### HSV - Práce a dodávky HSV

45 009,76

1 - Zemní práce 18 465,22

4 - Vodovodné konstrukce 1 257,60

5 - Komunikace pozemní 3 168,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní 1 011,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 344,71

997 - Přesun sutě 15 035,66

998 - Přesun hmot 2 726,94

### M - Práce a dodávky M

188,49

21-M - Elektromontáže - silnoproud 188,49

02.01.2017 - Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos) 188,49

### OST - Restaurátorské práce

136 491,98

62 - Restaurátorská oprava zdobných prvků uliční fasády včetně přesunu hmot 136 491,98

### PSV - Práce a dodávky PSV

167 734,24

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 947,00

763 - Konstrukce suché výstavby 63 862,45

766 - Konstrukce truhlářské 17 303,52

771 - Podlahy z dlaždic 32 592,02

772 - Podlahy z kamene 42 949,23

781 - Dokončovací práce - obklady 1 080,02

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

18 216,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna dle SD 05  
 Objekt: 105a - Změna č.105a - připočet  
 Soupis: **A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo: Datum: 10. 4. 2019  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>367 640,47</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				45 009,76	
D	1		Zemní práce				18 465,22	
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	16,000	91,08	1 457,28	sml.rozpočet
	vv		"pol. 7 - stavební deník 26.4.2019 - hromosvod" 1,0*4,0*4		16,000			
2	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,800	2 467,43	11 843,66	sml.rozpočet
	P		Poznámka k položce					
	vv		Výkopek bude použitý pro zpětný zásyp					
	vv		"pol. 7 - stavební deník 26.4.2019 - hromosvod" 1,0*4,0*4*0,3		4,800			
3	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,440	329,54	474,54	sml.rozpočet
	vv		4,8*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,440			
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,800	977,03	4 689,74	sml.rozpočet
	vv		"pol. 7 - stavební deník 26.4.2019 - hromosvod" 1,0*4,0*4*0,3		4,800			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 257,60	
5	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	16,000	78,60	1 257,60	ZL23
	vv		"pol. 7 - stavební deník 26.4.2019 - hromosvod" 1,0*4,0*4		16,000			
D	5		Komunikace pozemní				3 168,00	
6	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	16,000	198,00	3 168,00	sml.rozpočet
	vv		"pol. 7 - stavební deník 26.4.2019 - hromosvod" 1,0*4,0*4		16,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 011,63	
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,034	333,03	344,35	sml.rozpočet
	vv		"pol. 2 - stavební deník 11.4.2019 - úprava potrubí v m.č. 3.08" 1*0,3		0,300			
	vv		"pol. 11 - stavební deník 30.4.2019 - tělocvična" 3,67*0,2		0,734			
	vv		Součet		1,034			
8	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,034	542,82	561,28	sml.rozpočet
	vv		"pol. 2 - stavební deník 11.4.2019 - úprava potrubí v m.č. 3.08" 1*0,3		0,300			
	vv		"pol. 11 - stavební deník 30.4.2019 - tělocvična" 3,67*0,2		0,734			
	vv		Součet		1,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,025	4 240,00	106,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		"pol. 2 - stavební deník 11.4.2019 - úprava potrubí v m.č. 3.08" 0,5*0,25*0,2		0,025			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 344,71	
10	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	27,180	63,59	1 728,38	sml.rozpočet
	WV		"pol. 1 - stavební deník 10.4.2019 - SDK kastlík" 18,25*1,2		21,900			
	WV		"pol. 1.5 - stavební deník 10.4.2019 - revizní dvířka" 2,4*1,2		2,880			
	WV		"pol. 11 - stavební deník 30.4.2019 - tělocvična" 2,0*1,2		2,400			
	WV		Součet		27,180			
11	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,025	2 480,00	62,00	ZL6
	WV		"pol. 2 - stavební deník 11.4.2019 - úprava potrubí v m.č. 3.08" 0,5*0,25*0,2		0,025			
12	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	1,000	412,34	412,34	sml.rozpočet
	WV		"pol. 2 - stavební deník 11.4.2019 - úprava potrubí v m.č. 3.08" 1		1,000			
13	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	3,670	217,00	796,39	ZL104
	WV		"pol. 11 - stavební deník 30.4.2019 - tělocvična" 3,67		3,670			
14	K	976075211	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 20 kg	t	0,040	8 640,00	345,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		"pol. 11 - stavební deník 30.4.2019 - tělocvična" 2*0,02		0,040			
	D	997	Přesun sutě				15 035,66	
15	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	5,650	1 157,54	6 540,10	sml.rozpočet
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,650	412,34	2 329,72	sml.rozpočet
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	135,600	24,84	3 368,30	sml.rozpočet
	WV		5,65*24 *Přepočtené koeficientem množství		135,600			
18	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	5,650	495,14	2 797,54	sml.rozpočet
	D	998	Přesun hmot				2 726,94	
19	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	4,353	626,45	2 726,94	sml.rozpočet
	D	M	Práce a dodávky M				188,49	
	D	21-M	Elektromontáže - silnoproud				188,49	
	D	02.01.2017	Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)				188,49	
20	K	2.1.34	rozvodná krabice s vičkem a svorkovnicí do zdi nebo SDK , hl. 42mm	ks	1,000	188,49	188,49	R-položka
	WV		"pol. 9 - stavební deník 30.4.2019 - kabel v gastroprovozu" 1		1,000			
	D	OST	Restaurátorské práce				136 491,98	
	D	62	Restaurátorská oprava zdobných prvků uliční fasády včetně přesunu hmot				136 491,98	
21	K	622-R14	Šambrány soklových okének (nové) - výroba a doplnění nových šambrán	ks	1,000	4 131,36	4 131,36	sml.rozpočet
	WV		"pol. 1.2 - stavební deník 10.4.2019 - okna v 1.PP" 1		1,000			
22	K	622-R14a	Profilace přechodu kamenného soklu a zdiva - výroba a doplnění nové profilace	m	67,280	1 967,31	132 360,62	cena odvozena ze sml. rozpočtu
	P		Poznámka k položce: Cena odvozena z položky 622-R14					
	WV		"pol. 1.3 - stavební deník 10.4.2019 - profilace přechodu soklu"					
	WV		"jižní fasáda" 41,68		41,680			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"západní fasáda" 25,60		25,600			
	vv		Součet		67,280			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				167 734,24	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				9 947,00	
23	K	722210R01	Demontáž, oprava a zpětná montáž hydrantové skříně	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	R-položka
	vv		"pol. 15 - stavební deník 3.5.2019 - oprava hydrantů v 1.PP" 2		2,000			
24	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	98,000	1,50	147,00	sml.rozpočet
	D	763	Konstrukce suché výstavby				63 862,45	
25	K	763111924	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 0,50 do 1,00 m2	kus	1,000	2 070,00	2 070,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"pol. 13 - stavební deník 3.5.2019 - revizní dvířka" 1		1,000			
26	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	0,640	794,88	508,72	sml.rozpočet
	vv		"pol. 8 - stavební deník 29.4.2019 - podhled v m.č. 3.23a" 0,64		0,640			
27	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,200	821,37	985,64	sml.rozpočet
	vv		"pol. 3 - zápis GP do SD stavby 16.4.2019 - podhled v m.č. 3.08" 1,0*1,2		1,200			
28	K	763131623	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 2 x 12,5 mm	m2	1,800	170,00	306,00	ZL47
	vv		"pol. 1.5 - stavební deník 10.4.2019 - revizní dvířka" 3,0*0,6		1,800			
29	M	590305240	deska protipožární sdk tl. 12,5 mm	m2	3,960	158,98	629,56	sml.rozpočet
	vv		1,8*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,960			
30	K	763131913	Zhotovení otvoru v SDK podhledu s vyztužením profily	kus	8,000	763,00	6 104,00	ZL10
	vv		"pol. 1.5 - stavební deník 10.4.2019 - revizní dvířka" 2		2,000			
	vv		"pol. 13 - stavební deník 3.5.2019 - revizní dvířka" 6		6,000			
	vv		Součet		8,000			
31	K	763132812	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění dvojité	m2	1,800	46,00	82,80	ZL47
	vv		"pol. 1.5 - stavební deník 10.4.2019 - revizní dvířka" 3,0*0,6		1,800			
32	K	763164137	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	18,250	1 311,54	23 935,61	sml.rozpočet
	vv		"pol. 1.1 - stavební deník 10.4.2019 - SDK kastlík" 18,25		18,250			
33	K	763171114	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,50 do 1,00 m2	kus	1,000	406,00	406,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"pol. 13 - stavební deník 3.5.2019 - revizní dvířka" 1		1,000			
34	M	590307R07	dvířka revizní do SDK příčky 1200 x 700 mm	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	R-položka
	vv		"pol. 13 - stavební deník 3.5.2019 - revizní dvířka" 1		1,000			
35	K	763172315	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	8,000	794,88	6 359,04	sml.rozpočet
	vv		"pol. 1.5 - stavební deník 10.4.2019 - revizní dvířka" 2		2,000			
	vv		"pol. 13 - stavební deník 3.5.2019 - revizní dvířka" 6		6,000			
	vv		Součet		8,000			
36	M	590307R02	dvířka revizní do SDK podhledu 400 x 1000 mm	kus	2,000	2 810,50	5 621,00	R-položka
	vv		"pol. 1.5 - stavební deník 10.4.2019 - revizní dvířka" 2		2,000			
37	M	590307R03	dvířka revizní do SDK podhledu 1200 x 400 mm	kus	2,000	2 810,50	5 621,00	R-položka
	vv		"pol. 13 - stavební deník 3.5.2019 - revizní dvířka" 2		2,000			
38	M	590307R04	dvířka revizní do SDK podhledu 400 x 400 mm EI 45	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	R-položka
	vv		"pol. 13 - stavební deník 3.5.2019 - revizní dvířka" 1		1,000			
39	M	590307R05	dvířka revizní do SDK podhledu 400 x 400 mm	kus	2,000	510,00	1 020,00	R-položka
	vv		"pol. 13 - stavební deník 3.5.2019 - revizní dvířka" 2		2,000			
40	M	590307R06	dvířka revizní do SDK podhledu 200 x 200 mm	kus	1,000	395,00	395,00	R-položka
	vv		"pol. 13 - stavební deník 3.5.2019 - revizní dvířka" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	628,444	1,62	1 018,08	sml.rozpočet
	D	766	Konstrukce truhlářské				17 303,52	
42	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pol. 12 - stavební deník 2.5.2019 - dveřní mřížka" 1		1,000			
43	M	553414R01	mřížka větrací dveřní	kus	1,000	780,00	780,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Rozměr 600x80 mm					
	VV		"pol. 12 - stavební deník 2.5.2019 - dveřní mřížka" 1		1,000			
44	K	76667 21L	Repase stávajících dřevěných vnitřních dveří kazetových otočných jednokřídlových plných s obložkovou zárubní 700x1970 včetně kování zámku, nátěru	kus	1,000	14 943,65	14 943,65	sml.rozpočet
	VV		"pol. 10 - stavební deník 30.4.2019 - oprava výkazu výměr"					
	VV		"výplně otvorů"					
	VV		"21/L" 1		1,000			
45	K	766681811	Demontáž zárubní k opětovnému použití obložkových z masivu, plochy otvoru do 2 m2	m2	1,680	100,00	168,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pol. 5.1 - stavební deník 25.4.2019 - obložka dveří 10/P" 0,8*2,1		1,680			
46	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	794,88	794,88	sml.rozpočet
	P		Poznámka k položce: Zpětná montáž zárubně					
	VV		"pol. 5.1 - stavební deník 25.4.2019 - obložka dveří 10/P" 1		1,000			
47	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	167,995	3,00	503,99	sml.rozpočet
	D	771	Podlahy z dlaždic				32 592,02	
48	K	771151R01	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	58,915	517,40	30 482,62	ZL44
	P		Poznámka k položce: Např. Mapei Planitex D5					
	VV		navýšení tloušťky o 5 mm: m.č. 1.01: plocha 108,83 m2; přechody mezi chodbou 1.01 a ostatními místnostmi: plocha 9,0 m2 "pol. 6 - stavební deník 26.4.2019 - navýšení tloušťky stěrky" (108,83+9)*0,5		58,915			
49	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	304,826	6,92	2 109,40	sml.rozpočet
	D	772	Podlahy z kamene				42 949,23	
50	K	772R01	Vyplnění spáry umělým kamenem	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: 3.NP - mezi schodištěm a dlažbou					
	VV		"pol. 5.2 - stavební deník 25.4.2019 - vyplnění spáry" 1		1,000			
51	K	772R02	Kamenická oprava pískovcového parapetu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: U výstupu ze schodiště z 1.PP do MŠ					
	VV		"pol. 5.4 - stavební deník 25.4.2019 - oprava parapetu" 1		1,000			
52	M	583821R01	deska obkladová, žula tryskaná tl 5 cm do 0,24 m2	m2	3,830	7 797,51	29 864,46	sml.rozpočet
	P		Poznámka k položce: Navýšení plochy kamenných stupňů po zaměření skutečného stavu					
	VV		"pol. 5.5 - stavební deník 25.4.2019 - kamenné stupně" 3,83		3,830			
53	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý	m2	3,830	440,98	1 688,95	sml.rozpočet
	VV		"pol. 5.5 - stavební deník 25.4.2019 - kamenné stupně" 3,83		3,830			
54	K	772991431	Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně	m2	3,830	198,72	761,10	sml.rozpočet
	VV		"pol. 5.5 - stavební deník 25.4.2019 - kamenné stupně" 3,83		3,830			
55	K	998772203	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	423,145	1,50	634,72	sml.rozpočet
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 080,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	781473117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	0,680	516,67	351,34	sml.rozpočet
	VV		*pol. 4 - stavební deník 24.4.2019 - obklad sloupu" (0,09+0,16+0,09)*2,0		0,680			
57	M	597610001	obkládačky keramické - 40% obkladu barevný odstín	m2	0,748	207,22	155,00	sml.rozpočet
	VV		0,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,748			
58	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	0,680	27,82	18,92	sml.rozpočet
59	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	0,680	132,48	90,09	sml.rozpočet
60	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	0,680	21,20	14,42	sml.rozpočet
61	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	103,33	413,32	sml.rozpočet
	VV		*pol. 4 - stavební deník 24.4.2019 - obklad sloupu" 2*2,0		4,000			
62	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	10,431	3,54	36,93	sml.rozpočet
D	HZS		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				18 216,00	
63	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukci zedník	hod	44,000	414,00	18 216,00	sml.rozpočet
	VV		*pol. 2 - stavební deník 11.4.2019 - úprava potrubí v m.č. 3.08" 9		9,000			
	VV		*pol. 4 - stavební deník 24.4.2019 - obklad sloupu" 4		4,000			
	VV		*pol. 5.1 - stavební deník 25.4.2019 - obložka dveří 10/P" 7		7,000			
	VV		*pol. 9 - stavební deník 30.4.2019 - kabel v gastroprovozu" 2		2,000			
	VV		*pol. 11 - stavební deník 30.4.2019 - tělocvična" 10		10,000			
	VV		*pol. 14 - stavební deník 3.5.2019 - měření doby dozvuku" 3*4		12,000			
	VV		Součet		44,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 05

Objekt:

105a - Změna č. 105a - přípočet

Soupis:

## A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**28 683,27**

DPH základní  
snížená

Základ daně

28 683,27

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 023,49

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**34 706,76**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 05

Objekt:

105a - Změna č.105a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

10. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**28 683,27**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

28 683,27

VRN3 - Zařízení staveniště

17 271,73

VRN4 - Inženýrská činnost

8 330,72

VRN6 - Územní vlivy

1 540,41

VRN7 - Provozní vlivy

1 540,41

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 05

Objekt:

105a - Změna č.105a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

10. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>28 683,27</b>	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				28 683,27	
D	VRN3		Zařízení staveniště				17 271,73	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	3 676,40	17 271,73	sml.rozpočet
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 330,72	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizi pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	3 676,40	926,45	sml.rozpočet
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	3 676,40	7 404,27	sml.rozpočet
D	VRN6		Územní vlivy				1 540,41	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	3 676,40	1 540,41	sml.rozpočet
D	VRN7		Provozní vlivy				1 540,41	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	3 676,40	1 540,41	sml.rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 05

Objekt:

105b - Změna č.105b - odpočet

Soupis:

**A.b - Rekonstrukce objektu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-260 462,18**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-260 462,18  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-54 697,06  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-315 159,24**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 05

Objekt:

105b - Změna č. 105b - odpočet

Soupis:

**A.b - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum:

10. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-260 462,18**

PSV - Práce a dodávky PSV

-260 462,18

783 - Dokončovací práce - nátěry

-260 462,18



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 05

Objekt:

105b - Změna č.105b - odpočet

Soupis:

**A.b - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 10. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-260 462,18</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-260 462,18	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-260 462,18	
1	K	783846523	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	-547,500	475,73	-260 462,18	sml.rozpočet
	W		"pol. 1.4 - stavební deník 10.4.2019 - odpočet antigraffiti nátěru"					
	W		-(55+40,5)*3			-286,500		
	W		-(22,5+7,5+13,5+7,5+6,0+19,5+2,0+8,5)*3			-261,000		
	W		Součet			-547,500		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 05

Objekt:

105b - Změna č.105b - odpočet

Soupis:

## A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 4. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-20 321,24**

DPH základní  
snižená

Základ daně

-20 321,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 267,46

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-24 588,70**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 05

Objekt:

105b - Změna č. 105b - odpočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

10. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-20 321,24**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-20 321,24

VRN3 - Zařízení staveniště

-12 236,50

VRN4 - Inženýrská činnost

-5 902,06

VRN6 - Územní vlivy

-1 091,34

VRN7 - Provozní vlivy

-1 091,34

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna dle SD 05

Objekt:

105b - Změna č.105b - odpočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 10. 4. 2019


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-20 321,24</b>	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-20 321,24	
D		VRN3	Zařízení staveniště				-12 236,50	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	-2 604,62	-12 236,50	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				-5 902,06	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	-2 604,62	-656,36	sml.rozpočet
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	-2 604,62	-5 245,70	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				-1 091,34	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	-2 604,62	-1 091,34	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				-1 091,34	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	-2 604,62	-1 091,34	sml.rozpočet

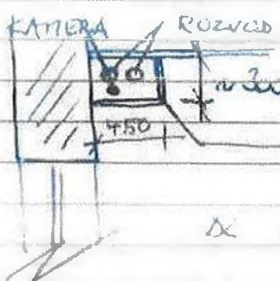Datum	Druh zápisu stavby:
3.2.2019 ZL104	<p>8) ZMĚNA FOKLU PVC - OTRANY PO JIZ' TROVEDENEM          POKROVANI = OPOVA OMI7AY, MALBY = 48,9 mb          PRACNY = 10 hod</p>
	<p>9) AKRYLOVANI RASTRU PODMLCU - 1. NP - 46,6 mb          2. NP - 134,5 mb          3. NP - 445,3 mb</p> <p>9) VYKONANI VEŠNICH ZAKAZU NA SILNICH SLOVITI          FLYBY JEDNOLIVYCH ZAKAZU NA PLOSE MEZI SLOVITI          NA OVI SLOVITI = TRIVARCI, MECHANICE          PRUVANI          PET UPRAVNYCH KLIDU =&gt; 38</p>
16.4.2019 MREDA pol. 1.1	<p>1) KASTLIK ZAKRYTU UT + LABELAT PRO KAMERA V TE          PRI FAYADE DO DVORA - DLE ZAPISU V SD 6 9 4. 2019</p>  <p>POJARNI KASTLIK SDR          DLE 1825 m x Š 450 x V 300</p>
pol. 1.2	<p>2) UPRESNENI OLEN V 1 P' ULICH. FAYADY =&gt; PAKOVANI          KONTAKT = RZ 62 (1000/1000) = 24 ks          NOVĚ = 25 ks - DLE JAKOSTI VEŠNICH ZAKAZU</p>
pol. 1.3	<p>3.) DLE ZAPISU 6P V SD 6 2 9.4.2019 JE PRUVANI          M-BY BYLA TROVEDENA PROFILACE NA PŘECHODU          KAPILNEM SVKLU A ZOVNA VYKON JE PŘEVYKANI          KOLIVYLA OKENEK NA VYKONNĚ PASTI.          KAMERA - VĚŠNÍ FAYADA =&gt; 41,68 mb          ZÁPNÍ FAYADA =&gt; 25,60 mb E 76,28 mb          PRO VÝPĚT RZ 62 PAKOVANI OLEN          = 1 ks = 2,1 mb = 7181,36 : 2,1 = 1.969,70 ks/mb</p>
pol. 1.4	<p>4.) DLE ZAPISU RESTAURACE V SD 6 2 9.4.2019 NEBOJE          TROVEDEN ANTIKRAFITOVY MATERI SVKLU. OPOJET POL. 54.</p>

WWW.OPTIC.CZ

Denní záznamy stavby

4. 7. 2017

pol. 1.5

REVIZNÍ DVÍŘKA POK. DO PROJEKTU V GASTROKUCHY  
M. 2.15 - NYTÍ NADOBÍ.

PRO KUCHY VZT JEDNOTKY UMÍSTĚNE NAD POUHLIEM  
JE NUTNO OJADIT DO ZVÝŠENÉ ČÁSTI POUHLIEM  
ATYPICKÉ REVIZNÍ DVÍŘKA = 2 x 40/1000 mm  
V PROJEKTU GKBI 10,5.

PRO OCHRANU REV. MÍSTA JE NUTNO USTAVIT  
MĚ PRŮVLEČNÉ POUHLIEM UPRAVY KUCHY A KUCHY  
Z. D. 2017

4. 7. 2017

pol. 2

OPRAVA VÝVODU POK. 02 V M. 3.01 VE VÝŠI  
VE 3. NP

NĚKDE JE VĚTŠÍ PĚTICÍ REGISTRACE, VÝVOD  
BYL Z POKLADY, NEJBLÍŽŠÍ KE STĚNĚ



PODLE VÝVODU Z POKLADY

ZABĚHÁNÍ POK. 02 STĚNY PRO VÝVOD ÚT.

PROJEKT 3. NP



VYBUDOVÁNÍ POKLADY

500 / 250 / 200

ÚPRAVA KUCHY V POKLADĚ - PRO VÝVOD ÚT.

PRÁCE: VYBUDOVÁNÍ POKLADY - ÚPRAVA VE STĚNĚ 5. NP

úpravy rozvodu viz ZL02B

OPRAVA VÝVODU ÚT V POKLADĚ

OPRAVA VÝVODU ÚT V POKLADĚ - ÚPRAVA VE STĚNĚ - 4. NP.

RUBRICKA

Prac. 3

SDK podhledu k podlaži (komplexní práce na l. 2.)  
 montáž podhledu SDK, výměna dřev. 1,2 m<sup>2</sup>

- Sříznutí uhořelých nosů 3-4 NP podle dlouh. požárního a sledování u střeš. práce, výtahy




Datum:

16.4.2019 PRÁCE:

- P.ČET PRACOVNÍKŮ 3-TMP, 2-OBKLADAC, 12-FASÁDÁ, 2-TRUHLÁŘ, 1-JT, 5-POČ, 16-ELEKTRO, 2-ZTI, 2-SDK, 4-NSV, 2-HEFASSTUS ZAPOJČNÍK, 1-KAPLOMÍK, 2-OKNA
- PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>
- PASIVNÍ PRÁCE
- MONTÁŽE IZOLACE NA PŮTŘEBI JT - 1.PP
- KOMPLETECE ZTI - USAZOVÁNÍ ZARÍZ PŘEDMĚTŮ 4.NP
- MONTÁŽE ZÁBRADLÍ NA HLAVNÍM SCHODIŠTI - NOVÉHO
- REPASE STAVADICÍHO ZÁBRADLÍ NA HL. SCHODIŠTI - MATEŘY, BROUSEN, REPASE STAVADICÍUH KAPLOMÍTUH STUPŮ - HL. SCHODIŠTE
- ŠTRUKOVÁNÍ, OPRAVA ŘÍMS, VÝZDOB - 1.NP
- ZAZDIVÁNÍ STUPNĚCKY 2.NP - ČHODBA
- REALIZACE POKLADKY PLE - ČHODBA PŘED HL. SCHODIŠTEM
- KOMPLETECE ELEKTRO - USAZ. SVÍTIPEL. - 4.NP, 3.NP - SBOROVNA
- MONTÁŽE SDK PROTIPŮZ. PODHLEDU - TĚLOVÍČNA
- MONTÁŽE SDK PODHLEDŮ V SOC ZARÍZENÍ - 3.NP, 2.NP
- POKLÁDKA DLAŽBY - MEZIPODEŠTĚ MEZI 3.NP A 4.NP - HL. SCHODIŠTI
- REKONSTRUCE FASÁDY
- ÚKLID STAVBY, STAVENIŠTE
- PODROBNÝ A SMĚLÝ PŘESVĚD NITUT
- MONTÁŽEEZS MĚSNETU DO OVKR. A OKEN 1.NP
- MELCHANIZACE EL. KVCMI MARADI



Datum	Detail Manuálu práce
27. 2. 19 POČ. 4	<p>DOPLNĚNÍ PRÁCE NA KOLEM HL. MĚ. 2.14 - 2.15 PO MONTÁŽI OKNÍ DVEŘI 17/20 BYL NA MĚ.P DOPLNĚNÍ BĚLÝM OBKLAD.</p>
	 <p>OBLOŽKA DVEŘI V. OBKLAD. 2000 MM LISNA 2. L. 01. 2007/11</p>
	<p><math>(90 + 160 + 90) \times 2000 = 0,68 \text{ m}^2 / \text{PRÁCE} 4 \text{ HOD}</math></p>
25. 4. 2019 POČ. 5.1	<p>DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OBLOŽKY DVEŘI 10/P VE 3 NP DO MĚ. 3.23. A DŮVODU OVAZENÍ RACU. JE NUTNO ODMONTOVAT NOVÉ OBLOŽKY DVEŘI 10/P (100/2100). KAPRŽERN RACU PRO KAPRŽERNÉ ROZVODY MÁ ROZMĚR 1000 MM, A TUDY NEPROVEDE JIS OVAZENÝMI (PRODRADI), (100/210).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEMONTÁŽ OBLOŽKY = 3 HOD</li> <li>• ZPĚTNÁ MONTÁŽ OBLOŽKY = 4 HOD</li> </ul>
25. 4. 2019 POČ. 5.2 I. 4	<p>• NEJ. VYKONÁNÍ A DOKONČENÍ VE 3 NP (B.A. OVLÁDÁNÍ) DĚLA UNĚVĚNĚ KAPRŽERNĚ CENA 6.000,- Kč • U VNITŘNÍ ZĚ. VCHODNÍE 2. PP DO MĚ. 3.23 ROZKROJENÝ MATOVÝ PRYLACOVÝ TAPET. TĚMTO BUDĚ KAPRŽERNĚ OPRÁVEN. CENA: 4.000,- Kč</p>
5.5	<p>• HLAVNÍ KAPRŽERNĚ VYKONÁNÍ 3. - 4. NP DLE TO. B.A. PRYLACOVANĚ. CENA KAPRŽERNĚ 360 MM PO SPÁHEČENÍ KAPRŽERNĚ NA V. MĚ. BYLO KAPRŽERNĚ VYKONÁNÍ KAPRŽERNĚ V. MĚ. DO 375 MM DO 402 MM Z TOMUTO DŮVODU MĚLO K KAPRŽERNĚ KAPRŽERNĚ <math>0,3, 0,3 \text{ m}^2 \times 4.191,57 (\text{Kč}) = 249864,46 \text{ Kč}</math></p>



26.7.2019  
 POK. 6  
 OPROTI ŽL 74 BYLO NALÉZENO NA VÝKONNÝM MÍSTĚ  
 V 1.PP. ZVÝŠENÍ TL NUCENÉHO VĚTRU V MČ. 1.01  
 V PRŮMĚRU O 5 mm NA CÍLOU ROZSAH 10 x 8,5 m<sup>2</sup>  
 DÁLE BUDE KONTROLA VŘÍTKA O 5 mm V PRŮMĚRU  
 MEZI CHLOBOU 1.01 A VĚTÍ MĚTANOSTMI = 9 m<sup>2</sup>  
 Z KTORÝCH VÝŠKA JE ROZSAH KONTROLA PRŮMĚRU  
 V R. 15 mm



26.4.2019  
 POK. 7  
 PRO KONIZÉ ZEMINŮ VĚTÍ V VÝKONNÝM MÍSTĚ  
 BYLO PROVĚDENO ROZEBRÁNÍ PĚŠE - 4 PŮZICE  
 DO 4 m<sup>2</sup> ŽL 489,0 m<sup>2</sup> = 16,0 m<sup>2</sup>  
 - VÝŠKA ZEMINŮ 4 PŮZICE DO 4 m<sup>2</sup>, V = 0,3 m,  
 DĚLKA 9 x 9,0 m, 0,3 m = 4,8 m<sup>3</sup>  
 - ZPĚTNÉ ZÁSYTÍ JE ZHROUČENÍM POD PĚŠE 4,8 m<sup>3</sup>  
 - PŮZICE PĚŠE OČISTIVA 16 m<sup>2</sup>

BALIK



29.4.2019  
 POK. 8  
 V MČ. 3.23A (VSTĚ. ROZKLASV)  
 PROVEDENÍ SOK PROTIPŮZÁRNÍ PODLE (SAIŠEN)  
 S OPLOUVANÍM EI 30 - 2 DESKY KVAPE 4x4 42,5 mm (BILIA)  
 PŮVODNĚ V PD NAVRZEN NEROPÁRNÍ PODLE  
 (SNÍŽENÝ) S DESKY KVAPE 4x4 42,5 mm (BILIA).  
 POUŽITÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ S PŮVODNÍ  
 VĚTÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ  
 A PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ

BALIK



29.4.2019  
 POK. 9  
 V PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ  
 A PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ  
 PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ  
 PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ PŮVODNÍ



Datum	Denní záznamy stavby										
30.4.2019	OPROBA VE VĚTRÁKU VĚTRÁK.										
POL.10	POL. 266 K YBCELY 21L VNITŘNÍ DVĚŘE 1 ks V TABULKÁCH 1 VE JEDNĚČNOSTI JSOU DVĚŘE 2 ks.										
30.4.2019	PO PŘEPROVENÍ ROZVODU ÚT V PROSTORU TĚLOCVIČNÝ										
POL.11	DOŠLO K UVOLNĚNÍ KONTROLY PRO KRAHY JDE ZAPÍSKA GP V SD LE DNE 30.4.2019 BUDOU PROVEDENY NÁSLEDUJÍCÍ PRÁCE - VYKŘÁNÍ VYTŘEVENÉ KONTROLY PRO KRAHY - VYKŘÁNÍ PŘÍROČNĚ POTRUBÍ ÚT K SŘEVDNĚNÍHO OBLEADOU - V 3,07 x 0,18 x HL 0,15 METRŮ - DODÁVKA OBŽEMŮ PO POTRUBÍ ÚT - ZAKRÝTÍ OMIER U BAFERŮ ÚT  PRÁCEVNOST = 10 HOD										
2.5.2019	DO DVĚŘNÍHO KOTOLA č.13/P MEZI HL 209-211										
POL.12	BUDĚ JAKOŽEŽNĚ VÁŽENA PŘIVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA J 600 x V 90 MM. VIZ KAPIT GP VSD 2.5.2019										
3.5.2019	DOPLENĚNÍ REVIZNÍCH DVĚŘEK.										
POL.13	<table border="0"> <tr> <td>RD 1200/400 - VSD PŘÍTEK KROU HL 1.13</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>RD 1200/400 - VSD PŘÍTEK HL 2.15</td> <td>2x</td> </tr> <tr> <td>RD 400/400 ET 4T PŘÍTEK HL 3.02</td> <td>1x</td> </tr> <tr> <td>RD 400/400 (PUM) PŘÍTEK HL 7.06</td> <td>2x</td> </tr> <tr> <td>RD 200/200 (PUM) PŘÍTEK HL 3.28</td> <td>1x</td> </tr> </table>	RD 1200/400 - VSD PŘÍTEK KROU HL 1.13	1x	RD 1200/400 - VSD PŘÍTEK HL 2.15	2x	RD 400/400 ET 4T PŘÍTEK HL 3.02	1x	RD 400/400 (PUM) PŘÍTEK HL 7.06	2x	RD 200/200 (PUM) PŘÍTEK HL 3.28	1x
RD 1200/400 - VSD PŘÍTEK KROU HL 1.13	1x										
RD 1200/400 - VSD PŘÍTEK HL 2.15	2x										
RD 400/400 ET 4T PŘÍTEK HL 3.02	1x										
RD 400/400 (PUM) PŘÍTEK HL 7.06	2x										
RD 200/200 (PUM) PŘÍTEK HL 3.28	1x										
	JEDNÁ VB O DODÁVKU A MONTÁŽ.										
3.5.2019	PRO VYBAVENÍ VEŘBY PRO PŘELENÍ DOBY PORUČKY										
POL.14	ZAKLADNÍ OBTEDMATOU 1 4 POALOVNÍČI - ZIENOVÁNÍ LADIC, P. DLI, WABYTRU - 3 HODINY CELEK 4 POALOVNÍČI x 3 HODINY = 12 HODIN  BALIK										

LISTA 2544988

Datum

Definiční slovy

3.5.219 V 1 PP BILY DEKONTAMINÁNY A OČIŠŤOVANÉ (PO POUŽITÍ  
POČ. 1F NOVÝCH OMIŤEK) OVAZENY ŽE SÚ HYGIENICKE A TECHN  
STANOVICH HYGIENY BUDDI TRÓVEDZ A REVIZE.  
STANOVICH HYGIENY BUDDI NOVÉ NÁTIENY ČERVENOU  
BARVOU.
