

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 136-PVO/2011,  
ISPROFIN: 500 372 0001, uzavřené dne 22.06.2012

na vypracování projektu a zhotovení stavby:

### „ ETCS – I. Koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“

mezi smluvními stranami:

#### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GRŘ pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

**Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností** (adresa pro doručování smluvní  
korespondence a daňových dokladů):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

a

#### 1.2. Zhotovitel:

**AŽD Praha s.r.o.**  
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17  
IČ: 48029483, DIČ: CZ48029483  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616  
zastoupena: **Ing. Zdeňkem Chrdlem**, jednatelem společnosti

a

**SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088  
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva  
**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Petrem Lapáčkem**, místopředseda představenstva

a

**STARMON s.r.o.**  
se sídlem Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01  
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751  
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 4338  
zastoupena: **Ing. Janem Šichanem**, jednatelem

a

**SIGNALBAU a.s.**

se sídlem Přerov III – Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 750 02

IČ: 25840819

DIC: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2166

zastoupena: **Miroslavem Jurmanem**, předsedou představenstva

účastníci sdružení „České technologie pro ETCS“ (dále jen Sdružení)

založeného dne 21.11. 2011 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení, společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, který je zmocněn na základě citované smlouvy o sdružení a „Plných mocí“ ze dne 21.11. 2011, plnit závazky a dostávat pokyny za a v zastoupení účastníků sdružení, uzavřít smlouvu o dílo a ji plnit včetně plateb.

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku jsou následující důvody:

1. Na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013, byl určen Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, k podpisu smluv, jež jsou výsledkem zadávacích řízení a jejich dodatků. Přílohou č. 7 Smlouvy (současně příloha č. 2 dodatku č. 1) je kopie „Pověření“ p. Ing. Mojmíra Nejezchleba
2. Změna kontaktní osoby na straně objednatele – výměna kontaktního zaměstnance ve věcech smluvních účinná k datu 01.08.2013. Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních byl jmenován pan [REDAKCE]. Dále byl doplněn koordinátor BOZP, kterým se stala společnost 4FIT CONSULTING, s.r.o., výkon činnosti koordinátora BOZP bude zajištěna [REDAKCE] a panem [REDAKCE]. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a bodem č. 1 PREAMBULE se upravuje čl. 1, odst. 1.1. Smlouvy.
3. Změna termínu ukončení díla. Důvodem změny ukončení díla je skutečnost, že v průběhu letošního roku došlo k dokončení přípravy a k urychlení zahájení realizace staveb v jednotlivých traťových úsecích a dotčených železničních stanicích souvisejících se stavbou „Výstavba ERMTS/ETCS L2 v úseku Břeclav státní hranice – Kolín“. Tento postup umožňuje eliminaci přechodných a provizorních stavů a realizaci již definitivních technických řešení. Předpokladem pro využití této možnosti je vzájemná koordinace pracovních postupů této stavby s pracovními postupy nově zahajovaných staveb. Využití této situace vyžaduje úpravy v harmonogramu stavby tak, aby bylo možno navázat jednotlivé pracovní činnosti a nedocházelo k provizorním, dočasným technickým řešením. Nově navržený harmonogram prací již výše uvedené návaznosti respektuje a je zpracován v souladu se závěry předchozích jednání. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram prací.
4. Zajištění ručení za DPH. Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje od 01.01.2013 oblast ručení pro objednatele za nezaplacenou daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která se týká plátců DPH. V souvislosti s touto skutečností se do článku 5 Smlouvy doplňuje nový odstavec 5.3.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9 odst. 9.2. Smlouvy na úpravě Smlouvy č. objednatele: S-0099/2012/PH, č. zhotovitele: 136-PVO/2011 takto:

1) **Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY**

- zrušuje se stávající text v odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 1.1. **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**,  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

**Kontaktní zaměstnanci :** (funkce, oprávnění, e-mail, telefon)

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]
- d) hlavní inženýr stavby, technický dozor objednatele: [REDAKCE] 9
- e) koordinátor BOZP: 4FIT CONSULTING, s.r.o, Oravská 1891/11, Praha 10, PSČ 100 00,  
koordinátoři BOZP: [REDAKCE]

**Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností** (adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

2) **Čl. 4. DOBA PLNĚNÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit provádění stavebních a montážních prací včetně zprovoznění systému tak, aby mohl být vydán ve lhůtě pro dokončení tj. do **31.03.2016** Protokol o převzetí prací pro celé dílo.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli současně při vydání Protokolu o převzetí prací pro celé dílo:

- souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,
- vyhotovení nezbytných geometrických plánů,
- knihu plánů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení.

3) **Čl. 5. CENA DÍLA**

- do článku 5 Smlouvy se doplňuje nový odstavec 5.3. v tomto znění:

- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 4) Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram prací, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí. V upraveném a aktualizovaném harmonogramu prací jsou uvedeny termíny rozhodujících činností v členění po jednotlivých provozních souborech. Harmonogram prací – nové znění k datu podpisu dodatku č. 1 nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 5 Smlouvy.

5) **Čl. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 9.4. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 9.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1:** Dopis nabídky ze dne 22.11.2011  
**příloha č. 2:** Dopis o přijetí nabídky ze dne 31.05.2012  
**příloha č. 3:** Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky  
Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky  
**příloha č. 4:** Technické podmínky - Technické specifikace  
Technické podmínky - Technické vymezení nabídky  
Technické podmínky - Obecné Technické podmínky  
**příloha č. 5:** Harmonogram prací – nové znění k datu podpisu dodatku č. 1  
**příloha č. 6:** Plné moci ze dne 21.11.2011  
**příloha č. 7:** Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 Ing. Mojmíra Nejezchleba - kopie

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a čtyři (4) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: S-0099/2012/PH, č. sml. zhotovitele: 136-PVO/2011 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram prací – nové znění k datu podpisu dodatku č. 1  
Příloha č. 2 (příloha č. 7 Smlouvy): Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 Ing. Mojmíra Nejezchleba - kopie


V Praze dne 29 -10- 2014

V Praze dne 23 -10- 2014

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Číslo	Název stavu	Číslo výkresu	Podpis	Stavba	Číslo výkresu	Podpis	Stavba	Číslo výkresu	Podpis	Stavba
1	Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Blatná ač/maršálek - Kolín	1308.dwg	2.7.13	2.7.13	2.7.13					
2	Základní stavby	1.001	2.7.13	2.7.13	2.7.13					
3	Zpracování ŽSŽ / svazky	790.dwg	2.7.13	2.7.13	2.7.13					
4	Laboratorní postavení funkce systému	404.dwg	10.1.14	10.1.14	10.1.14					
5	Nákladní listy na studijním stavu	309.dwg	7.2.14	10.1.14	10.1.14					
6	Modulacei bezpečnosti pro railový provoz	1708.dwg	1.1.13	10.1.14	10.1.14					
7	Železná trať	1308.dwg	6.2.13	10.1.14	10.1.14					
8	Stavbní plán stavby	791.dwg	21.7.14	10.1.14	10.1.14					
9	Realizace novostavby železniční tratě "BVC Praha - Blatná" v úseku Blatná ač/maršálek - Kolín	564.dwg	21.7.14	20.8.13	20.8.13					
10	Dozorčí stavby "Průhled na úseku Ústí n.L. - Kolín" (část 88) v soustavě ač/maršálek - Kolín	5.dwg	30.11.14	30.11.14	30.11.14					
11	Dozorčí stavby "Ústí n.L. - Kolín" (část 88) v soustavě ač/maršálek - Kolín	0.dwg	30.11.14	30.11.14	30.11.14					
12	Realizace novostavby železniční tratě "Ústí n.L. - Kolín" (část 88) v soustavě ač/maršálek - Kolín	465.dwg	3.3.14	20.8.13	20.8.13					
13	Dozorčí stavby "Ústí n.L. - Kolín" (část 88) v soustavě ač/maršálek - Kolín	0.dwg	31.10.14	31.10.14	31.10.14					
14	Rekonstrukce stavby 00.000 vst. křižovatky (000) v soustavě ač/maršálek - Kolín	0.dwg	30.11.13	30.11.13	30.11.13					
15	Projektování RBC (bezpečnosti) na železniční stanici Ústí n.L.	1.001	1.1.13	1.1.13	1.1.13					
16	Základní projekt stavby a zpracování výkresů (podklady pro stavbu) a AWM RBC	1371.dwg	9.7.13	10.1.14	10.1.14					
17	PS 01-01-101 Lantko-Blatná, balby ETCS	140.dwg	1.10.14	21.8.13	21.8.13					
18	PS 01-01-101 Lantko-Blatná, balby ETCS	31.dwg	1.10.13	21.8.13	21.8.13					
19	PS 01-02-101 Blatná-Ústí, balby ETCS	465.dwg	8.10.13	21.7.14	21.7.14					
20	PS 01-02-101 Blatná-Ústí, balby ETCS	250.dwg	3.3.13	24.8.13	24.8.13					
21	PS 01-05-101 Česká Třebová, balby ETCS	60.dwg	21.09.14	28.1.13	28.1.13					
22	PS 01-05-101 Česká Třebová, balby ETCS	90.dwg	1.10.14	18.1.13	18.1.13					
23	PS 01-06-101 Česká Třebová-Ústí, balby ETCS	309.dwg	9.7.13	10.1.14	10.1.14					
24	PS 01-07-101 Písečná, balby ETCS	80.dwg	2.1.14	30.1.14	30.1.14					
25	PS 01-08-101 Písečná-Kolín, balby ETCS	378.dwg	6.1.12	12.8.13	12.8.13					
26	PS 01-09-101 Kolín, balby ETCS	287.dwg	6.1.13	20.4.13	20.4.13					
27	Dozorčí projekce jednotlivých PS	1317.dwg	1.8.13	21.12.13	21.12.13					
28	PS 01-01-101 Lantko-Blatná, balby ETCS	80.dwg	1.2.13	20.8.13	20.8.13					
29	PS 01-01-101 Lantko-Blatná, balby ETCS	17.dwg	13.12.13	21.12.13	21.12.13					
30	PS 01-02-101 Blatná-Ústí, balby ETCS	66.dwg	1.8.14	20.12.14	20.12.14					
31	PS 01-04-101 Brno-Česká Třebová, balby ETCS	265.dwg	25.8.13	10.1.14	10.1.14					

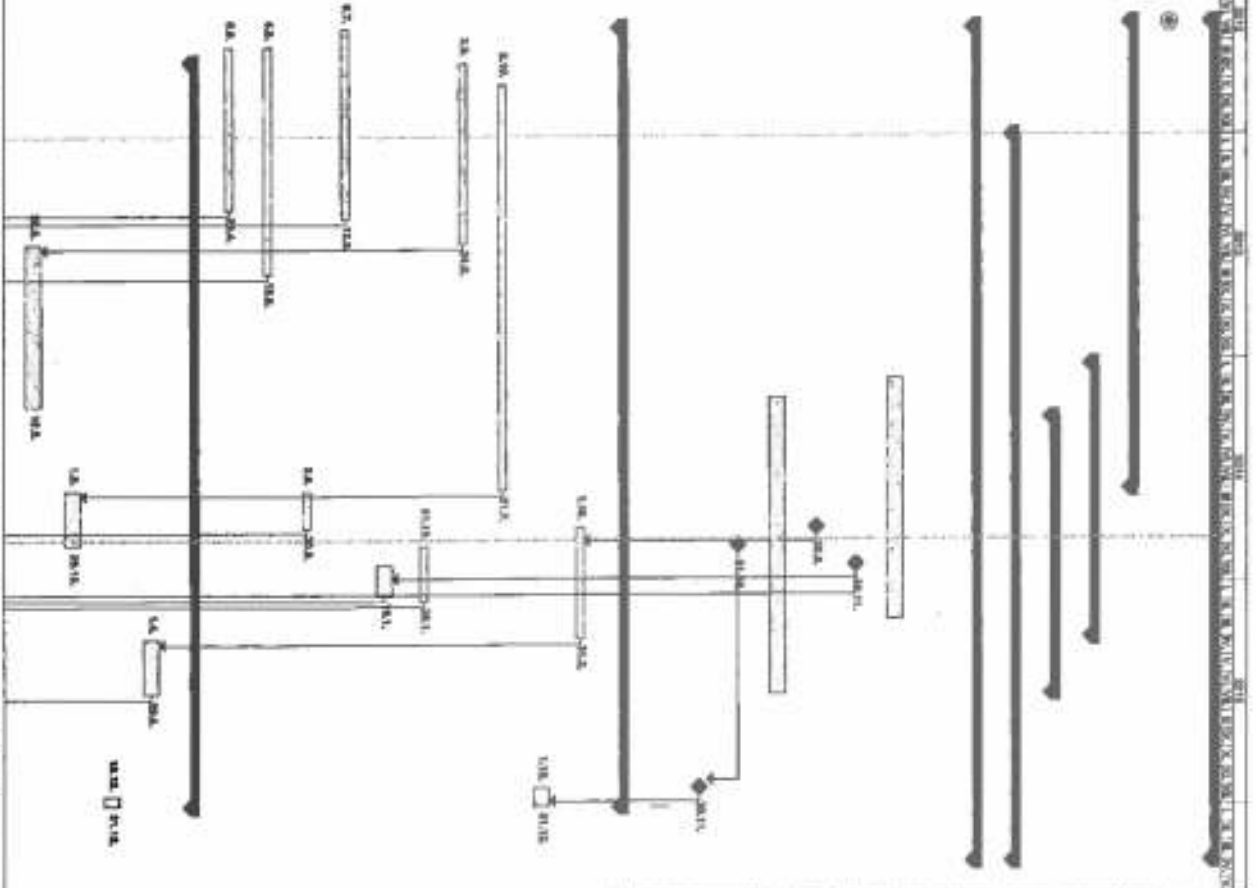

zhotovitel: AŽD Praha s.r.o. MZ Kolín

č.	Název úseku	Průřez	Objem	Termín	Ukončení
1	PS 01-05-101 Česká Třebová, sálky ETCS	30 dny	28.3.13	28.3.13	
2	PS 01-05-101 Česká Třebová, sálky ETCS - 2. úst. n.o.	30 dny	28.3.13	28.3.13	
3	PS 01-05-101 Česká Třebová - Pardubice, sálky ETCS	270 dny	14.3.13	13.3.14	
4	PS 01-07-101 Pardubice, sálky ETCS	30 dny	1.8.14	28.12.14	
5	PS 01-08-101 Pardubice-Kolín, sálky ETCS	322 dny	13.3.13	30.3.14	
6	PS 01-08-101 Kolín, sálky ETCS	306 dny	30.3.13	30.3.14	
7	PS 01-08-102 Brno - Česká Třebová, úpravy SZZ pro ETCS	242 dny	1.3.13	30.3.14	
8	PS 01-08-102 Brno - Česká Třebová, úpravy SZZ pro ETCS	191 dny	1.2.13	27.7.13	
9	PS 01-04-102 Brno - Česká Třebová, úpravy SZZ a TZZ pro ETCS	274 dny	30.11.12	30.3.13	
10	PS 01-04-103 Brno - Mělník - Svitavy, úprava TZZ	244 dny	1.3.13	30.10.13	
11	PS 01-04-104 Svitavy - sob. železnice, úprava TZZ	119 dny	1.2.14	30.3.14	
12	PS 01-05-102 Česká Třebová, úpravy SZZ pro ETCS	60 dny	2.4.14	30.3.14	
13	PS 01-05-102 Česká Třebová, úpravy SZZ pro ETCS - 2. úst. n.o.	30 dny	2.3.13	30.11.13	
14	PS 01-05-102 Česká Třebová - Pardubice, úpravy SZZ pro ETCS	364 dny	1.11.12	30.10.13	
15	PS 01-07-102 Pardubice, úpravy SZZ pro ETCS	98 dny	1.1.13	3.4.13	
16	PS 01-08-102 Pardubice-Kolín, úpravy SZZ pro ETCS	304 dny	1.3.12	31.7.13	
17	PS 01-08-102 Kolín, úpravy SZZ pro ETCS	30 dny	30.12.12	28.3.13	
18	PS 01-01-101 Lánšhůvek, RBC	180 dny	4.4.13	30.3.13	
19	PS 01-02-101 Blatná - Brno, RBC	304 dny	1.12.12	30.3.13	
20	PS 01-04-101 Brno - Česká Třebová, RBC	304 dny	1.12.12	30.3.13	
21	PS 01-05-101 Česká Třebová, RBC	304 dny	1.12.12	30.3.13	
22	PS 01-05-101 Česká Třebová, RBC - 2. úst. n.o.	304 dny	1.12.12	30.3.13	
23	PS 01-05-101 Pardubice, RBC	304 dny	1.12.12	30.3.13	
24	PS 01-08-101 Kolín, RBC	304 dny	1.12.12	30.3.13	
25	PS 01-08-102 Dvůr Královský od železniční zastávky Kolín	304 dny	1.12.12	30.3.13	
26	PS 01-08-103 Mladějov RBC nad Blatnou-Kolín	304 dny	1.12.12	30.3.13	
27	PS 01-08-104 Blatná od železniční zastávky ETCS L2	517 dny	1.3.13	30.7.14	
28	PS 01-08-201 Blatná-Kolín - úprava sítě odpočet kabelů	264 dny	23.3.13	22.3.13	
29	PS 01-08-202 Blatná-Kolín - úprava sítě odpočet kabelů	304 dny	17.3.13	13.3.14	

PS 01-08-101 Kolín, RBC  
 PS 01-08-102 Dvůr Královský od železniční zastávky Kolín  
 PS 01-08-103 Mladějov RBC nad Blatnou-Kolín  
 PS 01-08-104 Blatná od železniční zastávky ETCS L2

PS 01-05-101 Česká Třebová, sálky ETCS  
 PS 01-05-101 Česká Třebová, sálky ETCS - 2. úst. n.o.  
 PS 01-05-101 Česká Třebová - Pardubice, sálky ETCS  
 PS 01-07-101 Pardubice, sálky ETCS  
 PS 01-08-101 Pardubice-Kolín, sálky ETCS  
 PS 01-08-101 Kolín, sálky ETCS  
 PS 01-08-102 Brno - Česká Třebová, úpravy SZZ pro ETCS  
 PS 01-08-102 Brno - Česká Třebová, úpravy SZZ pro ETCS  
 PS 01-04-102 Brno - Mělník - Svitavy, úprava TZZ  
 PS 01-04-104 Svitavy - sob. železnice, úprava TZZ  
 PS 01-05-102 Česká Třebová, úpravy SZZ pro ETCS  
 PS 01-05-102 Česká Třebová, úpravy SZZ pro ETCS - 2. úst. n.o.  
 PS 01-07-102 Pardubice, úpravy SZZ pro ETCS  
 PS 01-08-102 Pardubice-Kolín, úpravy SZZ pro ETCS  
 PS 01-08-102 Kolín, úpravy SZZ pro ETCS  
 PS 01-01-101 Lánšhůvek, RBC  
 PS 01-02-101 Blatná - Brno, RBC  
 PS 01-04-101 Brno - Česká Třebová, RBC  
 PS 01-05-101 Česká Třebová, RBC  
 PS 01-05-101 Česká Třebová, RBC - 2. úst. n.o.  
 PS 01-05-101 Pardubice, RBC  
 PS 01-08-101 Kolín, RBC  
 PS 01-08-102 Dvůr Královský od železniční zastávky Kolín  
 PS 01-08-103 Mladějov RBC nad Blatnou-Kolín  
 PS 01-08-104 Blatná od železniční zastávky ETCS L2

PS 01-08-201 Blatná-Kolín - úprava sítě odpočet kabelů  
 PS 01-08-202 Blatná-Kolín - úprava sítě odpočet kabelů

Projekt ETCS, Blatná, Kolín, Brno  
 Verze 0107 z 20.10.2014

Konečný termín:





zhotovitel: A&D Praha s.r.o. MZ Kolín

číslo	úroveň	úroveň	úroveň	úroveň	úroveň
140	141	142	143	144	145
140	BRNOVCE - JI	26.10.13	26.10.13	26.10.13	
141	PS 01-03-101 Brno-Ceska Třebívka, NBO	26.11.13	26.11.13	26.11.13	
142	PS 01-04-101 Brno-Ceska Třebívka, NBO	26.11.13	26.11.13	26.11.13	
143	PS 01-05-101 Česka Třebívka, NBO	26.11.13	26.11.13	26.11.13	
144	PS 01-06-101 Česka Třebívka-Peráček, NBO	26.11.13	26.11.13	26.11.13	
145	PS 01-07-101 Peráček, NBO	26.11.13	26.11.13	26.11.13	
146	PS 01-08-101 Peráček-Kolín, NBO	26.11.13	26.11.13	26.11.13	
147	PS 01-09-101 Kolín, NBO	26.11.13	26.11.13	26.11.13	
148	<b>Čistič</b>	26.11.13	26.11.13	26.11.13	
149	PS 01-10-101 Napájecí NBO pro Brno-Kolín	26.11.13	26.11.13	26.11.13	
150	PS 01-11-101 Dopravní 26.11.13	26.11.13	26.11.13	26.11.13	
151	PS 01-12-101 Zkušební měřicí ETCS L3	1.8.14	1.8.14	1.8.14	
152	<b>sdělovací zařízení</b>	8.10.13	8.10.13	8.10.13	
153	PS 01-13-101 Brno-Kolín - sprava a údržba všech spravních kabeľů	8.10.13	8.10.13	8.10.13	
154	PS 01-14-101 Brno-Kolín - sprava a údržba všech přenosových čepů v rámci ETCS	17.8.14	17.8.14	17.8.14	
155	PS 01-15-101 Brno-Kolín - sprava a údržba číselní přenosové čepů pro ETCS	17.7.14	17.7.14	17.7.14	
156	PS 01-16-101 Brno-Kolín - výhledová síť ETCS v CGP Pákov	31.10.13	31.10.13	31.10.13	
157	výhled obklopených s udržením samostatně	1.8.14	1.8.14	1.8.14	
158	<b>Průhled a přenos pro celou dráhu</b>	31.3.13	31.3.13	31.3.13	





Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

## POVĚŘENÍ č. 1616

Pověřuji

**Ing. Mojmíra Nejezchleba**

██████████, zaměstnanec Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), ve funkci náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy, aby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s platnými předpisy vnitropodnikové legislativy za SŽDC podepisoval veškeré dokumenty v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek zadávaných v rámci úseku modernizace dráhy, a to zakázek zadávaných v režimu i mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně podpisu smluv, jež jsou výsledkem zadávacích řízení a jejich dodatků.

Oprávnění k podpisu dle tohoto pověření tedy zahrnuje zejména:

- veškeré dokumenty související se zahájením zadávacího řízení jako jsou oznámení o zakázce, opravné oznámení o zakázce, výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, výzva k jednání apod.,
- odpovědi na dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám, dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám včetně případů, kdy dochází ke změně zadávacích podmínek uveřejňovaných formou opravného oznámení,
- jmenování hodnotící komise či jiné komise pro otevírání obálek nebo posouzení kvalifikace,
- rozhodnutí o vyloučení uchazeče,
- schválení zprávy hodnotící komise,
- rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
- oznámení o zadání zakázky a písemná zpráva o veřejné zakázce,
- rozhodnutí zadavatele o vypořádání námitek, včetně oznámení o podaných námitkách a jejich vypořádání zadavatelem,
- rozhodnutí o zrušení jakéhokoli úkonu zadavatele či zadávacího řízení včetně oznámení o zrušení,
- vyjádření, rozklad či jiné návrhy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
- vyjádření a jiné návrhy ve správním soudnictví ve věci veřejných zakázek,
- jakékoliv ostatní oznámení informativní povahy v průběhu zadávacího řízení, např. oznámení o běhu zadávací lhůty, oznámení o podání návrhu uchazeče na přezkum úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a oznámení o vydání usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže apod.,
- podpis smlouvy, jež je výsledkem zadávacího řízení, jejich změn a dodatků a jiných případných úkonů ve věcech smluvních.

Pověření je uděleno po dobu výkonu funkce náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy.

Pověřený zaměstnanec je oprávněn udělit pověření jiné osobě, aby místo něho za SŽDC jednala v rozsahu shora uděleného pověření.

V Praze dne: 12 -07- 2013

.....  
 Ing. Jiří Kolář, Ph.D.  
 generální ředitel
