



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. HSAА-5982-11/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Dodatek“)




Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČ: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským – ředitelem Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy
Kontaktní osoba: plk. Ing. Zdeněk Borovička
E-mail: 
Telefon: 
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHITEKTURA, s.r.o.

Sídlo: Vikova 1142/15, Praha 4 - Krč, 140 00
IČ: 26505525
DIČ: CZ - 26505525
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3258172399/0800
Datová schránka: 5rsm47n
Jejíž jménem jedná: 
E-mail: 
Telefon: 

zapsaná v rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86423
(dále jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek upravuje Smlouvu o dílo č. HSAА-5982-11/2018, která byla uzavřena dne 17. 7. 2018 mezi objednatel a zhotovitelem ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2019 (dále jen „smlouva“).

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel uzavřel dne 17. 7. 2018 se zhotovitelem Smlouvu o dílo č.j. HSAА-5982-11/2018 (dále jen „smlouva“), kdy předmětem díla bylo zhotovení úpravy projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro budoucí stavbu hasičské stanice (dále jen „dílo“) v rozsahu a podle pokynů objednatele.

2. Zhotovitel dle požadavků a dodaných podkladů zpracoval projektovou dokumentaci pro územní řízení DUR, a dne 12. 3. 2019 zahájil inženýrskou činnost k získání Rozhodnutí o umístění stavby podáním žádosti o vydání stanoviska k územnímu řízení na dotčené orgány státní správy DOSS a správce sítí SS.
3. Ke dni podání žádosti o vydání Rozhodnutí o umístění stavby dne 10. 6. 2019 byla získána veškerá stanoviska DOSS kromě Odboru územního rozhodování MHMP. Žádost o stanovisko bylo Odboru územního rozhodování MHMP podána dne 12. 3. 2019. I přes opakovanou urgenci ze strany zhotovitele, nedošlo k vydání požadovaného stanoviska. Nečinností Odboru územního rozhodování MHMP bylo k datu konání ústního jednání k územnímu řízení dne 13. 8. 2019 způsobeno podstatné zdržení územního řízení, což zhotovitel, přestože řádně postupoval v příslušném řízení v souladu se Smlouvou a pokyny objednatele, nemohl ovlivnit. K datu 31. 7. 2019 tak došlo k prodlevě 20 týdnů pro získání ÚR. Na základě výše uvedených skutečností zhotovitel požádal dne 31. 7. 2019 o prodloužení termínu plnění z důvodu nečinnosti dotčených správních orgánů.
4. Další podstatnou skutečností, mající vliv na termín plnění, je požadavek ze strany objednatele ze dne 30. 5. 2019 na úpravu projektové dokumentace spočívající ve snížení objemu budovy o jedno podlaží. Na základě této skutečnosti došlo k prodlevě v rozsahu dvou týdnů.
5. Výše uvedené průtahy ze strany správních orgánů stále pokračují. V době uzavření tohoto dodatku je zdržení vyčísleno na 20 týdnů s tím, že předpokládaná doba prodlení není, s ohledem na uvedené skutečnosti, konečná. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že smluvně dohodnutý termín odevzdání díla nelze dodržet a bude tak tímto dodatkem, na základě vzájemné dohody smluvních stran, lhůta pro odevzdání díla posunuta o 12 týdnů. V případě vzniku potřeby dalšího prodloužení bude na základě písemného žádosti ze strany zhotovitele zahájeno jednání o dalším prodloužení lhůty pro odevzdání díla dle podmínky smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 6 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro dodání díla o dvanáct (12) týdnů.
2. Smlouva se mění následovně:

Článek IV., odst. 1. písm. b) se mění a bude nově znít takto:

„ETAPA II. bude protokolárně předána do padesátišesti (56) týdnů od protokolárního předání I. ETAPY, tedy do 11. 11. 2019.“

Článek IV. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"). Tento Dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

Za zhotovitele:

V Praze dne: 19-08-2019

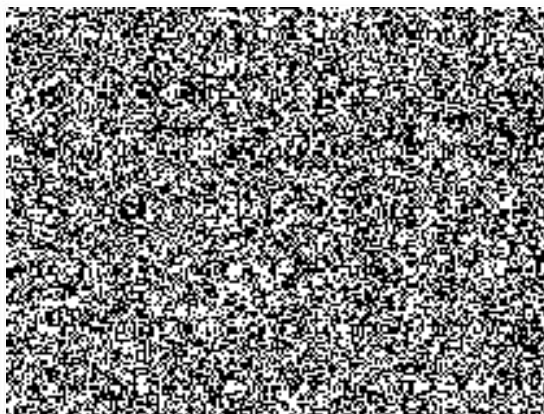

Za objednatele:

V Praze dne: 19-08-2019

