

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 1	
Zhotovitel:	ALSPO		
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum: 10. 7. 2019	
Název akce:			
<b>„ Modernizace učeben ZŠ Valašské Klobouky“</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny:</b> Výměna stávajících zásuvek NN a rozvodů.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po obnazení rozvodů silnoproudu a zjištění polohy vodičů bylo rozhodnuto o jejich výměně vzhledem ke stavu a stáří. Taktéž se nahrazuje materiál vodičů (původně Al, nyní Cu).</p> <p>Cena víceprací bez DPH: 56.814 Kč Cena méněprací bez DPH: 6.378,6</p> <p><b>Výsledná cena změny: 50.435,4 bez DPH</b></p> <p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá dopad na celkový termín díla</p> <p>Počet připojených listů specifikací: rozpočet VCP</p> <p>Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Oznámení vydává: TDS: IS Projekt s.r.o.</p> <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby: Nárok na provedení úprav elektroinstalace vyvstal po obnazení a zjištění stavu stávajících rozvodů v rekonstruovaných učebnách. Bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci instalací v místnostech, proto se doplňuje rozsah prací i pro stávající obvody.</b></p> <p><b>Stanovisko projektanta stavby: Na zjištěný nárok se přišlo po obnazení sítě a zjištění jejich polohy. Během přípravy projektu nebylo možné ze stávající dokumentace tohle zjistit předem.</b></p> <p>Souhlasím s provedenou změnou.</p> <p><b>Stanovisko investora</b></p> <p>Souhlasím s provedenou změnou.</p> <p>Příloha: Položkový rozpočet</p>			

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 2

Zhotovitel: ALSPO

Investor: Město Valašské Klobouky

Datum: 12. 8. 2019

Název akce:

**„ Modernizace učeben ZŠ Valašské Klobouky“**Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet

**Předmět změny:** 1. Doplnění osvětlení pracovních ploch pod skříňkami na stěnách  
2. Vyrovnání větší tloušťky podlah před pokládkou PVC

**Popis a zdůvodnění změny:**

1. Při zpracování výrobní dokumentace nábytku upozorňoval jeho dodavatel na nižší intenzitu osvětlení pracovních ploch, neboť část světla pohlcují skříňky nad plochami a žáci sedí ve směru osvětlení místnosti na pracovní plochu. Proto bylo rozhodnuto o doplnění ledpásků nad pracovní plochu do vyfrézovaných drážek skříněk.  
2. Po demontáži stávajících PVC se zjistilo, poškození podkladní vrstvy podlahy do větší hloubky (5mm) než předpokládal projekt (2,4mm). Bude nutno vylévat větší množství samonivelační stěrky a změna zahrnuje zvýšené množství materiálu.

1.

Cena víceprací bez DPH: 24.208 Kč

Cena méně prací bez DPH: 0 Kč

2.

Cena víceprací bez DPH: 108.890

Cena méně prací bez DPH: 0 Kč

**Výsledná cena změny bez DPH: 133.098 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá dopad na celkový termín díla

Počet připojených listů specifikací: rozpočet  
VCP

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  | chyba v PD  | chyba zhotovitele  | vyšší moc  | jiné okolnosti 

Oznámení vydává: TDS: IS Projekt s.r.o.

**Stanovisko technického dozoru stavby:** 1. Nárok na provedení úprav osvětlení vychází ze zkušeností provozu školy a následných požadavků na hygienické osvětlení pracoviště.

2. Zjištěná skutečnost stavu podlah byla patrná až po demontáži stávající krytiny, očištění nesoudržných vrstev podlahy.

**Stanovisko projektanta stavby:** 1. Požadavek na osvětlení pracoviště vychází ze zkušeností provozu školy a následných hygienických kontrol.

**2. Stav podlahy po demontáži PVC nelze předpokládat, teprve po demontáži lze vyhodnotit jednotlivé technologické kroky opravy.**

Souhlasím s provedenou změnou.

**Stanovisko investora**

Souhlasím s provedenou změnou.

Příloha: Položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 4		
Zhotovitel:	ALSPO			
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum: 16. 8. 2019		
Název akce:				
<b>„ Modernizace učeben ZŠ Valašské Klobouky“</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
<p><b>Předmět změny:</b> 1. Změna umístění jednotky vzduchotechniky vedle učebny chemie v obj. A</p> <p>2. Změna trasy přeložky kanalizace kolem výtahové šachty v obj. A.</p> <p>3. Zrušení SDK podhledu v m.č. 48 v obj. D.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>1. Vzduchotechnika: při vypracování výrobní dokumentace vznikl problém dopravy a montáže VZT jednotky do půdního prostoru vzhledem k rozměrům výlezu na střechu (venkovní montáže) a výlezu na půdu (přeprava z 3. NP.). Jednotka se přemístí do m.č. 118 c a na střechu se vyvedou trouby od přívodu vzduchu a výfuku.</p> <p>2. Přeložka kanalizace: V obj. A se plánovala přeložka kanalizace, která byla ve střetu se šachtou věže výtahu. O jejím obnažení se objevila 2 potrubí, které se odkloní kolem výtahové šachty zpět na stávající potrubí. Vše se bude řešit v m. č. 01a v prostoru pod schodištěm.</p> <p>3. Zrušení SDK podhledu: v m.č. 048, v obj. D se navrhuje SDK podhled z důvodu příznávaných spár mezi panely stropu. Vzhledem k tomu, že stejná situace je ve všech místnostech, tak se zde podhled vypouští.</p>				
<b>1.</b>				
Cena víceprací bez DPH:		0 Kč		
Cena méně prací bez DPH:		- 39.939,- Kč		
<b>2.</b>				
Cena víceprací bez DPH:		+ 1953,- Kč		
Cena méně prací bez DPH:		- 45.498,- Kč		
<b>3.</b>				
Cena víceprací bez DPH:		0,- Kč		
Cena méně prací bez DPH:		- 26.986,- Kč		

**Výsledná cena změny bez DPH: - 110.470,- Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá dopad na celkový termín díla



Počet připojených listů specifikací: rozpočet  
VCP, MP

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  | chyba v PD  | chyba zhotovitele  | vyšší moc  | jiné okolnosti

Oznámení vydává: GD ALSPO Zlín.

**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Souhlasím s provedenou změnou.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.

**Stanovisko investora**

Souhlasím s provedenou změnou.



Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 5		
Zhotovitel:	ALSPO			
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum: 20. 8. 2019		
Název akce:				
<b>„ Modernizace učeben ZŠ Valašské Klobouky“</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
1. Změna způsobu úpravy omítek				
2. Zrušení atyp. vestavěné skříně				
3. Změna obložení obkladem za omítku				
4. Ostatní drobné úpravy vynucené stavbou nebo požadavkem objednatele				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
1. Vzhledem k rozsáhlé opravě omítek po realizaci stavebních úprav byla zhotovitelem navržena úprava povrchu opravovaných omítek, která je kvalitativně stejná, ale provedení je rychlejší a dojde i k úspoře finanční.				
2. Bojler se zrušil, vestavěná skříň není nutná.				
3. Zrušení obkladu v kuchyni				
4. instalace ohřivačů TUV místo starého demontovaného bojleru				
<b>1.</b>				
Cena víceprací bez DPH:		0,- Kč		
Cena méně prací bez DPH:		- 308 597,- Kč		
<b>2.</b>				
Cena víceprací bez DPH:		0,- Kč		
Cena méně prací bez DPH:		- 8 628,- Kč		
<b>3.</b>				
Cena víceprací bez DPH:		0,- Kč		
Cena méně prací bez DPH:		- 36 020,- Kč		
<b>4.</b>				
Cena víceprací bez DPH:		29 480,- Kč		
Cena méně prací bez DPH:		0,- Kč		

**Výsledná cena změny bez DPH: - 323 765,- Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá dopad na celkový termín díla



Počet připojených listů specifikací: rozpočet

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  | chyba v PD  | chyba zhotovitele  | vyšší moc  | jiné okolnosti

Oznámení vydává: GD ALSPO Zlín.

**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Souhlasím s provedenou změnou.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.

**Stanovisko investora**

Souhlasím s provedenou změnou.

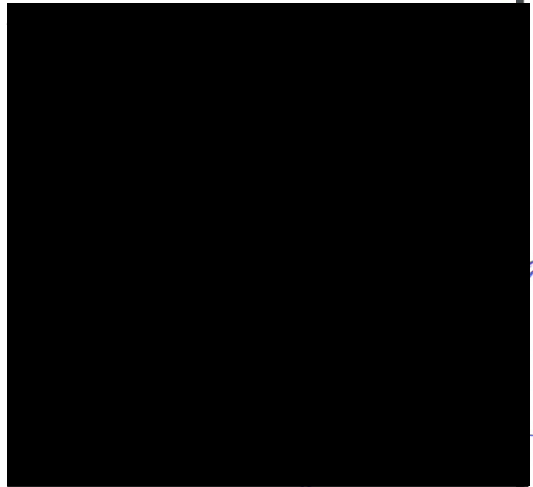

Příloha: Položkový rozpočet
