



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

30-29/2018

Dodatek č. 2

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. *Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace*

Sídlo: nábr. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25

Statutární zástupce:

IČ: 60680342

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. *KALAHA a.s.*

Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

Statutární zástupce:

e-mail:

telefon:

IČ: 255 62 151

DIČ: CZ25562151

Bankovní spojení, č.ú.:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Petr Bajer, místopředseda představenstva

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 5965

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmětem dodatku

Smluvní strany se dohodli na změně článku VII. Cena za provedení díla, a to na základě schválených změnových listů včetně rekapitulace změn které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1

Další články zůstávají nezměněny.

VII. Cena za provedení díla

Původní cena bez DPH	26 955 773,-Kč
Vícepráce bez DPH	1 124 941,47 Kč
Méněpráce bez DPH	-564 588,58 Kč
Nová cena bez DPH	27 534 126 Kč
Výše DPH	5 782 166 Kč
Cena včetně DPH	33 316 292 Kč

za část OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – Hlavní budova

Původní cena bez DPH	21 564 511,-Kč
Vícepráce bez DPH	766 303,04 Kč
Méněpráce bez DPH	-472 370,10 Kč
Nová cena bez DPH	21 858 444 Kč
Výše DPH	4 590 273 Kč
Cena včetně DPH	26 448 717 Kč


za část OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična

Původní cena bez DPH	5 391 262,-Kč
Vícepráce bez DPH	376 638,43 Kč
Méněpráce bez DPH	-92 218,48 Kč
Nová cena bez DPH	5 675 682 Kč
Výše DPH	1 191 893 Kč
Cena včetně DPH	6 867 575 Kč


Příloha č. 1 Rekapitulace změn

V Břeclavi, dne 27. 8. 2019

V Brně, dne

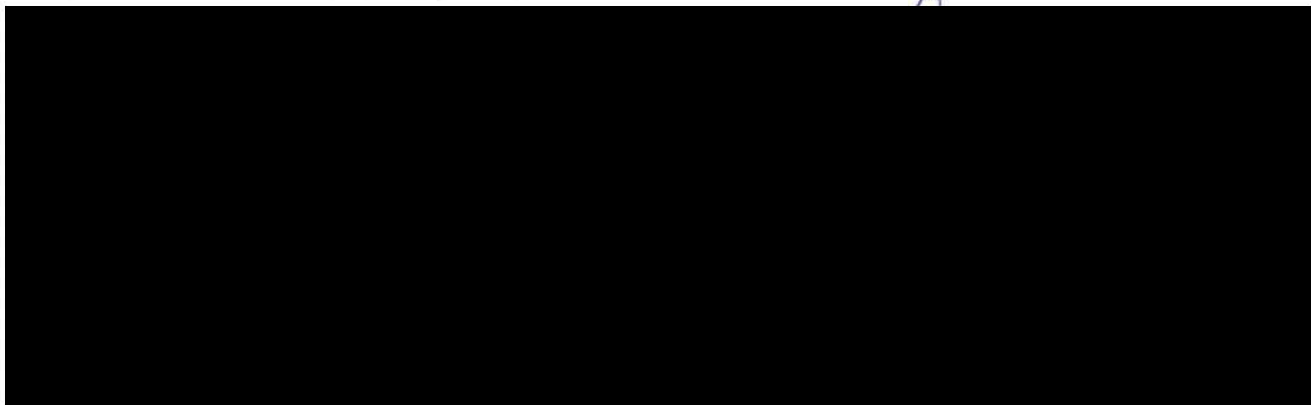



Rekapitulace změnových rozpočtů - Hlavní budova

Stavba:	OA Snížení energetické náročnosti budov
Adresa:	Břeclav, Smetanovo nábřeží 1224
Objednatel:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.
Zhotovitel:	KALAHA a.s.
Zpracoval:	


cena díla dle SOD bez DPH	21 564 511,00
---------------------------	---------------

číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	vícepráce v %	méněpráce v %	celková změna ceny v Kč	celková změna ceny v %
ZL01a	Výplně otvorů - přípr. pro žaluzie	23 800,00	0,00	0,11%	0,00%	23 800,00	0,11%
ZL02a	VZT - telefonní tlumiče	18 361,00	0,00	0,09%	0,00%	18 361,00	0,09%
ZL03a	VZT doplňky 1.NP	59 176,00	0,00	0,27%	0,00%	59 176,00	0,27%
ZL04a	VZT doplňky 2.NP	21 904,00	0,00	0,10%	0,00%	21 904,00	0,10%
ZL05a	VZT odpočet	0,00	-7 410,00	0,00%	-0,03%	-7 410,00	0,03%
ZL06a	Výplně otvorů-sklo kůra čirá	8 044,00	0,00	0,04%	0,00%	8 044,00	0,04%
ZL07a	Odpočet mříží, výměna skla Connex	300 215,65	-385 647,32	1,39%	-1,79%	-85 431,67	3,18%
ZL08a	Záměna zadních dveří	62 501,59	-62 501,59	0,29%	-0,29%	0,00	0,58%
ZL09a	Dodávka a montáž vst. dveří	32 539,53	0,00	0,15%	0,00%	32 539,53	0,15%
ZL10a	Střecha změny	0,00	-16 811,19	0,00%	-0,08%	-16 811,19	0,08%
ZL11a	Požátní izolace na VZT potrubí	239 761,27	0,00	1,11%	0,00%	239 761,27	1,11%
celkem		766 303,04	-472 370,10	3,55%	-2,19%	293 932,94	5,74%



OZNÁMĚNÍ ZMĚNY		Datum:		číslo OZ: 01a	
Zhotovitel:		KALAHA a.s.			
Investor:		SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.			
Název akce:		OA Snížení energetické náročnosti budov			
Způsob odeslání/předání:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy:					
Předmět změny:		Hlavní budova - Výplně otvorů - příprava pro žaluzie			
Popis a zdůvodnění změny:		Změna vyvolaná na základě požadavku objednatele. Projektová dokumentace nepočítala s montáží venkovních žaluzií na zastínění místností-učeben. Z tohoto důvodu byly do vybraných pozic oken přidány profily, které umožňují dodatečnou montáž zatínění učeben.			
Důvod vícepráce/méněpráce:					
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:					
<i>Pouklesání se zkušbou</i>					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST		Datum:	číslo ZL: 01a
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
Změnový list vystavil:	Dotu Bojst		
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov		
Předmět změny:	Hlavní budova - Výplně otvorů - příprava pro žaluzie		
Popis a zdůvodnění změny: Změna vyvolaná na základě požadavku objednatele. Projektová dokumentace nepočítala s montáží venkovních žaluzií na zastínění místností-učeben. Z tohoto důvodu byly do vybraných pozic oken přidány profily, které umožňují dodatečnou montáž zatínění učeben.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		23 800,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23 800,00 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy
Objekt: 08 Změnové listy - Hlavní budova
Rozpočet: ZL01a Hlavní budova - Výplně otvorů - příprava pro žaluzie

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	23 800,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	23 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 998,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 28 798,00 CZK

v

dne

Zpracováno programem EDVARD A RENEŠE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
76P	Plastové výrobky	HSV			23 800,00	100
Cena celkem					23 800,00	100

Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	08	Změnové listy - Hlavní budova
R:	ZL01a	Hlavní budova - Výplně otvorů - příprava pro žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 76P		Plastové výrobky				23 800,00
1	769041	Příplatek za rozšiřovací profil	ks	25,00000	952,00	23 800,00

OZNÁMĚNÍ ZMĚNY		Datum:		číslo OZ: 02a	
Zhotovitel:		KALAHA a.s.			
Investor:		SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.			
Název akce:		OA Snížení energetické náročnosti budov			
Způsob odeslání/předání:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy:					
Předmět změny:		Hlavní budova - VZT - telefonní tlumiče			
Popis a zdůvodnění změny:		Zaústění potrubí v duchotechniky bylo navrženo do sádkartonových podhledů. V místnostech soc. zařízení a WC se tyto podhledy nerealizují. Z tohoto důvodu došlo k úpravě potrubí vložením tlumících prvků			
Důvod vícepráce/méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:					
<p>Souhlasím, návrh na kábelové požadavek objednatele.</p>					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST		Datum:	číslo ZL: 02a
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov		
Předmět změny:	Hlavní budova - VZT - telefonní tlumiče		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Zaústění potrubí vduchotechniky bylo navrženo do sádkartonových podhledů. V místnostech soc. zařízení a WC se tyto podhledy nerealizují. Z tohoto důvodu došlo k úpravě potrubí vložením tlumících prvků</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	18 361,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
18 361,00 Kč	[REDAKCE]		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
[REDAKCE]			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy**

Objekt: **08 Změnové listy - Hlavní budova**

Rozpočet: **ZL02a Hlavní budova - VZT - telefonní tlumiče**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **KALAHA a.s.**
Maříkova 1899/1
62100 Brno-Řečkovice

IČO: **25562151**

DIČ: **CZ25562151**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 708,00
PSV			11 653,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 361,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 361,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 856,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

22 217,00 CZK

v

dne


Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Ostatní	HSV			6 708,00	37
728	Vzduchotechnika	PSV			11 653,00	63
Cena celkem					18 361,00	100

Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	08	Změnové listy - Hlavní budova
R:	ZL02a	Hlavní budova - VZT - telefonní tlumiče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Ostatní				6 708,00
1	11001	Montáž VZT zařízení a potrubí	ks	1,00000	6 708,00	6 708,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				11 653,00
2	728 - 1	Telefonní tlumič SGD 100/300	ks	23,00000	401,00	9 223,00
3	728 - 2	Telefonní tlumič SGD 125/300	ks	2,00000	401,00	802,00
4	728 - 3	Telefonní tlumič SGD 160/500	ks	1,00000	1 628,00	1 628,00

OZNÁMĚNÍ ZMĚNY		Datum:		číslo OZ: 03a	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.				
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.				
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov				
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy:					
Předmět změny:	Hlavní budova - VZT doplňky 1.NP				
Popis a zdůvodnění změny:	Stavební konstrukce, které nebyly zaznamenány v PD pro provedení stavby, nebylo možné zaměřit do pasportu stávajícího stavu. Z toho důvodu došlo k úpravám rozvodů VZT v 1.np.				
Důvod vícepráce/méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:					
	<i>Seuklasifikace s opravou rozvodů</i>				
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST		Datum:	číslo ZL: 03a
Zhotovitel: KALAHA a.s.			
Změnový list vystavil: 			
Název akce: OA Snížení energetické náročnosti budov			
Předmět změny: Hlavní budova - VZT doplňky 1.NP			
Popis a zdůvodnění změny: Stavební konstrukce, které nebyly zaznamenány v PD pro provedení stavby, nebylo možné zaměřit do pasportu stávajícího stavu. Z toho důvodu došlo k úpravám rozvodů VZT v 1.np.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		59 176,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
59 176,00 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy

Objekt: 08 Změnové listy - Hlavní budova

Rozpočet: ZL03a Hlavní budova - VZT doplňky 1. NP

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČO: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	59 176,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	59 176,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 176,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 427,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **71 603,00 CZK**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
07	Koncové elementy	HSV			38 658,00	65
10	Izolace	HSV			2 145,00	4
11	Ostatní	HSV			18 373,00	31
Cena celkem					59 176,00	100

Položkový rozpočet

S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	08	Změnové listy - Hlavní budova
R:	ZL03a	Hlavní budova - VZT doplňky 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 07		Koncové elementy				38 658,00
1	07003	Protidešťová žaluzie 500*630 mm se sítí proti hmyzu	ks	1,00000	1 628,00	1 628,00
2	07004	Protidešťová žaluzie 315*710 mm se sítí proti hmyzu	ks	1,00000	3 058,00	3 058,00
3	07005	Protidešťová žaluzie 315*1000 mm se sítí proti hmyzu	ks	1,00000	3 704,00	3 704,00
4	07006	Trouba 560*315/100mm	ks	1,00000	728,00	728,00
5	07007	Přechod 560*315-315*560/700mm	ks	1,00000	542,00	542,00
6	07008	Oblouk 400*280-400*400/90 stupňů	ks	2,00000	1 003,00	2 006,00
7	07009	Přechod 500*160-400*280/500mm	ks	1,00000	478,00	478,00
8	070091	Oblouk 400*280/45 stupňů	ks	4,00000	1 665,00	6 660,00
9	070092	Oblouk 400*250/45 stupňů	ks	4,00000	1 912,00	7 648,00
10	070093	Oblouk 560*315/*45 stupňů	ks	4,00000	1 802,00	7 208,00
11	070094	Trouba 400*280/500 mm	ks	2,00000	833,00	1 666,00
12	070095	Trouba 400*250/500 mm	ks	2,00000	833,00	1 666,00
13	070096	Trouba 560*315/500 mm	ks	2,00000	833,00	1 666,00
Díl: 10		Izolace				2 145,00
14	10001	Parotěsná kaučuková izolace VZT potrubí, tl. 20 mm, samolepicí role šířky 1 m	m2	3,00000	715,00	2 145,00
Díl: 11		Ostatní				18 373,00
15	11001	Montáž VZT zařízení a potrubí	ks	1,00000	16 033,00	16 033,00
16	11002	Ostatní a spojovací materiál (závěsy, těsnění, těsnicí pásy, volné příruby a další)	ks	1,00000	2 340,00	2 340,00



OZNÁMĚNÍ ZMĚNY	Datum:	číslo OZ: 04a
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.	
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov	
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy:		
Předmět změny:	Hlavní budova - VZT doplňky 2.NP	
Popis a zdůvodnění změny:	Stavební konstrukce, které nebyly zaznamenány v PD pro provedení stavby, nebylo možné zaměřit do pasportu stávajícího stavu. Z toho důvodu došlo k úpravám rozvodů VZT v 2.np.	
Důvod vícepráce/méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko technického projektanta stavby:	<i>Se souhlasem s úpravou rozvodů</i>	
Příloha:	11	

ZMĚNOVÝ LIST		Datum:	číslo ZL: 04a
Zhotovitel: KALAH A a.s.			
Změnový list vystavil: [REDACTED]			
Název akce: OA Snížení energetické náročnosti budov			
Předmět změny: Hlavní budova - VZT doplňky 2.NP			
Popis a zdůvodnění změny: Stavební konstrukce, které nebyly zaznamenány v PD pro provedení stavby, nebylo možné zaměřit do pasportu stávajícího stavu. Z toho důvodu došlo k úpravám rozvodů VZT v 2.np.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		21 904,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 904,00 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
[REDACTED]			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy
Objekt: 08 Změnové listy - Hlavní budova
Rozpočet: ZL04a Hlavní budova - VZT doplňky 2. NP

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	21 904,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	21 904,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 904,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 600,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **26 504,00 CZK**


Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
07	Koncové elementy	HSV			13 746,00	63
11	Ostatní	HSV			8 158,00	37
Cena celkem					21 904,00	100

Položkový rozpočet


S:	2018/R/27a	OA Břeclav - změnové listy
O:	08	Změnové listy - Hlavní budova
R:	ZL04a	Hlavní budova - VZT doplňky 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 07		Koncové elementy				13 746,00
1	07003	Trouba 315*1000/1000 mm	ks	1,00000	1 095,00	1 095,00
2	07004	Přechod 315*1000-560*315/770 mm	ks	1,00000	845,00	845,00
3	07005	Přechod 500*315-280*560/500 mm	ks	1,00000	416,00	416,00
4	07006	Odskok 315*500/U160 L800	ks	1,00000	554,00	554,00
5	07007	Trouba 560*280/1500 mm	ks	2,00000	2 098,00	4 196,00
6	07008	Trouba 560*280/1000 mm	ks	1,00000	699,00	699,00
7	07009	Přechod 560*280-315*500/500 mm	ks	1,00000	450,00	450,00
8	070091	Trouba 710*315/1000 mm	ks	1,00000	853,00	853,00
9	070092	Oblouk 710*315-315*315/90 stupňů	ks	1,00000	1 170,00	1 170,00
10	070093	Trouba 315*315/1500 mm	ks	1,00000	787,00	787,00
11	070094	Oblouk 400*280-400*400/90 stupňů	ks	2,00000	1 178,00	2 356,00
12	070095	Přechod 500*160-400*280/500 mm	ks	1,00000	325,00	325,00
Díl: 11		Ostatní				8 158,00
13	11001	Montáž VZT zařízení a potrubí	ks	1,00000	7 232,00	7 232,00
14	11002	Ostatní a spojovací materiál (závěsy, těsnění, těsnicí pásy, volné příruby a další)	ks	1,00000	926,00	926,00

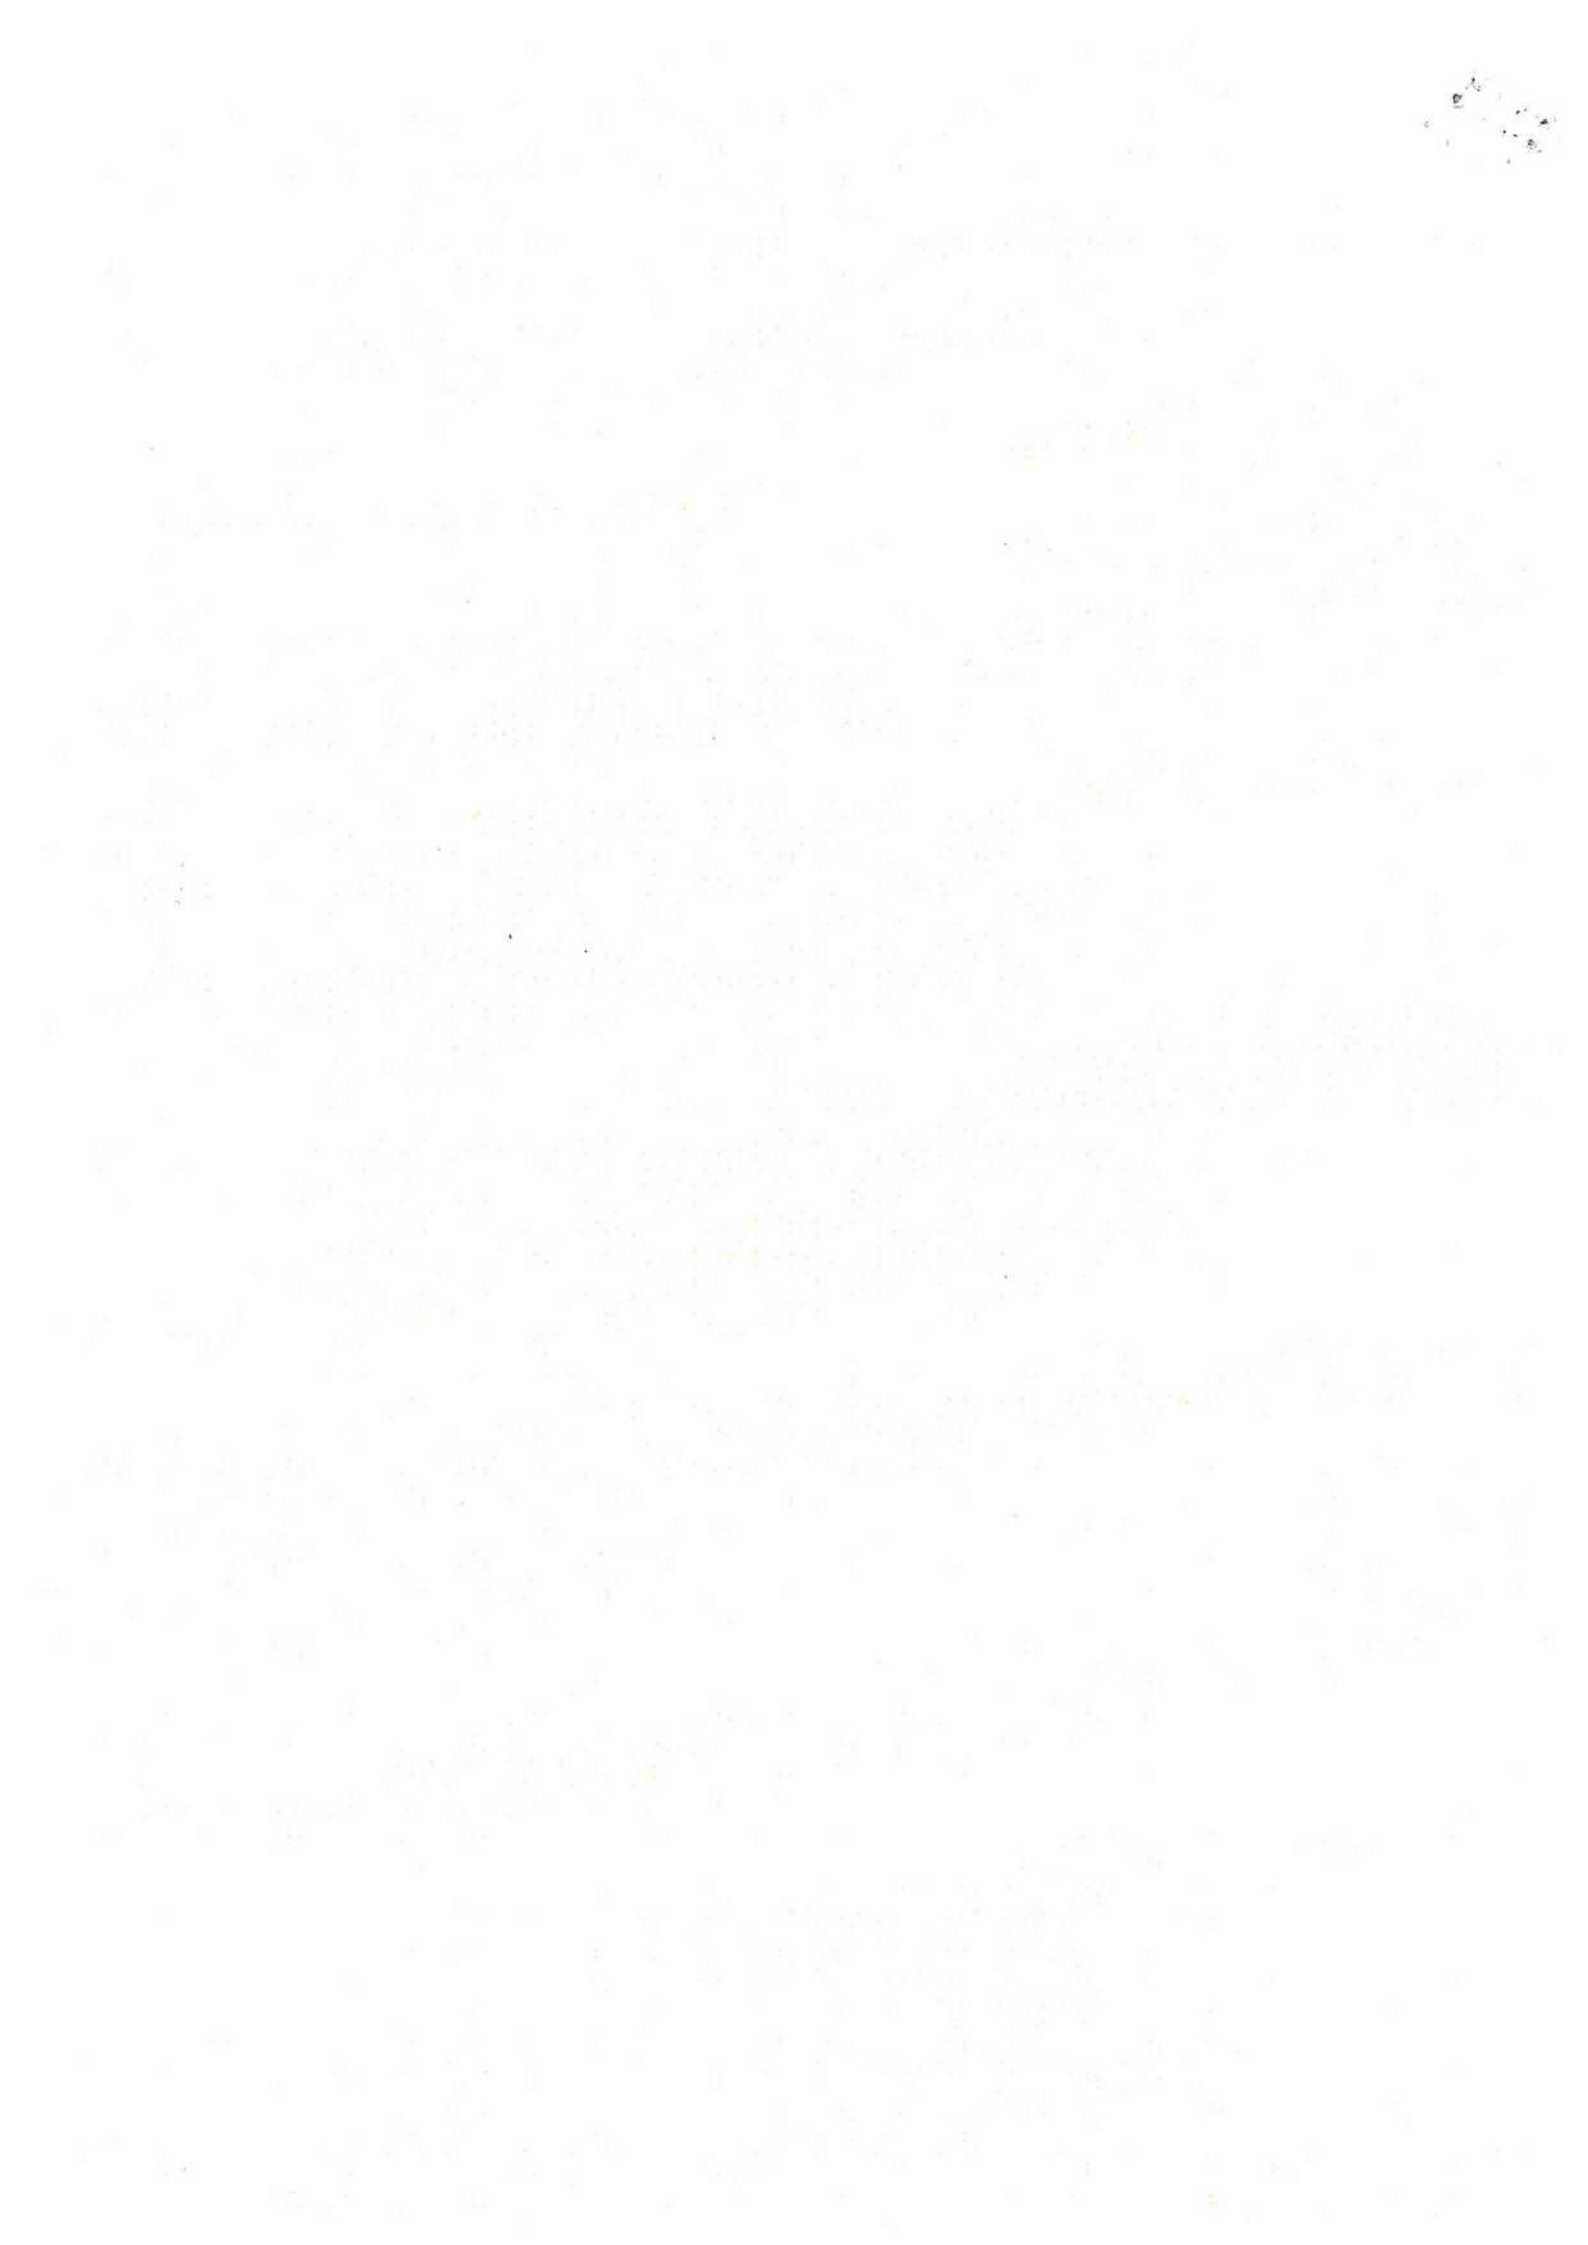

OZNÁMĚNÍ ZMĚNY		Datum:		číslo OZ: 05a	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.				
Investor:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.				
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov				
Způsob odeslání/předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy:					
Předmět změny:	Hlavní budova - VZT odpočet				
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Stavební konstrukce, které nebyly zaznamenány v PD pro provedení stavby, nebylo možné zaměřit do pasportu stávajícího stavu. Z toho důvodu došlo k úpravám rozvodů VZT.</p>				
Důvod vícepráce/méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko technického projektanta stavby:					
	<p><i>Lau Klát'ce s dpravou VZT</i></p>				
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST		Datum:	číslo ZL: 05a
Zhotovitel:	KALAHÁ a.s.		
Změnový list vystavil:	P [REDAKCE]		
Název akce:	OA Snížení energetické náročnosti budov		
Předmět změny:	Hlavní budova - VZT odpočet		
Popis a zdůvodnění změny:	Stavební konstrukce, které nebyly zaznamenány v PD pro provedení stavby, nebylo možné zaměřit do pasportu stávajícího stavu. Z toho důvodu došlo k úpravám rozvodů VZT.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-7 410,00 Kč	0,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-7 410,00 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy**

Objekt: **08 Změnové listy - Hlavní budova**

Rozpočet: **ZL05a Hlavní budova - VZT - odpočet**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **KALAHA a.s.** IČO: **25562151**
Maříkova 1899/1 DIČ: **CZ25562151**
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-7 410,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 410,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 410,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 556,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -8 966,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
09	Potrubí	HSV			-7 410,00	100
Cena celkem					-7 410,00	100
