






Dodatek č. 3

Č. j. KRPK-7714-23/ČJ-2019-1900VZ







ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-7714-13/ČJ-2019-1900VZ
ze dne 24. 4. 2019, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupený: **plk. Mgr. Petr Macháček**, ředitel krajského ředitelství
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor správy majetku,
Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov

Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: upshp5u

Zhotovitel **Josef Gonda**, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupený: Josef Gonda
Sídlo: Masarykova 775, 363 01 Ostrov
IČO: 66366640
DIČ: 
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: ---

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že z důvodu objektivních příčin na straně objednatele, popsanych v dokumentu č. j. KRPK-66554-65/ČJ-2018-1900MN ze dne 27. 8. 2019, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě jako příloha č. 1, dále na základě výsledků vyplynuvších z kontrolního dne 27. 8. 2019, jehož zápis je přílohou tohoto Dodatku jako č. 2, a na základě vyjádření projektanta k požární roletě, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku, je nezbytné přikročit ke změně termínu dokončení díla.
2. Termín dokončení díla nemá vliv na celkovou cenu díla.
3. Termín dokončení díla se prodlužuje nejpozději do 30. 9. 2019.

II.

1. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Příloha č. 1

Dokument č. j. KRPK-66554-65/ČJ-2018-1900MN ze dne 27. 8. 2019

Příloha č. 2

Zápis z kontrolního dne 27. 8. 2019

Příloha č. 3

Vyjádření projektanta k požární roletě

V
.....
Z
Josef Gonda

V Karlových Varech dne 28. 08. 2019

.....
za ob
plk.
Ředitel krajského ředitelství



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PCR19ETRPO28317555



ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Č.j.: KRPK- 66554-65/ČJ-2018-1900MN

Karlovy Vary 27. srpna 2019

Počet listů: 1

Přílohy: 1/2

Žádost o prodloužení smlouvy-dodatek 3

KŘP Kvk – OOP Kynšperk, Školní 775/10- rekonstrukce objektu vč. půdní vestavby

Na základě zjištěných skutečností na kontrolním dni dne 27. 8. 2019 žádáme tímto o prodloužení termínu realizace akce do 30. 9. 2019 a uzavření dodatku č.3.

Zhodnocení rozsahu prací vůči termínu provedení:


- 1) Řešení úpravy cely
Při rekonstrukci objektu bylo projektováno zvýšení světlé výšky v cele předběžného zadržení snížením základů v celé místnosti. Při provádění prací s ohledem na hloubku výkopu by však došlo k tomu faktu, že bychom se dostali pod základy budovy a došlo by k porušení statiky a hydroizolace objektu. Proto navýšení světlé výšky není možno v celé místnosti. Navrhované řešení je upravit prostor pouze ve výměře cely a částečně před celou, tak aby nebyl v cele umístěn schod. Nové řešení si vyžaduje drobnou úpravu projektu a vyčíslit více a méně práce. Tato skutečnost nebyla zřejmá při zadávání a projevuje až při odkrytí a realizaci těchto prováděcích prací.
- 2) Vzhledem ke stavu zdíva v objektu byly provedeny štuky v celém objektu.
- 3) Ke sjednocení vzhledu interiéru byly vyměněny veškeré zárubně.
- 4) Řešení protipožární rolety místnost č.101 dozorcí služba
Vzhledem ke změně požadavku na požární uzávěru–provozní důvody bylo rozhodnuto, že bude použita protipožární roleta, která provozně vyhovuje lépe (termín dodání cca 25.9.19)
- 5) Vzhledem k nutnosti stěhování jednotlivých místností došlo ke zdržení termínu i z důvodu nemožnosti přerušit provoz oddělení.

Dodatkem č. 1. byl prodloužen termín ukončení stavby **do 28. 8. 2019.**

Zdržení nebylo na straně dodavatele a proto z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace akce do **30. 9. 2019.**


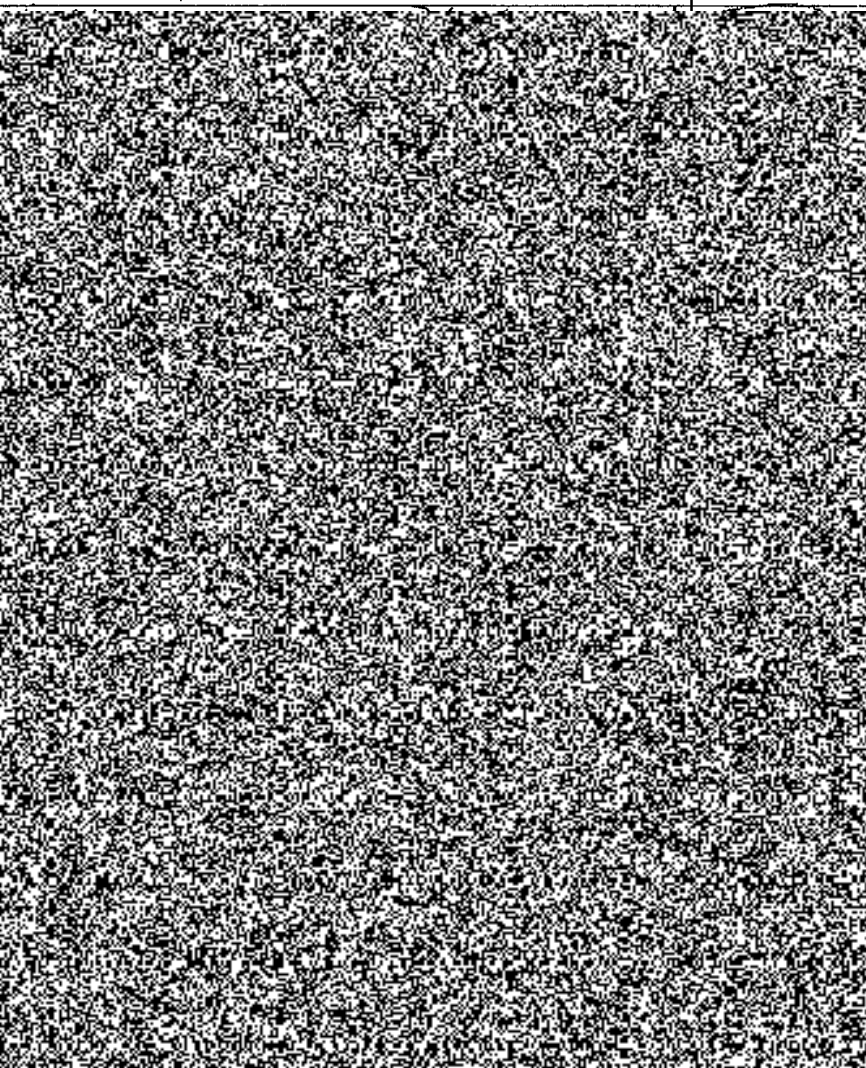
Děkuji.

S pozdravem



vedoucí OSM

- 1) Zápis z kontrolního dne 27.8. 2019

Denní záznamy stavby	Datum
<p>Stěp kopání, otvor ve sklepe na větrání, oprava QDI na chodbě, přouvání obkladu v 2 NP, osazení zářivky, elektika, rozvod slaboproudů, voda k montáži zařízení na WC v 1 NP, rozvod vody</p>	26. 8. 2019
<p>Přítomní vedáci elektikař</p>	
<p>ZÁPIS Z KD - TDS</p>	27. 08. 2019
<p>ÚČAST:</p>	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>1) ŘEŠENÍ PROTIPŮŽNĚKŮ ROLETY M. 101 - DOZORŮ SLUŽBA</p> <ul style="list-style-type: none"> - UMÍSTĚNÍ ZE STRANY SCHOPIŠTĚ - POŽADAVEK - PŘÍVOD POŽ. VODY NAVRŽENÉ PODLUŽÍ DN 20 + KULOVÍ UZÁVĚR S MOŽNOSTÍ UTPROUSTĚNÍ - POŽADAVEK - ELEKTRO - KABEL 3X 1,5 VOLTI KONEC - UMÍSTĚNÍ UKÁZANO NA MÍSTĚ - ÚPRAVA PARAPETU - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP 1 - ROZMĚR 1490x320 mm PARAMETRY DODÁ PROJEKTANT 	
<p>2) ODSOUHLASENO ŘEŠENÍ ÚPRAVY CELY</p>	
<p>3) ZHODNOCENÍ ROZSAHU PRACÍ VŮČI TERMÍNU PROVEDENÍ</p>	
<p>q1) VZKLEDEM KE STAVU ZDÍVA V OBJEKTU BYLY PROVEDENY ŠTUKY V CELEM OBJEKTU</p>	
<p>q2) KE SIEDNOCENÍ VZKLEDO INTERIERU BYLY VYNĚNĚNY VEŠKERÉ ZARUBNĚ</p>	
<p>q3) V CELE BYL ZJIŠTĚN VÍROV PODZEMNÍ VODY</p>	
<p>q4) VZKLEDEM KE ZMĚNĚ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ UZÁVĚRU → PROVOZNÍ PŮVODY BYLO ROZHODNUTO, ŽE BUDE POUŽITA PROTIPŮŽNĚK ROLETA, KTERÁ PROVOZNĚ VYHOVUJE LÉPE S TERMÍNEM DODÁVÍ 25.03.19</p>	
<p>5) ZDRŽENÍ TERMÍNU JE I Z DŮVODŮ NEMOŽNOSTI PŘERUŠENÍ PROVOZU ODDĚLENÍ</p>	
