

DODATEK Č. 7

SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“),
se zhotovitelem veřejné zakázky

č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1

„Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“
pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi
(dále jen „dodatek č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo“).

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice

IČ: 72050250, DIČ: CZ72050250

bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710

zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro ekonomiku

dále jen „objednatel“

a

Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z

zastoupená společností Metrostav a.s. jako vedoucím společníkem na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 15. 3. 2018 dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi společnostmi, zavázanými společně a nerozdílně,

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 1809-071/0100

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupený:



a

Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

zastoupený:



dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku


1. S ohledem na čl. V odst. 1 a odst. 2 Smlouvy o dílo k provedení stavby, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1 „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi“ (dále také „uzavřená smlouva o dílo“) **se dodatkem č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem na posunu termínu časově i věcně významného uzlového bodu postupu provedení díla – milníku č. 9 „Dokončení páteřních areálových rozvodů s přípojkami jednotlivých médií – vodovod, kanalizace, elektro, horkovod“ v „Harmonogramu postupu provedení díla“ v příloze č. 3 uzavřené smlouvy o dílo a to z 4. září 2019 na 4. února 2020.**
2. Důvodem pro změnu je zjištění, že v budoucí trase horkovodu dle projektové dokumentace byly při zahájení výkopu zjištěny kabely vysokého napětí, které nebyly uvedeny v žádné dosavadní dokumentaci. V důsledku tohoto zjištění musí dojít k přepracování trasy horkovodu.
3. Na základě výše uvedeného se objednatel se zhotovitelem tímto dodatkem č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo dohodl na novém „Harmonogramu postupu provedení díla“, který je v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo, který nahrazuje původní „Harmonogram postupu provedení díla“ v příloze č. 3 uzavřené smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a takto jej podepisují.

Příloha č. 1: Harmonogram postupu provedení díla ze dne 26. 8. 2019.

Za zhotovitele:

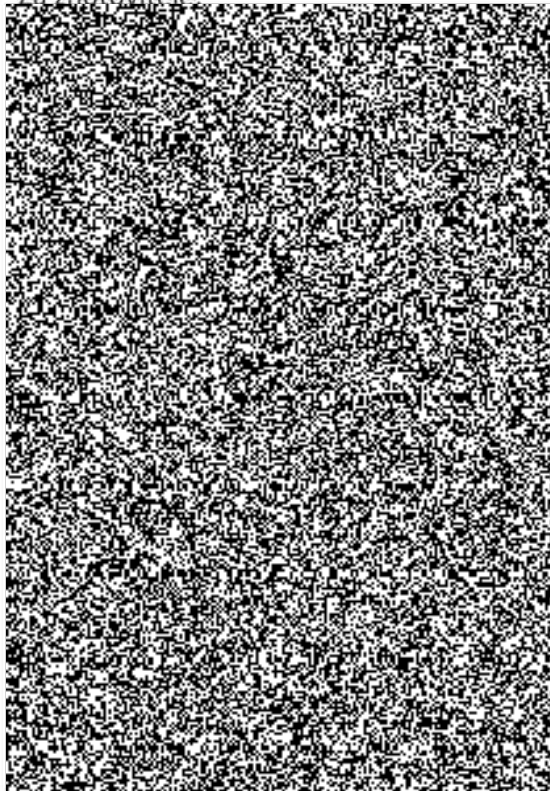


Za objednatele:

**Renata
Kaňková** Digitálně
podepsal Renata
Kaňková
Datum: 2019.08.29
12:37:37 +02'00'

.....
Renata Kaňková
náměstek ředitele Krajského ředitelství
Policie Pardubického kraje pro ekonomiku

Časový harmonogram plnění - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - ČÁST 1 VZ

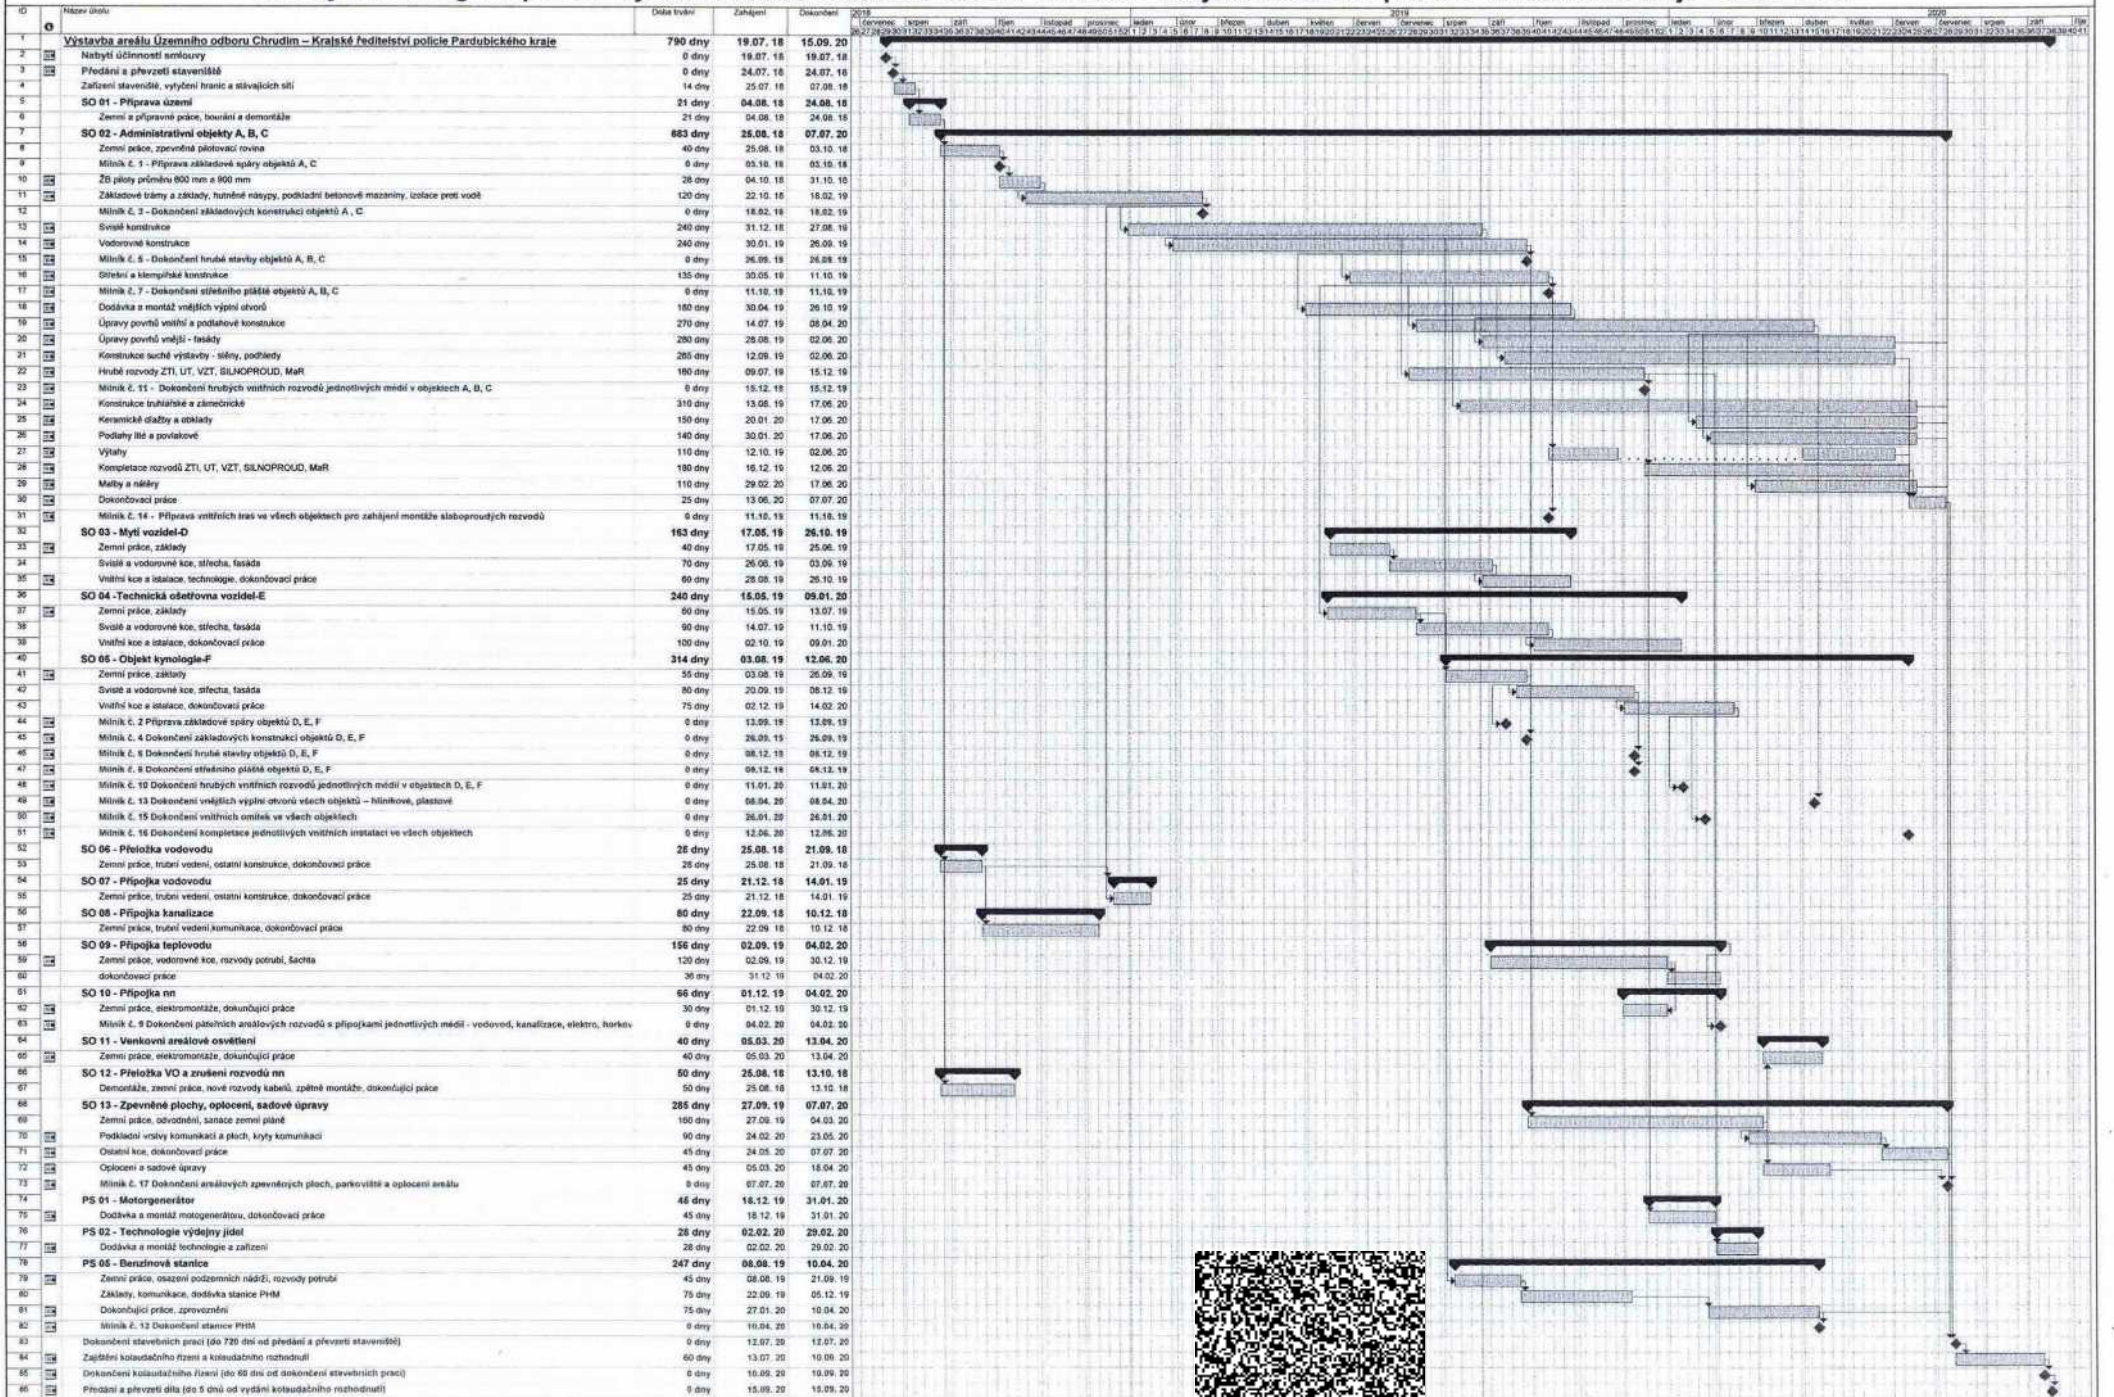

Finanční Harmonogram plnění

Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Fakturace za měsíc	Fakturace bez DPH	Součtově bez DPH
Měsíc 1	4 083 268,32	4 083 268,32
Měsíc 2	3 976 008,86	8 059 277,18
Měsíc 3	4 006 684,80	12 065 961,98
Měsíc 4	5 315 859,37	17 381 821,35
Měsíc 5	5 659 779,22	23 041 600,57
Měsíc 6	8 117 182,79	31 158 783,36
Měsíc 7	9 263 556,54	40 422 339,90
Měsíc 8	10 255 445,28	50 677 785,18
Měsíc 9	10 563 796,29	61 241 581,47
Měsíc 10	15 250 978,58	76 492 560,05
Měsíc 11	12 585 797,42	89 078 357,47
Měsíc 12	15 813 689,28	104 892 046,75
Měsíc 13	13 500 000,00	118 392 046,75
Měsíc 14	12 500 000,00	130 892 046,75
Měsíc 15	12 000 000,00	142 892 046,75
Měsíc 16	11 500 000,00	154 392 046,75
Měsíc 17	8 649 554,00	163 041 600,75
Měsíc 18	9 000 000,00	172 041 600,75
Měsíc 19	14 000 000,00	186 041 600,75
Měsíc 20	14 500 000,00	200 541 600,75
Měsíc 21	14 000 000,00	214 541 600,75
Měsíc 22	12 000 000,00	226 541 600,75
Měsíc 23	11 000 000,00	237 541 600,75
Měsíc 24	10 700 000,00	248 241 600,75
Měsíc 1 - zajištění kolaudace	150 000,00	248 391 600,75
Měsíc 2 - zajištění kolaudace	76 708,25	248 468 309,00
Celkem	248 468 309,00	248 468 309,00

Renata
Kaňko
vá

Digitálně
podepsal
Renata
Kaňková
Datum:
2019.08.29
12:38:55
+02'00'

