

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

181 / 1

Číslo ZBV:

2.4Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: **Společnost Čtyřkoly most****zastoupená vedoucím společníkem:**

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 62242105

druhý společník:

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

IČ: 28868781

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	-25 280,00	153 456,10	128 176,10

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-25 280,00	153 456,10	128 176,10

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

181 / 1

Číslo ZBV:

2.4

Strany smlouvy o dílo č. 2017/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 9.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Čtyřkoly most, zastoup. vedoucím společníkem: SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle Přehledu dalších dokladů	45	počet listů

Paré č.	Příjemce
1,2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	TDI
5	Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato změna vzniká na základě Stanovení přechodné úpravy provozu, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/1096 - most ev.č. 1096-1 ve Čtyřkolech, z důvodu demolice tohoto mostu a následné rekonstrukce. Návrh přechodné úpravy byl odsouhlasen Policií ČR dne 09.0.42019 a 15.04.2019 viz "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" vydal Městský úřad Benešov 17.4.2019.

Viz též "Rozhodnutí povolení uzavírky" vydal Městský úřad Benešov 18.4.2019 a Stanovení PUP na silnici č. I/3 z důvodu demolice a výstavby mostu ev.č. 1096-1 vydal Krajský úřad Středočeského kraje dne 17.4.2019.

V PDPS bylo uvažováno s vypracováním DIO vč. projednání a vyřízení DIR. Cena byla rozpuštěna do jednotlivých položek dopravního značení. V průběhu projednávání byla trasa na základě dalších a dalších požadavků třetích stran několikrát měněna a opakovaně projednávána. Toto si vyžádalo třikrát vyhotovení nového DIR.

Z uvedeného zdůvodnění vyplývá, že se jedná o Změny nezbytné k dokončení díla, které jsou tak podle § 5, odst. 1. písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná Změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-25 280,00	153 456,10	128 176,10	178 736,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost T.A.Q. s.r.o.	jméno	Jan Čikara	datum	15 -08- 2019	podpis
Projektant (autorský dozor): PONTEX spol. s r.o.	jméno	Ing. Lukáš Procházka	datum	19 -08- 2019	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Tomáš Vávra	datum	19.8.19	podpis
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Stanislav Pohunek	datum	19.8.19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel
Za Společnost Čtyřkoly most **ING. PETR DUCHEK, MBA** Ing. Karel Ryppl datum 23. 08. 2019 podpis
předseda představenstva společnosti jméno
SILNICE GROUP a.s. **Místopředseda představenstva**

Zhotovitel
Za Společnost Čtyřkoly most jméno Petr Jelínek datum 15 -08- 2019 podpis
jedenatel společnosti T.A.Q. s.r.o.

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	181 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 832 068,66

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 832 068,66	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-25 280,00	153 456,10	153 456,10	5,42%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-25 280,00	2 960 244,76	128 176,10	4,53%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Číkara souhlasím

Projektant (autor. dozor): Ing. Lukáš Procházka souhlasím

Stavební dozor: Ing. Tomáš Vávra souhlasím

Zástupce objednatele: Stanislav Pohunek souhlasím

Zaměstnanec objednatele
odpovědného za cenové
projednání změny: Petr Heinrich souhlasím

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: Čtyrkoly - III/1096 Čtyrkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-1 - PD

Číslo a název SO/PS: SO 181 - Dopravně inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: 181 - Dopravně inženýrská opatření

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	91400.	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	20,000	59,000	39,000	32,30	646,00	0,00	1.259,70	1.905,70	1.259,70	193,60
7	914232.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	117,000	207,000	90,000	129,10	15.104,70	0,00	11.819,00	26.923,70	11.819,00	76,92
8	914233	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	117,000	207,000	90,000	129,10	15.104,70	0,00	11.819,00	26.923,70	11.819,00	76,92
9	914239	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ. VEL. OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	9.114,000	12.358,000	3.244,000	10,50	93.874,20	0,00	33.413,20	127.287,40	33.413,20	35,59
10	914422.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000	48,000	34,000	129,10	1.807,40	0,00	4.389,40	6.196,80	4.389,40	242,86
11	914423.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	48,000	34,000	129,10	1.807,40	0,00	4.389,40	6.196,80	4.389,40	242,86
12	914429.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1.360,000	290,000	-1.070,000	20,70	28.152,00	-22.149,00	0,00	6.003,00	-22.149,00	-78,68
24	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	4,000	2,000	129,10	258,20	0,00	258,20	516,40	258,20	100,00
25	916323.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	4,000	2,000	129,10	258,20	0,00	258,20	516,40	258,20	100,00
26	916329.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	448,000	246,000	-202,000	15,50	6.944,00	-3.131,00	0,00	3.813,00	-3.131,00	-45,09
Nové položky													
101	02720R.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY - VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU DÍO VČ. PROJEDNÁNÍ A VYŘÍZENÍ DÍR (kalkulace ceny - podle nejnižší nabídky)	KPL	0,000	2,000	2,000	43.125,00	0,00	0,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	100,00
Celkem								163.956,80	-25.280,00	153.456,10	292.132,90	128.176,10	78,18

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PREHLED ZARAZENI ZMEN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/1096 Čtyřkolý, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1

1=1+15+20	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	38 762 487,64
2=1+15+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	40 033 972,83
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	46 465 267,20
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,33%
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Středování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(15/1)*100	Středování limitů 10 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	-3,68%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 291 535,28
7=(6/1)*100	Středování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,33%
8=110,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 618 731,29

9=(32/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 4	10,70%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 148 092,77
11=110,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 381 215,82

12=(36+37)*1100	Středování limitu 16 %	0,00%
13=36+37	Středování limitu 149 224 900 Kč	0,00
14=149224000/13		149 224 000,00

Skupiny změn

Č.Ú.	ZEV č.	Název SÚ/PS (přecitliv. Změny)	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Kosnota ZBV	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny napředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny do minimis (Změny nemění cenovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.))		
						Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné	Limit 15 %
10	17	19	19+23+26+29+33	20+24+27+30+34	21 19+20	22	23	24+23+23	25	26	27+25+26	28	29	30+28+29	31+25+28	32	33	34+32+33	35+32+33	36	37	38=(36+37)/11*100
		III/1096 Čtyřkolý, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1	-1 428 278,76	2 719 814,01	-29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 428 278,76	2 719 814,01	1 291 535,28	4 148 092,77	0,00	0,00	0,00%
321	1	Rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1 / doprava RDS bourání závrtní, předpínací žláby, jímky, ...	-1 402 998,76	2 566 357,51	1 163 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 402 998,76	2 566 357,51	1 163 358,15	3 969 356,62	0,00	0,00	0,32%
181	2	Dopravní inženýrská opatření / změna na základě předjednání	25 280,00	133 456,12	128 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	133 456,12	128 176,10	176 176,10	0,00	0,00	0,30%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2	
Název a evidenční číslo stavby:	III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	181 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Kalkulace nové položky - vypracování DIO	1	
Soupis prací	15	
Nabídky na vypracování DIO	2	
Stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Benešov 17.4.2019	10	
Rozhodnutí povolení uzavírky Městský úřad Benešov 18.4.2019	5	
Stanovení PÚP na sil. I_3 Středočeský kraj 18.4.2019	8	
Stanovisko TDI k ZBV 2	2	
Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	2	
počet listů celkem	45	

Cenová kalkulace nové položky

Příloha č. 7

stavba: III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Jednotková cena nové položky je stanovena v souladu s SoD odst.6.6., tj. dle § 17 Směrnice R-Sm-36, která je nedílnou přílohou SoD.

č. pol. rozpočtu	kód pol.	Popis položky	Měrná jednotka položky	množství (v soup. práci RDS)
	02720R.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU DIO vč. projednání	KPL	1,00
Rekapitulace rozkladu kalkulace		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací	Jednotková cena položky v Kč	43 125,00

Způsob ocenění: Cena položky byla stanovena individuálních kalkulací.

Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ položky	množství / MJ	cena v Kč/ MJ množství	celkem v Kč
		Měrná jednotka položky	kpl	1,00	43 125,00	43 125,00
		Materiál				
		Materiál celkem				
		Mzdy				
		Mzdy celkem				
		Stroje				
		Stroje celkem				
		Ostatní přímé náklady				
		<i>Pro ocenění položky byla vybrána nejnižší nabídka:</i>				
		Quo s.r.o., Křížkova 2158, Benešov	kpl	1,00	37 500,00	37 500,00
		Odvody z mezd	Kč		34,00%	
		Ostatní přímé náklady celkem				37 500,00
		Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				37 500,00
		Materiál + Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady celkem				37 500,00
		Režie				
		Výrobní režie	%	5,00	37 500,00	1 875,00
		Správní režie	%	5,00	37 500,00	1 875,00
		Režie celkem				3 750,00
		Materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + režie celkem				41 250,00
		Zisk	%	5,00	37 500,00	1 875,00
		Cena položky v Kč celkem v soupisu prací				43 125,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Čtyrkoly III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-1 - PD
Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.

Základní cena: 2 832 068,66 Kč

Cena celková: 2 960 244,76 Kč

DPH: 603 538,90 Kč

Cena s daní: 3 563 783,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 960 244,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čtyřkoly III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-1 - PD
 Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
101	02720R	N	POMOC PRÁČE ZŘÍZ.NEBO ZAJIŠTÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU DIO VČ. PROJEDNÁNÍ A VYŘÍZENÍ DIR Jednotková cena dle kalkulace v příloze ZBV.	KPL	0,000	43 125,00	0,00
	ZBV:	2	Změna oproti PDPS		2,000		86 250,00
			aktuální množství		2,000		86 250,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				86 250,00
1			Zemní práce				
1	125758		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem (použitelný materiál) šterkový val fr. 8*16 v 1,5m 15,0=15,000 [A]	M3	15,000	516,50	7 747,50
2	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkový val fr. 8*16 v 1,5m 15,0=15,000 [A]	M3	15,000	355,10	5 326,50
1			Zemní práce				13 074,00
5			Komunikace				
3	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	137,800	7 555,20	1 041 106,56



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Čtyrkoly III/1096 Čtyrkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-I - PD
Objekt:	SO 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozčvkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr (spojovací postřík) - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka <p>tl. 40mm, "předpoklad 5% z" celkové plochy objízdné trasy kromě I:3 $0,04 * 0,05 * (9900 + 500 + 200) * 6,5 = 137,800$ [A]</p>				1 041 106,56
9		Ostatní konstrukce a práce					
4	911EC2		<p>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)</p> <p>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)</p> <p>posun stávajících svodidel k ose komunikace a zpět $2 * 60,0 = 120,000$ [A]</p>	M	120,000	710,20	85 224,00
5	911EC3		<p>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>posun stávajících svodidel k ose komunikace a zpět $2 * 60,0 = 120,000$ [A]</p>	M	120,000	742,50	89 100,00
6	91400		<p>DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK</p> <p>zakrytí a následně odkrytí</p> <p>odhad 20=20,000 [A]</p>	KUS	20,000	32,30	646,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čtyřkoly III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-I - PD
 Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	2	Změna oproti PDPS odpočet původního množství -20--20.000 [A] 23.4.-27.4.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 7=7.000 [B] 27.-28.4.2019 Uzávěra I/3 - demolice mostu 26=26.000 [C] 28.4.-21.12.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 0=0.000 [D] Uzávěra I/3 - montáž nosníků 26=26.000 [E] Celkem A+B+C+D+E=59.000 [F]		39,000		1 259,70
			aktuální množství		59,000		1 905,70
7	914232		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a s oupku krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolici B20a-IS11b+IS11c+ostatní 4=6=57=10=77.000 [A] dlouhodobé značení během celé stavby E12-IS11b-B1-B20a-B26-C4c-A1S+E3a-B21a+ostatní 5=11=2+4+2+1+2+2+1=10=40.000 [B] Celkem 77=40=117.000 [C]	KUS	117,000	129,10	15 104,70
	ZBV:	2	Změna oproti PDPS		90,000		11 619,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čtyřkoly III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-1 - PD
 Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odpočet původního množství -117=- 117,000 [A]				
			23.4.-27.4.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 50=50,000 [B] 27.-28.4.2019 Uzávěra I/3 - demolice mostu 79=79,000 [C] 28.4.-21.12.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 0=0,000 [D] Uzávěra I/3 - montáž nosníků 78=78,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=90,000 [F]				
			aktuální množství		207,000		26 723,70
8	914233		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	117,000	129,10	15 104,70
			dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku *krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolici *B20a+IS11b+IS11c-ostatní 4+6-37+10=77,000 [A] *dlouhodobé značení během celé stavby *E12+IS11b-B1-B20a-B26+C4e+A15-F3a+B21a-ostatní 5+11-2+4+2-1+2-2-1-10=40,000 [B] Celkem: 77+40=117,000 [C]				
	ZBV:	2	Změna oproti PDPS		90,000		11 619,90
			odpočet původního množství -117=- 117,000 [A]				
			23.4.-27.4.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 0=0,000 [B] 27.-28.4.2019 Uzávěra I/3 - demolice mostu 79=79,000 [C] 28.4.-21.12.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 0=0,000 [D] Uzávěra I/3 - montáž nosníků 128=128,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=90,000 [F]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čtyřkoly III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-1 - PD
 Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	207.000	26 723,70
9	914239		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL. OCEL. FÓLIE TR 2 - NÁJEMNE dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolicí - předpoklad 2 dny 2*77=154,000 [A] dlouhodobé značení během celé stavby - předpoklad 32 týdnů=224 dny 224*40=8 960,000 [B] Celkem: 154+8960=9 114,000 [C]	KSDEN	9 114,000	10,30	93 874,20
	ZBI:	2	Změna oproti PDPS odpočet původního množství-9114=-9 114,000 [A] 23.4-27.4.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 50*5=250,000 [B] 27.-28.4.2019 Uzávěra I/3 - demolicí mostu 129*1=129,000 [C] 28.4-21.12.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 50*237=11 850,000 [D] Uzávěra I/3 - montáž nosníků 129*1=129,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 244,000 [F]		3 244,000		33 413,20
					aktuální množství	12 358.000	127 287,40
10	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolicí ostatní 8=8,000 [A] dlouhodobé značení během celé stavby IS11a+IP22+IP18b+ostatní 2=1+1=2=6,000 [B] Celkem: 8+6=14,000 [C]	KUS	14,000	129,10	1 807,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čtyřkoly III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-1 - PD
 Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBI:	2	Změna oproti PDPS odpočet původního množství -14=-14,000 [A] 23.4.-27.4.2019 Uzávěra III-1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 1=1,000 [B] 27.-28.4.2019 Uzávěra I/3 - demolice mostu 23=23,000 [C] 28.4.-21.12.2019 Uzávěra III-1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 0=0,000 [D] Uzávěra I/3 - montáž nosníků 24=24,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=34,000 [F]		34,000		4 389,40
			aktuální množství		48,000		6 196,80
11	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolici ostatní 8=8,000 [A] dlouhodobé značení během celé stavby [S1]a+IP22+IP18b=ostatní 2=1-1-2=6,000 [B] Celkem: 8+6=14,000 [C]	KUS	14,000	129,10	1 807,40
	ZBI:	2	Změna oproti PDPS odpočet původního množství -14=-14,000 [A] 23.4.-27.4.2019 Uzávěra III-1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 0=0,000 [B] 27.-28.4.2019 Uzávěra I/3 - demolice mostu 23=23,000 [C] 28.4.-21.12.2019 Uzávěra III-1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 0=0,000 [D] Uzávěra I/3 - montáž nosníků 25=25,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=34,000 [F]		34,000		4 389,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Čtyřkoly III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu cv.č.1096-1 - PD
Objekt:	SO 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	48,000	6 196,80
12	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolici - předpoklad 2 dny 2*8=16,000 [A] dlouhodobé značení během celé stavby - předpoklad 32 týdnů=224 dny 224*6=1 344,000 [B] Celkem: 16+1344=1 360,000 [C]	KSDEN	1 360,000	20,70	28 152,00
	ZBI:	2	Změna oproti PDPS odpočet původního množství -1360=-1 360,000 [A] 23.4.-27.4.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 1*5=5,000 [B] 27.-28.4.2019 Uzávěra I/3 - demolice mostu 24*1=24,000 [C] 28.4.-21.12.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pyšely 1*237=237,000 [D] Uzávěra I/3 - montáž nosníků 24*1=24,000 [E] Celkem: A+B+C D+E=-1 070,000 [F]		-1 070,000		-22 149,00
					aktuální množství	290,000	6 003,00
13	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	213,500	1 200,90	256 392,15



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čtyrkoly III/1096 Čtyrkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-I - PD
 Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'dlouhodobé značení během celé stavby 'V12c (100+100-100+20+24+24+20-100-100+100+100-100+100)*0.125=123,500 [A] 'V12d 180*2/3*0.125=15,000 [B] 'V4c 300*0.25=75,000 [C] Celkem: 123,5+15+75=213,500 [D]				
14	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	213,500	193,70	41 354,95
			VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ 'dlouhodobé značení během celé stavby 'V12c (100+100+100+20+24+24+20-100+100+100+100-100+100-100)*0.125=123,500 [A] 'V12d 180*2/3*0.125=15,000 [B] 'V4c 300*0.25=75,000 [C] Celkem: 123,5+15+75=213,500 [D]				
15	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	129,10	258,20
			Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení 'dlouhodobé značení během celé stavby 'na A15 2=2,000 [A]				
16	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	129,10	258,20
			Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení 'dlouhodobé značení během celé stavby 'na A15 2=2,000 [A]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Čtyřkoly III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-1 - PD
Objekt:	SO 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ Provizorní dopravní značení - kompletní - vč. napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby 'dlouhodobé značení během celé stavby - předpoklad 32 týdnů=224 dnů 224*2=448,000 [A]	KSDEN	448,000	64,60	28 940,80
18	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní - vč. napájení 'krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolici 'na Z4 2=2,000 [A] 'dlouhodobé značení během celé stavby 'na Z2 a Z4 2+4=6,000 [B] Celkem: 2+6=8,000 [C]	KUS	8,000	258,30	2 066,40
19	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní - vč. napájení 'krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolici 'na Z4 2=2,000 [A] 'dlouhodobé značení během celé stavby 'na Z2 a Z4 2+4=6,000 [B] Celkem: 2+6=8,000 [C]	KUS	8,000	258,30	2 066,40
20	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ Provizorní dopravní značení - kompletní - vč. napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	1 348,000	103,30	139 248,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čtyřkoly III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-I - PD
 Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolici - předpoklad 2 dny 2*2=4,000 [A] 'dlouhodobé značení během celé stavby - předpoklad 32 týdnů=224 dní 224*6=1 344,000 [B] Celkem: 4 1344=1 348,000 [C]				
21	916142		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení 'krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolici 'na Z4 2=2,000 [A] 'dlouhodobé značení během celé stavby 'na Z4 4=4,000 [B] Celkem: 2=4=6,000 [C]	KUS	6,000	1 162,20	6 973,20
22	916143		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení 'krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolici 'na Z4 2=2,000 [A] 'dlouhodobé značení během celé stavby 'na Z4 4=4,000 [B] Celkem: 2=4=6,000 [C]	KUS	6,000	1 162,20	6 973,20
23	916149		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	900,000	193,70	174 330,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čtyřkoly III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-1 - PD
 Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demolici - předpoklad 2 čny 2*2=4,000 [A] 'dlouhodobé značení během celé stavby - předpoklad 32 týdnů: 224 dnu 22*4=896,000 [B] Celkem: 4= 896+900,000 [C]				
24	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TRŽ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků 'dlouhodobé značení během celé stavby 2=2,000 [A]	KUS	2,000	129,10	258,20
	ZBV:	2	Změna oproti PDPS odpočet původního množství -2=-2,000 [A]		2,000		258,20
			23.4.-27.4.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pysely 1=1,000 [B] 27.-28.4.2019 Uzávěra I/3 - demolice mostu 1=1,000 [C] 28.4.-21.12.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyřkoly - Pysely 1=1,000 [D] Uzávěra I/3 - montáž nosníků 1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2,000 [F]				
			aktuální množství		4,000		516,40
25	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TRŽ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků 'dlouhodobé značení během celé stavby 2=2,000 [A]	KUS	2,000	129,10	258,20
	ZBV:	2	Změna oproti PDPS		2,000		258,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čtyrkoly III/1096 Čtyrkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-1 - PD
 Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odpočet původního množství -2=-2,000 [A]				
			23.4.-27.4.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyrkoly - Pyšely 1=1,000 [B] 27.-28.4.2019 Uzávěra I/3 - demolice mostu 1=1,000 [C] 28.4.-21.12.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyrkoly - Pyšely 1=1,000 [D] Uzávěra I/3 - montáž nosníků 1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2,000 [F]				
			aktuální množství		4,000		516,40
26	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní včetně patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 'dlouhodobé značení během celé stavby - předpoklad 32 týdnů=224 dny 224*2=448,000 [A]	KSDEN	448,000	15,50	6 944,00
	ZBI:	2	Změna oproti PDPS odpočet původního množství -448=- 448,000 [A]		-202,000		-3 131,00
			23.4.-27.4.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyrkoly - Pyšely 1*5=5,000 [B] 27.-28.4.2019 Uzávěra I/3 - demolice mostu 2*1=2,000 [C] 28.4.-21.12.2019 Uzávěra III/1096 - objízdná trasa ve směru Čtyrkoly - Pyšely 1*237=237,000 [D] Uzávěra I/3 - montáž nosníků 2*1=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E= 202,000 [F]				
			aktuální množství		246,000		3 813,00
27	916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESLUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní	KUS	217,000	129,10	28 014,70



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Čtyrkoly III/1096 Čtyrkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-1 - PD
Objekt:	SO 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			*krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demoliaci Z4a-Z4b 26+26=52,000 [A] *dlouhodobé značení během celé stavby Z4a-Z4b+Z4c 48+116+1=165,000 [B] Celkem: 52+165=217,000 [C]				
28	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní	KUS	217,000	129,10	28 014,70
			*krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demoliaci Z4a-Z4b 26+26=52,000 [A] *dlouhodobé značení během celé stavby Z4a-Z4b+Z4c 48+116+1=165,000 [B] Celkem: 52+165=217,000 [C]				
29	916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	37 064,000	6,50	240 916,00
			*krátkodobé značení při uzavěře sil. I/3 pro demoliaci - předpoklad 2 dny 2*52=104,000 [A] *dlouhodobé značení během celé stavby - předpoklad 32 týdnů 224 dny 224*165=36 960,000 [B] Celkem: 104+36960=37 064,000 [C]				
30	916622		VODICÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM VODICÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	205,000	452,00	92 660,00
			*dlouhodobé značení během celé stavby 205=205,000 [A]				
31	916623		VODICÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	205,000	452,00	92 660,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čtyrkoly III/1096 Čtyrkoly, rekonstrukce mostu ev.č.1096-1 - PD
Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ dlouhodobé značení během celé stavby 205*205,000 [A]				
32	916629		VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNĚ VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNĚ dlouhodobé značení během celé stavby - předpoklad 32 týdnů=224 dnu 224*205=45 920,000 [A]	MDEN	45 920,000	6,50	298 480,00
9			Ostatní konstrukce a práce				1 819 814,20
Celkem:							2 960 244,76

Nabídka

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
ing. Eva Stupková
Název akce:
III/1096 Čtyřkoly, oprava mostu



Předpokladaný termín:

Položka	Množství	M.J	Cena za jednotku	počet	Celkem bez DPH
Vypracování a proojednání PD na DIO a DIR	1	ks	37500	1	37500
Celkem					37 500,00
Celková cena za DIO bez DPH					37 500,00 Kč

Za Quo s.r.o. vypracoval:
Jiří Pejša, vedoucí střediska



ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.

264 01 Sedlčany
držitel ISO 9001:2001

IČO : 61681199 , DIČ : CZ 61681199 , KB Příbram pobočka Sedlčany č.ú. 905030247/0100

V Sedlčanech: 15.8. 2019

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Fetovská 1002/59, 160 00 Praha 6

ing. Eva Stupková

Název akce:

III/1096 Čtyřkoly, oprava mostu

Vypracování a projednání PD na DIO a DIR	1	ks	40000	1	40000
Celková cena za DIO bez DPH					40 000,00 Kč

Zpracoval: **Miroslav Váňa**
vedoucí divize značení

Údržba silnic s.r.o.
Na Červeném Hrádku 294
264 01 Sedlčany

<http://www.udrzbasilnic.eu>

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: stanovení přechodné úpravy provozu - OOP: žádost o povolení uzavírky a o stanovení PÚP, rekonstrukce
ID zprávy: 668144226
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas doručení: 17.4.2019 v 9:25:50

Odesílatel: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov, CZ
ID schránky: cb4bwan
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezdáno
Naše číslo jednací: MUBN/ 45383/2019/VÝST
Naše spisová značka: VÝST/ 8291/2019/TIC
Vaše číslo jednací: Nezdáno
Vaše spisová značka: Nezdáno
K rukám: Nezdáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2.1 čtyřkoly.pdf (691,62 kB)
3.1 čtyřkoly.pdf (941,01 kB)
3.4 čtyřkoly.pdf (534,41 kB)
3.5 čtyřkoly.pdf (460,69 kB)
4.2 čtyřkoly.pdf (498,89 kB)
2019-35088.pdf (173,6 kB)



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel:
fax:
e-mail:

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/45383/2019/VÝST
SPIS. ZNAČKA: VÝST/35088/2019/SEM
VYŘÍZUJÍ: Michaela Šebová - oprávněná úřední osoba
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM: 17.04.2019

Společnost T.A.Q. s.r.o., IČO 288 68 781, Fetrovská č.p. 1002/59, 160 00 Praha 6,
kterou zastupuje Quo s.r.o., IČO 264 87 985, Křížíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen „správní orgán“), věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na základě žádosti, kterou podala společnost

**Společnost T.A.Q. s.r.o., IČO 288 68 781, Fetrovská č.p. 1002/59, 160 00 Praha 6,
kterého zastupuje Quo s.r.o., IČO 264 87 985, Křížíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov**

(dále jen „navrhovatel“), po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“), stanovuje podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

silnice č. II/109, III/1094, III/1095, III/1096 a II/603, místní komunikace ulice Brigádníků a ulice Míru, Čerčany a dále místní komunikace ve Čtyřkolech – podél řeky směr Čerčany/Vysoká Lhota (komunikace navazuje na ulici Míru v Čerčanech), vše v obvodu Obce s rozšířenou působností Benešov.

popis:

Dopravní značení v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/1096, tedy v oblasti mostu č. evidenční 1096-1 ve Čtyřkolech (I. etapa) a dále v souvislosti s uzavírkou silnice č. I/3 v úseku mezi MÚK Senohraby a MÚK Čerčany (II. etapa).

Stránka 1 z 4

www.benesov-city.cz

IČO: 00 231 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.:



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

termín:

23.04.2019 – 21.12.2019

I. etapa (práce na mostě), viz situace DIO 2.1, 4.2

27.04.2019 od 17:00 hod. – 28.04.2019 do 07:00 hod.

II. etapa (demolice mostu, zároveň uzavírka silnice č. I/3, viz situace DIO 3.1, 3.4, 3.5)

Umístění dopravního značení je vyznačeno na situačním plánu, přesné parametry dopravního značení ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušné technické podmínky.

Provedení přechodné úpravy provozu zajistí zmocněnec navrhovatele. **Odpovědná osoba za odbornou realizaci úpravy podle tohoto stanovení (umístění, kontrolu a údržbu) je: Václav Zárybnický (QUO s.r.o., IČO 264 87 985, Křížkova č.p. 2158, 256 01 Benešov), tel.:**

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení a zařízení, popř. užití světelných signálů, musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále dle příslušných platných technických norem. Při jejich umísťování se postupuje podle TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schválených Ministerstvem dopravy pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 dne 31.7.2013 s odchylkami stanovenými TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, schválených Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 dne 12. března 2015.
2. Přechodnou úpravu provozu lze provést nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení uzavírky, resp. rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, dle zvláštního právního předpisu, vydaného příslušným silničním správním úřadem. Pokud stanovení přechodné úpravy provozu spadá do kompetence více správních orgánů, bude značení osazeno nejdříve po jeho stanovení všemi příslušnými správními orgány, aby tvořilo ucelený systém; tímto není dotčena podmínka uvedená v předchozí větě.
3. Pokud pomínou důvody pro provedení přechodné úpravy provozu před stanoveným termínem, bude neprodleně obnovena obecná a místní úprava provozu a tuto skutečnost oznámí odpovědná osoba neprodleně správnímu orgánu.
4. Veškeré dopravní značení a zařízení bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů křižovatek, resp. připojení účelových komunikací a sousedních nemovitostí.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo jiného veřejného zájmu si správní orgán vyhrazuje právo stanovit další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovení změnit.

Odůvodnění

Dne 27.03.2019 podal navrhovatel žádost o stanovení přechodné úpravy provozu, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/1096 – most č. ev. 1096-1 ve Čtyřkolech, z důvodu demolice předmětného mostu a následné rekonstrukce. Návrh přechodné úpravy provozu byl odsouhlasen Policií ČR dne 09.04.2019 a 15.04.2019.



Podrobnosti umístění značení stanovují TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, schválených Ministerstvem dopravy č. j. 21/2015-120-TN/1 dne 12. března 2015. Úpravou se stanovují odlišné povinnosti pro účastníky silničního provozu oproti obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Osazení dopravního značení, jeho kontrolu a udržování, zajišťuje navrhovatel, na jehož žádost je přechodná úprava stanovena.

Správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171 - § 174 správního řádu stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou OOP.

Poučení

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabývá OOP účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat proti OOP opravný prostředek.

Otisk úředního razítka.

Michaela Šebová, v. r.
odborný referent

Toto oznámení **musí být** na úřední desce **vyvěšeno** nejméně po dobu **15 dnů**.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Pisemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha

situace dopravního opatření

Obdrží

zmocněnec navrhovatele (dodejky)

Quo s.r.o., IDDS: 6k8cgy5

vlastník dotčené komunikace (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5

Obec Čerčany, IDDS: k3tbe6v

Obec Čtyřkoly, IDDS: 49hau35

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS:

2dtai5u

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf

na vědomí

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73 (doručováno mailem na adresu

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj (doručováno na adresy

ostatní - formou veřejné vyhlášky (§ 172 odst. 1 správního řádu)

K vyvěšení na úřední desku


Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov

Obecní úřad Čerčany, IDDS: k3tbe6v

Obecní úřad Čtyřkoly, IDDS: 49hau35

Obecní úřady Čerčany a Čtyřkoly se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.




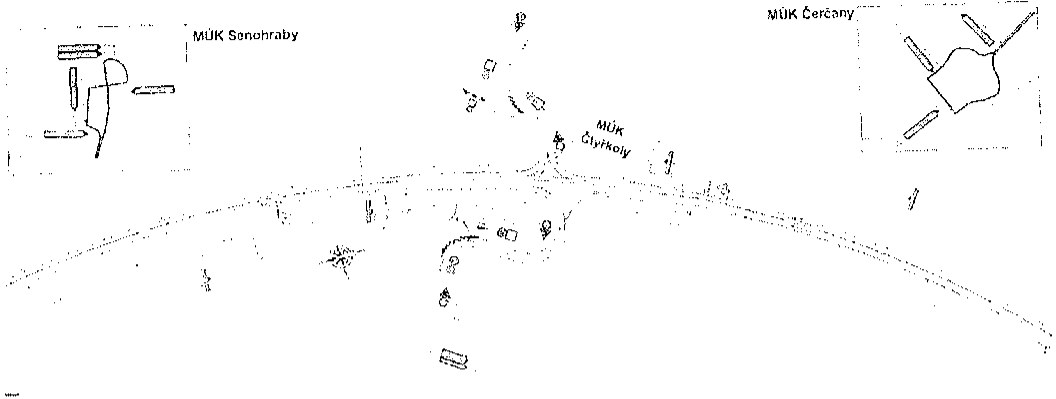


MUK Senohraby

MUK Čerčany

MUK Čtyřkoly


LEGENDA	
□	Obecní územní plán
□	Územní plán
□	Stavba
□	Stavba v plánu
□	Stavba v plánu (stavba v plánu)
□	Stavba v plánu (stavba v plánu)

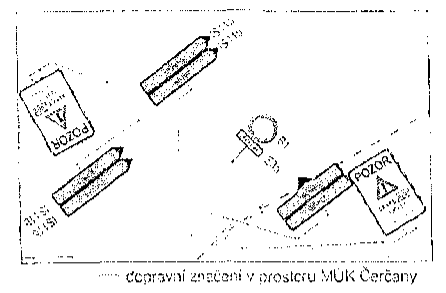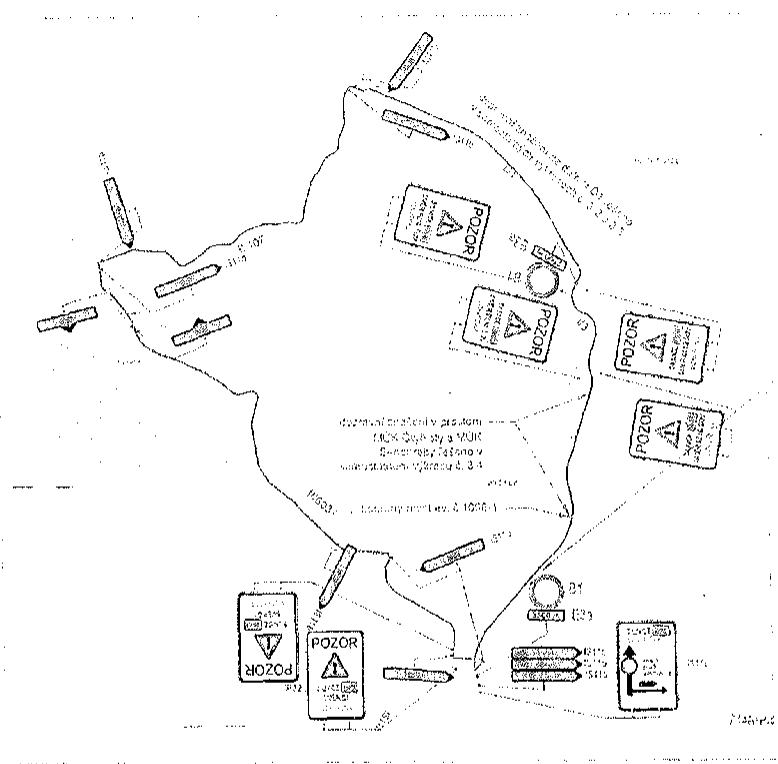


- LEGENDA**
- TRVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 - HAVARŽENÉ PŘECHODNÉ BZ
 - OBJÍZDNÁ TRASA
 - UZAVŘENÝ ÚSEK

Podle úpravy podle Úč. 100/2001 Sb. v znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 133/2004 Sb. v platném znění. Úč. 133/2004 Sb. v platném znění upravuje způsob a postup při uzavírání úseku silnice.

Objekt	Stavba	Objekt	Stavba
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Společnost T.A.Q.		Městská úřadnice Čerčany	
Příspěvková organizace, IČO 00 Praha 9		3.1	
1111086 Čtyřlody		03/2019	
rekonstrukce mostu č. 2, 1026-1		201 x 425	
DIO 1/3 - ETAPA 2 (ÚPLNÁ UZAVÍRKA 1/3)			

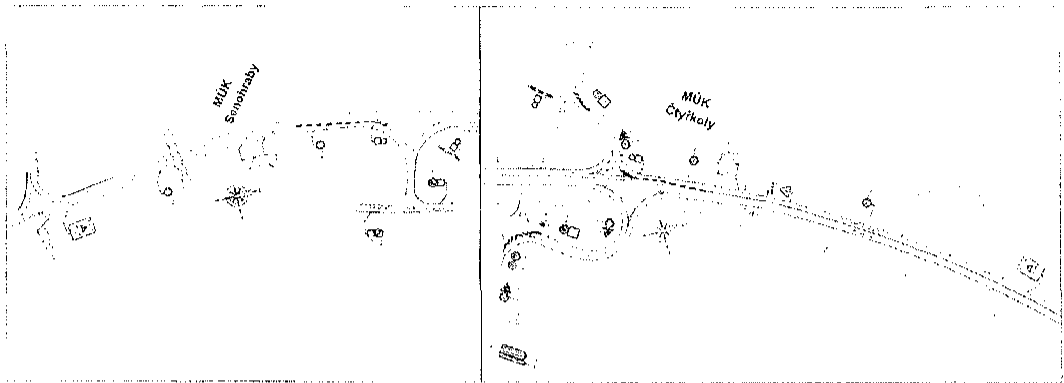

Legend	
	Road width
	Road type
	Road name
	Road number
	Road direction
	Road intersection
	Road junction
	Road roundabout
	Road barrier
	Road sign
	Road lighting
	Road drainage
	Road surface
	Road material
	Road color
	Road texture
	Road pattern
	Road scale
	Road units
	Road notes
	Road title
	Road author
	Road date
	Road version
	Road status
	Road category
	Road class
	Road level
	Road height
	Road depth
	Road width
	Road type
	Road name
	Road number
	Road direction
	Road intersection
	Road junction
	Road roundabout
	Road barrier
	Road sign
	Road lighting
	Road drainage
	Road surface
	Road material
	Road color
	Road texture
	Road pattern
	Road scale
	Road units
	Road notes
	Road title
	Road author
	Road date
	Road version
	Road status
	Road category
	Road class
	Road level
	Road height
	Road depth

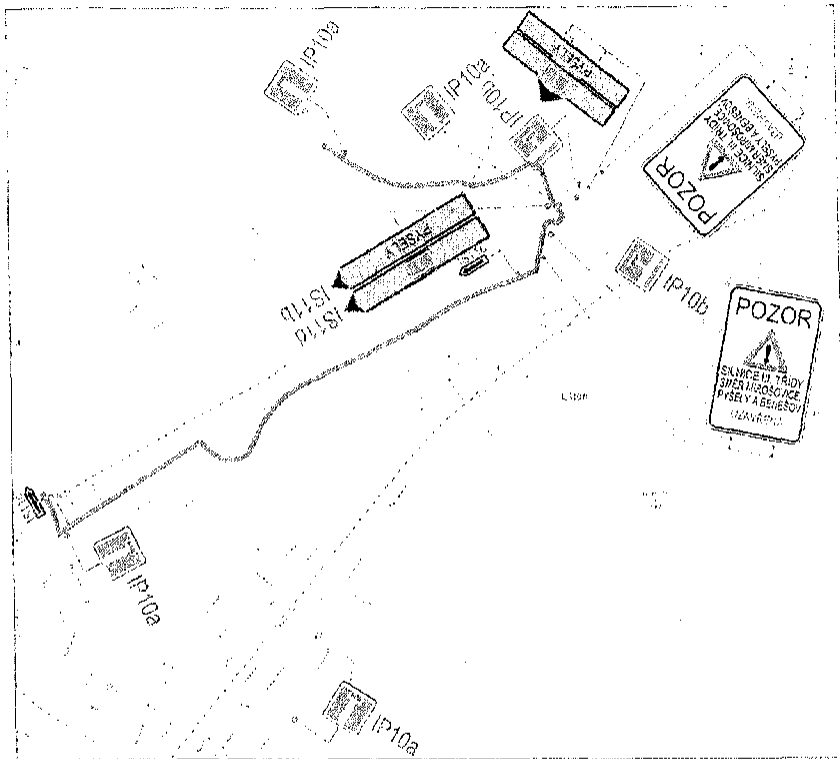


LEGENDA:



- TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NAHRAZEBNÉ PŘECHODNÉ OZ.
- OBLIČOVÁ TRASA

Platnost technického řešení od 15.12.2010 a platnost výkresu: 1:200
 Zpracoval: Ing. Petr Štáhl, Ing. Petr Štáhl, Ing. Petr Štáhl, Ing. Petr Štáhl
 Datum: 15.12.2010, 15.12.2010, 15.12.2010, 15.12.2010

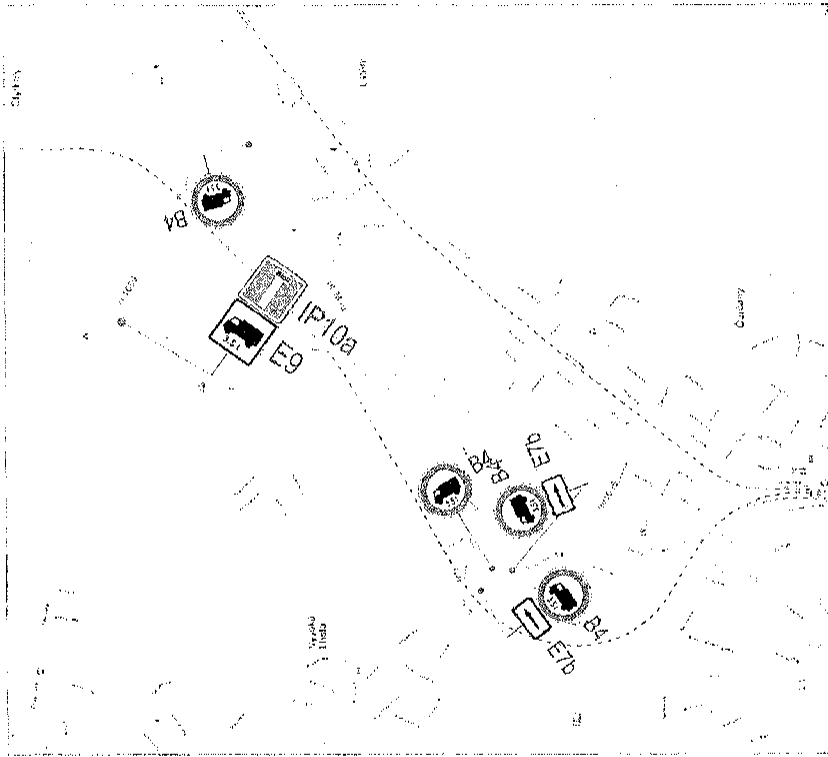
Objekt	Stožár	Číslo
1	J11P.13	1
Společnost T.A.Q. Feng, s.r.o. 100252, 160 00 Praha 6		Projekční a výkresová kancelář
III/1086 Čytkaly rekonstrukce křižovatky č. 1656		3,5
DIO 01 - ETAPA 2 (Čytkaly)		03.2010
		3 A 04



LEGENDA:

-  TRVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  NAVRŽENÉ PŘECHOVNÉ DZ

Číslo a název stavby: ...
 Číslo a název projektu: ...
 Datum: ...

Společnost ST/NOVA	
Společnost T.A.O. Petrovská 1022/2, 158 09 Praha 6	PROJEKANT (STUDIUM)
III/1396 Čtyřkoly rekonstrukce stav. č. 1026-1	4.2
D/D - ETAPA 3 (Čtyřkoly)	02/2015 3.4.15

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: rozhodnutí - povolení uzavírky: žádost o povolení uzavírky a o stanovení PÚP, rekonstrukce mostu Čty
ID zprávy: 668689746
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas doručení: 18.4.2019 v 12:58:31

Odesílatel: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov, CZ
ID schránky: cb4bwan
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MUBN/ 45823/2019/VÝST
Naše spisová značka: VÝST/ 8291/2019/TIC
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2019-35088.pdf (154,73 kB)



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel:
fax:
e-mail:

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/45823/2019/VÝST
SPIS. ZNAČKA: VÝST/35088/2019/SFM
VYŘÍZUJE: Michaela Šebová - oprávněná úřední osoba
TELEFON:
E-MAIL:
DATUM: 18.04.2019
Č. SPR. R.: 227/2019

Společnost T.A.Q. s.r.o., IČO 288 68 781, Fetrovská č.p. 1002/59, 160 00 Praha 6,
kterou zastupuje Quo s.r.o., IČO 264 87 985, Křížkova č.p. 2158, 256 01 Benešov

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ UZAVÍRKY

Výroková část

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 27.03.2019 podala společnost

Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská č.p. 1002/59, 160 00 Praha 6

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR a souhlasu správce komunikace - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“)

I. p o v o l u j e

úplnou uzavírku silnice č. III/1096, ve staničení cca km 2,086 – 2,218, tedy v oblasti mostu č. ev. 1096-1 ve Čtyřkolech, z důvodu demolice a následné rekonstrukce výše uvedeného mostu.

II. n a ř í z u j e o b j í ž d ě k u

v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. tohoto rozhodnutí, se stanovenou objíždňovou trasou:

- **Benešov (I/3) – Pyšely:** po silnici č. I/3 ve směru Mirošovice do MÚK Senohraby a odtud zpět do MÚK Čtyřkoly, odtud na silnici č. III/1096 ve směru Pyšely;
- **Mirošovice (I/3) – Čtyřkoly:** po silnici č. I/3 ve směru Benešov do MÚK Čerčany a odtud zpět do MÚK Čtyřkoly, odtud na silnici č. III/1096 ve směru Čtyřkoly.

Autobusová doprava:

Po dobu uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka „Pyšely,u vily“, jako náhradní zastávka bude „Pyšely,Sokolovna“.



III. Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky

1. Uzavírka se povoluje za účelem demolice a následné rekonstrukce mostu č. ev. 1096-1 ve Čtyřkolech.
2. **Doba trvání uzavírky je stanovena 23.04.2019 – 21.12.2019.**
3. Dopravní značení v místě uzavírky a na trase objížďky se stanovuje dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Městským úřadem Benešov, Odborem výstavby a územního plánování, oddělením silničního správního úřadu dne 17.04.2019 pod č.j. MUBN/45383/2019/VÝST a dále dle stanovení vydaných Krajským úřadem pro Středočeský kraj ze dne 17.04.2019 pod č.j. 043533/2019/KUSK-DOP/Bry a Městským úřadem v Říčanech ze dne 17.04.2019 pod č.j. 111547/2019-MURI/OSAD. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu a zodpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky. Po ukončení uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu.
4. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
5. **V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení akce a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na tel.: , nebo mailem (s potvrzením o doručení) a dále silničnímu správnímu úřadu na e-mail v hlavičce tohoto rozhodnutí.**
6. Žadatel zajistí, aby na začátku uzavírky byla umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena, pokud je doba trvání uzavírky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací.
7. Pracovník odpovědný za dopravní značení: **Václav Zárybnický** (QUO s.r.o., IČO 264 87 985, Křížíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov), tel.:
8. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: **Jan Čikara** (Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská č.p. 1002/59, 160 00 Praha 6), tel.:

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním platném znění (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská č.p. 1002/59, 160 00 Praha 6,
QUO s.r.o., Křížíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov

Odůvodnění

Žadatel podal dne 27.03.2019 žádost o povolení uzavírky komunikace, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

V žádosti je uvedena jako osoba odpovědná za přechodnou úpravu provozu (dopravní značení a zařízení) pověřená osoba zmocněnce žadatele, správní orgán proto zahrnul zmocněnce žadatele do okruhu účastníků řízení se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze správního řádu, konkrétní povinnosti zahrnul do podmínek rozhodnutí v odpovídajícím rozsahu dle obsahu podané žádosti.



Silniční správní úřad oznámil písemností ze dne 03.04.2019 účastníkům řízení zahájení řízení a k projednání žádosti nařídil ústní jednání, které se konalo dne 12.04.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky posoudil a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a po projednání podle § 24 zákona o pozemních komunikacích povolil uzavírku komunikace při použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 000 66 001, Obec Čerčany, IČO 002 31 584, Obec Čtyřkoly, IČO 005 08 519, Obec Senohraby, IČO 002 40 737, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Požadavky uvedené ve vyjádřeních jsou uvedené v podmínkách rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka.

Michaela Šebová, v. r.
odborný referent

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží

zmocněnec žadatele a účastní řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

Quo s.r.o., IDDS: 6k8cgy5



účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 11, 150 00 Praha 5
Obec Čerčany, IDDS: k3tbe6v
Obec Čtyřkoly, IDDS: 49hau35
Obec Senohraby, IDDS: 967b6bm
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Městský úřad Říčany, oddělení dopravy, silniční správní úřad, IDDS: skjbfwd

na vědomí

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj
ČSAD Benešov a.s., IDDS: kyndmj5



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Stanovení PÚP na silnici č. I/3 z důvodu demolice a výstavby mostu ev. č. 1096-1
ID zprávy: 668362072
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas doručení: 18.4.2019 v 6:09:29

Odesílatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ
ID schránky: keebyyf
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: 043533/2019/KUSK
Naše spisová značka: SZ_043532/2019/KUSK/6
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Stanoveni_PUP_na_silnici_I_3_demolice_a_vystavba_mostu_evc_1096_1.pdf (726,88 kB)
2.1.pdf (691,62 kB)
3.1.pdf (941,01 kB)
3.4.pdf (534,41 kB)
4.1.pdf (803,66 kB)

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Číslo jednací: 043533/2019/KUSK-DOP/Bry
Spisová značka: SZ_043532/2019KUSK/6
Značka: DOP/Bry
Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Brychtová
Praha: 17.04.2019

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6 - Dejvice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/3

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o silničním provozu“, na základě návrhu Společnost T.A.Q. s.r.o., sídlo: Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000, IČ: 28868781, obdrženo 27.03.2019,

stanovuje

podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** na silnici č. I/3 v tomto rozsahu:

Místo stanovení: silnice č. I/3 v cca km 0,152 – 5,500 staničení silnice, v úseku křižovatka silnice č. I/3 a dálnice D 1 až křižovatka silnic I/3 a II/603

Důvod stanovení: vyznačení uzavírky a objízdné trasy při demolici mostu ev. č. 1096-1 a jeho následně výstavbě, práce proběhnou při úplné a částečné uzavírce silnice č. I/3

Přechodná úprava provozu: dle situací (dopravně inženýrského opatření), které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení

Platnost stanovení:

1) DIO pro etapu 1 a 3: **23.04.2019 – 21.12.2019** – částečná uzavírka I/3

2) DIO pro etapu 2: **27.04.2019 od (17:00) do 28.04.2019 (07:00)** -- úplná uzavírka I/3

Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž dopravního značení: Quo s.r.o., Benešov, Křížkova 2158, PSČ 256 01, IČ: 264 87 985, kontaktní osoba: Václav Zárybnický, tel.:

Podmínky stanovení:

1. Dopravní značení a zařízení, dále jen „DZ“, musí svým provedením odpovídat zákonu o silničním provozu, vyhlášce č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1, kterou doplňují vzorové listy VL 6.1. DZ, a bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (III. vydání).
2. DZ bude instalováno odbornou firmou.
3. Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž DZ je povinna po celou dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. DZ musí být pravidelně kontrolováno.
4. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací.
5. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna ve vzdálenosti min. 50 m.
6. **DZ, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nikoli přelepeno škrtačí páskou.**
7. Dopravní značení umístěné na silnici č. I/3 bude opatřeno dostatečným počtem podstavců, aby nedocházelo k jejich spadu vlivem nárazového větru.
8. Pohybující se dělníci po komunikacích budou mít ochranný reflexní pracovní oděv, nebo alespoň vestu.

9. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.
10. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírecce, které v předmětné věci vydal zdejší silniční správní úřad.

Odůvodnění

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel 27.03.2019 návrh Společnosti T.A.Q. s.r.o., sídlo: Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000, IČ: 28868781, na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/3. Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při demolici a následné výstavbě mostu ev. č. 1096-1, práce proběhnou za částečné a úplné uzavírky silnice č. I/3 a silnice č. III/1096-1. K návrhu se písemně vyjádřilo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Praha - venkov - JIH, DI, 11.04.2019, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, DI, 09.04.2019 a Ředitelství silnic a dálnic ČR 12.04.2019. Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje návrhu na stanovení přechodné úpravy vyhověl a přechodnou úpravu provozu stanovil, neboť s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu je třeba pracovní místo, uzavírku a objížďku na silnici č. I/3 označit. Návrh dopravního značení rovněž odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost silničního provozu.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/3.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Středočeského kraje.

.....

Ing. Martina Brychtová
odborná referentka silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, rovněž bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí opatření obecné povahy.

Obdrží:

- Společnost T.A.Q. s.r.o., sídlo: Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000, prostřednictvím Quo s.r.o., Benešov, Křížkova 2158, PSČ 256 01, IČ: 6k8cgy5


- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, ID DS: zjq4rhz
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Praha venkov - JIH, DI, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice, ID DS: 2dtai5u
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, DI, K Pazderně 906, 256 01 Benešov, ID DS: 2dtai5u

S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a o zpětné zaslání dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí


- Krajský úřad Středočeského kraje
- Obec Mirošovice
- Obec Poříčí nad Sázavou
- Obec Senohraby
- Obec Čtyřkoly
- Obec Čerčany

Přílohy:


- Dopravně inženýrské opatření
 - 1) DIO I/3 Etapa 2 (úplná uzavírka I/3) – 3.1
 - 2) DIO I/3 Etapa 2 (úplná uzavírka I/3) – 3.4
 - 3) DIO I/3 Etapa 3 – 4.1
 - 4) DIO I/3 Etapa 1 – 2.1





MUK Senohraby



MUK Čerčany

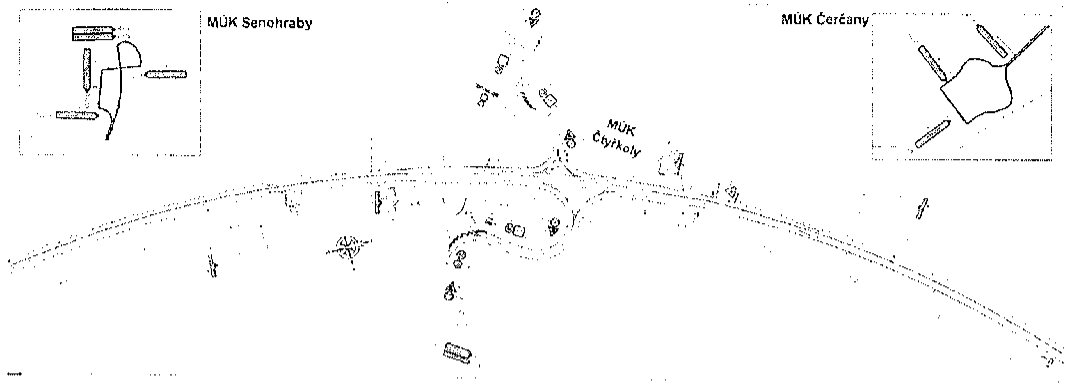

Legenda	Legenda
<ul style="list-style-type: none"> 1. Stavební území 2. Územní vymezení 3. Vnější hranice 4. Vnější hranice 5. Vnější hranice 6. Vnější hranice 7. Vnější hranice 8. Vnější hranice 9. Vnější hranice 10. Vnější hranice 11. Vnější hranice 12. Vnější hranice 13. Vnější hranice 14. Vnější hranice 15. Vnější hranice 16. Vnější hranice 17. Vnější hranice 18. Vnější hranice 19. Vnější hranice 20. Vnější hranice 21. Vnější hranice 22. Vnější hranice 23. Vnější hranice 24. Vnější hranice 25. Vnější hranice 26. Vnější hranice 27. Vnější hranice 28. Vnější hranice 29. Vnější hranice 30. Vnější hranice 31. Vnější hranice 32. Vnější hranice 33. Vnější hranice 34. Vnější hranice 35. Vnější hranice 36. Vnější hranice 37. Vnější hranice 38. Vnější hranice 39. Vnější hranice 40. Vnější hranice 41. Vnější hranice 42. Vnější hranice 43. Vnější hranice 44. Vnější hranice 45. Vnější hranice 46. Vnější hranice 47. Vnější hranice 48. Vnější hranice 49. Vnější hranice 50. Vnější hranice 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Stavební území 2. Územní vymezení 3. Vnější hranice 4. Vnější hranice 5. Vnější hranice 6. Vnější hranice 7. Vnější hranice 8. Vnější hranice 9. Vnější hranice 10. Vnější hranice 11. Vnější hranice 12. Vnější hranice 13. Vnější hranice 14. Vnější hranice 15. Vnější hranice 16. Vnější hranice 17. Vnější hranice 18. Vnější hranice 19. Vnější hranice 20. Vnější hranice 21. Vnější hranice 22. Vnější hranice 23. Vnější hranice 24. Vnější hranice 25. Vnější hranice 26. Vnější hranice 27. Vnější hranice 28. Vnější hranice 29. Vnější hranice 30. Vnější hranice 31. Vnější hranice 32. Vnější hranice 33. Vnější hranice 34. Vnější hranice 35. Vnější hranice 36. Vnější hranice 37. Vnější hranice 38. Vnější hranice 39. Vnější hranice 40. Vnější hranice 41. Vnější hranice 42. Vnější hranice 43. Vnější hranice 44. Vnější hranice 45. Vnější hranice 46. Vnější hranice 47. Vnější hranice 48. Vnější hranice 49. Vnější hranice 50. Vnější hranice

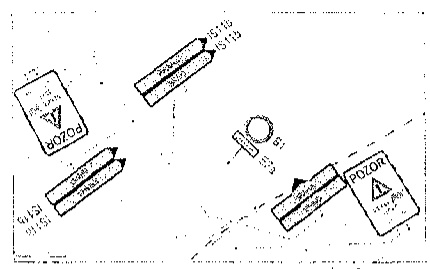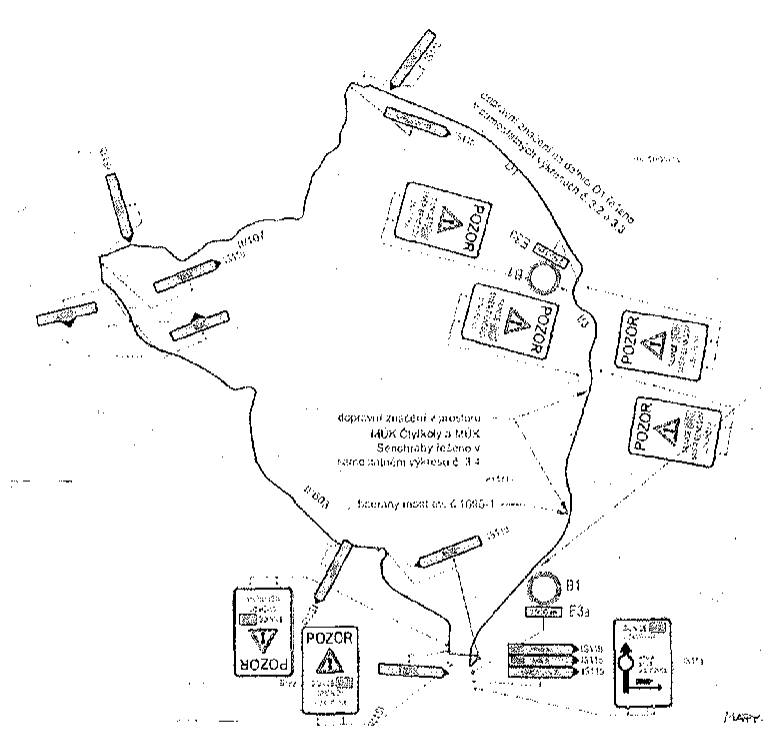


LEGENDA:


- TRVALE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NÁVĚŠTĚ PRŮCHODNÉ DZ
- OBJEKTNÍ TRASA
- UZAVŘENÝ ÚSEK

2.2.4. Názvy, číslo poz. označení, počet a umístění objektů
 2.2.4.1. Názvy, číslo poz. označení, počet a umístění objektů
 2.2.4.2. Názvy, číslo poz. označení, počet a umístění objektů

Stavba číslo	2019/13	
Společnost T.A.O.	Felčická 1802/53, 180 33 Praha 5	VÝČOVÁNÍ A PŘÍLOHY
101/1096 Čtyřkoly	licenční most č. č. 1096-1	3.1
DIO 03 - ETAPA 2 (UPLNÁ UZAVÍRKA 03)		2024.010 2024.026

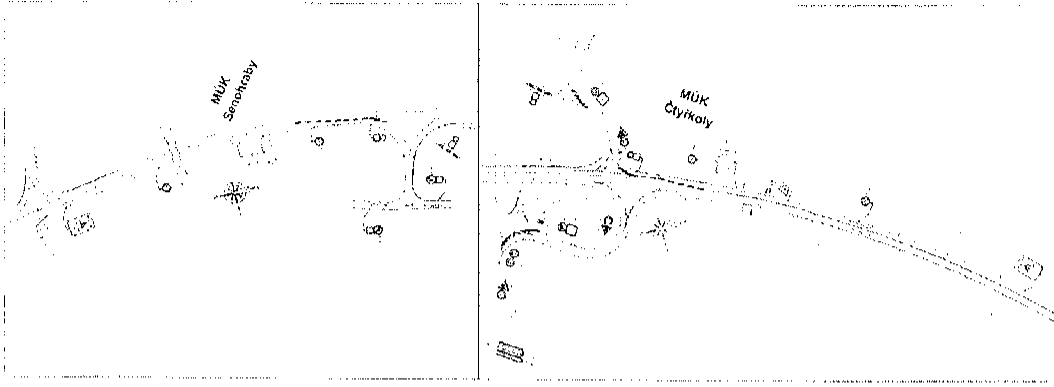

№	Наименование детали	Материал	Изв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

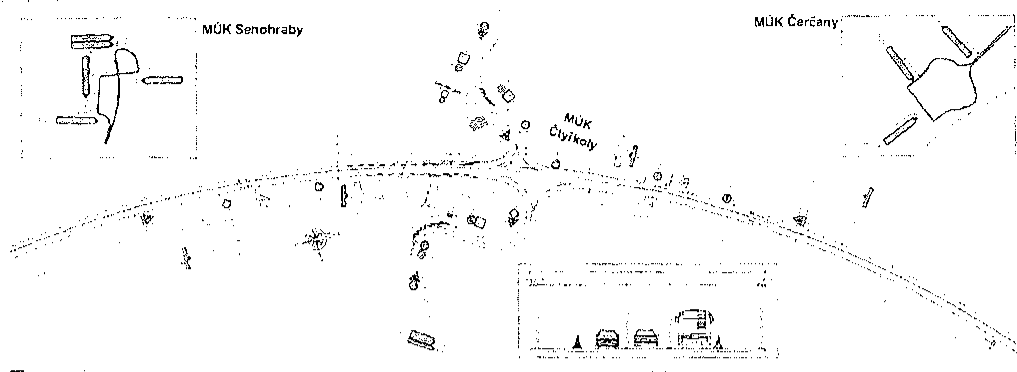

Symbol	Legend
(Symbol)	1. Územní plán
(Symbol)	2. Územní plán
(Symbol)	3. Územní plán
(Symbol)	4. Územní plán
(Symbol)	5. Územní plán
(Symbol)	6. Územní plán
(Symbol)	7. Územní plán
(Symbol)	8. Územní plán
(Symbol)	9. Územní plán
(Symbol)	10. Územní plán
(Symbol)	11. Územní plán
(Symbol)	12. Územní plán
(Symbol)	13. Územní plán
(Symbol)	14. Územní plán
(Symbol)	15. Územní plán
(Symbol)	16. Územní plán
(Symbol)	17. Územní plán
(Symbol)	18. Územní plán
(Symbol)	19. Územní plán
(Symbol)	20. Územní plán
(Symbol)	21. Územní plán
(Symbol)	22. Územní plán
(Symbol)	23. Územní plán
(Symbol)	24. Územní plán
(Symbol)	25. Územní plán
(Symbol)	26. Územní plán
(Symbol)	27. Územní plán
(Symbol)	28. Územní plán
(Symbol)	29. Územní plán
(Symbol)	30. Územní plán
(Symbol)	31. Územní plán
(Symbol)	32. Územní plán
(Symbol)	33. Územní plán
(Symbol)	34. Územní plán
(Symbol)	35. Územní plán
(Symbol)	36. Územní plán
(Symbol)	37. Územní plán
(Symbol)	38. Územní plán
(Symbol)	39. Územní plán
(Symbol)	40. Územní plán
(Symbol)	41. Územní plán
(Symbol)	42. Územní plán
(Symbol)	43. Územní plán
(Symbol)	44. Územní plán
(Symbol)	45. Územní plán
(Symbol)	46. Územní plán
(Symbol)	47. Územní plán
(Symbol)	48. Územní plán
(Symbol)	49. Územní plán
(Symbol)	50. Územní plán
(Symbol)	51. Územní plán
(Symbol)	52. Územní plán
(Symbol)	53. Územní plán
(Symbol)	54. Územní plán
(Symbol)	55. Územní plán
(Symbol)	56. Územní plán
(Symbol)	57. Územní plán
(Symbol)	58. Územní plán
(Symbol)	59. Územní plán
(Symbol)	60. Územní plán
(Symbol)	61. Územní plán
(Symbol)	62. Územní plán
(Symbol)	63. Územní plán
(Symbol)	64. Územní plán
(Symbol)	65. Územní plán
(Symbol)	66. Územní plán
(Symbol)	67. Územní plán
(Symbol)	68. Územní plán
(Symbol)	69. Územní plán
(Symbol)	70. Územní plán
(Symbol)	71. Územní plán
(Symbol)	72. Územní plán
(Symbol)	73. Územní plán
(Symbol)	74. Územní plán
(Symbol)	75. Územní plán
(Symbol)	76. Územní plán
(Symbol)	77. Územní plán
(Symbol)	78. Územní plán
(Symbol)	79. Územní plán
(Symbol)	80. Územní plán
(Symbol)	81. Územní plán
(Symbol)	82. Územní plán
(Symbol)	83. Územní plán
(Symbol)	84. Územní plán
(Symbol)	85. Územní plán
(Symbol)	86. Územní plán
(Symbol)	87. Územní plán
(Symbol)	88. Územní plán
(Symbol)	89. Územní plán
(Symbol)	90. Územní plán
(Symbol)	91. Územní plán
(Symbol)	92. Územní plán
(Symbol)	93. Územní plán
(Symbol)	94. Územní plán
(Symbol)	95. Územní plán
(Symbol)	96. Územní plán
(Symbol)	97. Územní plán
(Symbol)	98. Územní plán
(Symbol)	99. Územní plán
(Symbol)	100. Územní plán

Od: Tomáš Vávra <vavra.tomas@email.cz>
Komu:
Datum: 4.8.2019 17:44
Věc: RE: Čtyřkoly - návrh ZBV 2 SO 181 DIO
Kopie:

Dobrý den,

S předloženým ZBV 2 souhlasím.

S pozdravem Ing. Tomáš Vávra

From
Sent: Thursday, August 1, 2019 5:36 PM
To:
Cc:
Subject: Čtyřkoly - návrh ZBV 2 SO 181 DIO

Dobrý den,

v příloze zasilám návrh ZBV č. 2, SO 181 na stavbu III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1 a žádám o Vaše stanovisko.

Do ZBV budou dodatečně doplněny přílohy - tři nabídky na vypracování DIO a žádost o změnu rozsahu díla.

Pane Pohunek, prosím o zaslání „žádosti“ !
děkuji

S pozdravem
Ing. Eva Štupková

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Sídlo:
Fetrovská 1002/59 | Praha 6 | 160 00
IČO: 28868781 | DIČ: CZ28868781

www.taq.cz |

Tato zpráva a všechny připojené soubory mohou obsahovat chráněné informace, považované právními předpisy za tajné. Zpráva je určena pouze pro zamýšleného adresáta. V případě že omylem obdržíte tuto zprávu, informujte prosím jejího odesílatele pomocí odpovědi na tento e-mail a smažte zprávu i příložené soubory. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nesmíte tuto zprávu jakkoliv užit, zpřístupnit, rozšiřovat, anebo z ní pořizovat kopie nebo tisky.

Z této emailové zprávy nevzniká osobě/osobám, jejichž jménem byla odeslána (odesílatel), žádný závazek v souvislosti s uvedeným předmětem zprávy. Tato zpráva není ze strany odesílatele příslibem ani nabídkou k uzavření jakékoliv smlouvy, změny stávajícího právního vztahu či protinávrhem na jeho změnu, doplnění, pokud tak ve zprávě nebo jejích přílohách není výslovně uvedeno. Odesílatel výslovně trvá na uzavření jakýchkoliv

právních vztahů pouze písemnou formou s tím, že veškeré smluvní vztahy odesílatele, včetně jejich změn, musí být uzavřeny písemně s podpisy všech účastníků resp. jejich statutárních orgánů (popřípadě jejich zmocněnců na základě písemné plné moci) na téže listině. Jakákoliv jiná forma uzavření smluvního vztahu, zejména ústní, elektronická atd. se výslovně vylučuje.



Posuďte prosím, zda je nezbytné tento dokument tisknout!



Bez virů www.avq.com



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Technická 1/150 21 Praha 5
Zápis: 054 11
IČ: 00066001

Společnost Čtyřkoly most

zastoupená vedoucím společníkem:

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00
Praha 1
IČ: 62242105

druhý společník:

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Naše spisová značka:

číslo jednací:

Vyřizuje:
S. Pohunek

Datum
2.8.2019

III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 2017/00066001/2018, odst. 6.6 Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v:

„Oproti uvažovanému DIR v projektové dokumentaci ve stupni PDPS bylo před zahájením stavby DIR nutné měnit dle aktuální situace a požadavků třetích stran. DIR bylo opakovaně měněno a projednáváno tak, aby byl zajištěn plynulý provoz při uzavírce mostu a na objízdných trasách.“



***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Tyto změny vznikly z nepředvidaných důvodů po zahájení stavby. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

Položky jsou podle čl. 2.8 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 6. 3. 2017 zařazený do Skupiny 3.

Stanislav Pohunek
mostní technik, oblast Benešov
