



## Dodatek č. 10

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801564  
Evidenční číslo Dodatku č.10: DS201901124  
Agendové číslo Dodatku č.10: DS201801564/10  
na provedení stavebních prací

projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň  
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“

reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

**CZ.05.5.18/0.0/0.0./17\_070/0006796**

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

---

### 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o**  
PSC, sídlo: 460 07 Liberec 3, Hanychovská 832/37  
zastoupený: Ing. Martinem Stašákem, na základě plné moci  
Ing. Jaroslavem Koškem, na základě plné moci  
IČO: 47781874  
DIČ: CZ47781874  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Holemý, hl. stavbyvedoucí  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C/3922

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## **2. Preambule**

**2.1** Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801564, dne 11.2.2019 Dodatek č. 1, dne 4.7.2019 Dodatky č. 2,3,4 dne 7.8.2019 Dodatky č. 5,6, a Dodatky č. 7, 8, 9 dne 13.8.2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň**“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy:

**a) „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**, jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.

**b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“**, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

## **3. Předmět dodatku č. 10**

Předmětem tohoto Dodatku č. 10 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo DS201801564 ze dne 26.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.2.2019, Dodatku č. 2, 3 a 4 ze dne 4.7.2019, Dodatku č. 5, 6 ze dne 7.8.2019 a Dodatku č. 7, 8, 9 ze dne 13.8.2019.

Předmětem tohoto dodatku č. 10 je navýšení ceny díla.

3.1 S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3.2 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3.3 Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

## **4. Cena díla a platební podmínky**

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečně nepředvídatelné stavební práce akce „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I.**

**stupeň – stavební práce“**, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 10 ve Změnových listech č. 49 až 55.

**4.1.1. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 679 349,62 Kč bez DPH.**

Objem víceprací bez DPH:	778 452,60 Kč
Objem méněprací bez DPH:	99 102,98 Kč
<b>Celkový objem víceprací bez DPH:</b>	<b>679 349,62 Kč</b>
1. Původní cena díla projektu IPRÚ:	
Cena díla bez DPH	44 221 224,43 Kč
Cena díla včetně DPH	53 507 681,56 Kč
2. Původní cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	14 007 262,93 Kč
Cena díla včetně DPH	16 948 788,15 Kč
1. Nová cena díla projektu IPRÚ	
Cena díla bez DPH	44 728 954,23 Kč
Cena díla včetně DPH	54 122 034,62 Kč
2. Nová cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	14 178 882,75 Kč
Cena díla včetně DPH	17 156 448,13 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	<b>58 228 487,36 Kč</b>
Původní celková cena díla včetně DPH:	<b>70 456 469,71 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>58 907 836,98 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>71 278 482,75 Kč</b>

## **5. Všeobecná ustanovení**

- 5.1 Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 10 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- 5.6 Dodatek č. 10 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Tento dodatek č. 10 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 804/2019 ze dne 27.8.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – ZL č. 49 až 55

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne .....

V Liberci dne .....

.....  
Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....  
Ing. Martin Stašák, na základě plné moci

.....  
Ing. Jaroslav Košek, na základě plné moci

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 49.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 31.7.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** nepředvídatelná okolnost – vyztužení kleneb ve 4.NP

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388


Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

#### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- dle zápisu statika je nutné vyztužit cihelné klenby u výtahové šachty ve 4.NP

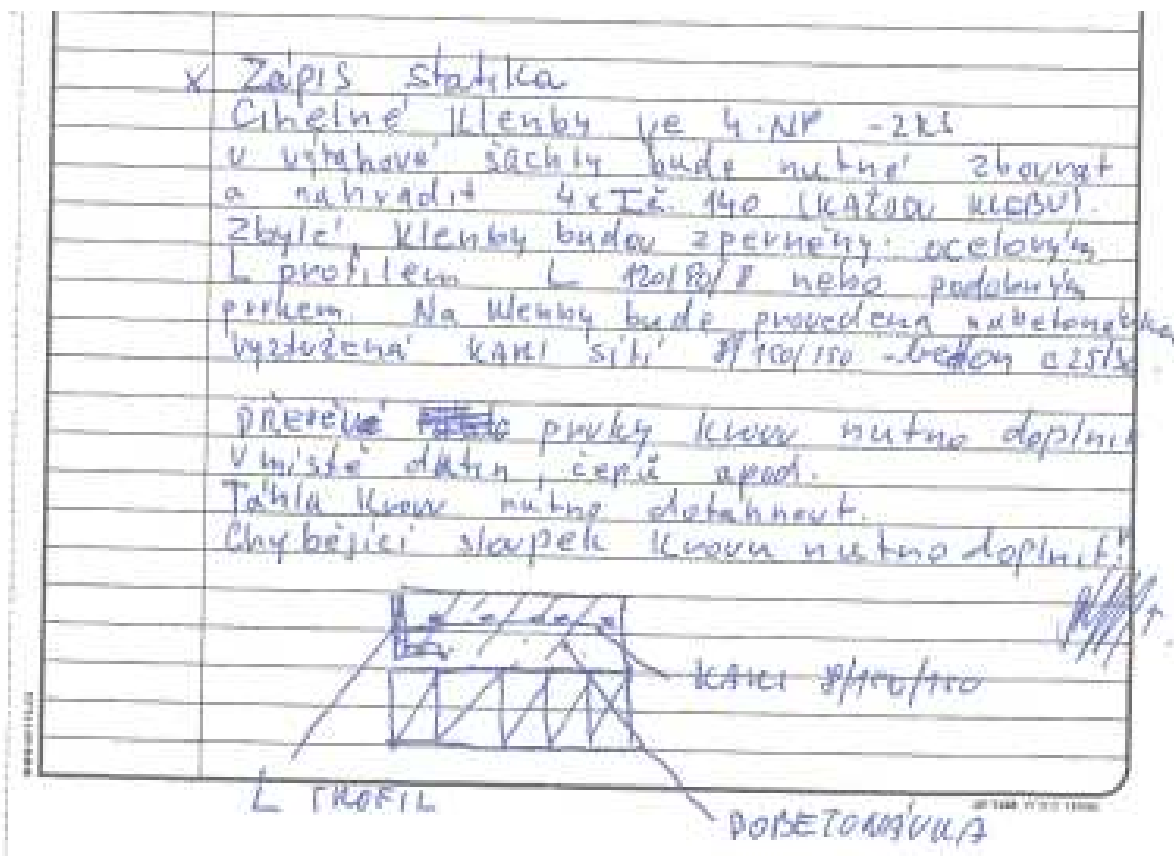

EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

## REKAPITULACE:

Vícepráce: + 77 689,06 Kč bez DPH

### 49: Ztužení cihelných kleneb

77 689,06

#### 4: Vodorovné konstrukce

9 780,63

25.	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek - hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	3,12	3 041,87	9 490,63
32.	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), - s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových / sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu	t	0,01	29 000,00	290,00

#### 6.1.: Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 620,48

75.	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu - vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	3,12	1 160,41	3 620,48
-----	-----------	--	----	------	----------	----------

#### 6.2.: Přesun sutě

11 402,33

106.	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	5,616	796,00	4 470,34
109.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,616	213,85	1 200,98
110.	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	78,624	9,32	732,78
112.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	5,616	890,00	4 998,24

#### 6.3.: Přesun hmot

2 143,09

113.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	7,655	279,96	2 143,09
------	-----------	--	---	-------	--------	----------



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**767: Konstrukce zámečnické**

**48 242,52**

279.	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	500,5	51,76	25 903,68
282.	1301082-R	ocel profilová	t	0,541	40 000,00	21 621,60
286.	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,541	1 325,77	717,24

**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**

**2 500,00**

596.	X138	Statický návrh	ks	1,0	2 500,00	2 500,00
------	------	----------------	----	-----	----------	----------

**VLIV NA CENU: + 77 689,06 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 31.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.**

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 31.7.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 31.7.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 50.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 1.8.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: nepředvídatelné okolnosti - sněhové zábrany

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- dle výkazu výměr se měly měnit všechny sněhové zábrany. Zábrany byly odborně posouzeny a vyměnit je třeba jen 50ks zábran, které jsou poškozené, u ostatní zábran bude provedeno očištění a nátěr.

### REKAPITULACE:

Vícepráce: - 11 616,97 Kč bez DPH

**50: Sněhové zábrany**

**-11 616,97**

**764: Konstrukce klempířské**

**-32 716,97**

516.	76421365 7	Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou	kus	- 211,0	155,06	-32 716,97
------	---------------	--	-----	---------	--------	------------

**783: Nátěry**

**21 100,00**

597.	X139	Nátěr sněhových zábran	kus	211,0	100,00	21 100,00
------	------	------------------------	-----	-------	--------	-----------

VLIV NA CENU: - 11 616,97 Kč bez DPH

### ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 1.8.2019



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE:** 1.8.2019

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** Jiří Šnajdr

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.**

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 51.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 1.8.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** nepředvídatelné okolnosti - odpočet pozednic a nastavení vaznic

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- dle projektové dokumentace a výkazu výměr se měla horní pozednice odstranit a nahradit novou. Dle mykologického průzkumu, který je přílohou tohoto změnového listu, se odstranit nemusí, jedná se o méněpráce.
- Dále na 3 místech střešní vazby bude provedeno odstranění a nová dodávka a montáž uhnílych vaznic, jedná se o vícepráce.

### REKAPITULACE:

**Vícepráce: - 87 486,01 Kč bez DPH**

**51: Odpočet pozednic**

**-87 486,01**

**762: Konstrukce tesařské**

**-87 486,01**

503.	76233192 3	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm <sup>2</sup> , - délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	- 204,1	108,69	<b>-22 183,63</b>
506.	76233292 2	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), - průřezové plochy přes 120 do 224 cm <sup>2</sup>	m	- 204,1	376,18	<b>-76 778,04</b>
508.	99876210 3	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	- 2,782	1 455,55	<b>-4 049,34</b>
600.	X141	Nastavení vaznic	ks	3,0	5 175,00	15 525,00



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: - 87 486,01 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Jiří Šnajdr**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 52.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 1.8.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: chyba projektové dokumentace – ve výkazu výměr chybí nové hřebenáče

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- dle projektové dokumentace se má instalovat kompletně nový hromosvod, ale ve výkazu výměr chybí instalace nových hřebenáčů, které je nutno vyměnit z důvodu montáže nového hromosvodu.

### REKAPITULACE:

Vícepráce: 185 246,21 Kč bez DPH

#### 52: Nové hřebenáče

185 246,21

#### 6.2.: Přesun sutě

868,98

106.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,428	796,00	340,69
109.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,428	213,85	91,53
110.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,992	9,32	55,85
112.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,428	890,00	380,92

#### 764: Konstrukce klempířské

184 377,22

598.	X140	D + M hřebenáče	m	229,0	747,50	171 177,50
599.	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	229,0	57,64	13 199,72



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: 185 246,21 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Jiří Šnajdr**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: FS Vision, s.r.o.**

**Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec “**

**Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006796**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 53.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 2.8.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** nepředvídatelné okolnosti - nové svody

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: FS Vision, s.r.o.**

**Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec “**

**Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006796**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- dle projektové dokumentace se předpokládalo použití stávajících svodů, ale tyto svody jsou uhnílé, proto dojde k výměně na nové měděné, do výšky 3m budou plastové

**REKAPITULACE:**

**Vícepráce: 171 619,82 Kč bez DPH**

**53: Nové svody**

**171 619,82**

**6.2.: Přesun sutě**

**1 360,32**

106.	9970131 15	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,67	796,00	533,32
109.	9970135 01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,67	213,85	143,28
110.	9970135 09	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,38	9,32	87,42
112.	9970138 31	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,67	890,00	596,30

**6.3.: Přesun hmot**

**124,58**

113.	9980110 03	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	0,445	279,96	124,58
------	---------------	--	---	-------	--------	--------

**764: Konstrukce klempířské**

**170 134,91**

100.	7640048 63	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	- 90,0	100,81	-9 072,90
109.	9987641 03	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,445	1 949,72	867,63
110.	9987641 81	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,445	992,59	441,70
601.	7640048 61	Demontáž svodu do suti	m	170,0	55,38	9 414,65
602.	7645384 23	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	120,0	1 212,37	145 483,83
603.	X142	Plastový svod	m	50,0	460,00	23 000,00



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: FS Vision, s.r.o.**

**Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec “**

**Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006796**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: 171 619,82 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: FS Vision, s.r.o.**

**Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec “**

**Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006796**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Jiří Šnajdr**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Martin Sehnoutka**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 54.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 1.8.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** nepředvídatelné okolnosti - nová střecha nad vikýři

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program





**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**54: Střecha nad vikýři**

**286 955,71**

**712: Povlakové krytiny**

**8 065,64**

119.	71233 1101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	181,5	16,00	2 904,00
120.	62811 1200	pás asfaltovaný A330 H	m2	208,725	24,00	5 009,40
121.	99871 2103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,134	1 136,14	152,24

**762: Konstrukce tesařské**

**109 902,13**

158.	76233 2932	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové - plochy přes 120 do 224 cm2	m	135,0	233,76	31 557,60
161.	60512 0110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	2,138	6 650,00	14 220,36
163.	76234 1210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	181,5	115,00	20 872,50
164.	60515 1110. 1	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	4,792	6 600,00	31 624,56
168.	76239 5000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, - pásová ocel, vruty	m3	6,93	843,32	5 844,21
183.	99876 2103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,973	1 455,55	5 782,90

**764: Konstrukce klempířské**

**168 987,94**

220.	76412 1452	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 4 do - 10 ks/m2 do 30 st.	m2	181,5	1 125,23	204 229,25
227.	99876 4103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,543	1 949,72	1 058,70
512.	7641- 101	Překotvení stávající krytiny hliníkovými šrouby	m2	- 181,5	200,00	-36 300,00



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: 286 955,71 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Jiří Šnajdr**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 55.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 1.8.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** chyba projektové dokumentace a nepředvídatelné okolnosti - změny potrubí ÚT

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

55a – rozvod topení nelze vést rovně z důvodu překážky (traverzy), cesta je vedena dle zakreslení

55b – metry potrubí ve výkazu výměr neodpovídají skutečnosti, jsou počítány pouze pro levé radiátory, ale v PD jsou pravé radiátory, proto je více metrů potrubí

### REKAPITULACE:

**Vícepráce: 56 941,80 Kč bez DPH**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**


**Umístění: Liberec**

**Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018**

**Smlouva objednatele č.: DS201801564**

**PŮDORYS 4.NP**

**TYPICKÝ DETAIL DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY M:1:50:**

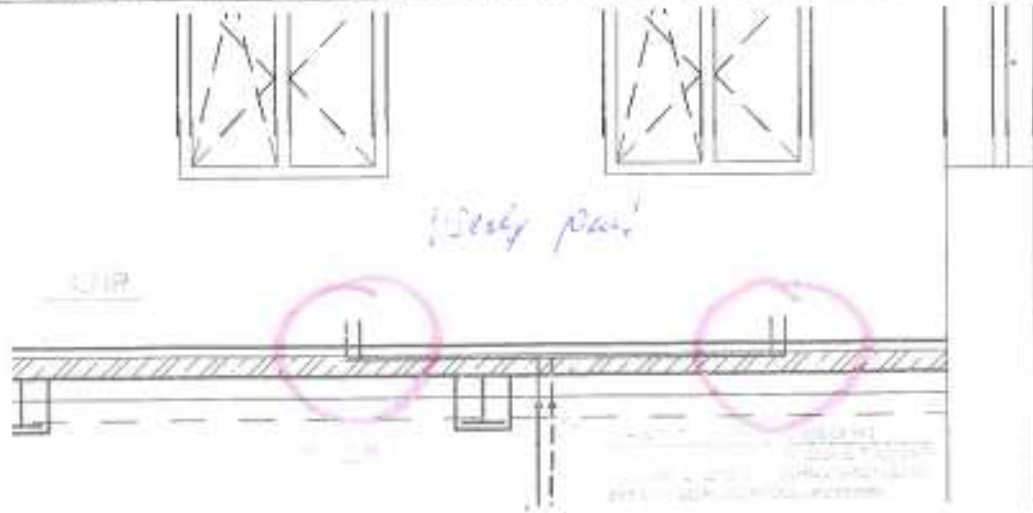

**TYPICKÝ DETAIL NAPOJENÍ  
OTOPNÉHO TĚLESA M:1:50:**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**


**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

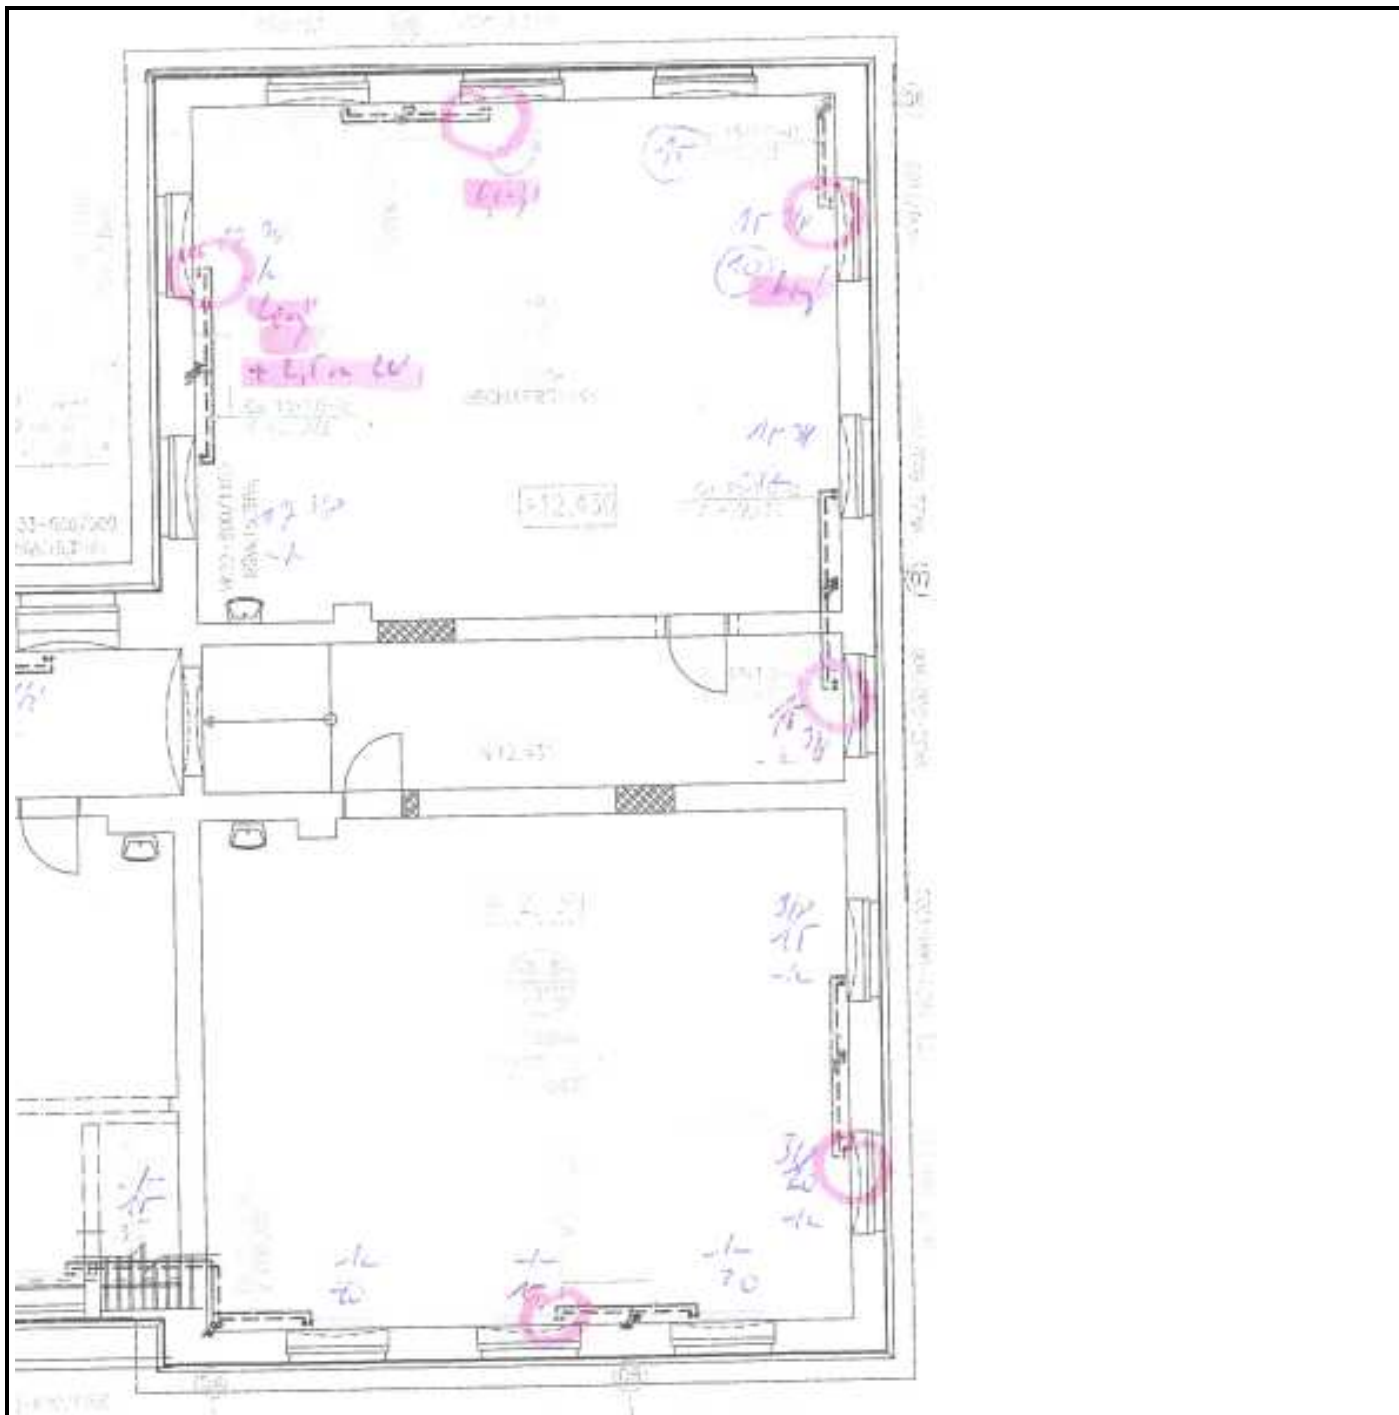

**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

**55a: ÚT obcházení ŽB stropu** **24 804,12**

**733.3: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí** **22 418,10**

17.	R000000017	dtto 18x1,0	m	57,0	349,60	19 927,20
20.	R000000020	Příplatek k potrubí měděnému za vedení v konstrukci podlahy- koordinace se zhotovitelem stavební - části	m	28,5	87,40	2 490,90

**733.4: Ústřední vytápění - tepelné izolace** **2 386,02**

23.	R000000023	dtto Č18mm, tl. 13 mm	m	57,0	41,86	2 386,02
-----	------------	-----------------------	---	------	-------	----------

**55b: Připojovací potrubí k OT** **32 137,68**

**733.3: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí** **28 069,20**

18.	R000000018	dtto 15x1,0	m	72,0	302,45	21 776,40
20.	R000000020	Příplatek k potrubí měděnému za vedení v konstrukci podlahy- koordinace se zhotovitelem stavební - části	m	72,0	87,40	6 292,80

**733.4: Ústřední vytápění - tepelné izolace** **2 868,48**

24.	R000000024	dtto Č15mm, tl. 13 mm	m	72,0	39,84	2 868,48
-----	------------	-----------------------	---	------	-------	----------

**735.3: Ostatní** **1 200,00**

38.	R000000038	Přesuny hmot	ks	0,3	4 000,00	1 200,00
-----	------------	--------------	----	-----	----------	----------

**VLIV NA CENU: 56 941,80 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Jiří Šnajdr**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 1.8.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program
