



KUJCP010X2H5

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/061/19/1

Č. smlouvy zhotovitele: S20-017-0032

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č.ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 470

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s.r.o.
se sídlem: Rudolfovska č.p. 64, č. or. 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michael Šmucem, jednatelem společnosti
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michael Šmucr

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Odpovědný geodet: GEO CB, Ing. Josef Bušek

tel. č. 

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zbyněk Soukup, stavbyvedoucí

tel. č. 

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Michael Řepa, vedoucí stavby

tel. č. 

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka

tel. č. 

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Oprava komunikací SFDI 2019 – okres Český Krumlov“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/061/19 ze dne 27. 6. 2019 s názvem „Oprava komunikací SFDI 2019 – okres Český Krumlov“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2019, takto:

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	34 925 791,68 Kč
DPH 21 % Kč	7 334 416,25 Kč
Celkem včetně DPH	42 260 207,93 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	32 600 155,83 Kč
DPH 21 % Kč	6 846 032,72 Kč
Celkem včetně DPH	39 446 188,55 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 27. 8. 2019 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 994/2019/RK-76 ze dne 5. 9. 2019.

V Českých Budějovicích dne 23.9.2019

za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne 9.9.2019

za zhotovitele:



Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Příloha: změnový list č. 1



 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavba: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/061/19

Úsek:

č. smlouvy zhotovitele: S20-017-0032

- 1 Oprava silnice II/162 křiž. s III/1605 - Veleslavice
- 2 Oprava silnice III/1436 Brloh - U Hemmra
- 3 Oprava silnice III/1572 Omlenička
- 4 Oprava silnice III/1622 Větrná - Lomský rybník a Čertova stěna
- 5 Oprava silnice III/16316 Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: Inbest spol. s r.o.

Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Projektant: Miroslav Řepa, ČKAIT 0101609

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny:

- | | |
|---|--|
| 1 Oprava silnice II/162 křiž. s III/1605 - Veleslavice: | změna technologie provádění
zřízení krajnic dle požadavku SÚS |
| 2 Oprava silnice III/1436 Brloh - U Hemmra: | neprováděné práce |
| 3 Oprava silnice III/1572 Omlenička: | neprováděné práce
obnova skrytých kanalizačních šachet |
| 4 Oprava silnice III/1622 Větrná - Lomský rybník a Čertova stěna: | neprováděné práce |
| 5 Oprava silnice III/16316 Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň: | neprováděné práce |

Dotčené místo: Veleslavice, Brloh, Omlenička, Větrná, Přední Výtoň

Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6

Návrh ocenění:

1 Oprava silnice II/162 křiž. s III/1605 - Veleslavice	-1 248 966,74 Kč
2 Oprava silnice III/1436 Brloh - U Hemmra	-115 648,76 Kč
3 Oprava silnice III/1572 Omlenička	-421 377,00 Kč
4 Oprava silnice III/1622 Větrná - Lomský rybník a Čertova stěna	-108 408,42 Kč
5 Oprava silnice III/16316 Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň	-431 234,93 Kč

Celkem bez DPH -2 325 635,85 Kč

DPH -488 383,53 Kč

Celkem -2 814 019,38 Kč

inbest

SWIETELSKY ⑧

Podpis návrhovatele

Datum: 24. 8. 2019

Vyjádření: dáváme stavbám řád

TDI: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. datum: 24. 8. 2019 podpis:

závod ČESKÝ KRUMLOV

Projektant: Domoradice 127, 381 01 Č. Krumlov datum: 24. 8. 2019 podpis:

IČO: 709 71 641 ①

Investor : datum: 24. 8. 2019 podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č. 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: Oprava silnice II/162 křiž. s II/1605 - Vetelavice, SO 101 Oprava silnice II/162 staničení 3,428 - 4,165 km

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	23.7.2019	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	frézování pouze ohrusné vrstvy v tl. 60 mm	na základě výsledků laboratorních zkoušek podkladních asf. vrstev došlo ke změně tl. frézované vrstvy ze 140 mm na 60 mm	
2	23.7.2019	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM	dle skutečného množství dle pol. 11372A	dle skutečného množství dle pol. 11372A	
3	23.7.2019	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	nebyly prováděny lokální opravy na podkladních asf. vrstvách	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - nečerpáno	
4	23.7.2019	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM	nebyly prováděny lokální opravy na podkladních asf. vrstvách	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - nečerpáno	
5	23.7.2019	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	nebyly prováděny lokální opravy na podkladních asf. vrstvách	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - nečerpáno	
6	23.7.2019	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	nebyly prováděny lokální opravy na podkladních asf. vrstvách	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - nečerpáno	
9	25.7.2019	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	instalace skelné mříže byla provedena v místech určených TDI	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - čerpáno částečně	
15		56961N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	bylo provedeno zpevnění krajnic z recyklovaného mat. v délce 2x737 m, šířce 0,25 m	Požadavek SÚS JČK nad rámec VV	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov		Registrační číslo projektu:										
Číslo a název objektu: Oprava silnice II/162 kříž. s II/1605 - Veleslavice, SO 101 Oprava silnice II/162 staničení 3,428 - 4,165 km												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
1	23.7.2019	72681	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	650,034	278,586	-371,448	940,98	611 668,99	262 143,85	-349 525,14
2	23.7.2019	72681	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM	t	1 560,082	668,607	-891,475	-100,00	-156 008,20	-66 860,70	89 147,50
3	23.7.2019	72682	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	965,470	0,000	-965,470	940,98	908 487,96	0,00	-908 487,96
4	23.7.2019	72682	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM	t	2 317,128	0,000	-2 317,128	-100,00	-231 712,80	0,00	231 712,80
5	23.7.2019	72682	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	1 665,620	0,000	-1 665,620	17,68	29 448,16	0,00	-29 448,16
6	23.7.2019	72682	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	1 665,620	0,000	-1 665,620	140,36	233 786,42	0,00	-233 786,42
9	25.7.2019	72684	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY	m2	3 969,482	2 948,000	-1 021,482	65,57	260 278,93	193 300,36	-66 978,57
15			56961N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM	m2	0,000	368,500	368,500	49,93	0,00	18 399,21	18 399,21
											-1 248 966,74	


Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis
SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Michael Řepa	

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	
INBEST spol. s r.o., Ing. Martin Frdlík	
projektant/AD	
Miroslav Řepa, ČKAIT 0101609	
zadavatel/objednatel	
Jihočeský kraj	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:
Schválil:	podpis:

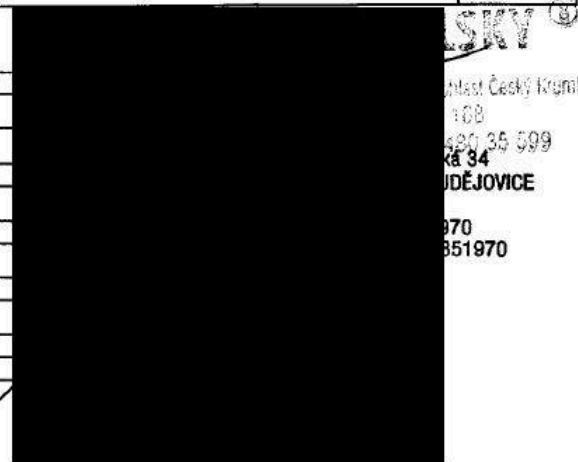

Změnový list č. 2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/1436 Brloh - U Hemmra

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
		SO 101	Oprava silnice III/1436 staničení 0,000-0,300 km			
4	10.7.2019	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	nebylo prováděno drcení hrubozrného materiálu	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - nečerpáno	
13	12.7.2019	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	nebyla prováděna výšková úprava obrubníků	nebyla potřeba	
		SO 102	Oprava silnice III/1436 staničení 2,350-2,765 km			
1	10.7.2019	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	nebylo prováděno drcení hrubozrného materiálu	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - nečerpáno	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 2 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/1436 Brloh - U Hemmra

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
			SO 101	Oprava silnice III/1436 staničení 0,000-0,300 km								
4	10.7.2019		12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	m3	49,500	0,000	-49,500	477,28	23 625,36	0,00	-23 625,36
13	12.7.2019		91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	115,000	0,000	-115,000	579,31	66 620,65	0,00	-66 620,65
			SO 102	Oprava silnice III/1436 staničení 2,350-2,765 km								
1	10.7.2019		12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	m3	53,224	0,000	-53,224	477,28	25 402,75	0,00	-25 402,75
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:											-115 648,76	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby JIH, Michael Řepa		

Schválili:

Inženýr stavby/TDI		
INBEST spol. s r.o., Ing. Martin Frdlík		
projektant/AD		
Miroslav Řepa, ČKAIT 0101609		
zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválili:	podpis:	datum:

OKY ®

Český Krumlov

5 509

vská 34

BUDĚJOVICE

1970

0851970

Změnový list č. 3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/1572 Omlenička, SO 101 Oprava silnice III/1572 staničení 15,820-16,340 km

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
4	12.8.2019	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	nebylo prováděno drcení hrubozrného materiálu	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - nečerpáno	
10	15.8.2019	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	osazení nových vpustí dle skutečné potřeby - viz položka 96687	viz položka 96687	
11	15.8.2019	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	zvětšení počtu výškové úpravy poklopů dle skutečnosti	byly nalezeny další skryté poklopy, které bylo nutné výškově upravit	
13	15.8.2019	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	nebyla prováděna výšková úprava obrubníků	nebyla potřeba	
14	15.8.2019	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	vybourání vpustí dle skutečné potřeby	funkční uliční vpustí byly ponechány	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 3 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov						Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: Oprava silnice III/1572 Orleníčka, SO 101 Oprava silnice III/1572 staničení 15,620-16,340 km												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo stránky ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
4	12.8.2019		12843 PŘEDRCENÍ VYKOPKU TR. II	m3	100,110	0,000	-100,110	477,28	47 780,50	0,00	-47 780,50	
10	15.8.2019		89712 VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	12,000	7,000	-5,000	12 382,79	148 593,48	86 679,53	-61 913,95	
11	15.8.2019		89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	5,000	10,000	5,000	2 283,37	11 416,85	22 833,70	11 416,85	
13	15.8.2019		91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	550,000	0,000	-550,000	579,31	318 620,50	0,00	-318 620,50	
14	15.8.2019		96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	kus	12,000	7,000	-5,000	895,78	10 749,36	6 270,46	-4 478,90	
											-421 377,00	


Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Michael Řepa		

Schválil:

inženýr stavby/TDI	podpis	datum
INBEST spol. s r.o., Ing. Martin Frdlík		
projektant/AD	podpis	datum
Miroslav Řepa, ČKAIT 0101609		
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Jihočeský kraj		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:




 SWIETELSKY
 Český Krumlov
 385 01
 380 35 509
 Mlýnská 34
 BUDĚJOVICE
 389 01
 380851970

Změnový list č. 4 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/1622 Větrná - Lomský rybník a Čertova stěna

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ	
		SO 101	Oprava silnice III/1622 staničení 7,365-8,440 km				
1	7.8.2019	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	nebylo prováděno drcení hrubozrného materiálu	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - nečerpáno		
0		SO 102	Oprava silnice III/1622 staničení 10,020-10,080 km				
3	7.8.2019	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	nebylo prováděno drcení hrubozrného materiálu	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - nečerpáno		
0		SO 103	Oprava silnice III/1622 staničení 10,150-10,940 km				
3	6.8.2019	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	nebylo prováděno drcení hrubozrného materiálu	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - nečerpáno		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 4 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov		Registrační číslo projektu:											
Číslo a název objektu: Oprava silnice III/1622 Větrná - Lomský rybník a Čertova stěna													
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
			SO 101	Oprava silnice III/1622 staničení 7,365-8,440 km									
1	7.8.2019		12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	m3	125,775	0,000	-125,775	477,28	60 029,89	0,00	-60 029,89	
			SO 102	Oprava silnice III/1622 staničení 10,020-10,080 km									
3	7.8.2019		12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	m3	7,155	0,000	-7,155	477,28	3 414,94	0,00	-3 414,94	
			SO 103	Oprava silnice III/1622 staničení 10,150-10,940 km									
3	6.8.2019		12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	m3	94,208	0,000	-94,208	477,28	44 963,59	0,00	-44 963,59	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-108 408,42		

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Michael Řepa		

Schválil:

inženýr stavby/TDI		
INBEST spol. s r.o., Ing. Martin Frdlík		
projektant/AD		
Miroslav Řepa, ČKAIT 0101609		
zadavatel/objednatel		
Jihočeský kraj		
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:




 Český Krumlov
 509
 34
 DĚJOVICE
 70
 51970

Změnový list č. 5 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: Oprava silnice III/16316 Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň, SO 101 Oprava silnice III/16316 staničení 0,000-3,700 km

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
5	12.7.2019	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 50MM	nebylo provedeno doplnění vrstvy ŠD 0/32	položka byla stanovena pouze předpokladem a čerpání vázáno na souhlas investora - nečerpáno	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 1
(položkový rozpois)

1 Oprava silnice II/162 křiž. s III/1605 - Veleslavice						
1 ZL1 - SO 101 Oprava silnice II/162 staničení 3,428-4,165 km						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	-371,448	M3	940,98	-349 525,14
2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 100,-KČ/T	-891,475	T	-100,00	89 147,50
3	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	-965,470	M3	940,98	-908 487,96
4	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 100,-KČ/T	-2 317,128	T	-100,00	231 712,80
5	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	-1 665,620	M2	17,68	-29 448,16
6	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	-1 665,620	M2	140,36	-233 786,42
9	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	-1 021,482	M2	65,57	-66 978,57
10	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM délka 737 m, šířka 0,25 m, oboustranné 2*737*0,25 = 368,5 m2	368,500	M2	49,93	18 399,21

Celkem Odbytová cena bez DPH: -1 248 966,74

Celkem Odbytová cena s DPH: -1 511 249,76


Celkem Odbytová cena bez DPH: -1 248 966,74

Změnový list č. 1
(položkový rozpois)

2 Oprava silnice III/1436 Brloh - U Hemmra					
2 ZL2.1 - SO 101 Oprava silnice III/1436 staničení 0,000-0,300 km					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
4	12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	-49,500	M3	477,28	-23 625,36
13	91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	-115,000	M	579,31	-66 620,65
	Sazba DPH				-90 246,01
	DPH celkem				-90 246,01
	Celkem				-109 197,67
				Odbytová cena s DPH:	-109 197,67
				Odbytová cena bez DPH:	-115 000,00


2 ZL2.2 - SO 102 Oprava silnice III/1436 staničení 2,350-2,765 km					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	-53,224	M3	477,28	-25 402,75
	Sazba DPH				-5 334,58
	DPH celkem				-5 334,58
	Celkem				-30 737,33
				Odbytová cena s DPH:	-30 737,33
				Odbytová cena bez DPH:	-36 071,88

Celkem **Odbytová cena bez DPH:** **-115 648,76**



Změnový list č. 1
(položkový rozpois)

3 Oprava silnice III/1572 Omlenička						
3 ZL3.1 - SO 101 Oprava silnice III/1572 staničení 15,820-16,340 km						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
4	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	-100,110	M3	477,28	-47 780,50
10	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	-5,000	KUS	12 382,79	-61 913,95
11	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	5,000	KUS	2 283,37	11 416,85
12	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	-550,000	M	579,31	-318 620,50
13	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	-5,000	KUS	895,78	-4 478,90
		Sazba DPH		DPH celkem		-421 377,00
Celkem				21,00	-88 489,17	-509 866,17
Celkem						-421 377,00



Změnový list č. 1
(položkový rozpois)

4 Oprava silnice III/1622 Větrná - Lomský rybník a Čertova stěna					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	-125,775 M3	477,28	-60 029,89
		Sazba DPH			-60 029,89
Celkem					-72 636,17
		DPH celkem			
		Sazba DPH			
		21,00			-12 606,28
		Odbytová cena bez DPH:			
		Odbytová cena s DPH:			

4 ZL4.2 - SO 102 Oprava silnice III/1622 staničení 10,020-10,080 km					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
3	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	-7,155 M3	477,28	-3 414,94
		Sazba DPH			-3 414,94
Celkem					-4 132,08
		DPH celkem			
		Sazba DPH			
		21,00			-717,14
		Odbytová cena bez DPH:			
		Odbytová cena s DPH:			

4 ZL4.3 - SO 103 Oprava silnice III/1622 staničení 10,150-10,940 km					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
3	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TR. II	-94,208 M3	477,28	-44 963,59
		Sazba DPH			-44 963,59
Celkem					
		DPH celkem			
		Sazba DPH			
		21,00			-9 442,35
		Odbytová cena bez DPH:			
		Odbytová cena s DPH:			
		Odbytová cena bez DPH:			

Změnový list č. 1
(položkový rozpis)

5 Oprava silnice III/16316 Lipno nad Vltavou - Přední Výtoň					
5 ZL5 - SO 101 Oprava silnice III/16316 staničení 0,000-3,700 km					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem

5	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŤI TL. DO 50MM	-5	842,500	M2	73,81	-431 234,93
Celkem						DPH celkem	-431 234,93
Sazba DPH						DPH celkem	-431 234,93

Celkem **Odbytová cena bez DPH:** **-431 234,93**

STAVBA CELKEM

Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	-2 325 635,85
21,00	-488 383,53	Odbytová cena s DPH:	-2 814 019,38

odště
STAVBA CELKEM (8)
