

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20č.: **ZL10***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí **Datum:** 5.9.2019

Předmět změny: Demontáž stávajícího podhledů 4.NP
Dotčené místo: Budova "A" KSO
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **15 747,25 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Demontáž stávajícího podhledu 4.NP - havarijní stav.

Důvod: Po demontáži veškerých stav. příček v 4.NP (pravá strana) byl zjištěn havarijní stav stávajícího podhledu, který byl vlivem zatečení značně degradován. Bylo rozhodnuto o okamžité demontáži.

Výsledek: Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů. Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché. Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek.

Cena:

Přípočty: 15 747,25 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM 15 747,25 Kč (bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
Specifikace změn 3 listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
[redacted]souhlas *AMO* Datum: 5.9.2019**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě
[redacted]souhlas *AMO* Datum: 5.9.2019**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdinasouhlas *AMO* Datum: 5.9.2019**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.
[redacted]souhlas *AMO* Datum: 5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6.12.2018

Zadavatel:
ČR-KS v Ostravě

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:
DIČ:

Projektant:
ateliér 38

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 747,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

15 747,25

ZL ZL 15 747,25

ZL 10 Demontáž podhledů 15 747,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 10 - Demontáž podhledů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 747,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: **ZL 10 - Demontáž podhledů**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 747,25
97 - Prorážení otvorů	1 548,82
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	6 237,65
HSV - Práce a dodávky HSV	3 303,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 303,72
PSV - Práce a dodávky PSV	4 657,06
763 - Konstrukce suché výstavby	1 432,00
766 - Konstrukce truhlářské	3 225,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 10 - Demontáž podhledů

Místo:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

atelier 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 747,25


D		97	Prorážení otvorů				1 548,82
23	K	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	26,22000	59,07	1 548,82
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 237,65
40	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,25490	253,00	823,49
41	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,50980	57,50	374,31
42	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,25490	148,96	484,85
43	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	61,84310	6,47	400,12
44	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,25490	241,50	786,06
45	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	32,54900	34,50	1 122,94
46	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,25490	172,50	561,47
47	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	3,25490	517,50	1 684,41
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 303,72
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 303,72
	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	26,22000	126,00	3 303,72
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 657,06
D		763	Konstrukce suché výstavby				1 432,00
	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	20,00000	71,60	1 432,00
D		766	Konstrukce truhlářské				3 225,06
	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	26,22000	123,00	3 225,06





Průloha č.1 - 2L 10

- Plocha prací

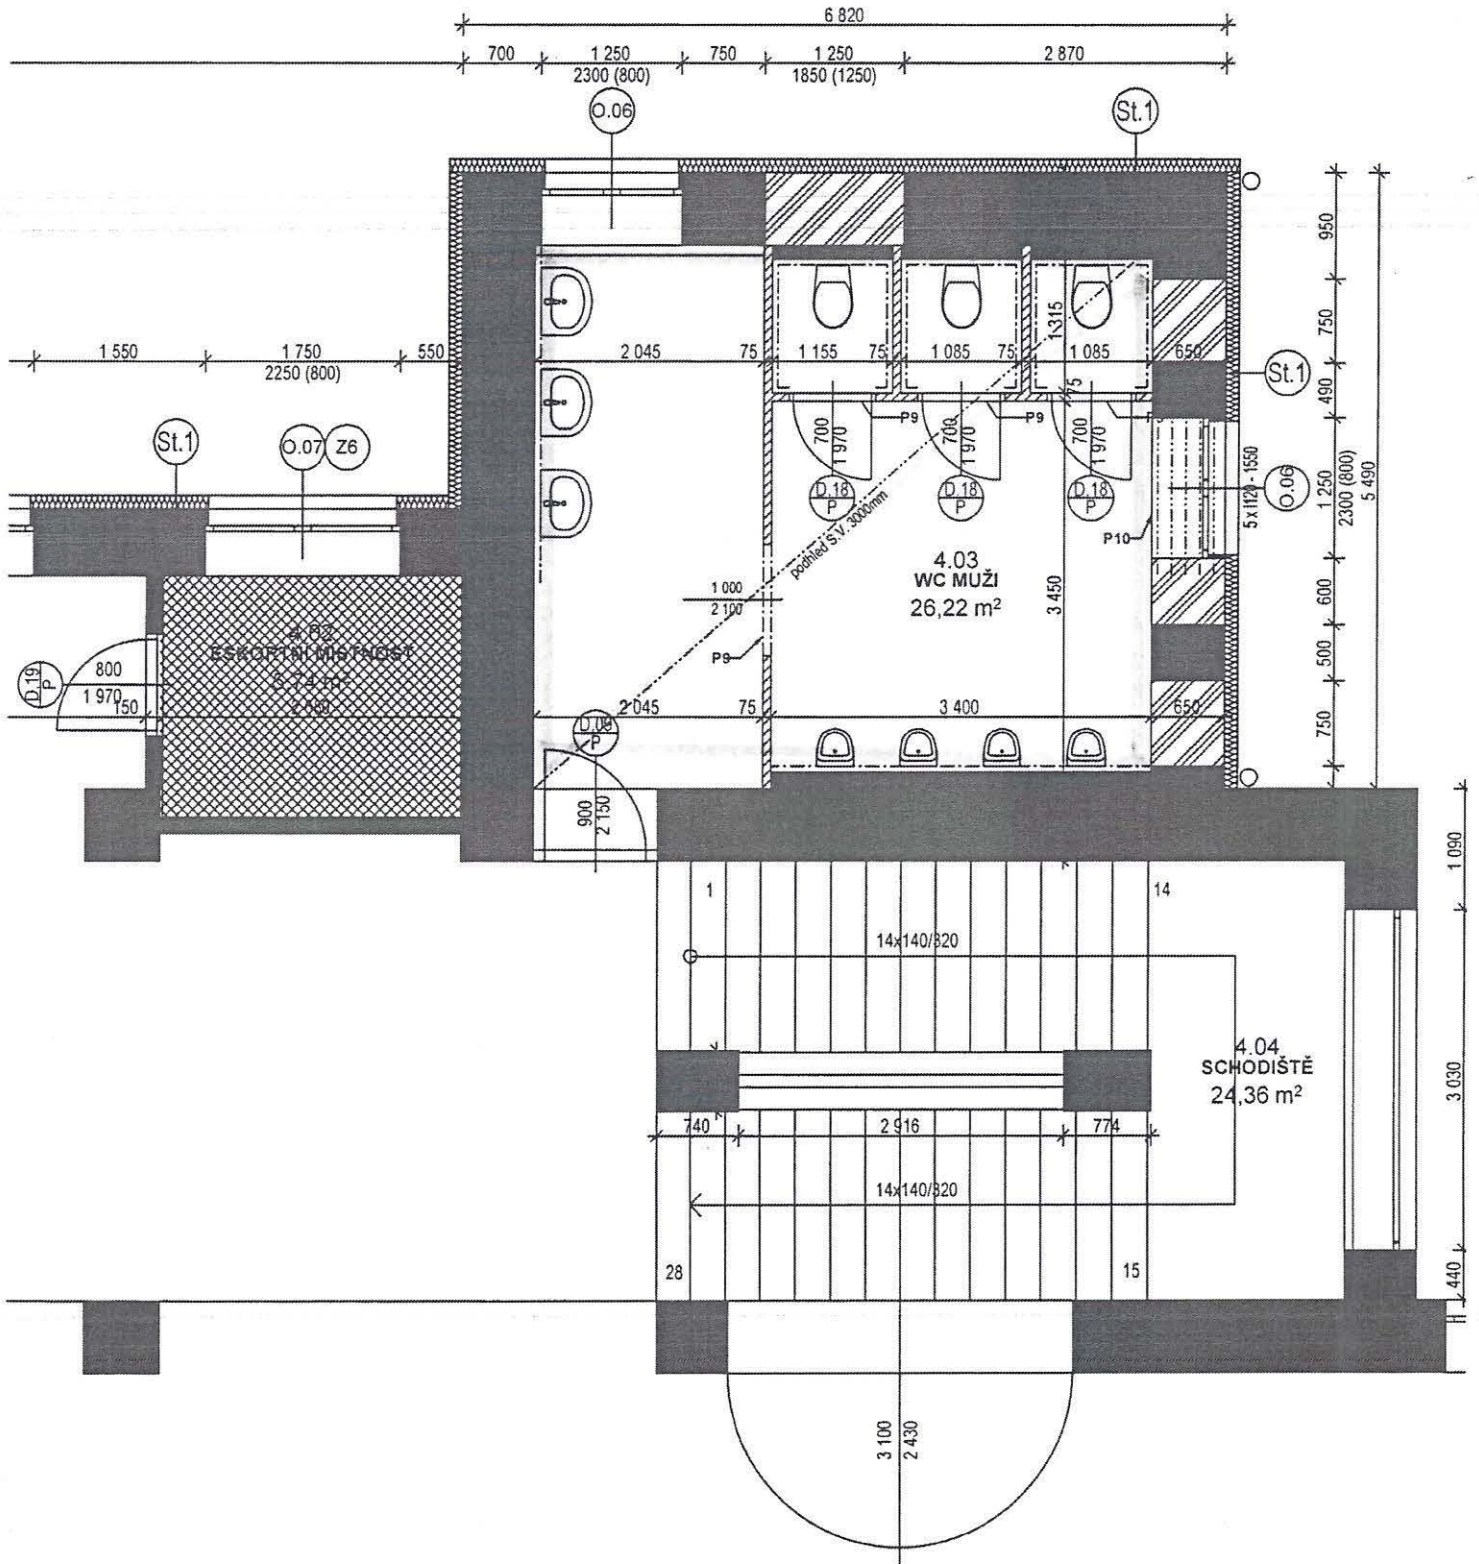

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20č.: **ZL11****Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů****Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí **Datum:** **5.9.2019**

Předmět změny: Sanace žebírkového stropu 4.NP
Dotčené místo: **Budova "A" KSO**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **71 727,46 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Sanace žebírkového stropu 4.NP - havarijný stav.
Důvod: Po stržení podhledu (viz. ZL 10) bylo zjištěno, že stávající žebírkový železobetonový strop ve 4.NP na pravé straně je poškozen degradací betonu a korozí výztuže; je nutné jej sanovat systémovým, ochranným, upevňovacím nátěrem betonu líce kleneb a podhledů (t. 20 mm), korozi odstranit proudem, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči; Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl. 20 mm; Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva
Výsledek:
Cena:
Přípočty: 71 727,46 Kč
Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM 71 727,46 Kč (bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
Specifikace změn 2 listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
[redacted]

[redacted] Datum: 5.9.2019

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě
[redacted]

souhlas [redacted] Datum: 5.9.2019

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas [redacted] Datum: 5.9.2019

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.
[redacted]

souhlas [redacted] Datum: 5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 6.12.2018

Zadavatel:
ČR-KS v Ostravě

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:
DIČ:

Projektant:
ateliér 38

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 727,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

71 727,46

ZL ZL

71 727,46

ZL 11

Sanace žebírkového stropu 4.np

71 727,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 11 - Sanace žebírkového stropu 4.np

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:


Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 727,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: **ZL 11 - Sanace žebírkového stropu 4.np**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	71 727,46
94 - Lešení a stavební výtahy	1 671,60
99 - Staveništní přesun hmot	711,41
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 794,45
HSV - Práce a dodávky HSV	65 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 11 - Sanace žebírkového stropu 4.np

Místo:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem


71 727,46

D	94		Lešení a stavební výtahy				1 671,60
89	K	941955004R00	Lešení lehké pomocné	m2	30,00000	55,72	1 671,60
D	99		Staveništní přesun hmot				711,41
99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,20150	592,10	711,41
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 794,45
40	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,98000	253,00	500,94
41	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,96000	57,50	227,70
42	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,98000	148,96	294,94
43	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,62000	6,47	243,40
44	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,98000	241,50	478,17
45	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,80000	34,50	683,10
46	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,98000	172,50	341,55
47	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	1,98000	517,50	1 024,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 550,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 550,00
	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm	m2	30,00000	401,00	12 030,00
	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	30,00000	133,00	3 990,00
100	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	30,00000	1 403,00	42 090,00
	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	30,00000	248,00	7 440,00



Priloha č. 1 - 2L 11

 - Rozsah práce

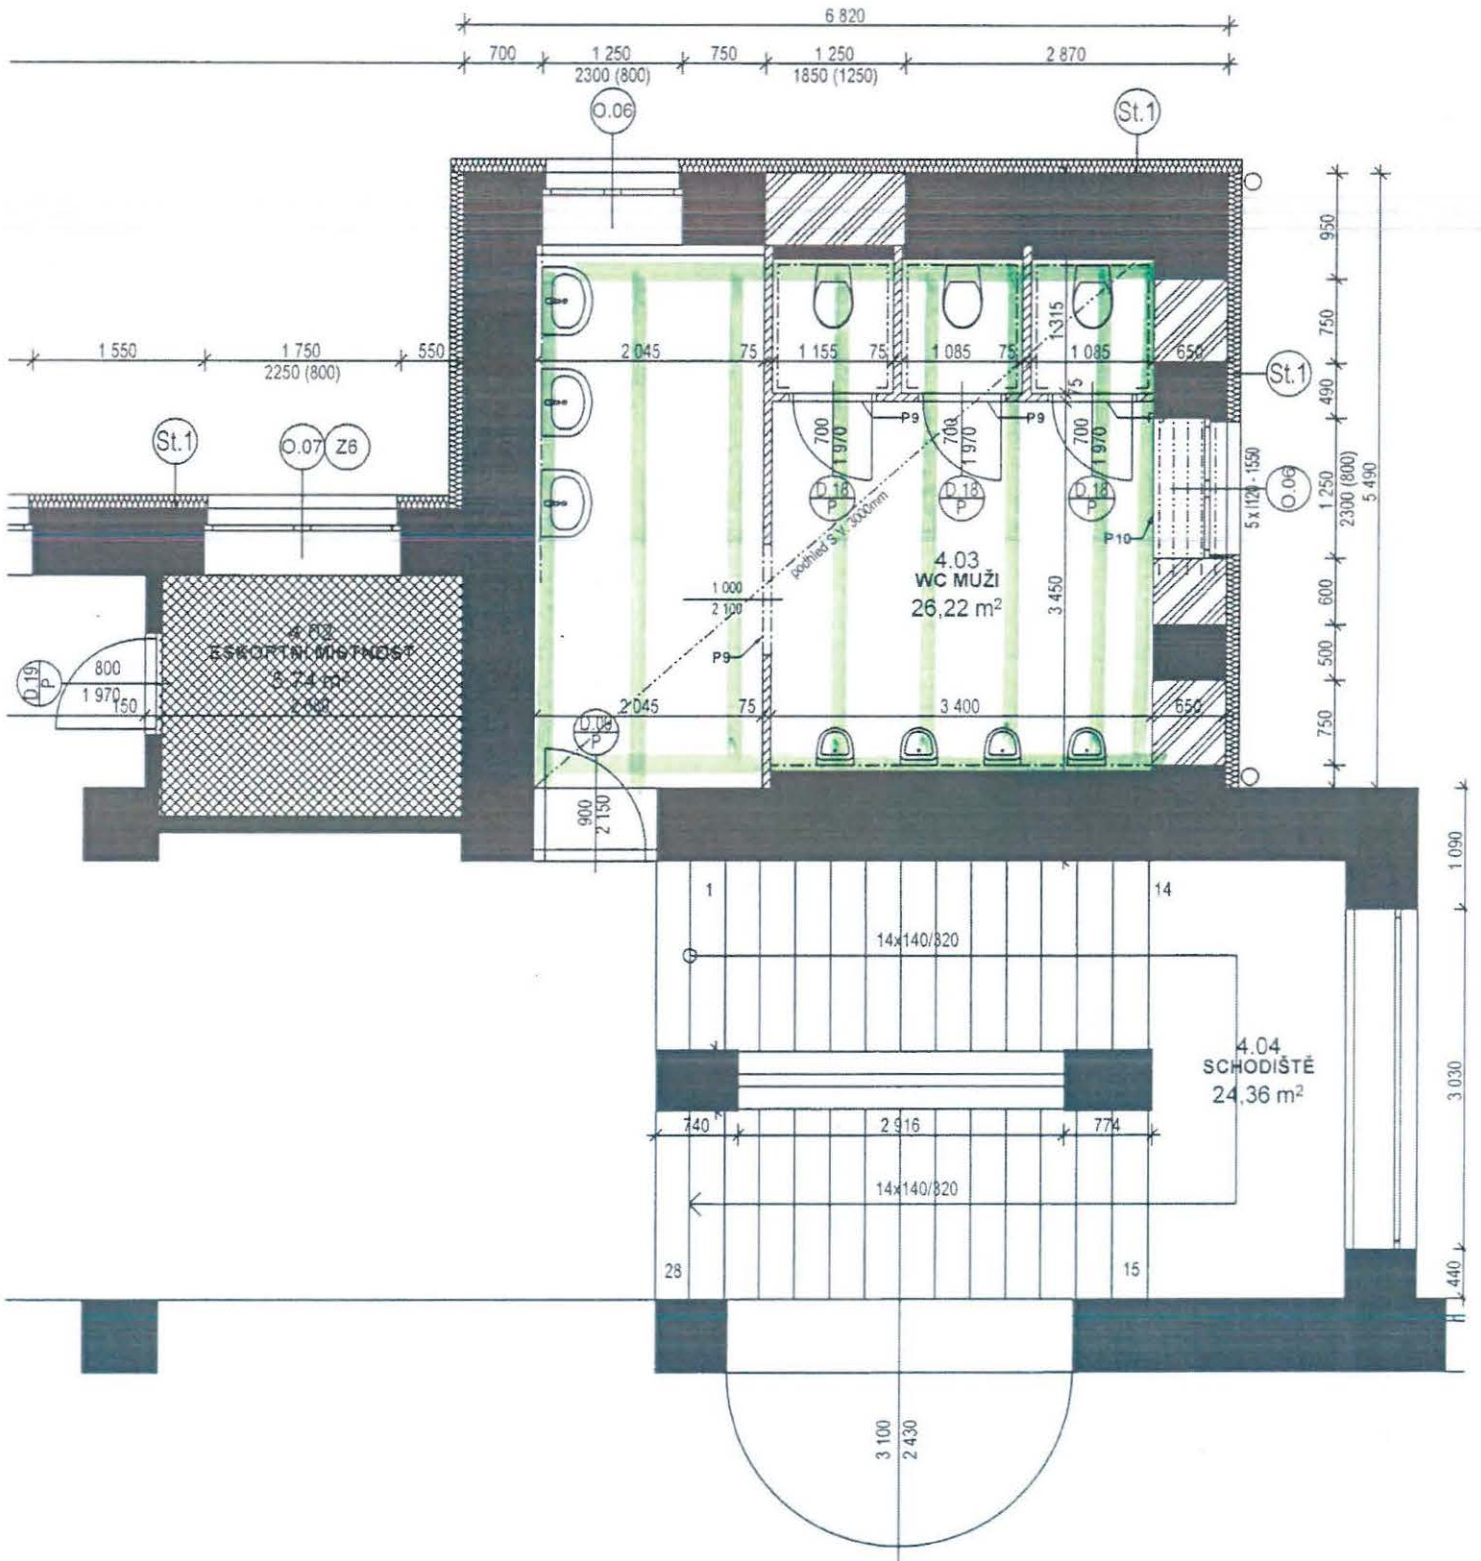

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/2018č.: **ZL12***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí **Datum:** 05.09.2019

Předmět změny: Doplnění žiletkového drátu (bruno válce) na střeše KSO
Dotčené místo: **Budova "A" KSO**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby:
Dopad do ceny díla dle SOD: (bez DPH)
Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Doplnění žiletkového drátu (bruno válce) na střeše KSO z důvodu bezpečnosti.
Důvod: Dodatečný požadavek VVO na instalaci zábrany z žiletkového drátu na okraj střechy z důvodu zabezpečení VVO s ohledem na další investiční akci KSO: "rekonstrukce fasád budovy "A".
Výsledek: D+M mechanická zábrana BRUNO válec (žiletkový drát).

Cena:

Přípočty: 38 330,88 Kč

Odpočty: -11 978,40 Kč

CENA CELKEM**26 352,48 Kč**

(bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
Specifikace změn 2

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
[redacted]

[redacted] podpis souhlas ANO Datum: 5.9.2019

Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě
[redacted]

[redacted] podpis souhlas ANO Datum: 5.9.2019

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

[redacted] podpis souhlas ANO Datum: 5.9.2019

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.
[redacted]

[redacted] podpis souhlas ANO Datum: 5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: IČ:
ČR-KS v Ostravě DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:
atelér 38 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 352,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

26 352,48

ZL ZL 26 352,48

ZL 12 Doplnění žiletkového drátu na střeše 26 352,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 12 - Doplnění žiletkového drátu na střeše

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:


Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 352,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL - ZL

Soupis: **ZL 12 - Doplnění žiletkového drátu na střeše**

Místo:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018

Projektant: ateliér 38

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 352,48

767 - Konstrukce zámečnické

26 352,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síní č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 12 - Doplnění žiletkového drátu na střeše

Místo:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:


██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 352,48

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		767	Konstrukce zámečnické				26 352,48
189	K	767-005.RXX.1	D+M mechanická zábrana BRUNO válec vč. nosiče, nosného prvku a kotvení	m	42,00000	912,64	38 330,88
190	K	767-005.RXX.1A	D+M mechanická zábrana BRUNO - odpočet nosiče, nosného prvku a kotvení	m	42,00000	-285,20	-11 978,40

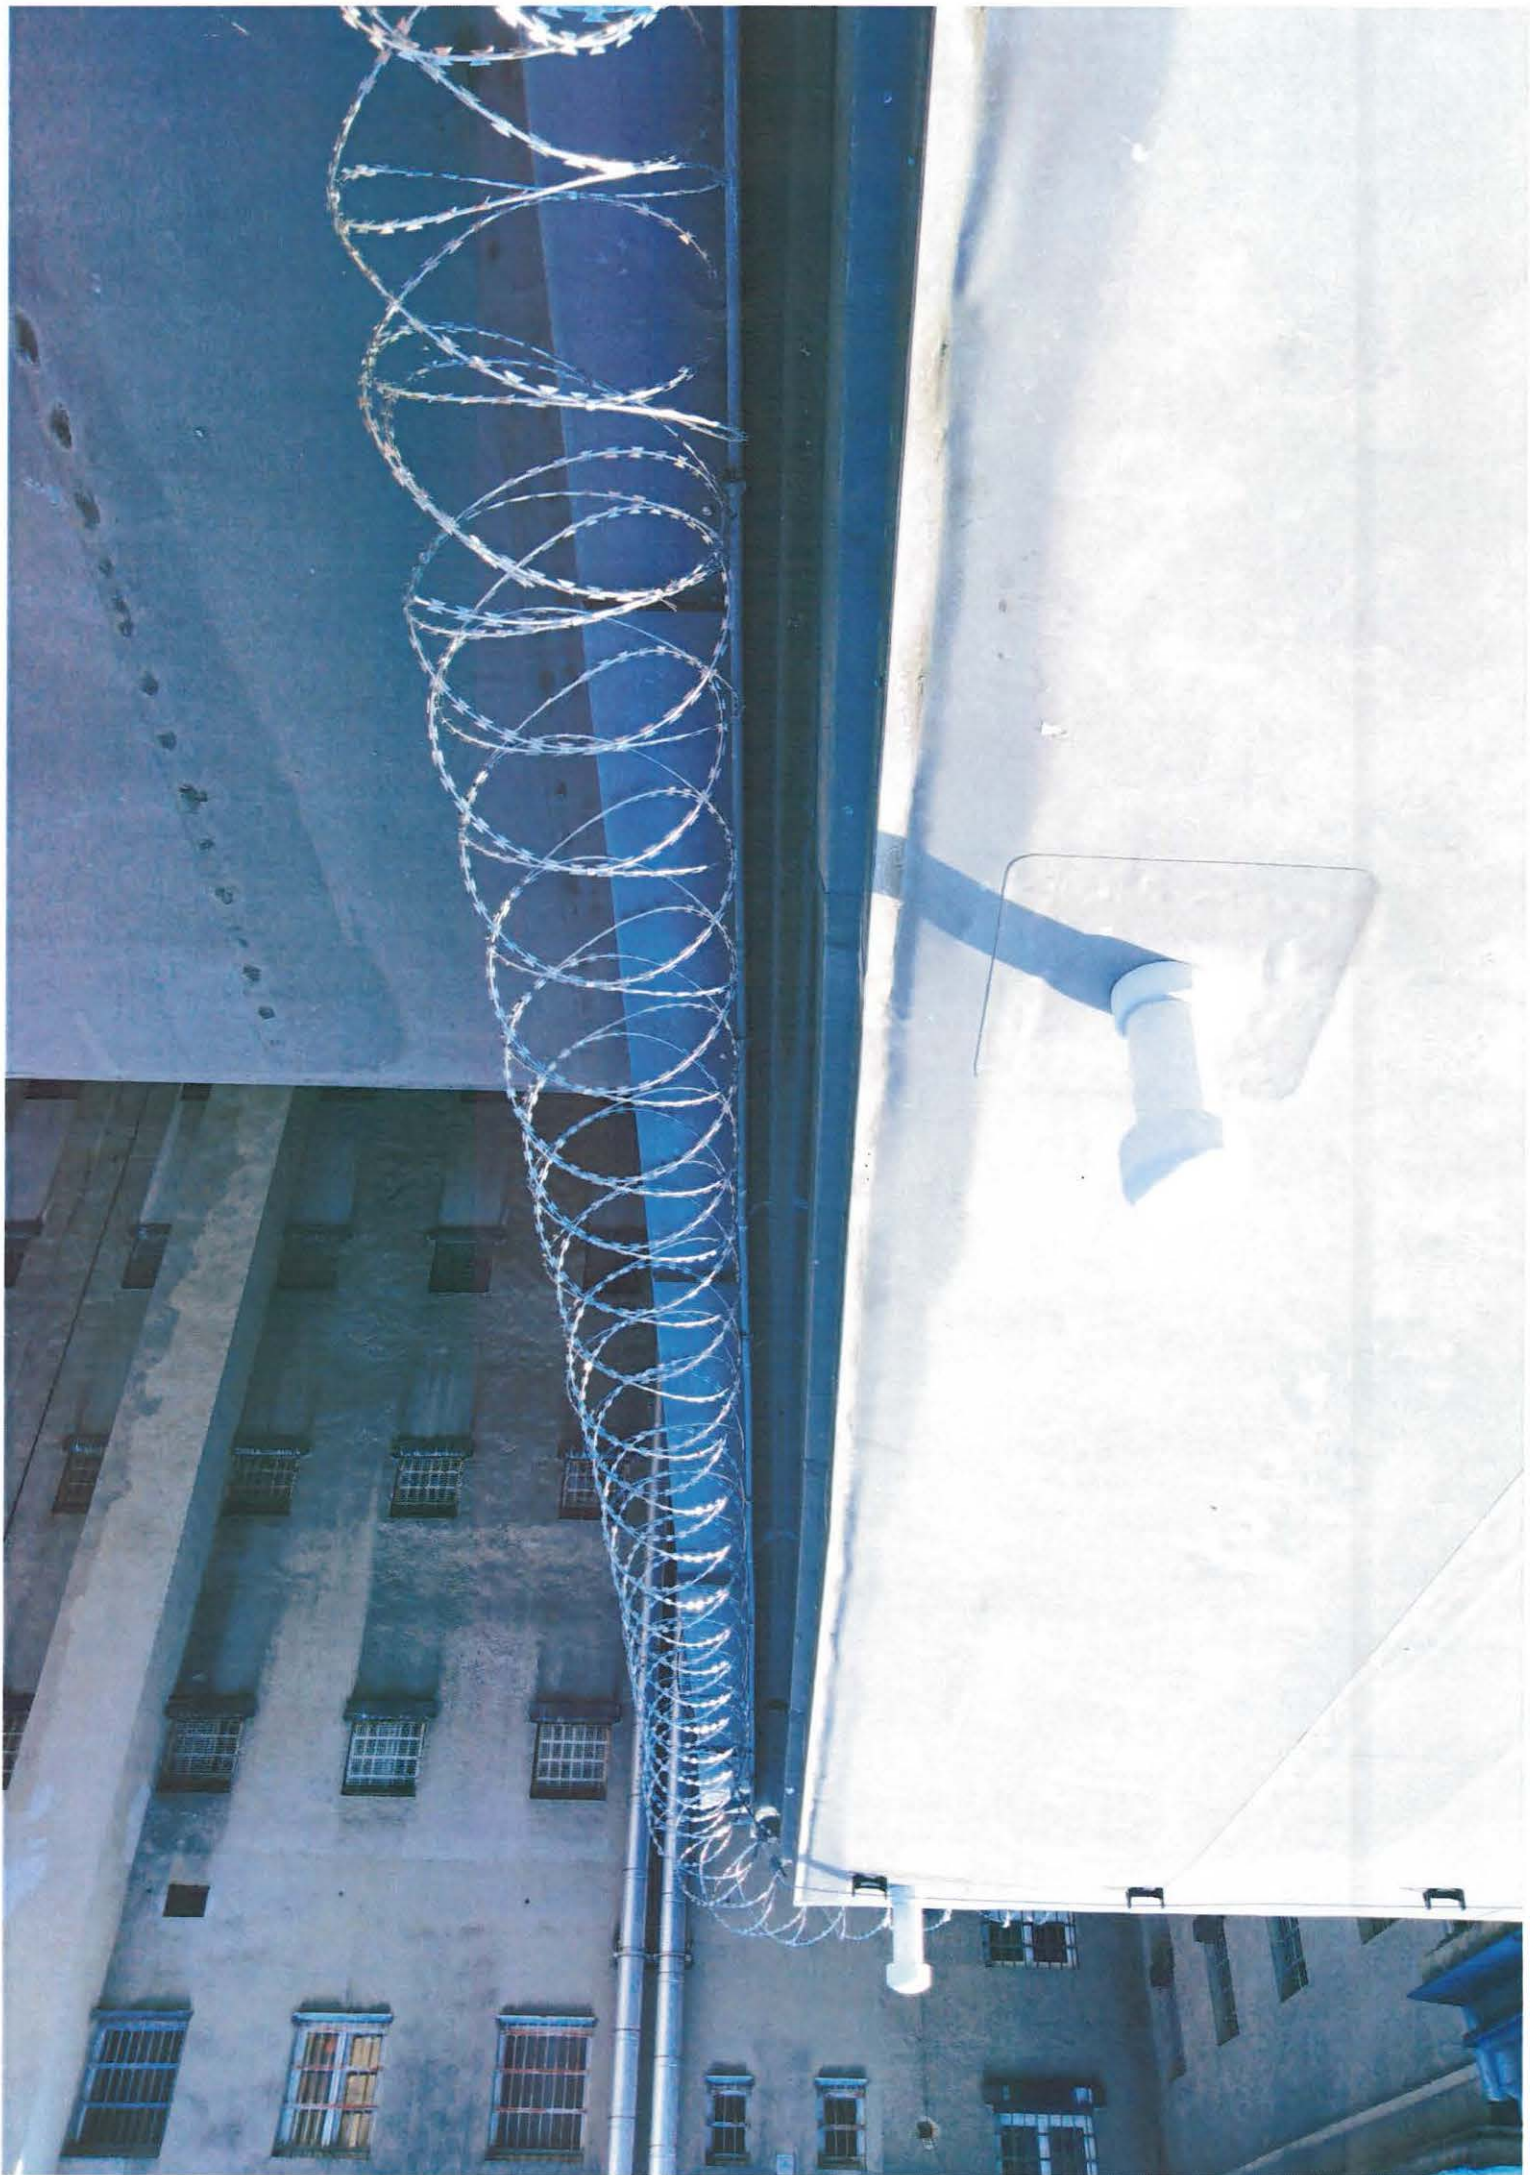

Křídlo C. — 2L 12

— Umístění brány včera na středě KSO



POHLED VE DVOŘE
 UO
 ZNICE
 ZNICE

OBJEKT A1
 OBJEKT V2

OBJEKT A1
 OBJEKT V2

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL13***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer **Datum:** 5.9.2019

Předmět změny: Bourání monolitického žel. bet. překladů 2. až 4.np
Dotčené místo: Budova "A" KSO
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **11 646,42 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Bourání monolitických žel. bet. překladů 2. až 4.NP z důvodu výšek oken.
Důvod: Po odsekání omítek bylo zjištěno, že v místech, do kterých mají být v sociálních zařízeních v pravém křídle rozšířeny okenní otvory, prochází ve zdivu monolitický železobetonový překlad, který je nutno
Výsledek: Vybourání ŽB překladů.

Cena:

Přípočty: 11 646,42 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM 11 646,42 Kč (bez DPH)

Přílohy: Krycí list 1 listů
Specifikace změn 2 listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
[redacted]**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě
[redacted]**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.
[redacted]

[redacted] souhlas AVO Datum: 5.9.2019

[redacted] souhlas AVO Datum: 5.9.2019

[redacted] souhlas AVO Datum: 5.9.2019

[redacted] souhlas AVO Datum: 5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel:
ČR-KS v Ostravě

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:
DIČ:

Projektant:
ateliér 38

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 646,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

11 646,42

ZL

ZL

11 646,42

ZL 13

Bourání překladů 2. až 4.np

11 646,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 13 - Bourání překladů 2. až 4.np

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 646,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: **ZL 13 - Bourání překladů 2. až 4.np**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 646,42
94 - Lešení a stavební výtahy	334,32
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 209,10
HSV - Práce a dodávky HSV	5 103,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 103,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síní č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: **ZL 13 - Bourání překladů 2. až 4.np**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 646,42

D 94 Lešení a stavební výtahy 334,32

89	K	941955004R00	Lešení lehké pomocné	m2	6,00000	55,72	334,32
----	---	--------------	----------------------	----	---------	-------	--------

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 6 209,10

40	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,24000	253,00	819,72
41	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,48000	57,50	372,60
42	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,24000	148,96	482,63
43	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	61,56000	6,47	398,29
44	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,24000	241,50	782,46
45	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	32,40000	34,50	1 117,80
46	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,24000	172,50	558,90
47	K	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs	t	3,24000	517,50	1 676,70

D HSV Práce a dodávky HSV 5 103,00


D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 103,00

	K	964011211	Vybourání ŽB překladů dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	1,35000	3 780,00	5 103,00
--	---	-----------	--	----	---------	----------	----------



Průhled č. - 2L13

- Páru batarko průhledu 2. NP- 4. NP

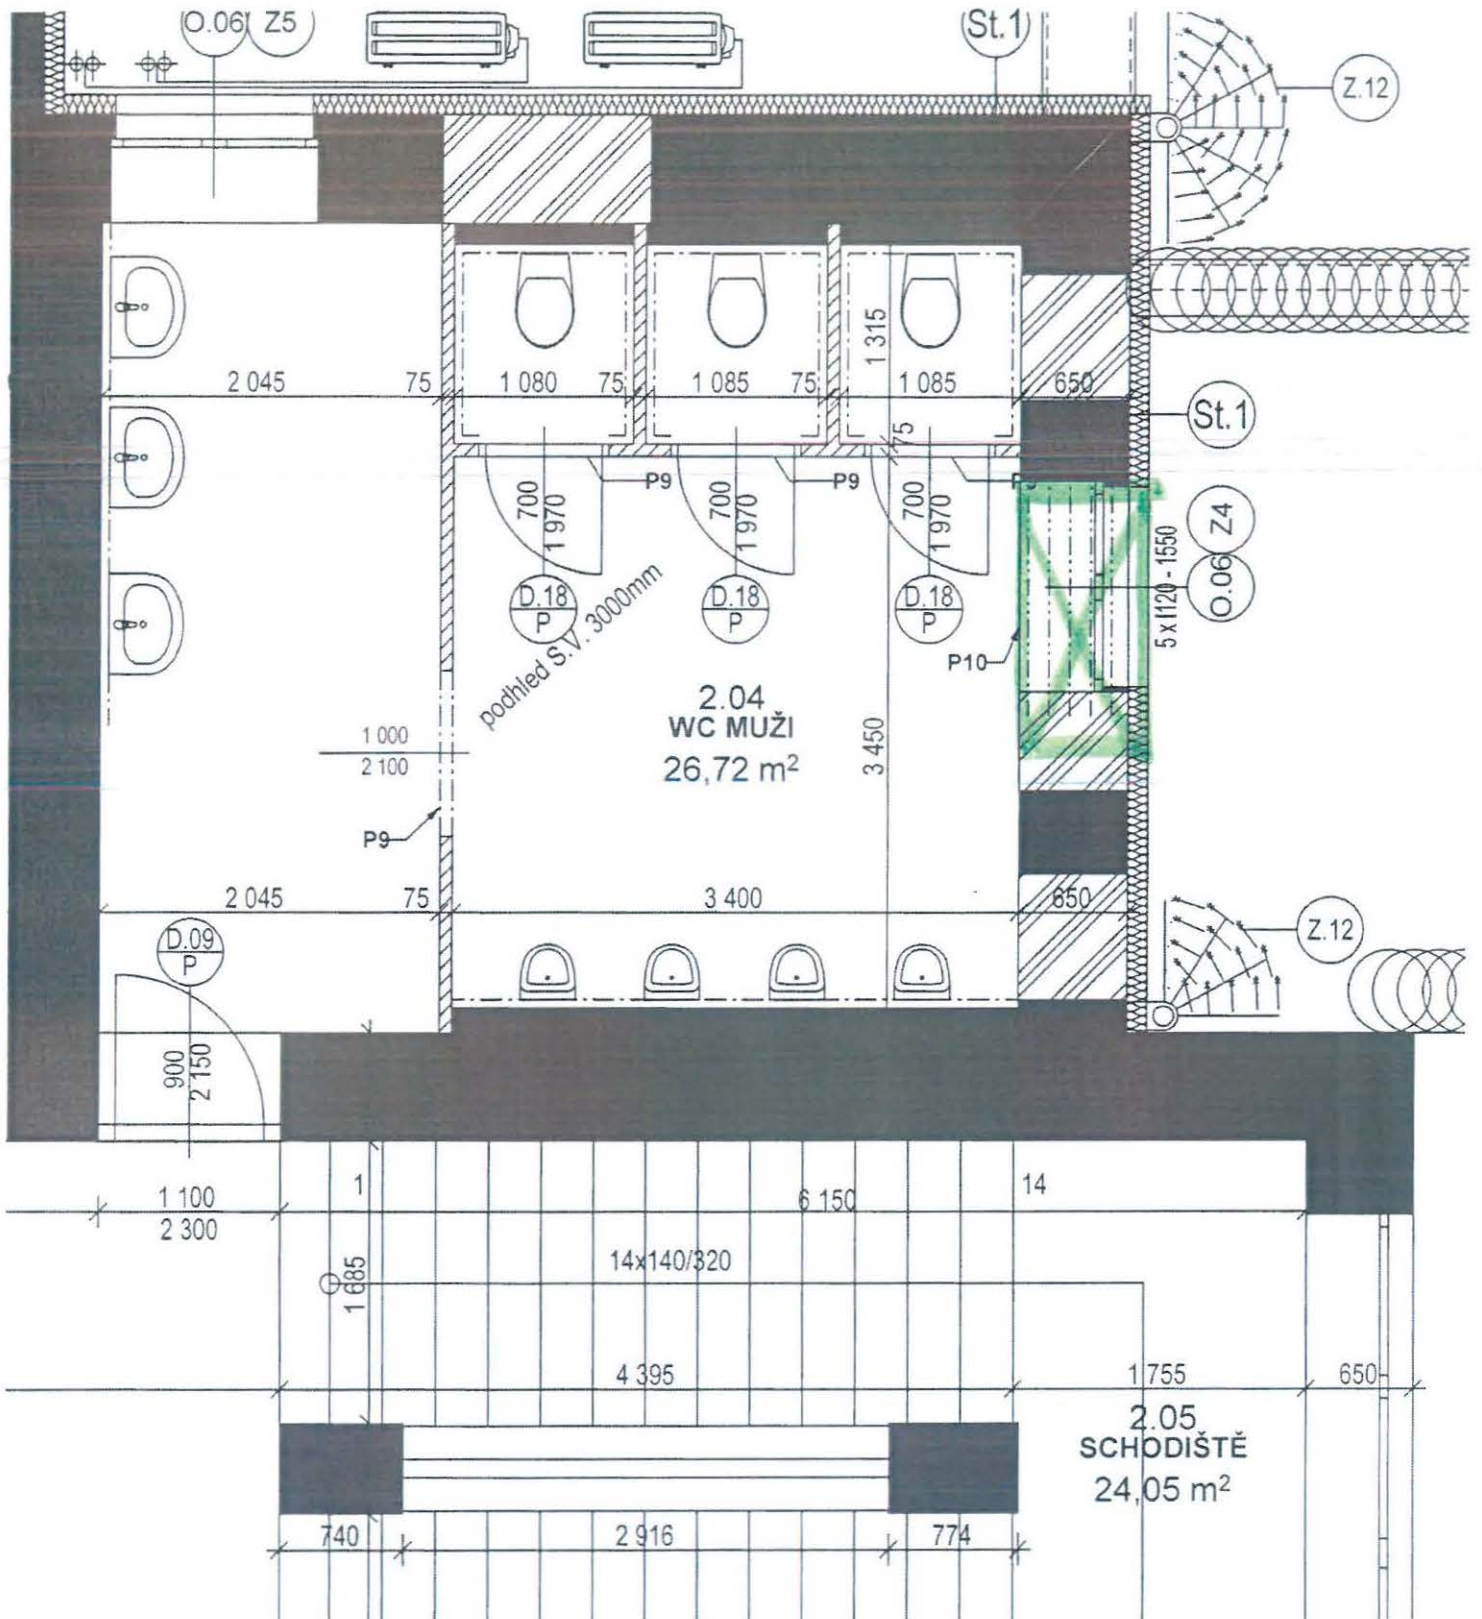

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL14**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:****5.9.2019**

Předmět změny: Změna materiálu pro rozvody vody
Dotčené místo: Budova "A" KSO
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **odpočet** **-104 308,75 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Změna materiálu pro rozvody vody (studená, teplá, cirkulace).
Důvod: Změna materiálu potrubního systému, který je z hlediska napojování svařováním vhodnější pro provádění spojů v podkladních vrstvách podlah (souvisí se ZL09 - bourání a betonáž podkladních
Výsledek: Změna materiálu potrubí.

Cena:

Připočty: 475 803,00 Kč

Odpočty: -580 111,75 Kč

CENA CELKEM**-104 308,75 Kč**

(bez DPH)

Přílohy: Krycí list
Specifikace změn1
0listů
listů**Stanovisko:****Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
[redacted]

Podpis

souhlas *AWO*

Datum:

*5.9.2019***Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě
[redacted]souhlas *AWO*

Datum:

*5.9.2019***Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdinasouhlas *AWO*

Datum:

*5.9.2019***TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.
[redacted]souhlas *AWO*

Datum:

5.9.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 6.12.2018

Zadavatel:
ČR-KS v Ostravě

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:
DIČ:

Projektant:
ateliér 38

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -104 308,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-104 308,75

ZL ZL -104 308,75

ZL 14 Rozvody vody -104 308,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 14 - Rozvody vody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-104 308,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL - ZL
Soupis: **ZL 14 - Rozvody vody**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum: 6.12.2018
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-104 308,75

722 - Vnitřní vodovod

-104 308,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích sítí č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 14 - Rozvody vody

Místo:

ČR-KS v Ostravě

Zadavatel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

6.12.2018

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-104 308,75

D 722

Vnitřní vodovod

-104 308,75

11	K	722173401R00	Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASALT PLUS 20 X 2,8mm	m	172,00000	408,91	70 332,52
12	K	722173402R00	Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASALT PLUS 20 X 2,8mm	m	210,00000	408,91	85 871,10
13	K	722173403R00	Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASALT PLUS 26 X 3,5 mm	m	79,00000	589,75	46 590,25
14	K	722173404R00	Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASALT PLUS 26 X 3,5 mm	m	52,00000	589,75	30 667,00
15	K	722173405R00	Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASALT PLUS 32 X 4,4 mm	m	86,00000	735,27	63 233,22
16	K	722173406R00	Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASALT PLUS 32 X 4,4 mm	m	120,00000	735,27	88 232,40
17	K	722173407R00	Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASALT PLUS 40 X 5 mm	m	24,00000	941,26	22 590,24
18	K	722173408R00	Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASALT PLUS 40 X 5 mm	m	15,00000	941,26	14 118,90
19	K	722173409R00	Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASALT PLUS 50 X 6,9 mm	m	15,00000	1 219,01	18 285,15
20	K	722173419R00	Potrubí třívrstvé z PPR FIBER BASALT PLUS 63 X 8,6 mm	m	22,00000	1 631,01	35 882,22
1	K	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé, D 20x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	-172,00000	483,00	-83 076,00
2	K	722178113RT1.1	Potrubí vícevrstvé, D 20x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	-210,00000	483,00	-101 430,00
3	K	722178114RT1	Potrubí vícevrstvé, D 26x3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	-52,00000	713,00	-37 076,00
4	K	722178114RT1	Potrubí vícevrstvé, D 26x3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	-79,00000	713,00	-56 327,00
5	K	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé, D 32x3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	-86,00000	931,50	-80 109,00
6	K	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé, D 32x3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	-120,00000	931,50	-111 780,00
7	K	722178116RT1	Potrubí vícevrstvé, D 40x3,5 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	-24,00000	1 092,50	-26 220,00
8	K	722178116RT1	Potrubí vícevrstvé, D 40x3,5 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	-15,00000	1 092,50	-16 387,50
9	K	722178117RT1	Potrubí vícevrstvé, D 50x4 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	-15,00000	1 322,50	-19 837,50
10	K	722178118RT1	Potrubí vícevrstvé, D 63x4,5 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	-22,50000	2 127,50	-47 868,75

