

# ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL23

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

**Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázet

**Datum:**

**5.9.2019**

**Předmět změny:** Úprava trasy rozvody vody a vypuštění bidetových spršek pro veřejnost.

**Dotčené místo:** Budova "A" KSO

**Odkaz na výkresy:** relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn

**Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:** pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace

**Odkaz na jinou část smlouvy:** ---

**Změna termínu dokončení stavby:**

**Dopad do ceny díla dle SOD:**

(bez DPH)

**Změnu vyvolal:**

## Popis a odůvodnění změny:

**Popis:** Úprava trasy rozvody vody v 1.PP a 1.NP a vypuštění bidetových spršek pro veřejnost.

Po vyhodnocení skutečného stavu bylo zjištěno, že nové rozvody vody v levé části objektu nelze

**Důvod:** napojit na stávající potrubní trasu procházející v 1.PP pod levou částí a je nutné provést napojení až na hlavní trasu v chodbě objektu A KSO:

**Výsledek:** Přípočet vodovodního potrubí, tepelné izolace a armatur podle dodatečně zpracovaných výkresů a odpočet 10ks bidetových spršek.

**Cena:**

Přípočty: 95 575,88 Kč

Odpočty: -55 800,00 Kč

**CENA CELKEM**

**39 775,88 Kč**

(bez DPH)

**Přílohy:** Krycí list  
Specifikace změn

1

2

listů  
listů

**Stanovisko:**

**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.

**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravě

**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.  
Ing. Jan Hrdina

**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.

Podpis

souhlas ANO

Datum:

5.9.2019

souhlas ANO

Datum:

5.9.2019

souhlas ANO

Datum:

5.9.2019

souhlas ANO

Datum:

5.9.2019



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002  
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6.12.2018
Zadavatel:		IČ:	
ČR-KS v Ostravě		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
Stavos Stavba a.s. Ostrava		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
ateliér 38		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
[REDAKOVANÉ]		DIČ:	
Poznámka:			

---

Cena bez DPH

39 775,88

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síní č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**39 775,88**

ZL ZL

39 775,88

ZL 23

Rozvody vody 1.PP a 1.NP, odpočet bidetových spršek

39 775,88

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

**ZL 23 - Rozvody vody 1.PP a 1.NP, odpočet bidetových spršek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

Atelier 38

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**39 775,88**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

**ZL 23 - Rozvody vody 1.PP a 1.NP, odpočet bidetových spršek**

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

6.12.2018

Projektant:

Atelier 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**39 775,88**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 693,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 693,30

722 - Vnitřní vodovod

92 882,58

725 - Zařizovací předměty

-55 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

ZL 23 - Rozvody vody 1.PP a 1.NP, odpočet bidetových spršek

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

6.12.2018

Projektant:

Atelier 38

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**39 775,88**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 693,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 693,30

18	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm - stoupačky ÚT	kus	2,00000	318,55	637,10	CS ÚRS 2018 02
19	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm - stoupačky ÚT	kus	4,00000	514,05	2 056,20	CS ÚRS 2018 02

D 722 Vnitřní vodovod 92 882,58

3	K	722173401R00	Potrubí FIBER BASALT PLUS d 20 X 2,8mm	m	45,00000	408,91	18 400,95	
4	K	722173402	Potrubí FIBER BASALT PLUS d 26 x 3mm	m	15,00000	589,75	8 846,25	
5	K	722173403	Potrubí FIBER BASALT PLUS d 32 x 4,4mm	m	39,00000	735,27	28 675,53	
6	K	722181221U00	Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32	m	39,00000	70,15	2 735,85	
7	K	722181222	Vod potrubí izolace PE tl-20- DN-32	m	15,00000	111,55	1 673,25	
8	K	722181223	Vod potrubí izolace PE tl-20- DN-26	m	45,00000	92,00	4 140,00	
9	K	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	4,00000	192,05	768,20	
10	K	722235112	kulový kohout DN 20 dodávka+ montáž	ks	5,00000	312,80	1 564,00	
11	K	722235113	kulový kohout DN 25 dodávka+ montáž	ks	4,00000	415,15	1 660,60	
12	K	722235114	kulový kohout DN 32 dodávka+ montáž	ks	2,00000	594,55	1 189,10	
13	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí PPR DN 50	m	99,00000	44,85	4 440,15	
14	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80	m	99,00000	42,55	4 212,45	
15	K	72230	Upevňovací technika pro potrubí dodávka + montáž	m	99,00000	74,75	7 400,25	
16	K	7241	multifunkční termostatický ventil cirkulační dodávka + montáž	ks	2,00000	3 588,00	7 176,00	

D 725 Zařizovací předměty -55 800,00

17	K	7251	Bidetová sprška dodávka + montáž	kpl	10,00000	-5 580,00	-55 800,00	
----	---	------	----------------------------------	-----	----------	-----------	------------	--











# ROZVOD VODY - PŘÍSOBY 1.PP

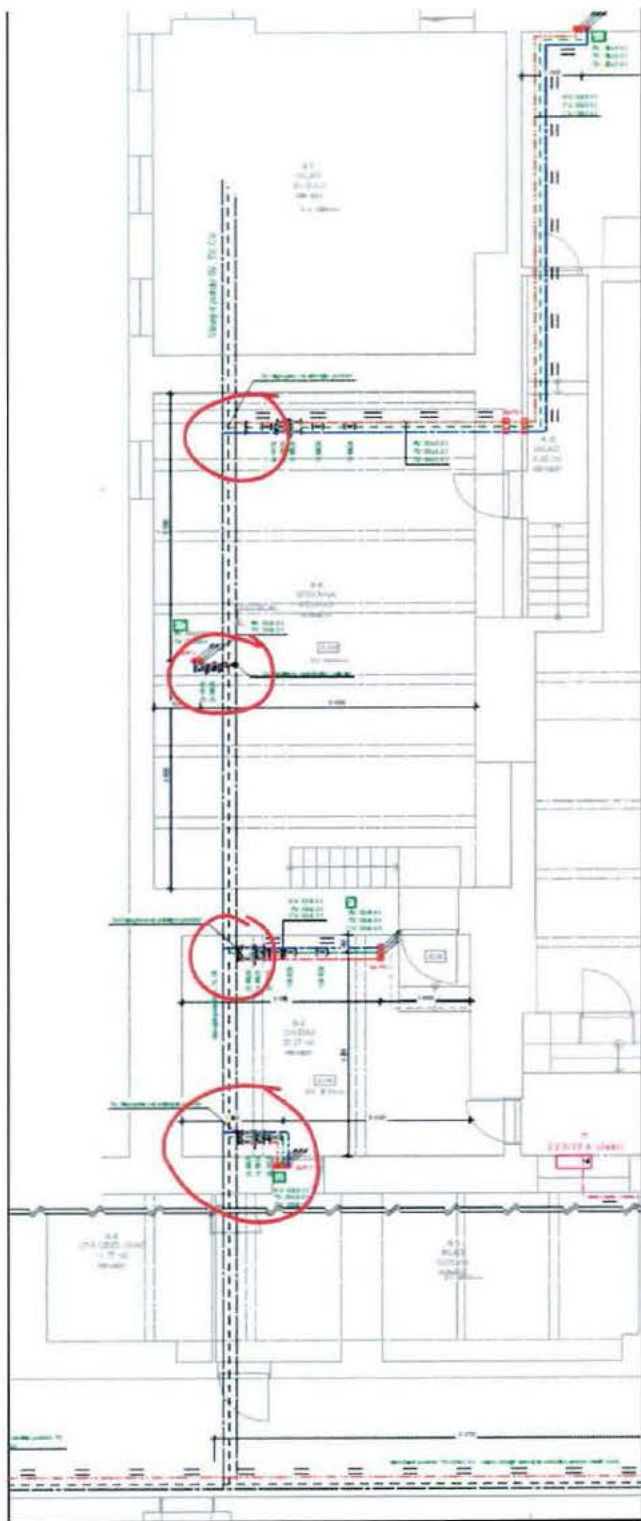

Původní způsob napojení na stávající trasu pod levým křídlem

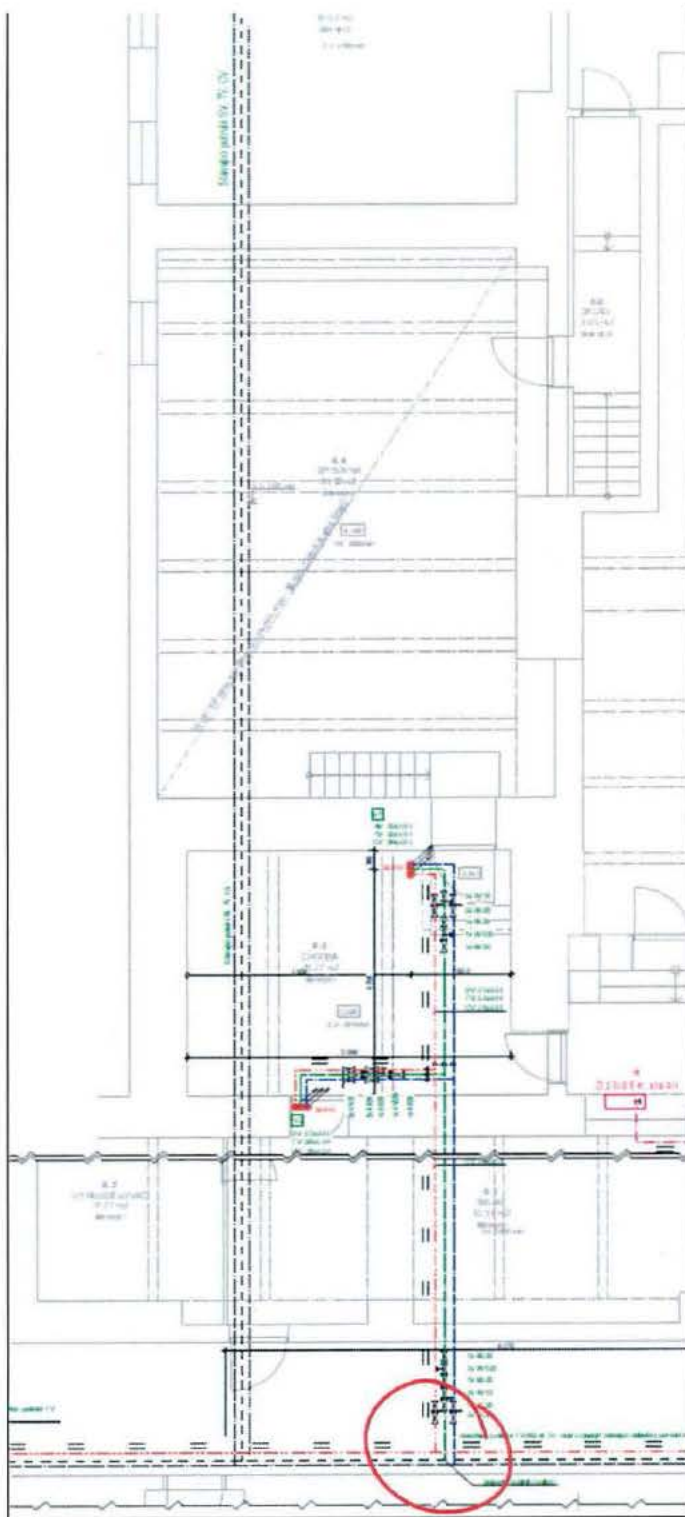

Nový způsob napojení na hlavní trasu v chodbě budovy A

-

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20**č.: **ZL24***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázem **Datum:** 5.9.2019

Předmět změny: Úprava VZT potrubí z prostoru 1.PP  
Dotčené místo: **Budova "A" KSO**  
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*  
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*  
Odkaz na jinou část smlouvy: ---  
Změna termínu dokončení stavby: **není**  
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **4 455,84 Kč** (bez DPH)  
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

**Popis a odůvodnění změny:**

Popis: Úprava VZT potrubí z prostoru 1.PP.  
Důvod: Po odkrytí anglického dvorku ve dvoře bylo zjištěno, že do dvorku pod úroveň terénu ústí výduch odvětrání z 1.PP; protože v rámci rekonstrukce se dvorek ruší je nutné vyvést výduch pomocí VZT  
Výsledek: Přípočet hranatého pozinkovaného potrubí s protidešťovou žaluzií v profilu aby mohlo být zapraveno pod zateplení budovy v soklové části.  
Cena:  
Přípočty: 4 455,84 Kč  
Odpočty: 0,00 Kč

**CENA CELKEM 4 455,84 Kč (bez DPH)**

Přílohy: Krycí list 1 listů  
Specifikace změn 2 listů

**Stanovisko:**  
**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.Podpis  
souhlas *AWO* Datum: 5.9.2019**Objednatel:** ČR - Krajský soud v Ostravěsouhlas *AWO* Datum: 5.9.2019**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.  
Ing. Jan Hrdinasouhlas *AWO* Datum: 5.9.2019**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.souhlas *AWO* Datum: 5.9.2019





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: R19-002  
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6.12.2018
Zadavatel:		IČ:	
ČR-KS v Ostravě		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
Stavos Stavba a.s. Ostrava		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
ateliér 38		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
[REDAKOVANÉ]		DIČ:	
Poznámka:			

---

Cena bez DPH 4 455,84

---

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R19-002

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Místo: Datum: 6.12.2018

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

4 455,84

ZL ZL

4 455,84

ZL 24 Úprava výstupu ventilátoru v anglickém dvorku

4 455,84



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

**ZL 24 - Úprava výstupu ventilátoru v anglickém dvorku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

Atelier 38

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6.12.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**4 455,84**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

**ZL 24 - Úprava výstupu ventilátoru v anglickém dvorku**

Místo:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

Atelier 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**4 455,84**

D37 - Zařízení 3 Větrání spisoven m.č. 0.12, 0.14, 0.17

**4 455,84**

D12 - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH

2 197,95

D17 - SPOJOVACÍ MATERIÁL:

401,76

D39 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

1 856,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL - ZL

Soupis:

**ZL 24 - Úprava výstupu ventilátoru v anglickém dvorku**

Místo:

Datum:

6.12.2018

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

Atelier 38

Zhotovitel:

Štávos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 455,84</b>	
	D	D37	Zařízení 3 Větrání spisoven m.č. 0.12, 0.14, 0.17				4 455,84	
	D	D12	MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				2 197,95	
2	K	1020-29	do obvodu 1500 40% tvarovek	bm	2,50000	879,18	2 197,95	
	D	D17	SPOJOVACÍ MATERIÁL:				401,76	
3	K	1103-9	ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY	kg	2,00000	200,88	401,76	
	D	D39	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE				1 856,13	
1	K	1231-16625	PZZN-500x500-R2-S	ks	1,00000	1 856,13	1 856,13	











