

Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace
se sídlem Sokolská 3961, 760 01 Zlín
zastoupená Mgr. Lívií Popeskovou, ředitelkou školy
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Lívia Popesková, ředitelkou školy
IČ: 71007504
DIČ: CZ71007504

(dále jen „objednatel“)

a

DISKET, s.r.o.
se sídlem ev.č.1, 763 41 Biskupice
zastoupená [redacted] jednatel
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel
zástupce ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí
IČ: 60722231
DIČ: CZ60722231
zapsaná v obchodním rejstříku u KS. soudu v Brně, oddíl C, vložka 16634

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele: 05/2019 / 1
číslo smlouvy zhotovitele: 219019 / 1

Preambule

1. Stavební práce měly být prováděny dle smlouvy o dílo za plného provozu mateřské školy převážně v době letních prázdnin. Součástí prací bylo vybourání a zhotovení nového přístupového chodníku včetně podkladových vrstev. V případě provádění rekonstrukce chodníku by vznikl hlubší výkop, který by velmi ztížil přístup dětí, rodičů a ostatních uživatelů do objektu a ohrozil by jejich bezpečnost. Při provádění zemních, bouracích a ostatních prací by bylo hřiště pro děti zcela uzavřeno. Z výše uvedených bezpečnostních a provozních důvodů vznikl mateřskou školou požadavek na přerušení prací až do doby přerušení provozu mateřské školy.
2. V letních měsících se měly provádět sadové úpravy, vzhledem ke klimatickým podmínkám, velmi suchému počasí nešlo tyto práce provádět a bylo dohodnuto jejich provedení za vhodnějších klimatických podmínek.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je z výše uvedených důvodů prodloužení termínu plnění na akci:

"Mateřská škola Zlín - Sokolská - školní zahrada"

(dále také „dílo“),

Článek IV. Doba a místo plnění ve smlouvě o dílo se v bodě 1 ruší v části:

Ukončení provádění díla do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

dle smlouvy o dílo s ohledem na vyřízení legislativy ohledně dopravního značení a zvláštního užívání komunikací, veřejného prostranství a klimatické podmínky mělo být dílo ukončeno **do 21.9.2019**

a nahrazuje se novým zněním:


Ukončení provádění díla: do 21. 10. 2019.

Článek II. Závěrečné ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že mateřská škola zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 20. 9. 2019


objednatel
 Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961,
 příspěvková organizace



Mgr. Lívia Popesková
 ředitelka školy

V Biskupicích dne 16. 9. 2019

zhotovitel
 DISKET, s.r.o.

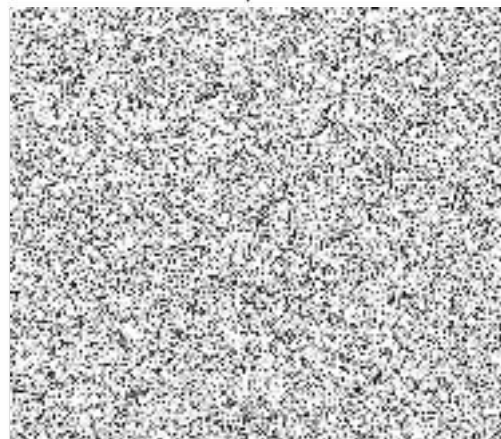

jeonátel
