


Změnový list č. 1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr SoD č. 2019D0284 ze dne 12.08.2019

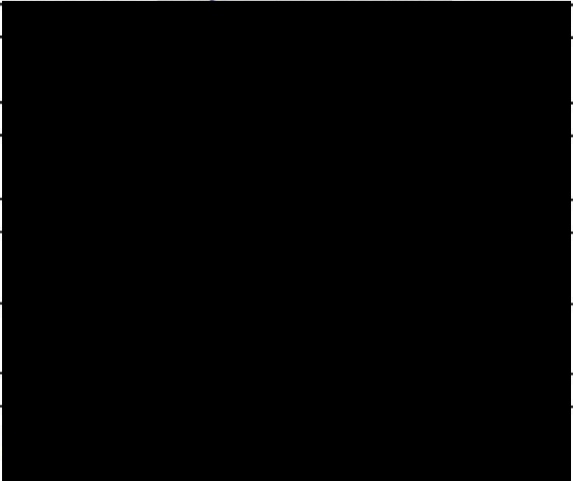
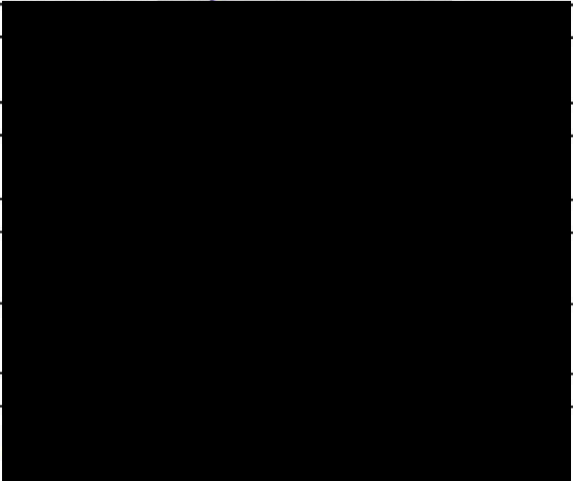
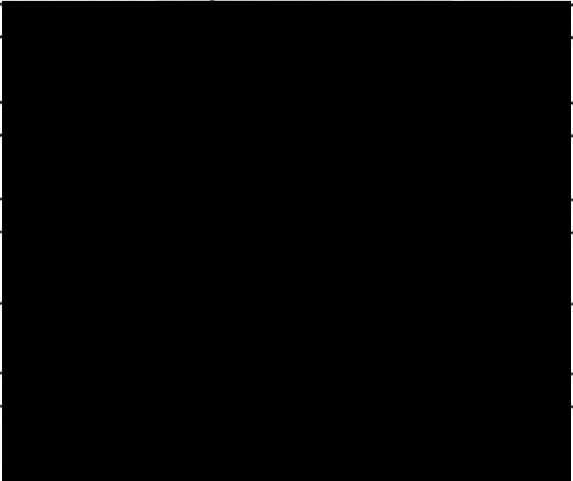
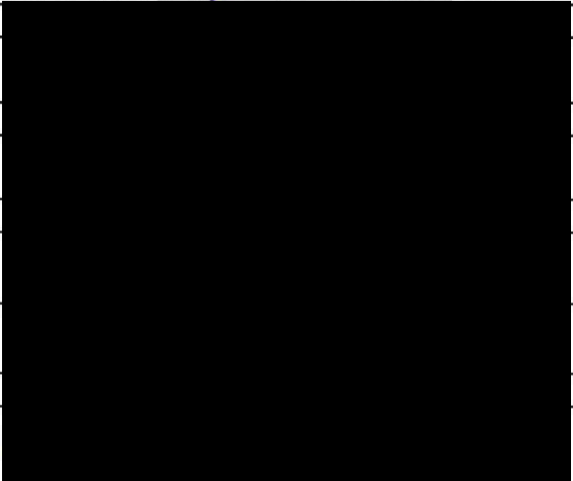
Stavba: **„PÁTEŘNÍ INFRASTRUKTURA PRŮMYSLOVÉ ZÓNY – 2.ETAPA, ČÁST 1
ODVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE, VĚTEV D4“,
Týn nad Vltavou, k.ú. Hněvkovice u Týna n. Vlt.** –

Číslo	Název objektu	cena víceprací bez DPH
01:	Vícepráce: Přeložka kanalizace	79 511,81
<i>Vícepráce budou hrazeny z položky č. 32 „finanční rezerva“ rozpočtu SO 01 Kanalizace.</i>		
Číslo	Název objektu	rozdíl ceny položky rozpočtu SoD bez DPH po započítání víceprací
02:	Položka č. 32 „finanční rezerva“ rozpočtu SO 01 Kanalizace.	-488,19
03:	Položka č. 51 „finanční rezerva“ rozpočtu SO 02 Obnova retenční nádrže.	-100 000,00
Celkový dopad změn dle ZL č.1 na cenu díla dle SoD Celkem Kč, bez DPH		-100 488,19

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Karel Šafář		10 -10- 2019

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		10 -10- 2019
Bc. David Mikolášek		
projektant/AD		10 -10- 2019
Bc. David Mikolášek		
za zadavatele/objednatele (město Týn nad Vltavou)		10 -10- 2019
Ing. Petr Rohlena		
za provozovatele kanalizace (Vltavotýnská teplotárenská a.s.)		10 -10- 2019
Zdeněk Štos		

Změnový list č. 1 - část 1**Popis a zdůvodnění změn****Název projektu: Páteří infrastruktura průmyslové zóny - 2. etapa: 1. část - větev D4**

Číslo a název objektu: Kanalizace

poř. č.	datum vzniku změny	popis	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
1		Přeložka kanalizace	V rámci stavby vynucená přeložka kanalizace.	Před započítáním stavby nebyl znám stav řešené kanalizace a možné další připojení vedlejších stok. Po provedení kamerových zkoušek daného úseku kanalizace, byly vyloučeny další připojení/připojky. Po kamerových zkouškách bylo přijato nejvhodnější technické řešení pro přepojení stávající kanalizace do nově budované dešťové kanalizace větve D4. Přeložka řeší změnu toku (úhlu) napojení stávající kanalizace do šachet tak, aby byla zajištěna její budoucí bezproblémová funkčnost. Navržené změny prací a dodávek nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené SOD. Úhrada víceprací dle ZL č.1 bude hrazena z položky č. 32 „finanční rezerva“ původního rozpočtu SO 01 Kanalizace. Ocenění víceprací bylo provedeno dle cen rozpočtu SOD. V původním rozpočtu neuvedené položky (položka č. 33, 34, 35, 36, 37) byly oceněny cenami v čase a místě obvyklými.
2		Položka č. 32 „finanční rezerva“ původního rozpočtu SO 01 Kanalizace.	Z části čerpána položka rozpočtu.	Položka bude z části čerpána na úhradu víceprací dle ZL č.1 za provedení přeložky kanalizace. Zbývá část položky č. 32 „finanční rezerva“ původního rozpočtu SO 01 Kanalizace nebude čerpána.
3		Položka č. 51 „finanční rezerva“ původního rozpočtu SO 02 Obnova retenční nádrže.	Nečerpána položka rozpočtu.	V průběhu stavby nebylo čerpáno z položky č. 51 "finanční rezerva" rozpočtu SO 02 Obnova retenční nádrže.

Změnový list č. 1 - část 2

Přeložka kanalizace - vícepráce hrazené z položky č. 32 "finanční rezerva" rozpočtu SO 01 Kanalizace

Pátevní infrastruktura průmyslové zóny - 2. etapa: 1. část - větev D4

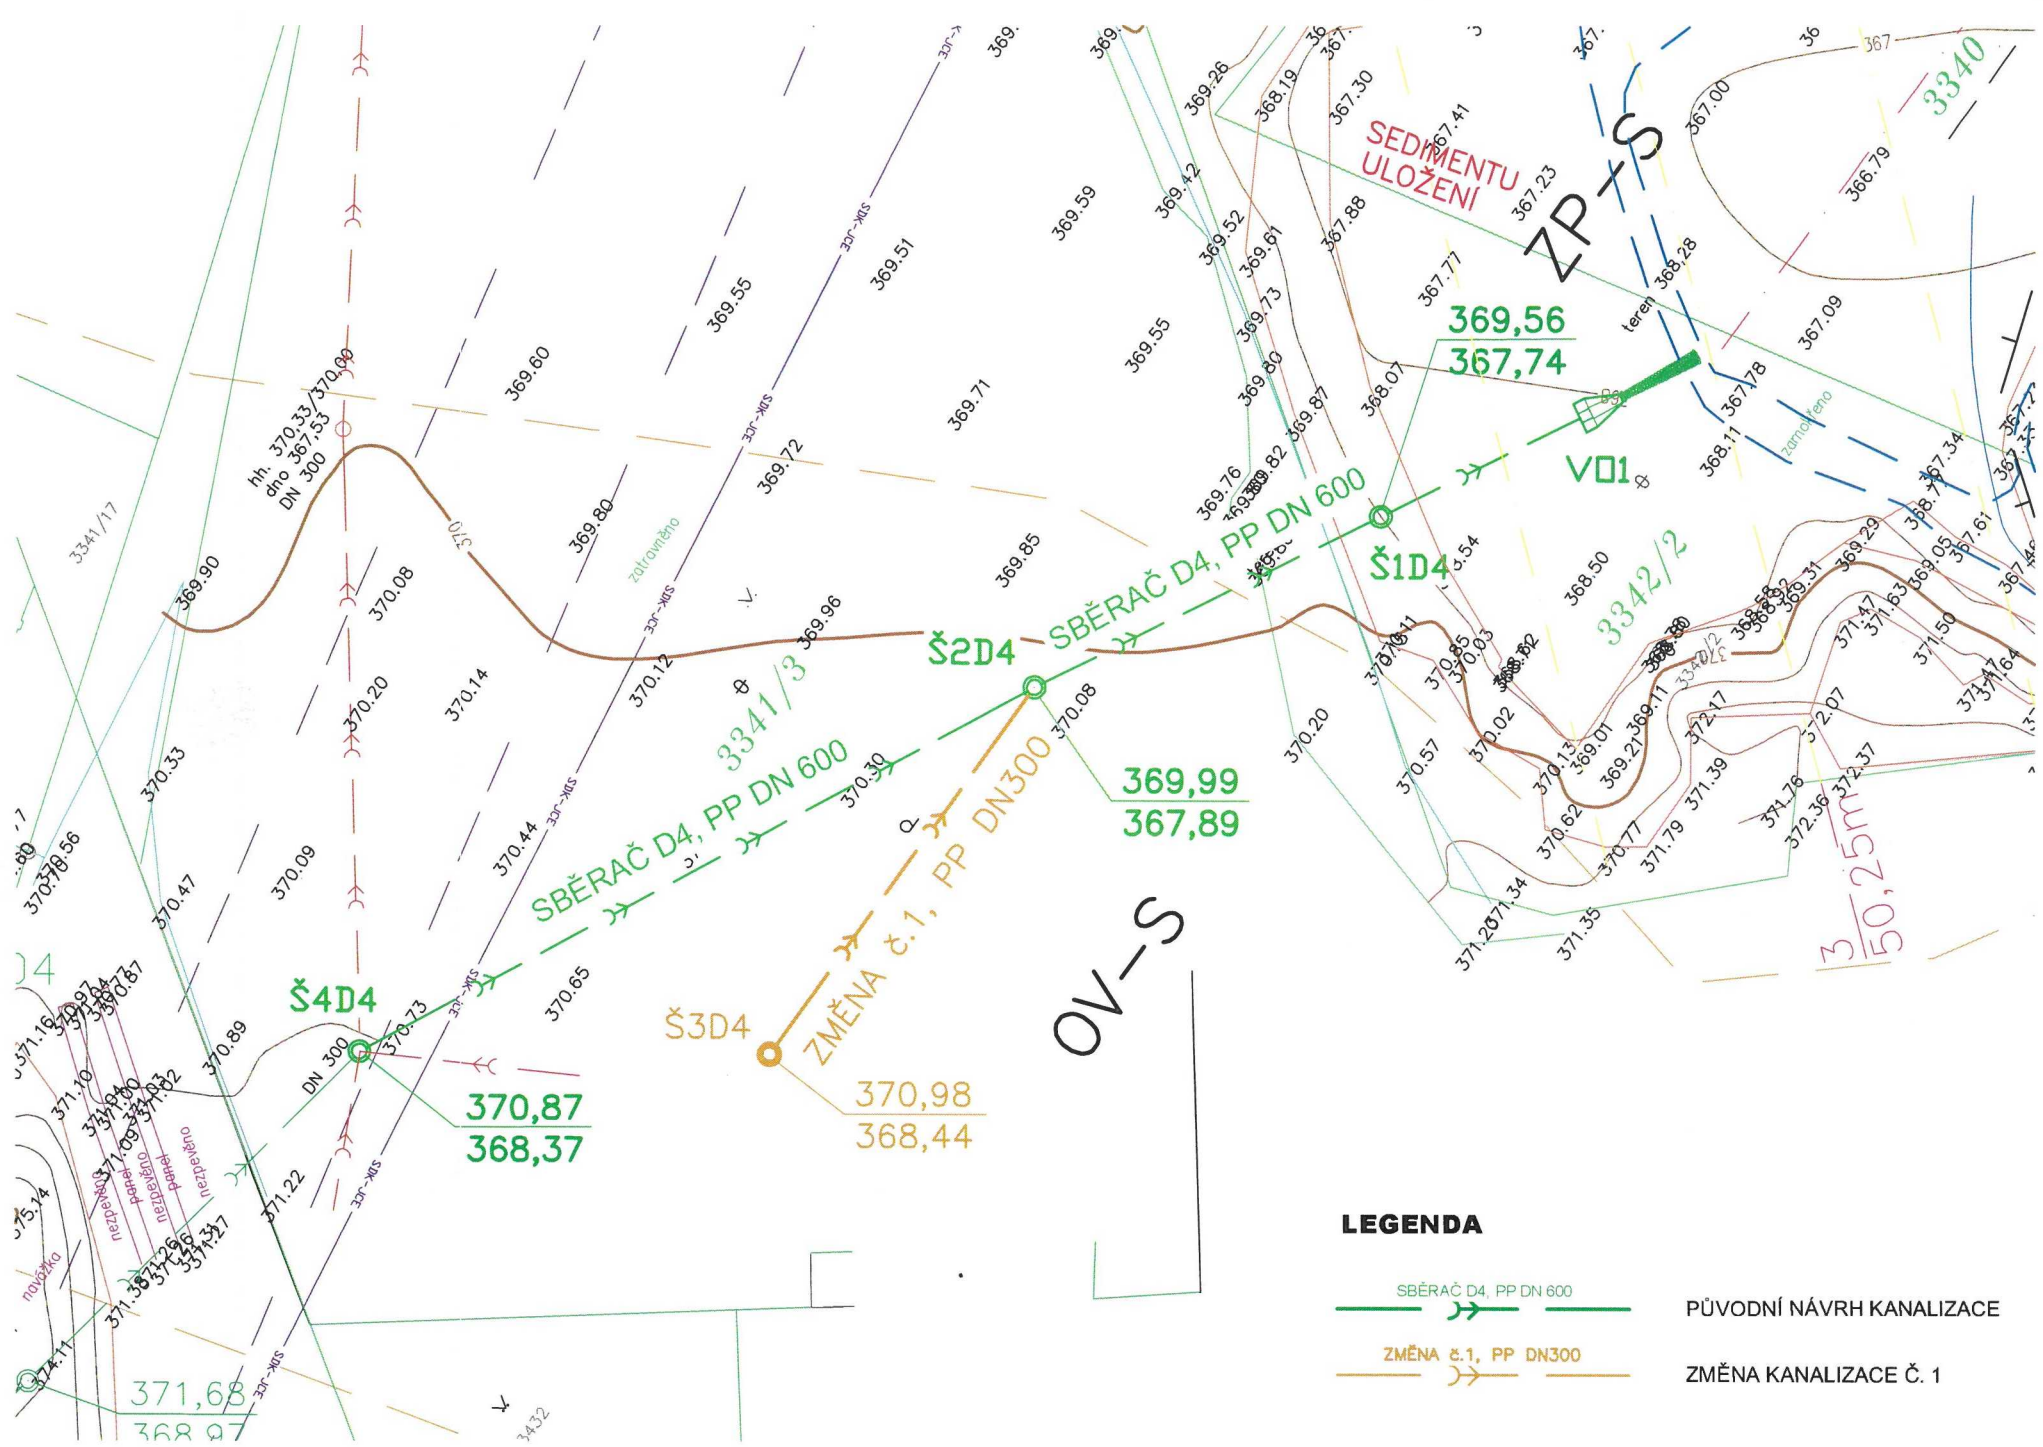
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	cena / MJ	cena dle SoD	celková cena mpo změně	rozdíl ceny	
Číslo a název rozpočtu: SO 01 Kanalizace											
1. - Přeložka kanalizace - vícepráce hrazené z položky č. 32 "finanční rezerva" rozpočtu SO 01 Kanalizace											
Díl:	1	Zemní práce								42 899,11	
	1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	60,62500	63,62500	3,00000	67,95	4 119,47	4 323,32	203,85
	3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	214,79228	265,79228	51,00000	142,65	30 640,12	37 915,27	7 275,15
	6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	159,30504	180,30504	21,00000	111,15	17 706,76	20 040,91	2 334,15
	33	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,00000	18,87900	18,87900	86,94	0,00	1 641,34	1 641,34
	34	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,00000	18,87900	18,87900	230,40	0,00	4 349,72	4 349,72
	11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	241,35362	273,47462	32,12100	108,90	26 283,41	29 781,39	3 497,98
	7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	85,71778	101,59720	15,87942	511,20	43 818,93	51 936,49	8 117,56
	13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, dodání osiva	m2	242,50000	342,50000	100,00000	23,85	5 783,63	8 168,63	2 385,00
	12	181301104R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2	m2	242,50000	342,50000	100,00000	107,10	25 971,75	36 681,75	10 710,00
	8	58337310	Štěrkopísek frakce 0-8	t	141,43434	148,64874	7,21440	330,50	46 744,05	49 128,41	2 384,36
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								3 350,70	
	15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	16,67160	19,67160	3,00000	1 116,90	18 620,51	21 971,21	3 350,70
Díl:	8	Trubní vedení								29 842,00	
	35	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	0,00000	30,00000	30,00000	56,30	0,00	1 689,00	1 689,00
	22	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	93,00000	123,00000	30,00000	13,10	1 218,30	1 611,30	393,00
	36	800111111T00	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	0,00000	1,00000	1,00000	5 980,00	0,00	5 980,00	5 980,00
	37	28614273R	Trubka kanalizační K2 300x6000 mm PP hrdlová	kus	0,00000	5,00000	5,00000	4 356,00	0,00	21 780,00	21 780,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								3 420,00	
	26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,04016	6,60016	4,56000	750,00	1 530,12	4 950,12	3 420,00
Celkem Přeložka kanalizace KČ, bez DPH:										79 511,81	
<i>Poznámka: bude hrazeno z položky č. 32 "finanční rezerva" rozpočtu SO 01 Kanalizace</i>											

Změnový list č. 1 - část 3

Měněpráce

Pátevní infrastruktura průmyslové zóny - 2. etapa: 1. část - větev D4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SoD	množství po změně	rozdílné množství	cena / MJ	cena dle SoD	celková cena po změně	rozdílné ceny
Číslo a název rozpočtu: SO 01 Kanalizace										
Měněpráce										
Díl:	VN	Vedlejší náklady								-488,19
32	005 26-1030 R	Finanční rezerva	soubor	1,00000	0,99389	0,00611	80 000,00	80 000,00	79 511,81	-488,19
		<i>část položky č.32 Rozpočtu SO 01 použita na úhradu víceprací spojených s přeložkou kanalizace dle ZL č.1 - viz rozpis oceněných položek</i>								
Číslo a název rozpočtu: SO 02 Obnova Retenční nádrže										
Měněpráce										
Díl:	VN	Vedlejší náklady								-100 000,00
51	005 26-1030 R	Finanční rezerva	soubor	1,00000	0,00000	1,00000	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
		<i>položka č.51 Rozpočtu SO 02 není čerpána</i>								
Celkem										-100 488,19
Celkem měněpráce dle ZL č. 1, v Kč, bez DPH:										-100 488,19



LEGENDA

SBĚRAČ D4, PP DN 600

ZMĚNA č.1, PP DN300

PŮVODNÍ NÁVRH KANALIZACE

ZMĚNA KANALIZACE Č. 1
