

Ev. č. smlouvy objednatele:	31/2018/ MWS
Ev. č. smlouvy zhotovitele:	

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998/6000

Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,

email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

CUBESPACE s.r.o.

Nad Šetelkou 481, 180 00 Praha 8

IČ: 27886794

Bankovní spojení: Komerční banka, 35-8744480277/0100

Telefon :(+420) 733 353 718

Email: info@cubespace.eu

www: <http://www.cubespace.eu>

Zastoupený: Mgr. Martin Kokta, MBA, CEO, jednatel společnosti, tel.: (+420) 733 353 718

email: info@cubespace.eu

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci a realizaci stavby s názvem
„Navýšení kapacit MŠ Praha-Slivenec“.

1.

Účel a důvod uzavření dodatku č. 1 k SOD

1.1

Účelem uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (SOD) je změna termínů realizace díla. Důvodem je návrh etapizace do žádosti o dotaci z OPPPR (Operační program Praha - pól růstu ČR).

2.

Změna termínů realizace díla

2.1

Nově jsou oproti harmonogramu a textu smlouvy o dílo v čl. 2 dohodnuty tyto etapy díla a termíny jejich realizace:

Etapa	Název etapy	Lhůta
	Počátek prací na PD	1.2.2018
1. etapa	Dokončení projektové dokumentace	30.6.2018
2. etapa	Vydání společného územního a stavebního povolení (SÚSP) a dokončení prováděcí dokumentace (DPS)	31.12.2018
3. etapa	Dokončení stavby vč. přípojek, kolaudace, vybavení MŠ	30.6.2019

2.2 Nově se mění také Příloha č. 2 SoD – Harmonogram díla dle přílohy č. 1 dodatku.

3.

Závěrečná ustanovení

3.1



Tento dodatek je vyhotoven ve **3 vyhotoveních** s platností originálu. **Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.**

3.2

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 0 příloh.

V Praze dne 21.6.2018

V Praze dne 21.6.2018

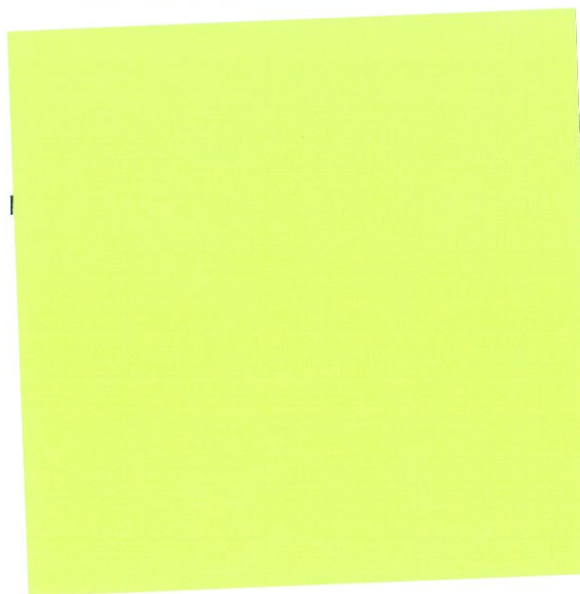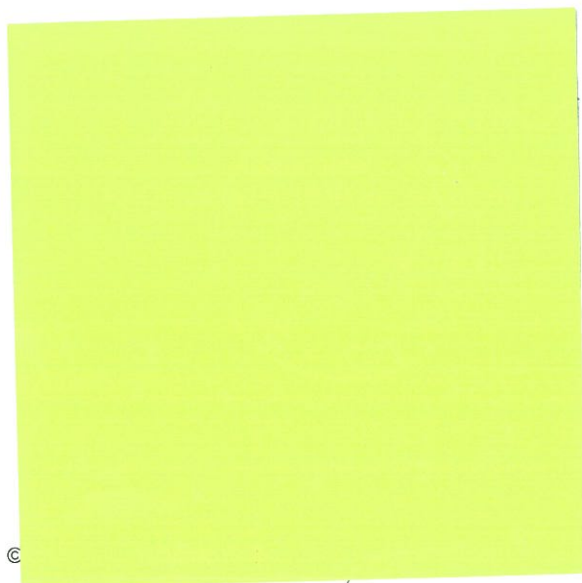

sti

Příloha č. 1 dodatku
Časový harmonogram výstavby (přípravy a realizace stavby)

č. akce	Popis prací	Zahájení	Konec
1	Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení	02.04.2018	22.04.2018
2	Vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců sítí a sousedů	23.04.2018	24.08.2018
3	Vydání společného územního a stavebního povolení (SÚSP) včetně právní moci	25.08.2018	31.12.2018
4	Dokumentace provádění stavby či realizační dokumentace (DPS)	15.09.2018	30.01.2019
5	Dílenská dokumentace	16.09.2018	30.1.2019
6	Realizace díla - základy a inženýrské sítě	01.03.2019	10.06.2019
7	Realizace díla v montážní hale (stavba kontejnerů)	01.10.2018	30.04.2019
8	Realizace díla - montáž v místě stavby	01.05.2019	10.06.2019
9	Autorský dozor	07.09.2018	10.06.2019
10	Dokumentace skutečného provedení stavby	10.6.2019	15.06.2019
11	Žádost o kolaudaci díla	15.6.2019	15.06.2019
12	Zajištění kolaudace díla	30.06.2019	30.06.2019
