

Denní záznamy stavby:

List č.

34054

Datum:

Počasí: jasno 27°C

Prac. doba: 7⁰⁰-19⁰⁰

Poč. prac.: 1 THP (DNÍČ), 2L

Popis prac.: rovnání dna potoku - protokol vody
trídění materiálu

15. 7. 2018

Úterý

Stav. vody: 236,07 mnm



Počasí: poloblačno, dešť 18°C

Prac. doba: 7⁰⁰-19⁰⁰

Poč. prac.: 2 THP (RIMOŠIV, DNÍČ)
4L+3 STROJNÍČI

16. 7. 2018

Pondělí

Stavební mech.: Bagu 315, MAN, BAGL 305
MAN NAVES

Popis prac.: odvoz materiálu na skladiště


50-501 - rovnání dna bagrem

- kácení křovin přes stromo

- odvoz křovin

- vybourání obrubníků přes
stromo

Stav. vody: 236,05 mnm



Zápis geodeta: Vytvořeno vytyčovací bodové pole
pomocí GPS - CZEPOS a ČJNS. Změny 2 výškoví
body pro potřebu stavby.

16. 7. 2018





Doprastav a.s. Organizační složka Praha

K zahradnictví 13

182 00 Praha 8

V Praze dne 10.7.2019

Věc: II/337 Močovice most ev.č. 337-007 – vyjádření TDI k návrhu ZBV.

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby ze dne 8.7. 2019 uvedené akce Vám sděluji následující.

ZBV č. 2 - SO 001 Demolice stávajícího mostu


Zvýšení množství stavebních prací spojených s demolicí stávajícího mostu, dopravou na skládky a skládkovným z důvodu jiné zastižené tloušťky mostovky proti předpokladu PDPS.

S výše uvedeným návrhem ZBV za TDI souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jindřich Přivratský, TDI

VPÚ DECO PRAHA a.s.



PRAHA a.s. Podbabská 1014/20
Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
182 00, DIČ: CZ60193280
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Doprastav, a.s.
Organizační složka PRAHA
K zahradnictví 13
182 00 Praha

V Praze, dne 10.07.2019

Stavba: II/337 Močovice, most ev. č. 337 – 007 přes potok Klejnárku

Věc: Vyjádření AD k návrhu ZBV č.2

Na vaši žádost o stanovisko autorského dozoru k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby uvedené akce Vám sděluji následující.

1) ZBV č.2 – SO 001 Demolice stávajícího mostu

Stanovisko: Při demolici mostu byla zastižena jiná tloušťka mostovky oproti předpokladu PDPS.

S výše uvedeným návrhem za AD souhlasím.

S pozdravem,

2
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
tel.: (+420) 224 354 363
ingutis@ingutis.cz
www.ingutis.cz
Ing. INGUTIS, spol. s r.o.
(autorský dozor)

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 76014

Datum vzniku a zápisu:	<u>6. března 2006</u>	
Spisová značka:	<u>C 110811 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>A 76014 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u> <u>vymazáno 12. ledna 2016</u>
	<u>A 11191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích</u>	<u>zapsáno 12. ledna 2016</u> <u>vymazáno 17. ledna 2019</u>
	<u>A 76014 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 17. ledna 2019</u>
Obchodní firma:	<u>ROBSTAV stavby s.r.o.</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>ROBSTAV stavby k.s.</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u> <u>vymazáno 3. ledna 2019</u>
	<u>ROBSTAV k.s.</u>	<u>zapsáno 3. ledna 2019</u>
Sídlo:	<u>Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 13000</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 12. ledna 2011</u>
	<u>Praha 2, italská 1580/26, PSČ 12000</u>	<u>zapsáno 12. ledna 2011</u> <u>vymazáno 1. července 2015</u>
	<u>Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6</u>	<u>zapsáno 1. července 2015</u> <u>vymazáno 18. prosince 2015</u>
	<u>Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek</u>	<u>zapsáno 18. prosince 2015</u> <u>vymazáno 11. dubna 2017</u>
	<u>Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek</u>	<u>zapsáno 11. dubna 2017</u> <u>vymazáno 3. ledna 2019</u>
	<u>Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4</u>	<u>zapsáno 3. ledna 2019</u>
Identifikační číslo:	<u>274 30 774</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u>
Právní forma:	<u>Společnost s ručením omezeným</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>Komanditní společnost</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u>
Předmět podnikání:	<u>zprostředkování obchodu a služeb</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u>

	vymazáno 18. ledna 2010
<u>velkoobchod</u>	zapsáno 6. března 2006 vymazáno 18. ledna 2010
<u>specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím</u>	zapsáno 6. března 2006 vymazáno 18. ledna 2010
<u>maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím</u>	zapsáno 6. března 2006 vymazáno 18. ledna 2010
<u>přípravné práce pro stavby</u>	zapsáno 6. března 2006 vymazáno 18. ledna 2010
<u>provádění staveb, jejich změn a odstraňování</u>	zapsáno 6. března 2006
<u>nakládání s odpady</u>	zapsáno 6. března 2006 vymazáno 18. ledna 2010
<u>silniční motorová doprava nákladní</u>	zapsáno 22. srpna 2006 vymazáno 18. ledna 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	zapsáno 18. ledna 2010
<u>Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny</u>	zapsáno 18. ledna 2010 vymazáno 20. ledna 2016
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí	zapsáno 20. ledna 2016
<u>výkon zeměměřičských činností</u>	zapsáno 18. ledna 2010
<u>projektová činnost ve výstavbě</u>	zapsáno 18. ledna 2010

Statutární orgán:

Jednatel:

ROBERT BENESDen vzniku funkce: 6. března 2006Den zániku funkce: 30. května 2007

zapsáno 6. března 2006

vymazáno 21. září 2007

Jednatel:

Ing. RADEK KOZÁKDen vzniku funkce: 6. března 2006

zapsáno 6. března 2006

vymazáno 18. ledna 2010

Jednatel:

Ing. RADEK KOZÁK

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	SO 901/1	

Objednatel: **Středočeský kraj**
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: **REKO Močovice**

Vedoucí společník **Doprastav, a.s.**
Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK
IČ: 31333320
podnikající v ČR jako **Doprastav, a.s., organizační složka Praha**
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
IČ: 49281429

Společník **Doprastav CZ s.r.o.**
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
IČ: 405561027

Společník **Robstav stavby k.s.**
Mezi vodami 205/2a, Modřany, 143 00 Praha4
IČ:274 30 774

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	73 892,00	73 892,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	73 892,00	73 892,00


Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list


Název a evidenční číslo Stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 901/1	Číslo ZBV: 3														
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření																
Strany smlouvy o dílo č. S-1093/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.04.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: REKO Močovice, K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> <u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 2. Změnový list 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 4. Rozpis ocenění Změn položek 5. Přehled zařazení změn do skupin 6. Přehled dalších dokladů Další doklady dle přehledu 1 2 1 1 1 1 31 počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RDK</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 2. Změnový list 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 4. Rozpis ocenění Změn položek 5. Přehled zařazení změn do skupin 6. Přehled dalších dokladů Další doklady dle přehledu 1 2 1 1 1 1 31 počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RDK</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3,4	Zhotovitel	5	Projektant	6	TDI	7	RDK
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 2. Změnový list 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 4. Rozpis ocenění Změn položek 5. Přehled zařazení změn do skupin 6. Přehled dalších dokladů Další doklady dle přehledu 1 2 1 1 1 1 31 počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RDK</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3,4	Zhotovitel	5	Projektant	6	TDI	7	RDK			
Paré č.	Příjemce															
1,2	Objednatel															
3,4	Zhotovitel															
5	Projektant															
6	TDI															
7	RDK															
Iniciátor změny: Doprastav a.s., Organizací složka Praha Popis a zdůvodnění Změny:																
<u>Prodloužení DIO o dobu ZTP</u> Změna se týká prodloužení doby pro provedení díla o 98 dní, z důvodů nevhodných klimatických podmínek zamezujících provádění díla v rámci zimního období, dle čl. II bodu 2.7 smlouvy o dílo, dále jen "SoD". Smluvní lhůta provádění byla 36 týdnů od Výzvy objednatele k zahájení realizace (doklad 08). Výzva byla odeslána zhotoviteli s datem 28.6.2018. Termín dokončení dle SoD (36 týdnů) byl 7.3.2019, v návaznosti na termín výzvy objednatele. Práce byly přerušeny v období ZTP od 12.12.2018 do 19.3.2019, na základě Zápisu z KD 10 bod 10.1 (dne 5.12.2018 - doklad 9) a souvisejících dokumentů Ohlášení zhotovitele ze dne 12.12.2018 (doklad 10), Zápisu ve SD (doklad 11) a aktualizací HMG o ZTP (doklad 17). Znovuzahájení prací po ZTP je povoleno zástupcem objednatele zápisy ve SD (viz SO 301 - doklad 11). Konečný termín pro dokončení stavby se tedy posouvá o 98 dnů, ze 7.3.2019 na 13.6.2019. Důsledkem přerušení prací po dobu ZTP bylo prodloužení DIO. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nezbytnou pro dokončení díla, která je podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.																

Udaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
0,00	73 892,00	73 892,00	73 892,00	

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Martin Nikmon	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Václav Ráček	datum		
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jindřich Přívratský	datum	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Mgr. Martin Tutka	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis	
				Číslo pa	

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:3

Název Stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 901/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
208 089,55

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	208 089,55	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	73 892,00	73 892,00	35,51%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	281 981,55	73 892,00	35,51%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Nikmon

souhlasím 25. 09. 2019

Projektant (autorský dozor): Ing. Václav Ráček

souhlasím 25. 09. 2019

Stavební dozor: Ing. Jindřich Přivratský

souhlasím 25. 09. 2019

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

souhlasím 07. 10. 2019

Supervize (RDK) Ing. Václav Chytil

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jan Fidler, DiS

souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901 - Dopravně inženýrská opatření								SO 901/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 901 - Dopravně inženýrská opatření								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Nové položky											
7	914129	doprav značky základ vel ocel fólie TR1 - nájemné od 12.12.2018 do 20.3.2019 (98 dní x 29 značek)	kus/den	0	2842	2 842,000	7,00	0,00	0,00	19 894,00	19 894,00	19 894,00	100,00
8	914429	doprav znač 100x150cm ocel fólie TR1 - nájemné od 12.12.2018 do 20.3.2019 (98 dní x 7 značek)	kus/den	0	686	686,000	21,00	0,00	0,00	14 406,00	14 406,00	14 406,00	100,00
9	916139	dopravní světlo výstražné souprava 5 kusů - nájemné od 12.12.2018 do 20.3.2019 (98 dní x 2 soupravy)	kus/den	0	196	196,000	202,00	0,00	0,00	39 592,00	39 592,00	39 592,00	100,00
CELKEM:								0,00	0,00	73 892,00	73 892,00	73 892,00	

Za Zhotovitele: (stavbyvedoucí)

Datum:



Za Objednatele: (odpovědný TDI)

Datum:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/337, most ev.č.337-007 Močovice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	15 430 251,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15 598 245,91
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	18 873 877,55
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,09%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14 odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	167 994,91
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,69%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 629 075,30

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,29%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,80%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	167 994,91
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 715 125,50

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

Skupiny změn

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
						Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměra položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/337, most ev.č.337-007 Močovice	0,00	167 994,91	167 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 728,23	44 728,23	44 728,23	0,00	123 266,68	123 266,68	123 266,68	0,00	0,00%
101.2	1	Komunikace II/337 - chodník / Provedení obchůzní trasy	0,00	49 374,68	49 374,68			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		49 374,68	49 374,68	49 374,68		0,00%
001	2	Demolice stávajícího mostu / Rozdíly oproti PDPS zjištěné při realizaci bouracích prací	0,00	44 728,23	44 728,23			0,00			0,00	0,00	44 728,23	44 728,23	44 728,23			0,00	0,00		0,00%
901	3	Dopravné inženýrské opatření / Prodloužení DIO o dobu ZTP	0,00	73 892,00	73 892,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	73 892,00	73 892,00	73 892,00		0,00%
																					0,00%
																					0,00%
																					0,00%
																					0,00%
																					0,00%
																					0,00%
																					0,00%
																					0,00%
																					0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k dalu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/337, most ev.č.337-007 Močovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 901/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO 901 po změně	3	
08 Výzva KSÚS _zahájení stavby	1	
09 KD č.10_2018-přerušeni klima	4	
10 Ohlášení zhotovitele o začátku ZTP	1	
11 SD SO 201, SD SO 202, SD SO 301 - přerušeni	3	
12 Žádost zhotovitele o souhlas KSÚS s DIO	3	
13 Souhlas KSÚS s prodloužením DIO	1	
14 Povolení PČR k DIO	1	
15 Mě Čáslav souhlas s uzávěrou	8	
16 HMG smluvní	1	
17 HMG_ZTP	1	
18 Vyjádření TDI k ZBV3 - DIO	1	
19 Vyjádření AD_DIO	1	
20 Změna adresy společníka zhotovitele výpis z OR	2	
Počet listů celkem	31	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

Objekt

Reg.

Reg. číslo

Objekt

Reg. číslo

Zpracovatel

Objekt

Objekt

Reg. číslo

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Reg.

Náklady z rozpočtu 281 981,55

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 281 981,55

DPH - náklady	281,55	%	281 981,55		281 981,55
DPH - náklady	0,00	%			0,00

Cena s DPH v CZK 341 197,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Stavba:

Stavba:

II/337 Močovice, most ev. č. 337-007 přes potok Klejnárku - verze 4

Místo:

Datum:

27.02.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		281 981,55	341 197,68
SO 901 Dopravně inženýrská opatření		281 981,55	341 197,68
SO 901 Dopravně inženýrská opatření		281 981,55	341 197,68
2) Ostatní náklady		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		281 981,55	341 197,68

ROZPOČET

Stavba:

II/337 Močovice, most ev. č. 337-007 přes potok Klejnárku - verze 4

Objekt:

SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

Část:

SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							281 981,55
9 - Ostatní konstrukce a práce							281 981,55
1	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	29,000	2 499,84	72 495,36
Přechodné dopravní značení základní velikosti - objízdná trasa. Dodávka a montáž, vše v režii zhotovitele. Délka nájmu 270 dnů. Značky B1 4 ks, E13 2 ks, Z2 4 ks, A15 2 ks, E3a 6 ks, IP10a 2 ks, IS 11b 6 ks a IP10h 3 ks. (Počty dle OJ). Předmětné klíčovatky dig. AutoCAD položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.							
A1					29,000		
B1					29,000		

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	29,000	50,48	1 463,92
<i>Průběžně dopravní značky základní velikosti - objednat travní, Demontáž v režii žadatele. Délka nájezdu 270 dnů. Značky P22 2 ks a B1 to 3 ks - předstírat Předstírat 1/10 dnů dig. Autocall 10 dnů za zřízení odstranění demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>							
		A2	4 + 2 + 4 + 2 + 6 + 2 + 6 + 3		29,000		
		B2	"Celkem: "A2		29,000		
3	K	914421	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	7 673,19	53 712,33
<i>Průběžně dopravní značky základní velikosti - objednat travní, Demontáž v režii žadatele. Délka nájezdu 270 dnů. Značky P22 2 ks a B1 to 3 ks - předstírat Předstírat 1/10 dnů dig. Autocall 10 dnů za zřízení odstranění demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>							
		A3	7,00		7,000		
		B3	"Celkem: "A3		7,000		
4	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	151,44	1 060,08
<i>Průběžně dopravní značky základní velikosti - objednat travní, Demontáž v režii žadatele. Délka nájezdu 270 dnů. Značky P22 2 ks a B1 to 3 ks - předstírat Předstírat 1/10 dnů dig. Autocall 10 dnů za zřízení odstranění demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>							
		A4	7,00		7,000		
		B4	"Celkem: "A4		7,000		
5	K	916131	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	39 375,96	78 751,92
<i>Souprava 5 ks světla S7. Dodávka a montáž, v režii žadatele. Délka nájezdu 270 dnů. Počet 2 ks. Předstírat 1/10 dnů dig. Autocall 10 dnů za zřízení odstranění demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>							
		A5	2,00		2,000		
		B5	"Celkem: "A5		2,000		
6	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	302,97	605,94
<i>Souprava 5 ks světla S7. Demontáž v režii žadatele. Délka nájezdu 270 dnů. Počet 2 ks. Předstírat 1/10 dnů dig. Autocall 10 dnů za zřízení odstranění demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>							
		A6	2,00		2,000		
		B6	"Celkem: "A6		2,000		
7	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KUS/ den	2 842,000	7,000	19 894,00
					<i>ZBV3 - nájemné od 12.12.2018 do 20.3.2019 (98 dnů 29 značek). Cena položky byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP 2018</i>		
					2 842,000		
8	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KUS/ den	686,000	21,000	14 406,00
					<i>ZBV3 - nájemné od 12.12.2018 do 20.3.2019 (98 dnů 7 značek). Cena položky byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP 2018</i>		
					686,000		
9	K	916139	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	KUS/ den	196,000	202,000	39 592,00
					<i>ZBV3 - nájemné od 12.12.2018 do 20.3.2019 (98 dnů 2 soupravy). Cena položky byla stanovena na základě expertních cen uvedených v cenové soustavě OTSKP 2018</i>		
					196,000		

VÝZVA

V souladu s čl. II., odst. 2.1. a 2.2., Smlouvy o dílo č. S-1093/DOP/2018 ze dne 30. 4. 2018. (dále jen SoD) a na základě dohody vyzývá Krajská správa a údržba silnic, zhotovitele společnost Doprastav, a.s., IČ: 492 81 429 se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 182 00, k plnění předmětu díla SoD tj. zahájení realizace akce „II/337, most ev.č. 337-007 Močovice“.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (126)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001

28. 06. 2018

Bc. Z

Ředitel Krajské správy a údr

ho kraje, p.o.

Zápis z kontrolního dne č. 10 stavby

II/337, most ev.č. 337 – 007 Močovice

Kontrolní den			
Číslo	10	konaný dne	5.12. 2018

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 10

Program kontrolního dne / operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) Stav PD (předávání RDS, schvalování TePř ...)
 - b) Popis provedených prací
 - c) Finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného HMG (předávání podkladů – RDS aj.)	Stavba probíhá dle předaného HMG vyjma SO 301 dešťová kanalizace (prodlení cca 3 týdny z důvodu kolize v napojení na stávající DK. Zhotovitel předal čistopis TePř a RDS pro spodní stavbu a el. koncept VTD ocelové konstrukce od Pontex. Aktuální termíny: 10.12. 2018 betonáž základu OZ1 Do 15.1.2019 RDS komplet včetně rozdílového výkazu výměr Do 14.12.2018 cca pokračování prací dle počasí DO 5.12. VTD mostní závěr a ložiska Ocelová konstrukce v „černém stavu“ cca 15.12.2018 u spol OK-BE
b) popis provedených prací	Provedeny zpětné zásypy OP2, OZ2 a OZ3 pod drenážní potrubí, obnažení pilot OZ1. Zhotovitel vypracoval měsíční zprávu o provedených pracích za 10/2018.
c) finanční plnění	Od začátku stavby prostavěno 5 224 255,26 Kč bez DPH (včetně fakturace za 11/2018).

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
1.1.	Harmonogram	Aktualizovat harmonogram stavby. Předat informaci na ObÚ Močovice	Zhotovitel	Trvá do 14.12.2018
1.2.	RDS, TePř.	Předat konečný koncept včetně rozdílového výkazu výměr	Zhotovitel	Nesplněno, trvá do 15.1.2019
2.2	Vyzískaný materiál	Doložit předání výzisku žul. kostek KSÚS Kolín. Ostatní materiál - doložit podklady pro povinný odkup (recyklát, zábradlí, žul sloupky)	Zhotovitel	Trvá

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 10 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 10/2018	II/337, MOST EV.Č. 337 – 007 MOČOVICE	FORMULÁŘ KD/OP	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3	

		Re KD10: Objednatel kompletně odebere vyzískané žul. kostky, dá info o termínu, předání zápisem v SD a vážní listky. Znalecký posudek hotov. Ostatní materiál beze změny.	Objednatel	
4.2	ObÚ – žádost – osvětlení	Obec žádá po dobu stavby zajistit osvětlení na obchůzní trase z důvodu bezpečnosti chodců Re KD5: DIO (včetně obchůzní trasy) bylo projednáno a schváleno Policií ČR a účastníky stav. řízení včetně obce - bez osvětlení. Re KD10: KSÚS prověří možnosti	Objednatel	Trvá
5.1	Omlítka čp.62 – mikrotrhliny	Majitel čp.62 p. Semrádová dává na vědomí výskyt mikrotrhlin na vnitřních omlítkách (omítky cca 3 měsíce staré) po provedení pilot u OP1 sousedící s pozemkem. Re KD7 : Provézt opakovanou pasportizaci objektu po odbourání pilot a zemních pracích u OP1, porovnat s předchozí.	Zhotovitel	Trvá
6.4.	Sjednocení povrchu na zceleném pozemku	Navrhnout způsob řešení sjednocení povrchu (panely+asfalt) na zceleném pozemku obce u OP2	AD	Trvá
9.1.	Sloupy NN ČEZ	Zhotovitel připomíná nutnost odstranit sloupy NN ČEZ.	ObÚ Močovice	Trvá

3. Kontrola kvality

a) zpráva o vyhodnocení kvality Demolice stávající konstrukce provedena jednorázově zjednodušeným postupem odlišným od TePř, ostatní beze změny dle TePř a PDPS.

4. Stav BOZP a PO

Problematika BOZP bude řešena samostatnou měsíční zprávou. Nutno udržovat značení a oplocení stavby s ohledem na riziko pohybu cizích osob.

KOO BOZP připomíná důsledné používání osobních ochranných pomůcek – přilby, rukavice, brýle a nošení reflexního oblečení - vest s firemním označením.

5. Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
10.1	Přerušení stavby – klima	Zápisem do SD a žádostí na Středočeský kraj potvrzenou optimálně TDI a AD. Pouze za nevhodných klimatických podmínek a nemožnosti jiných činností.	Zhotovitel	
10.2	Oplocení u čp.63	Prověřit rozpor mezi výkresy, pozici opěry a oplocením u čp.63 – přeplocení ?	AD+zhotovitel	20.12.2018

5. Různé

R.01 Kabel CETIN – upozornění AD : před domem č.p.3 se nachází kabel CETIN v neurčené poloze, nutno ochránit a postupovat dle požadavků správce

R 02 V rámci KD3 provedeno místní šetření ve věci přeplocení u domu čp. 62 (plot neoprávněně až na pozemku stavby).
Plot bude zrušen bez náhrady – viz také samostatný zápis v SD.

7. Závěr

Datum konání příštího KD / OP KD č.11 – svolá TDI po dohodě a dle průběhu (přerušení) prací

Zapsal TDI:

Ing. Jindřich Přivratský



RAHA a.s. Podbabská 1014/20
Praha 6, ČU: 2689681/0303
93280, DIČ: CZ60193280
Technický DOZOR INVESTORA

Podpis

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 10 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 10/2018	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 2/3

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD č.10

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky.

Elektronicky odesláno dne 6.12. 2018 na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 10 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		FORMULÁŘ KD
KD 10/2018	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3

Prezenční listina

Název akce: II/337, most ev.č. 337-007 Močovice			
Místo konání: Močovice			
Datum konání: 6.12.2018			
Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS		
Ing. Milan Jeřábek	KSÚS		
Ing. Jindřich Přivratský	VPÚ – TDI		
Ing. Petr Jelínek	VPÚ - KOBOZP		
Ing. Václav Ráček	INGUTIS – AD		
Ing. Miroslav Ritnošík	Doprastav, a.s.		
Michal Kabela	Robstav stavby		
Lukáš Avenarius	Doprastav, a.s.		
Peter Dinič	Doprastav, a.s.		
Jiří Stehlík	Doprastav, a.s.		
Milan Kos	Obec Močovice		

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	II/337, MOST EV.Č. 337-007 MOČOVICE	Prezence
EVIDENČNÍ ČÍSLO: KD/OP_10/2018	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRÁNKA 1 z 1

Adresa:

Středočeský kraj
Zborovská 11
Praha 5- Smíchov
p.Martin Herman

Váš dopis číslo/ze dne

Naše číslo

Vyřizuje/
Ing.Lukáš Avenárius
Tel: 

Praha
12.12.2018

Věc: Ohlášení přerušení prací stavby II/307, most ev.č. 337-007 Močovice

Vážení obchodní partnere, tímto dopisem Vám ohlašujeme přerušení prací stavby II/307, most ev.č. 337-007 Močovice z důvodu klimatických podmínek.

V Praze dne 12.12.2018

Ing. Miroslav Ritnošík

Doprastav

Doprastav
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
-0272-

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008

Telefon
+420 286 890 541

Fax
+420 286 890 528

Internet
www.doprastav.sk
sekretariat.os@doprastav.cz
ID datové schránky: 2udzke9

IČO: 492 81 429
DIČ: CZ49281429

Denní záznamy stavby: SO 201

List č.

61353

Datum:

Zápis zhotovitele: Dne 4.12.2018 provedla t. Aauliát osazení elektro skříně do příslušného chráněného objektu. Zhotovitel upozorňuje, že osazení elektro skříně není součástí jeho doleží, neprováděl žádné stavební práce (přípomoc) pro zhotovitele této alce. Foto dokumentace malána TDI.

Zápis TDI.

Souhlasím se zápisem zhotovitel. Stavba dosud nijak nenasakovala do chráněného objektu d.p. 3, ani při osazení elektro skříně.

Zápis zhotovitele:

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek není vstavení práce pozastaveno.

Zápis zhotovitele:

Na základě výzvy objednatele, ze dne 18.3.2019, jsou od dnešního dne zahájeny práce na stavbě II/337 - Mozdvice.

Zahřívání - počasí spíše -1°C +2°C

12. 12.

Pracovní doba: 7-19

Pracovníci: TUP 15, 4 linet 1x

Mukomlany: Auto s rukou: CAT 30T

Popis práce: - Odhřívání 1 zářadku OZ 1

- Nalování a odvoz hrdinů

- úklid komunikace

Ihor vody: 236,4 m³/m

Zápis zhotovitel:

12. 12. 20

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek jsou veškeré práce pozastaveny.

Zápis zhotovitel:

20. 3. 20

Na základě výzvy objednatele, ze dne 18. 3. 2019, jsou od dnešního dne zahájeny práce na stavbě II/337 Mostec.

Polojasno +3°C + 11°C

20. 3. 202

Pracovní doba: 7-18

Pracovníci: TUP 15, 4-LINET 3x, 1000W 1x, 04-06 6x

Mechanik: AI-2002; nářez; elektrická; svářečky; vjízací klado;

Popis práce: - Montáž armatury OZ 1 část 1

- výkop zářadové spá pro OZ 1 - část 2

- bourání betonu

Zápis zhotovitele.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek jsou veškeré práce pozastaveny

Zápis TDI.

Přetrvání prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na základě SO) zhotovitele

Zápis zhotovitele.

Na základě výzvy objednatelů ze dne 18.8.2019, po odpracování dne, 19.8.2019, zahájení práce ve starší II/332 - Nová Ves

Zápis TDI

Po zřízení přístavce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek opětovně zahájení práce.

Jasno +2°C + 19°C

23. 8. 2019

Pracovní doba: 7-18

robotu

Pracovní tým: 4 lidé a 2

- Popis práce:
- Odstranění zámkové dlažby z chodníku
 - Ruční vykop zeminy v místě napojení na stávající dešťovou kanalizaci - větší množství inv. vlt
 - odbočení betonových podzemních pod branbou oplocení

Stav vody: 26,6 m n.m.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Oblast Kutná Hora
Klejnarská 894, Kolín

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS VLASTNÍKA KOMUNIKACE

Žádáme Vás o souhlas s umístěním přechodného dopravního značení a souhlas s uzavírkou a objízdnou trasou v souvislosti se stavbou 11/337 Močovice most ev. č. 337 — 007 přes potok Klejnárku

Žadatel:

Doprastav, a.s.,
Organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, Praha 8, 180 00
IČ: 49281429

v zastoupení :

INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
Obránců míru 258, 503 02 Předměřice n.L.
IČ: 274 78 866
PhDr. Denisa Pešková, tel.: 

Osoba odpovědná za stavbu : Ing. Ritnošík, tel.: 

Osoba odpovědná za dopravní značení : Jan Pazdziora, tel.: 

INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
Obránců míru 258, 503 02 Předměřice n.L.
IČO: 274 78 866

Místo : sil. II/337 Močovice , sil. II/339, sil. III/33721, sil. III/33722 , sil. III / 33718 viz situace

Termín: 1.1.2019 – 30.6.2019

Důvod: stavba 11/337 Močovice most ev. č. 337 — 007 přes potok Klejnárku

INKA - do
Hradec K
Obránc
503 02
IČO: 274
78 866

Plná moc

Firma:

INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02

Předměřice nad Labem, IČ: 274 78 866, zastoupená panem Jiřím Fantou

uděluje plnou moc

pro zaměstnance:

PhDr. Denisa Pešková k veškerým úkonům souvisejícím s dopravním opatřením při akci:

Novostavba mostu ev. č. 377-007 přes potok Klejnárku - uzavírka sil. II/337 Močovice

INKA - dopravní značení
Hradec Králové s.r.o.
Obránců míru 258
503 02 Předměřice nad Labem
IČO: 27478866 DIČ: CZ27478866

Fanta Jiří

PhDr. Denisa Pešková

PLNÁ MOC

Firma: **Doprastav, a.s.**
Organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČ: 49281429

uděluje plnou moc pro:

Firma: **INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o.**
Obránců míru 258, 503 02 Předměstí nad Labem
IČO: 274 78 866

Zplnomocňujeme firmu INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., zastoupenou Jiřím Fantou k veškerým úkonům souvisejícím s dopravním opatřením při akci:
Novostavba mostu ev.č. 377 -077 přes potok Klejnárku v Močovicích sil.II/337

Doprastav
ORG. SLOŽKA PRAHA
K ZAHRADNICTVÍ 13, 182 00 PRAHA 8
IČ: 49281429
za Doprastav, a.s.

INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
Obránců míru 258
503 02 Předměstí nad Labem
IČO: 27478866 DIČ: CZ27478866
za INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o.



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
Obránců míru 258
503 02 Předměřice nad Labem

Váš dopis značily/ze dne

Naše čj.
8150/18/KSUS/KHT/Rys

Vyřizuje/telefon
Ryšánek/602868205

Kolín
30.10.2018

Ev.č. 57165/2018-KSÚS

Věc : Vyjádření k přechodnému dopravnímu značení, k objízdné trase a ke zvláštnímu užívání silnice II/337 při úplné uzavírcce silnice II/337 v místě mostu ev.č. 337-007 z důvodu jeho rekonstrukce.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí – silnic II. a III.tříd - souhlasí se zvláštním užíváním silnice II/337, přechodným dopravním značením, úplnou uzavírkou silnice II/337 v místě mostu ev.č. 337-007 a s vedením objízdné trasy po silnicích II/339 a III/33721 dle předloženého návrhu v termínu od 1.1.2019 do 30.6.2019 za těchto podmínek:

- ✓ Objízdné trasy a přechodné dopravní značení budou projednány a schváleny Policií ČR, DI Kutná Hora.
- ✓ Žadatel o uzavírku zajistí instalaci přechodného dopravního značení a po dobu trvání uzavírky a objížděk bude provádět jeho pravidelnou kontrolu a údržbu.
- ✓ Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy.
- ✓ O uzavírcce a objížděčkách, jejich zahájení a délce trvání informujte obce, kterých se uzavírka a objížděčky dotknou.
- ✓ O povolení zvláštního užívání, uzavírky silnice, stanovení objízdných tras a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci požádejte Městský úřad Čáslav - odbor dopravy.



vedoucí TSÚ oblasti Kutná Hora
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (67)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Územní odbor Kutná Hora
Dopravní inspektorát
Na Náměti 421
284 01 Kutná Hora



Č. j. KRPS-163998-1/ČJ-2018-010506

Kutná Hora 30. května 2018

Počet listů: 1

INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
Obránců míru 258
503 02 Předměřice nad Labem

Vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a k přechodné úpravě provozu na
pozemních komunikacích na okr. Kutná Hora

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Kutná Hora podle § 77 odst. 2 písm. b) z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů vydává písemné vyjádření ke stanovení přechodného dopravního značení, ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 1 z.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) citovaného zákona a k objízdné trase při úplné uzavírce pozemní komunikace dle § 24 odst. 2 písm. d) citovaného zákona. PČR DI Kutná Hora

souhlasí

s návrhem DIO pro uzavírku mostu ev. č. 337-007 v obci Močovice v termínu od 28.6.2018 do 30.12.2018 z důvodu rekonstrukce mostu. DZ č. IP22 na sil. II/339 a III/33721 ve směru od obce Krchleby a Žáky požadujeme doplnit o DZ č. IS11b s uvedením konkrétních cílů (Močovice + Čáslav). Náhradní trasa pro pěší musí být řádně vyznačena dle schváleného návrhu pod naším č.j. KRPS-158447-1/ČJ-2016-010506 ze dne 9. května 2016. Musí být zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů. Pracovní místo musí být zajištěno proti pádu a úrazu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a řádně osvětleno. Za snížené viditelnosti musí být použity výstražná světla v souladu s TP 66. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, požadujeme přelepit škrtačí páskou nebo zakrýt.

Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy (TP). Jako závazný předpis pro umístění přechodných dopravních značek lze užít publikaci vydanou CDV Brno „TP 66“ (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích). Na místě prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz. Pohybující se dělníci po komunikacích budou mít ochranný reflexní pracovní oděv, nebo alespoň vestu.

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.

31.10.2018 – Souhlasíme s prodloužením termínu do 30.6.2019.

zapsal: komisař por. Jiří Louda, DiS.
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]
e-mail podatelna: [redacted]
ID: 2dtai5u

komisař npor. Patrik Kraus, DiS.
vedoucí DI ÚO Kutná Hora
tel. [redacted]



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
Obránců míru 258
503 02 Předměřice nad Labem

Jednací číslo: MěÚ/26982/2018/DOP
Spis. značka: 4993/2018

Vyřizuje: **Jana Šulcová**
Tel.: 
E-mail: 
Datum: **29.11.2018**

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o uzavírku podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 7.11.2018 podala společnost Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 180 00 Praha 8, IČ: 49281429 zastoupená na základě plné moci společností INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČ: 27478866 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání a projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

I. POVOLUJE

Prodloužení termínu úplné uzavírky silnice II/337 v kat. území Močovice z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací rekonstrukce mostu II/337, most ev. č. 377-007 přes potok Klejnárku od 1.1.2019 do 30.6.2019.

Uzavřený úsek: silnice II/337 cca 150 m

Objízdná trasa: cca 6 km

Ostatní ujednání rozhodnutí č.j. MěÚ/15403/2018/DOP ze dne 14.6.2018 zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 180 00 Praha 8, IČ: 49281429 zastoupená na základě plné moci společností **INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČ: 27478866**



Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav | Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 300 131 | sulcova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz
IČ: 00236021 | DIČ: CZ00236021 | DS: ffnbe7e



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/26982/2018/DOP

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní delikt podle § 42b zákona o pozemních komunikacích s možností sankce až do výše 500.000,-.

O d ů v o d n ě n í

Dne 7.11.2018 podala společnost Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 180 00 Praha 8, IČ: 49281429 zastoupená na základě plné moci společností INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČ: 27478866 žádost o prodloužení termínu úplné uzavírky silnice č. II/337 v kat. území Močovice z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací - realizace stavby – II/337, most ev. č. 377-007 přes potok Klejnárku.

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad po posouzení žádosti a doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy a na základě souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přís. org. zn.: 8150/18/KSUS/KHT/Rys ze dne 30.10.2018, souhlas Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora dne 30.5.2018, Č.j. KRPS-163998-1/ČJ-2018-010506 aktualizovaného dne 31.10.2018, dospěl k závěru, že realizace stavby – II/337, most ev. č. 377-007 přes potok Klejnárku v obci Močovice si vyžádá úplné omezení provozu na silnici II/337, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 26 Praha 5, prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Čáslav. Na základě § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Miroslav Brandejský
vedoucí odboru dopravy



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/26982/2018/DOP

Rozdělovník:

Účastníci:

- Doprastav, a.s. Org. složka Praha, zast. INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
- Obecní úřad Močovice, Močovice 26, 286 01 Čáslav

Dotčené orgány:

- KŘ PČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
- ÚSZS StčK, Kutná Hora, IDDS: wjmjahj
- Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, IDDS: f3ahpz8
- ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s., IDDS: x4kgvqt

Na vědomí:

- MO ČR, Agentura logistiky, Reg. středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk




Jednací číslo: MěÚ/26982/2018/DOP

P2: 167205-163 992-1/5-2018-010706

K1

KŘÍŽOVATKA STYKOVÁ – SIL. II/337 A III/33721

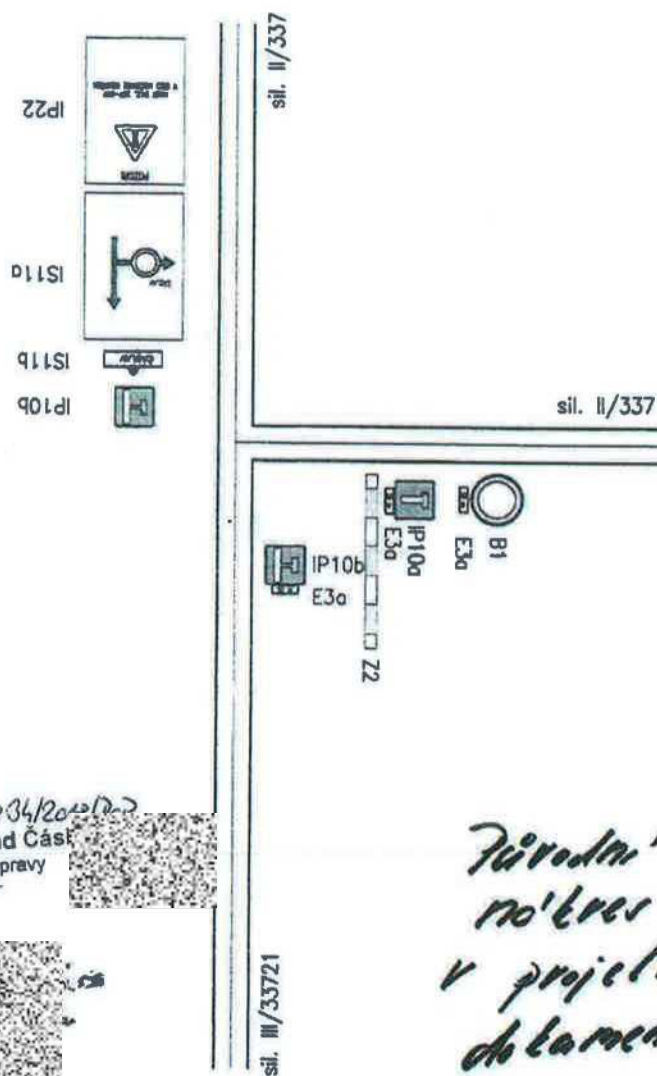

Městský úřad Čáslav
odbor dopravy

Für den
meisten
v. projektion
dokumentation.




MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/26982/2018/DOP

K2PS- 163 998- 1/CS- 2018- 016506

K2

KŘÍŽOVATKA STYKOVÁ – SIL. III/33722, II/33721

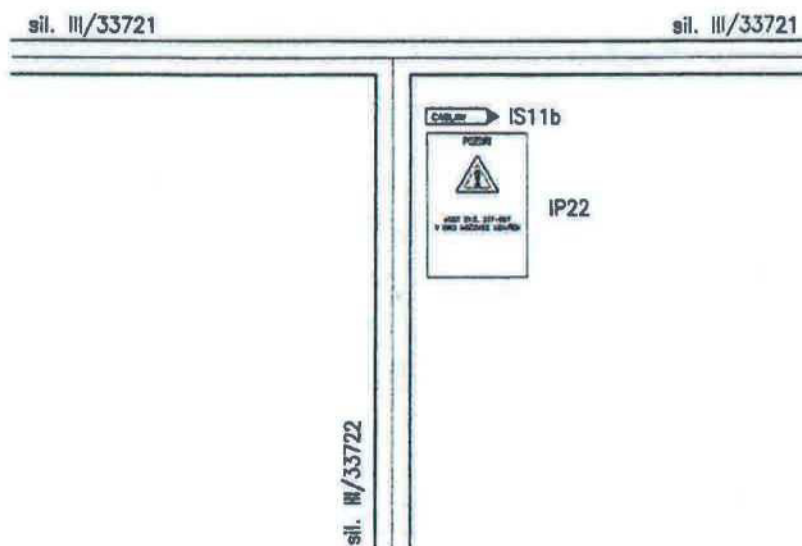

KLIC
KRAJSKÝ
STŘET
JZERNÍ
JOHANN
POSTOVNÍ
64 29 KLI

16.4.13 13 34/201
Městský úřad Čáslav
odbor dopravy
- 11 -



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy


Jednací číslo: MěÚ/26982/2018/DOP

KRP3- 163 998-1 / ČS- 2018- 010706

3

K3

KŘÍŽOVATKA – SIL. II/339, III/33721

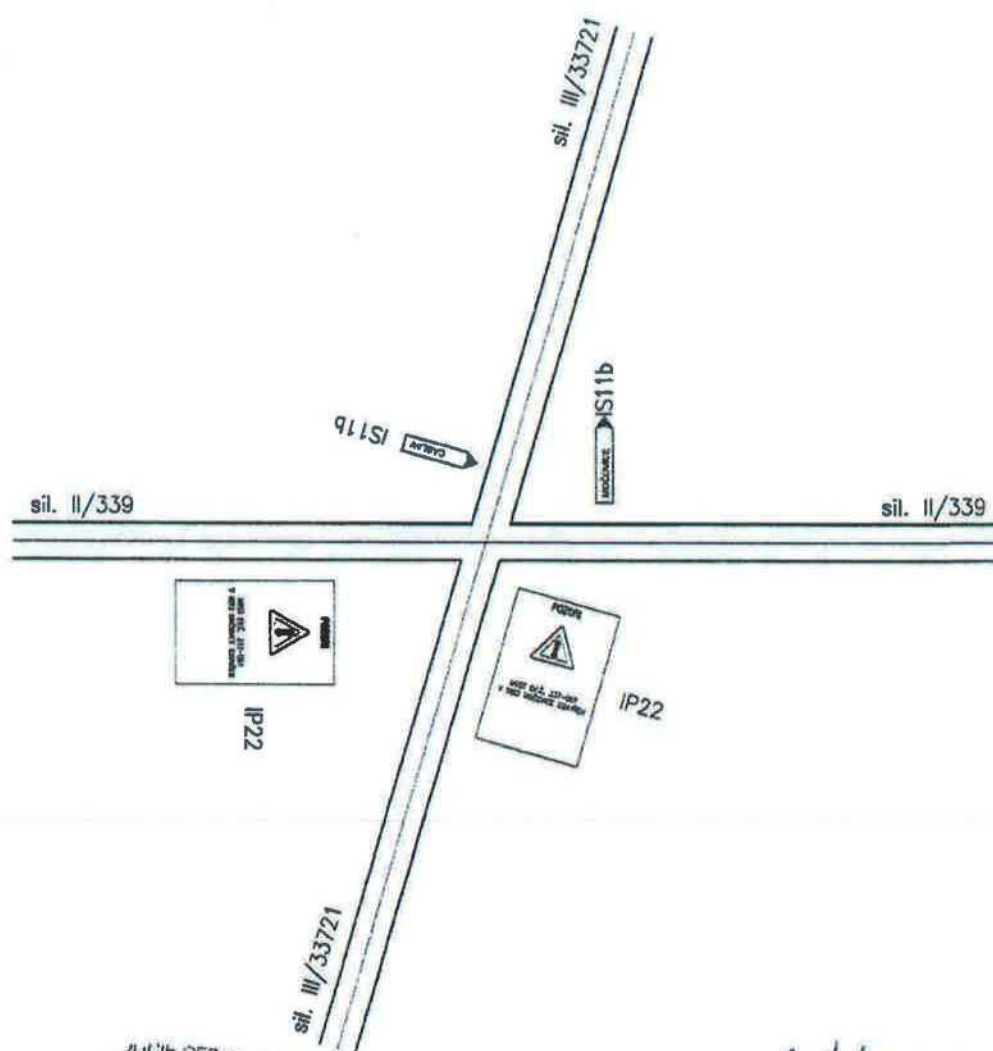

JIHOCESKÝ KRAJ
STŘEDNÍ
JZEMIN
DOPRAVNÍ
VI PO
KRAJ
KRAJ

MěÚ/13884/2018
Městský úřad Čáslav
odbor dopravy
- 11 -



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/26982/2018/DOP

KRP5-163 9018-1 /ČS-2018-010506

6

K4

KŘIŽOVATKA STYKOVÁ – SIL. II/337, II/339



- 4 -

KRP5-163 9018-1 /ČS-2018-010506
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
ODBOR DOPRAVY
11.11.2018

Městský úřad Čáslav
odbor dopravy

- 11 -




Jednací číslo: MěÚ/26982/2018/DOP

TRASA PRO CHODCE

trans pro choice

uzavřený úsek

[illegible]

Městský úřad
odbor dopravy

	
boprástav	
Kruh: _____ Znak, prístupnosť: _____ Kruhová: _____ Kruh (občianske): _____	 INKA Inštitút národného kultúrneho dedičstva Bratislava Iľanová 10 821 08 Bratislava 10 Tel.: 02 58 22 11 11 Fax: 02 58 22 11 12 E-mail: inka@inka.sk
Mesto: R337 Mošovce - novostavba mostu ev.č. S37 - 007 pre potok Kľajnárku DOPRAVNÝ NÁSTROJNÝ PRÍSTROJ	Dátum: 24.1.2019 D.ŠANČIČ 1659 STUŽENÝ PD: DČI Miesto: - Podpis: - Podpis: -

HARMONOGRAM II/337 Močovice, most ev. č. 337-007 přes potok Klejnárku

Harmonogram	1.měsíc v pořadí				2.měsíc v pořadí				3.měsíc v pořadí				4.měsíc v pořadí				5.měsíc v pořadí				6.měsíc v pořadí				7.měsíc v pořadí				8.měsíc v pořadí				9.měsíc v pořadí			
	týden v pořadí				týden v pořadí				týden v pořadí				týden v pořadí				týden v pořadí				týden v pořadí				týden v pořadí				týden v pořadí				týden v pořadí			
POPIS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Předání staveniště (a zřízení ZS)																																				
Přípravné práce																																				
SO 001 Demolice stávajícího mostu																																				
SO 101 Komunikace II/ 337																																				
SO 201 Most ev.č. 337-007																																				
SO 202 Opěrné zdi 1, 2, 3																																				
SO 301 Přeložka dešťové kanalizace																																				
SO 411 Ochrana kabelu Cetin																																				
SO 901 DIO																																				
Dokončení stavby																																				

FINANČNÍ HARMONOGRAM II/337 Močovice, most ev. č. 337-007 přes potok Klejnárku

Harmonogram	1.měsíc v pořadí	2.měsíc v pořadí	3.měsíc v pořadí	4.měsíc v pořadí	5.měsíc v pořadí	6.měsíc v pořadí	7.měsíc v pořadí	8.měsíc v pořadí	9.měsíc v pořadí
POPIS									
Finanční plán cena bez.DPH	1 388 722,59	1 697 327,61	1 851 630,12	1 712 757,86	1 712 757,86	1 712 757,86	1 712 757,86	1 851 630,12	1 789 909,12
	15 430 251,00								

V Praze dne : 29.1. 2018


 Dopravní
 ORGANIZAČNÍ SLO
 ul. Podvinná 13, 1
 CO: 4928
 *****02101
 Mgr. M
 Dopravní



21. 1. 2018

HMG Prodloužení výstavby o Zimní technologickou přestávku
ZSV & ZTP - DIO

Popis	1. pololetí				2. pololetí				3. pololetí				4. pololetí				5. pololetí				6. pololetí				7. pololetí				8. pololetí				9. pololetí				10. pololetí			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Předání staveniště (ařízení ZS)																																								
Přípravné práce																																								
SO 001 Demolice stávajícího mostu																																								
SO 101 Komunikace II/337																																								
SO 201 Most ev.č.337-007																																								
SO 202 Opěrné zdi 1, 2, 3																																								
SO 301 Přeložka dešťové kanalizace																																								
SO 411 Ochrana kabelu Cetin																																								
SO 901 DIO																																								
Dokončení stavby																																								

Poznámky

Termín zahájení a dokončení předmětu díla dle SOO - 36 týdnů od výzvy objednatel, tzn. 28.6.2018 do 7.8.2018

Zahájení prací dle výzvy objednatel dno 28.6.2018

Začátek ZTP dle ohlášení zhotovitel dno 12.12.2018

Opětovné zahájení prací dle Výzvy objednatel dno 20.1.2019

Termín ukončení prací - 36 týdnů prodlouženo o 98 dnů ZTP - 13.6.2019

Za zhotovitele Ing. Martin H.



CZ, s.r.o. ②
ctví 13
aha 8
S: CZ05561027

Za Objednatel (odpovědný) TDS Ing. Jindřich Přivratský



Podbabská 1014/20
2689681/0300
CZ60193280
07 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA - O



Doprastav a.s. Organizační složka Praha

K zahradnictví 13

182 00 Praha 8

V Praze dne 3.6.2019

Věc: II/337 Močovice most ev.č. 337-007 – vyjádření TDI k návrhu ZBV.

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby uvedené akce ze dne 22.5. 2019 Vám sděluji následující.

1) ZBV č. 3 - SO 901 Prodloužení DIO:

- Prodloužení nájemného dopravního značení
- Prodloužení nájemného výstražných světel
- Prodloužení provozu zařízení staveniště

Vše z důvodu prodloužení termínu realizace stavby vlivem nepříznivých klimatických podmínek v zimním období dle SOD

S výše uvedeným návrhem ZBV č. 3 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jindřich Přívratský, TDI



VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20
Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČO: 60193280, DIČ: CZ60193280

07 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ©

Doprastav, a.s.
Organizační složka PRAHA
K zahradnictví 13
182 00 Praha

V Praze, dne 26.6.2019

Stavba: II/337 Močovice, most ev. č. 337 – 007 přes potok Klejnárku

Věc: Vyjádření AD k návrhu ZBV č.3

Na vaši žádost o stanovisko autorského dozoru k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby uvedené akce Vám sděluji následující.

1) ZBV č.3 – SO 901 Prodloužení DIO

Stanovisko: Vlivem prodloužení termínu realizace stavby souhlasím s prodloužením DIO.

- prodloužení nájemného dopravního značení,
- prodloužení nájemného výstražných světel,
- prodloužení provozu zařízení staveniště.

S výše uvedeným návrhem za AD souhlasím.

S pozdravem,

 **INGUTIS,** 1
spol. s r.o.
Tháškova 2077/7, 166 29 Praha 6
tel.: (+420) 224 354 363
IČ: 48112828
Ing. Václav Ráček, Ph.D.
INGUTIS, spol. s r.o.
(autorský dozor)

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 76014

Datum vzniku a zápisu:	6. března 2006	
Spisová značka:	<u>C 110811 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>A 76014 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u> <u>vymazáno 12. ledna 2016</u>
	<u>A 11191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích</u>	<u>zapsáno 12. ledna 2016</u> <u>vymazáno 17. ledna 2019</u>
	<u>A 76014 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 17. ledna 2019</u>
Obchodní firma:	<u>ROBSTAV stavby s.r.o.</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>ROBSTAV stavby k.s.</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u> <u>vymazáno 3. ledna 2019</u>
	<u>ROBSTAV k.s.</u>	<u>zapsáno 3. ledna 2019</u>
Sídlo:	<u>Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 13000</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 12. ledna 2011</u>
	<u>Praha 2, italská 1580/26, PSČ 12000</u>	<u>zapsáno 12. ledna 2011</u> <u>vymazáno 1. července 2015</u>
	<u>Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6</u>	<u>zapsáno 1. července 2015</u> <u>vymazáno 18. prosince 2015</u>
	<u>Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek</u>	<u>zapsáno 18. prosince 2015</u> <u>vymazáno 11. dubna 2017</u>
	<u>Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek</u>	<u>zapsáno 11. dubna 2017</u> <u>vymazáno 3. ledna 2019</u>
	<u>Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4</u>	<u>zapsáno 3. ledna 2019</u>
Identifikační číslo:	274 30 774	<u>zapsáno 6. března 2006</u>
Právní forma:	<u>Společnost s ručením omezeným</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>Komanditní společnost</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u>
Předmět podnikání:	<u>zprostředkování obchodu a služeb</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u>

	vymazáno 18. ledna 2010
<u>velkoobchod</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
<u>specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
<u>maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
<u>přípravné práce pro stavby</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
<u>provádění staveb, jejich změn a odstraňování</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u>
<u>nakládání s odpady</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
<u>silniční motorová doprava nákladní</u>	<u>zapsáno 22. srpna 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	<u>zapsáno 18. ledna 2010</u>
<u>Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny</u>	<u>zapsáno 18. ledna 2010</u> <u>vymazáno 20. ledna 2016</u>
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí	<u>zapsáno 20. ledna 2016</u>
<u>výkon zeměměřičských činností</u>	<u>zapsáno 18. ledna 2010</u>
<u>projektová činnost ve výstavbě</u>	<u>zapsáno 18. ledna 2010</u>
Statutární orgán: jednatel:	
<u>ROBERT BENEŠ, dat. nar. 23. března 1977</u> <u>Rokycany, Tymákovská 842/III, PSČ 33701</u> <u>Den vzniku funkce: 6. března 2006</u> <u>Den zániku funkce: 30. května 2007</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 21. září 2007</u>
jednatel:	
<u>Ing. RADEK KOZÁK, dat. nar. 18. listopadu 1972</u> <u>Pízeň, Nad Radbuzou 24, PSČ 31800</u> <u>Den vzniku funkce: 6. března 2006</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
jednatel:	
<u>Ing. RADEK KOZÁK, dat. nar. 18. listopadu 1972</u> <u>Praha 6 - Liboc, Libocká 258/22, PSČ 16200</u>	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 201/1	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 337-007		

Objednatel: **Středočeský kraj**
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: **REKO Močovice**

Vedoucí společník **Doprastav, a.s.**
Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK
IČ: 31333320

Společník **Doprastav CZ s.r.o.**
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
IČ: 405561027
podnikající v ČR jako **Doprastav, a.s., organizační složka Praha**
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
IČ: 49281429

Společník **Robstav stavby k.s.**
Mezi vodami 205/2a, Modřany, 143 00 Praha4
IČ:274 30 774

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	138 793,12	138 793,12

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	138 793,12	138 793,12

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 201/1	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 337-007		

Strany smlouvy o dílo č. S-1093/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.04.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: REKO Močovice se sídlem K zahradnictví ev.č. 13, 182 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu	37	počet listů

Paré č.	Příjemce
1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6	TDI
7	RDK

Iniciátor změny: Doprastav a.s., Organizací složka Praha

Popis a zdůvodnění Změny:

Rozdíly oproti PDPS zjištěné při realizaci mostu

Změna obsahuje odchylky v množství položky stavebních prací - navýšení počtu zkoušek integrity pilot objekt SO 201 - most ev.č. 337-007 dle čl. II bodu 2.8 smlouvy o dílo, dále jen "SOD". K navýšení množství prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému ve výkazu výměr viz. čl. I odst. 1.1 SoD došlo na základě požadavku platných TKP, (doklad 10) a dle souvisejícího stanoviska zástupce objednatele, odpovědného TDI (doklad 08) a stanovisko AD (doklad 09). Z důvodu zjištěného stavu v průběhu provádění prací bylo provedení většího počtu zkoušek integrity pilot oproti zadávací PDPS nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nezbytnou pro dokončení díla, která je podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	138 793,12	138 793,12	138 793,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Martin Nikmon	datum	podp
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Václav Ráček	datum	podp
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jindřich Přivratský	datum	podp
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podp
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho obě strany přiložily své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Martin Tutka	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis
				Číslo p

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:4

Název Stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 201/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 337-007	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 161 260,60

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 161 260,60	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	138 793,12	138 793,12	1,52%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	9 300 053,72	138 793,12	1,52%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	<u>Ing. Martin Nikmon</u>	25. 09. 2019	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	<u>Ing. Václav Ráček</u>	25. 09. 2019	souhlasím
Stavební dozor:	<u>Ing. Jindřich Přívratský</u>	25. 09. 2019	souhlasím
Zástupce Objednatele:	<u>Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA</u>	07. 10. 2019	souhlasím
Supervize (RDK)	<u>Ing. Václav Chytil</u>		souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	<u>Ing. Jan Fidler, DiS</u>		souhlasím




Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 337-007/1								201/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 337-007/1								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
78	93333	ZKOUSKA INTEGRITY PILOT SYSTEMOVYCH	kus	6	14	8	17 349,14	104 094,84		138 793,12	242 887,96	138 793,12	233,33%
CELKEM:								104 094,84	0,00	138 793,12	242 887,96	138 793,12	

Za Zhotovitele: (stavbyvedoucí) Ing. Martin Nikmon

Datum:

Podpis:



Za Objednatele: (odpovědný TDI) Ing. Jiří Pávek

Datum:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/337, most ev.č.337-007 Močovice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	15 430 251,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15 737 039,03
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	19 041 817,23
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,99%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování změny 1% % pro podstatnou změnu pro změny způsobené dle § 14, odst. 6), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	306 788,03
7=6/11*100	Sledovací limit 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,89%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 629 075,30

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,29%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,70%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	306 788,03
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 715 125,50

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000:37		149 224 000,00

Skupiny změn

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	II/337, most ev.č.337-007 Močovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č. 337-007
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO 201 po ZBV 1	29	
08 Stanovisko TDI	1	
09 Stanovisko AD	1	
10 TKP_16	3	
11 Doklad o změně adresy společníka zhotovitele - výpis z obch.rejstříku	2	
12 Půdorys C_SO 201_02	1	
Počet listů celkem	37	
