

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	pod číslo	rok	dobu plnění
EV číslo v SSL				

DOHODA O NAROVÁNÍ

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D.,
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „HZS Moravskoslezského kraje“)

a

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Sídlo: Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 27787443, DIČ: CZ27787443

Zastoupená: 

Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s., č. účtu: 489110036/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 29685

(dále jen „zhotovitel“)

(oba dále jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2019 smlouvu o dílo (ev.č. objednatele HMSK/SML/84/2019), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) pro stavbu Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (dále jen „IVC Kopřivnice“), včetně zajištění související inženýrské činnosti, a to všech úrovní projektové dokumentace, zejména zajištění, kompletace a zpracování do projektové dokumentace veškerých dokladů nutných k vydání územního rozhodnutí pro stavbu, jakož i zajištění vydání tohoto územního rozhodnutí (dále jen „smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 06.03.2019, kdy byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv.
2. V čl. V. smlouvy bylo smluvními stranami sjednáno, že zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tedy do 07.10.2019, a v čl. XIII. odst. 1 smlouvy pak byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla. Prodlení zhotovitele s předáním díla je rovněž jedním z důvodů možného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. V čl. VII. odst. 2 smlouvy pak byla sjednána možnost dílčí fakturace po předání čistopisu DÚR v požadovaném rozsahu a provedení.

II. Dohoda o narovnání

1. Dne 06.10.2019 zhotovitel předal objednateli čistopis DÚR v požadovaném rozsahu a provedení, lze tedy v souladu s čl. VII. odst. 2 smlouvy zaplatit část ceny díla ve výši 60 % na základě zhotovitelem vystavené faktury.
2. Součástí zhotovitelem předané dokumentace je také návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové

Veřejná zakázka ev. č. 250/2018/VZMR

IVC Kopřivnice – projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí



hladiny 22 kV (VN) č. 19_SOBS01_4121573299 včetně technických podmínek pro připojení objektu, předložený dne 04.10.2019 společností ČEZ Distribuce, a.s., která je správcem a provozovatelem distribuční sítě VN. Na základě posouzení zde uvedených podmínek připojení objektu IVC Kopřivnice objednatel zjistil, že navrhované řešení je technicky i ekonomicky nevhodné, neboť nerespektuje koncepci připojování integrovaných výjezdových center u HZS Moravskoslezského kraje, která kromě jiného klade důraz na připojování objektů pomocí kabelové smyčky. Navrhované řešení totiž předpokládá napojení IVC pouze z jediné VN linky, která by v případě poruchy na distribuční síti neumožnila zálohové napájení z jiného směru a současně by přesunula na vrub investora, tedy objednatele veškeré náklady na zřízení i následnou údržbu celé kabelové VN přípojky v délce asi 500 m.

3. Navrhované podmínky připojení objektu jsou pro objednatele neakceptovatelné, smluvní strany se proto dohodly, že objednatel sám projedná se společností ČEZ Distribuce, a.s. úpravu navrhovaného řešení s cílem zajistit připojení objektu pomocí kabelové smyčky. Lze přitom předpokládat, že toto jednání může být časově náročné. Dokud objednatel neakceptuje podmínky připojení objektu, nelze podat žádost o vydání územního rozhodnutí.
4. S ohledem na to, že dne 07.10.2019 již uplynula sjednaná doba plnění, tedy lhůta pro předání díla podle smlouvy, je mezi smluvními stranami sporné, zda na straně zhotovitele vzniklo prodlení s předáním díla a zda je objednatel oprávněn případné prodlení sankcionovat v souladu s uzavřenou smlouvou.
5. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů narovnávají svá sporná práva a závazky takto:
 - a) Závazek zhotovitele dokončit dílo podle uzavřené smlouvy nadále trvá.
 - b) Vzhledem k tomu, že zhotovitel popsané důvody nedodržení sjednané doby předání díla nezpůsobil, nemohl je v době uzavření smlouvy předvídat ani těmito důvody nijak předejít, smluvní strany se dohodly na změně sjednané doby plnění tak, že zhotovitel je povinen dokončit dílo podle smlouvy do 3 měsíců od okamžiku, kdy objednatel sdělí zhotoviteli, že podmínky připojení objektu IVC Kopřivnice akceptoval. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel nebude uplatňovat smluvní pokutu podle čl. XIII odst. 1 smlouvy, a to za dobu ode dne uplynutí sjednané doby plnění do uplynutí lhůty 3 měsíců od okamžiku, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že podmínky připojení objektu IVC Kopřivnice akceptoval.
 - c) Ostatní ustanovení smlouvy se touto dohodou o narovnání nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této dohodě budou použity pouze pro účely plnění této dohody a při uveřejnění dohody budou anonymizovány.

4. Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této dohody a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.


19 - 11 - 2019

Ostrava dne



H

Ostrava dne 9. 11. 2019

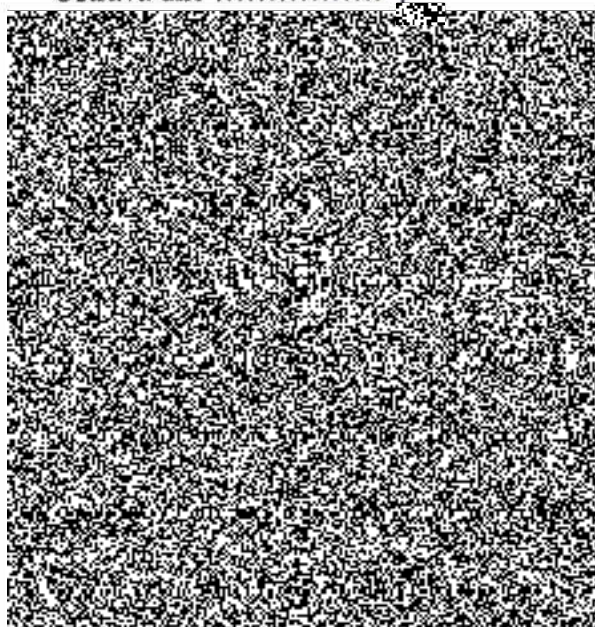

za objednatele:

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel

HZS Moravskoslezského kraje

H a n i č k ý z á c h r a n n ý s b o r

Moravskoslezského kraje

Výškovická 40

700 30 Ostrava - Zábřeh

19

