


DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5619050562.03 (ORG 4130)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 40619


I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Oliverem Pospíšilem, předsedou představenstva



(„objednatel“)

Zhotovitel: FERRMONT, a.s.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika
Zastoupený: Ing. Radovan Lahoda, předseda představenstva
Ing. Juraj Rutzký, člen představenstva
Ing. Tomáš Focko, člen představenstva
společnost zapsaná v OR SR Trenčín oddíl : Sa, vložka : 10737/R
IČO: 31 619 916
IČO DPH / DIČ: SK2020441907 / 2020441907
Bankovní spojení: VÚB a.s.
č.ú. 381140372/0200



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2019 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, VDJ Bystre 2 tl. p. 2x2500 m³ – rekonstrukce armaturní komory a technologie“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci části stavby ORG 4130 - Brno, VDJ Bystre 2 tl. p. 2x2500 m³ – rekonstrukce armaturní komory a technologie:

- vícepráce v rámci objektů DSO 01.1 **669 107,00 Kč bez DPH**

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1 ze dne 4. 10.2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH **11 230 844,00 Kč**

se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

| | |
|---|-------------------------|
| Cena bez DPH | 11 230 844,00 Kč |
| <u>Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo</u> | <u>669 107,00 Kč</u> |
| Cena celkem bez DPH | 11 899 951,00 Kč |

- 3) Článek XV. odst. 11 ve znění:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“

Se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je aktualizovaná Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zaslání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 3 je:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č.1 ze dne 4. 10. 2019
 - aktualizovaná Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.

Doložka:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/052 dne 20. 11. 2019.

V Brně dne 28-11-2019
Za objednatele:

V Brně dne 28-11-2019
Za zhotovitele :

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

FERRMONT. 

sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
pracovisko: Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907

.....
FERRMONT, a.s.

Harmonogram prací - VDJ Bystrc 2

objekt

Ostatní a vedlejší náklady stavby
 DSO 01.1 Stavební úpravy
 DSO 01.2 Stavební elektro
 DPS 01.1 Rek technologie- dem. práce
 DPS 01.2 Rek technologie- vystrojení
 PS 02 Elektro, MaR, ASŘ

týždeň
 poznámka

| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


28 -11- 2019



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
 1.

28 -11-



FERRMONT 
 sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
 pracovisko: Pestovateľská 8, 823 04 Bratislava
 IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907

Finanční harmonogram - VDJ Bystrc 2

objekt

Ostatní a vedlejší náklady stavby

DSO 01.1 Stavební úpravy

DSO 01.2 Stavební elektro

DPS 01.1 Rek technologie- dem. práce

DPS 01.2 Rek technologie- vstrojení

PS 02 Elektro, MaR, ASŘ

týždeň
cena


| | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | | | |
| 828 000 | | | | | 324500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128500 | | | | 375 000 | | | |
| 6 116 893 | | | | | 334 278 | | | | 534 278 | | | | 768 557 | | | | 906 419 | | | | 801 418 | | | | 801 418 | | | | 1 301 418 | | | | 669 107 | | | | | | | |
| 263 327 | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 555 | | | | 135 772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 865 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 433 | | | | | | | | 53 432 | | | | | | | | | | | |
| 3 466 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 601 458 | | | | 346 620 | | | | 1 265 774 | | | | 1 252 350 | | | | | | | |
| 1 118 664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 838 998 | | | | 279 666 | | | | | | | |
| 11 899 951 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| spolu bez DPH | | | | | - | | | | 658 778 | | | | 534 278 | | | | 768 557 | | | | 1 033 974 | | | | 1 592 081 | | | | 1 148 038 | | | | 3 588 122 | | | | 2 576 123 | | | |

28 -11- 2019



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
t.

28 -11- 2019



FERRAMONT s.r.o.

sídlo: Trenčiansko 1320/89, 020 01 Púchov
pracoviško: Pastovateľská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907

| | | |
|---|---|---|
| Brno, VDJ Bystrc 2. tl. p. 2x2500 m3 – rekonstrukce armaturní komory a technologie | | |
| Změnový list č. 1 | | Datum předložení zhotovitelem 4. 10. 2019 |
| Objednatel | Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno | |
| Zastoupený | Společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno | |
| Zhotovitel | FERRMONT, a.s. Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská republika | |
| Objekt: DSO 01.1 - Stavební úpravy | | |
| Specifikace změn: DSO 01.1 – Oprava hydroizolace DSO 01.1 – Úpravy vnitřních stěn podle skutečnosti | | |
| <p>Zdůvodnění změny: Při úpravách vnitřních stěn armaturní komory byla zjištěna rozsáhlá nesoudržnost omítek a to vlivem prostupující vlhkosti z vnějšku objektu. Pro zajištění předepsané kvality díla bylo nezbytně nutné provést opravu hydroizolace z vnější podúrovňové části objektu. Potřeba provedení těchto prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.</p> <p style="text-align: right;">Vícepráce: 669.107,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč</p> | | |
| <p>Finanční dopad změny:</p> <p style="text-align: right;">Vícepráce 669.107,00 Méněpráce 0,00 Celkem + 669.107,00 Kč bez DPH</p> | | |
| <p>Přílohy: č.1 – soupisy prací – položkový rozpočet č.2 – výkresová dokumentace s vyznačením dotčených částí č.3 – fotodokumentace</p> | | |
| V Brně dne <u>28-11-2019</u> | | V Brně dne <u>28-11-2019</u> |
| Za objednatele: | | Za zhotovitele: |
| <p>Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. P. [redacted]</p> <p>za statutární město Brno na základě plné moci Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. [redacted]</p> | | <p>[redacted] FERRMONT a.s. Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava 916 IČ DPH: SK2020441907</p> <p>FERRMONT, a.s. [redacted]</p> |

| | | | |
|----------|--|---------|----------------------------|
| Projekt: | Břno, VDJ Bystrc 2. tl. p. 2x2500 m ³ – rekonstrukce armaturní komory a technologie | Objekt: | DSO 01.1 - Stavební úpravy |
|----------|--|---------|----------------------------|

| Zadávací dokumentace | | | | | | Skutečnost | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|----------------|----------|----------------------|------------------|--------|------------------|---|----------------|----------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------|----------------|--|
| Poř.č. | Číselné zařazení | Popis položky | M.j. | Množství | Jednotková cena (Kč) | Celkem cena (Kč) | Poř.č. | Číselné zařazení | Popis položky | M.j. | Množství | Jednotková cena (Kč) | Celkem cena (Kč) | Rozdílné množství | Rozdílná cena (Kč) | J. hodnota [1] | Hmotnost celkem [1] | J. sur [1] | Sur Celkem [1] | |
| | | | | | | | | | Oprava hydroizolace, úprava vnitřních stěn podle skutečnosti, záměna materiálového provedení | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Zemní práce | | | | | 1 | Zemní práce | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 139601102R00 | Hruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 a přeložením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | m ³ | 142,750 | 1 010,00 | 144 177,50 | 5 | 139601102R00 | Hruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 a přeložením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | m ³ | 223,110 | 1 010,00 | 225 341,10 | 80,360 | 81 163,60 | | | | | |
| | | Hroubení rýh pro novou opěrnou zeď 2,5*2*28,55 | | 142,750 | | | | | Hroubení rýh pro novou opěrnou zeď 2,5*2*28,55 | | 142,750 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Obnažení stávající hydroizolace 18,2*4,9*21*2 | | 80,360 | | | | | | | | | |
| 7 | 151821215R00 | Začlenění ocelových zápor hmotnosti do 70 kg/m, délky do 5 m svazích z výškových rýh nebo kolejnič, s případným zarovnaním vnitřních konců | m | 60,000 | 1 070,00 | 64 200,00 | 7 | 151821215R00 | Začlenění ocelových zápor hmotnosti do 70 kg/m, délky do 5 m svazích z výškových rýh nebo kolejnič, s případným zarovnaním vnitřních konců | m | 92,000 | 1 070,00 | 98 440,00 | 32,000 | 34 240,00 | | | | | |
| | | B557 pažení opěrné zdi 4*15 | | 60,000 | | | | | B557 pažení opěrné zdi 4*15 | | 60,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pažení obnažené hydroizolace 4*4 | | 32,000 | | | | | | | | | |
| 8 | 151823101R00 | Uložení zápor délky 8 m ocelových jednoduších, pro pažení hroubených výkopů do předem provedených rýh, se zabezpečením spodního konce a případným ručním obvazem záporů nikem | m | 60,000 | 1 788,00 | 107 280,00 | 8 | 151823101R00 | Uložení zápor délky 8 m ocelových jednoduších, pro pažení hroubených výkopů do předem provedených rýh, se zabezpečením spodního konce a případným ručním obvazem záporů nikem | m | 92,000 | 1 788,00 | 164 496,00 | 32,000 | 57 216,00 | | | | | |
| | | B557 pažení opěrné zdi 4*15 | | 60,000 | | | | | B557 pažení opěrné zdi 4*15 | | 60,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pažení obnažené hydroizolace 4*4 | | 32,000 | | | | | | | | | |
| 9 | 151824205R00 | Výtažní zápor hmotnosti do 70 kg/m, délky do 5 m ocelových svazích | m | 60,000 | 529,00 | 31 740,00 | 9 | 151824205R00 | Výtažní zápor hmotnosti do 70 kg/m, délky do 5 m ocelových svazích | m | 92,000 | 529,00 | 48 668,00 | 32,000 | 16 928,00 | | | | | |
| | | B557 pažení opěrné zdi 4*15 | | 60,000 | | | | | B557 pažení opěrné zdi 4*15 | | 60,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pažení obnažené hydroizolace 4*4 | | 32,000 | | | | | | | | | |
| 10 | 182201102R00 | Vodorovné přeměnění výkopu z průměru 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m při suchu bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, zeřezání uvnitřním bez rozměry | m ³ | 137,040 | 38,00 | 5 207,52 | 10 | 182201102R00 | Vodorovné přeměnění výkopu z průměru 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m při suchu bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, zeřezání uvnitřním bez rozměry | m ³ | 297,760 | 38,00 | 11 314,88 | 160,720 | 6 107,36 | | | | | |
| | | Uložení zeminy na mazdoposky pro opětovné využití, porostka je 2 krát | | | | | | | Uložení zeminy na mazdoposky pro opětovné využití, porostka je 2 krát | | | | | | | | | | | |
| | | Hroubení rýh pro novou opěrnou zeď 2,5*2*28,55 | | 286,500 | | | | | Hroubení rýh pro novou opěrnou zeď 2,5*2*28,55 | | 286,500 | | | | | | | | | |
| | | Záhyb opěrné zdi puvodní zeminou 1*28,55*2*0,3+1,5*1+1*1*0,5*2 | | 148,450 | | | | | Záhyb opěrné zdi puvodní zeminou 1*28,55*2*0,3+1,5*1+1*1*0,5*2 | | 148,450 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Obnažení stávající hydroizolace 18,2*4,9*21*2 | | 80,720 | | | | | | | | | |
| 14 | 171201201R00 | Uložení svazpny na skládce nebo do hloubky bezruť. Uložení svazpny na skládce na výšku přes 2m nebo na skládce s rozprostřením svazpny ve vřstvěch a 4 hrubým utvářením | m ³ | 68,520 | 17,00 | 1 164,84 | 14 | 171201201R00 | Uložení svazpny na skládce nebo do hloubky bezruť. Uložení svazpny na skládce na výšku přes 2m nebo na skládce s rozprostřením svazpny ve vřstvěch a 4 hrubým utvářením | m ³ | 148,880 | 17,00 | 2 530,96 | 80,360 | 1 366,12 | | | | | |
| | | Hroubení rýh pro novou opěrnou zeď 2,5*2*28,55 | | 142,750 | | | | | Hroubení rýh pro novou opěrnou zeď 2,5*2*28,55 | | 142,750 | | | | | | | | | |
| | | Záhyb opěrné zdi puvodní zeminou 1*28,55*2*0,3+1,5*1+1*1*0,5 | | 74,230 | | | | | Záhyb opěrné zdi puvodní zeminou 1*28,55*2*0,3+1,5*1+1*1*0,5 | | 74,230 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Obnažení stávající hydroizolace 18,2*4,9*21*2 | | 80,360 | | | | | | | | | |
| 15 | 17101201R00 | Opěrný objekt bez průhledů svazpny svazpnou z vřstvěch hornin II. a nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vřstvěch kraj objektu, při jakoukoliv míře zhutnění | m ³ | 148,880 | 720,00 | 49 334,40 | 15 | 17101201R00 | Opěrný objekt bez průhledů svazpny svazpnou z vřstvěch hornin II. a nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vřstvěch kraj objektu, při jakoukoliv míře zhutnění | m ³ | 148,880 | 720,00 | 107 193,60 | 80,360 | 57 859,20 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|--------|-----------|--|
| 131 | 97908111R00 | 131 | 27 353,80 | 311,00 | 129,828 | 211,00 | 150,618 | 31 780,49 | 20,790 | 4 386,69 | |
| <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Demontážní práce z podlahy a potrubím</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> | | | | | | | | | | | |
| 132 | 97908211R00 | 132 | 38 351,96 | 290,00 | 129,828 | 290,00 | 150,618 | 42 173,16 | 20,790 | 5 921,20 | |
| <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Demontážní práce z podlahy a potrubím</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> | | | | | | | | | | | |
| 133 | 97908221R00 | 133 | 4 024,68 | 71,00 | 129,828 | 71,00 | 50,018 | 4 669,17 | 20,790 | 544,49 | |
| <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Demontážní práce z podlahy a potrubím</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> | | | | | | | | | | | |
| 764 | Konstrukce klempříské | 764 | | | 129,828 | | 150,618 | | | | |
| <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Demontážní práce z podlahy a potrubím</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> | | | | | | | | | | | |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | 61 | | | 129,828 | | 150,618 | | | | |
| <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Demontážní práce z podlahy a potrubím</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> | | | | | | | | | | | |
| 55 | 97803191R00 | 55 | 1 586,00 | 75,00 | 21,000 | 75,00 | 29,750 | 7 581,00 | 78,750 | 5 985,00 | |
| <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Demontážní práce z podlahy a potrubím</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> | | | | | | | | | | | |
| 56 | 60201512R1 | 56 | 4 524,36 | 143,00 | 30,570 | 143,00 | 109,320 | 16 179,36 | 78,750 | 11 655,00 | |
| <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Demontážní práce z podlahy a potrubím</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> <p>Úprava vnitřní a vnitřních prostor na vnitřní do 1 m</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|------------------------------|---|----------------|--------|--------------|-----------|--------|------------|--|--|
| | | | | omítky v bezpečnostní síťce ve výšce s populovanou stěnou spodní stěny 12% z celkové plochy 0,13525 | | 78,750 | | | | | | |
| | | | 992011112875 | D-M Omítka stěn radnice vespolečnosti, radnice, tloušťka vrstvy 20 mm | m ² | 52,500 | 278,00 | 14 595,00 | 52,500 | 14 595,00 | | |
| | | | | NS12, 10% z celkové plochy 0,11525 | | 52,500 | | | | | | |
| Celkem | | 1 116 595,00 | Celkem | | | | 1 785 702,00 | | | 669 107,00 | | |
| | | | Celkem vícepráce | | | | | | | 669 107,00 | | |
| | | | Celkem méněpráce | | | | | | | 0,00 | | |
| Celkem včetně DPH 21% | | 1 351 080,00 | Celkem včetně DPH 21% | | | | 2 160 639,00 | | | 809 619,00 | | |

Zkontrolováno, výměny souhlasí
8.10.2019


FERRMONT. ⁵⁹

FERRMONT s.r.o. ediční závod
Tuřanka 1
ICO: 038


Rozpočet je ehlodilich
celkové - poidilich
9.10.2019

Příloha č.2.1 k ZL č.1

PŮDORYS 1.PP

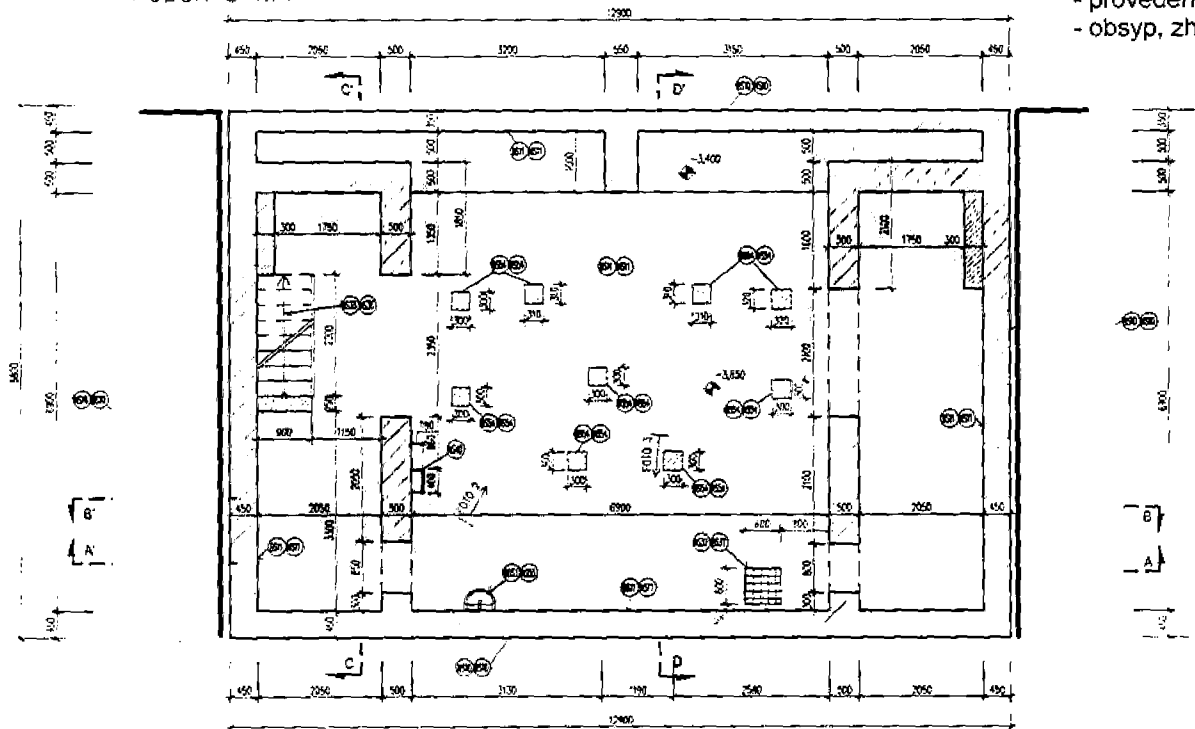

PŮDORYS 1.NP




- výkop pro odkrytí stávající hydroizolace
- bourání obezdívky hydroizolace, oplechování
- odstranění stávající hydroizolace
- provedení penetrace, hydroizolace
- provedení obezdívky, oplechování
- obsyp, zhutnění, osev

TAIL

HYDROFOLACE

- UDJ BYSTRC II

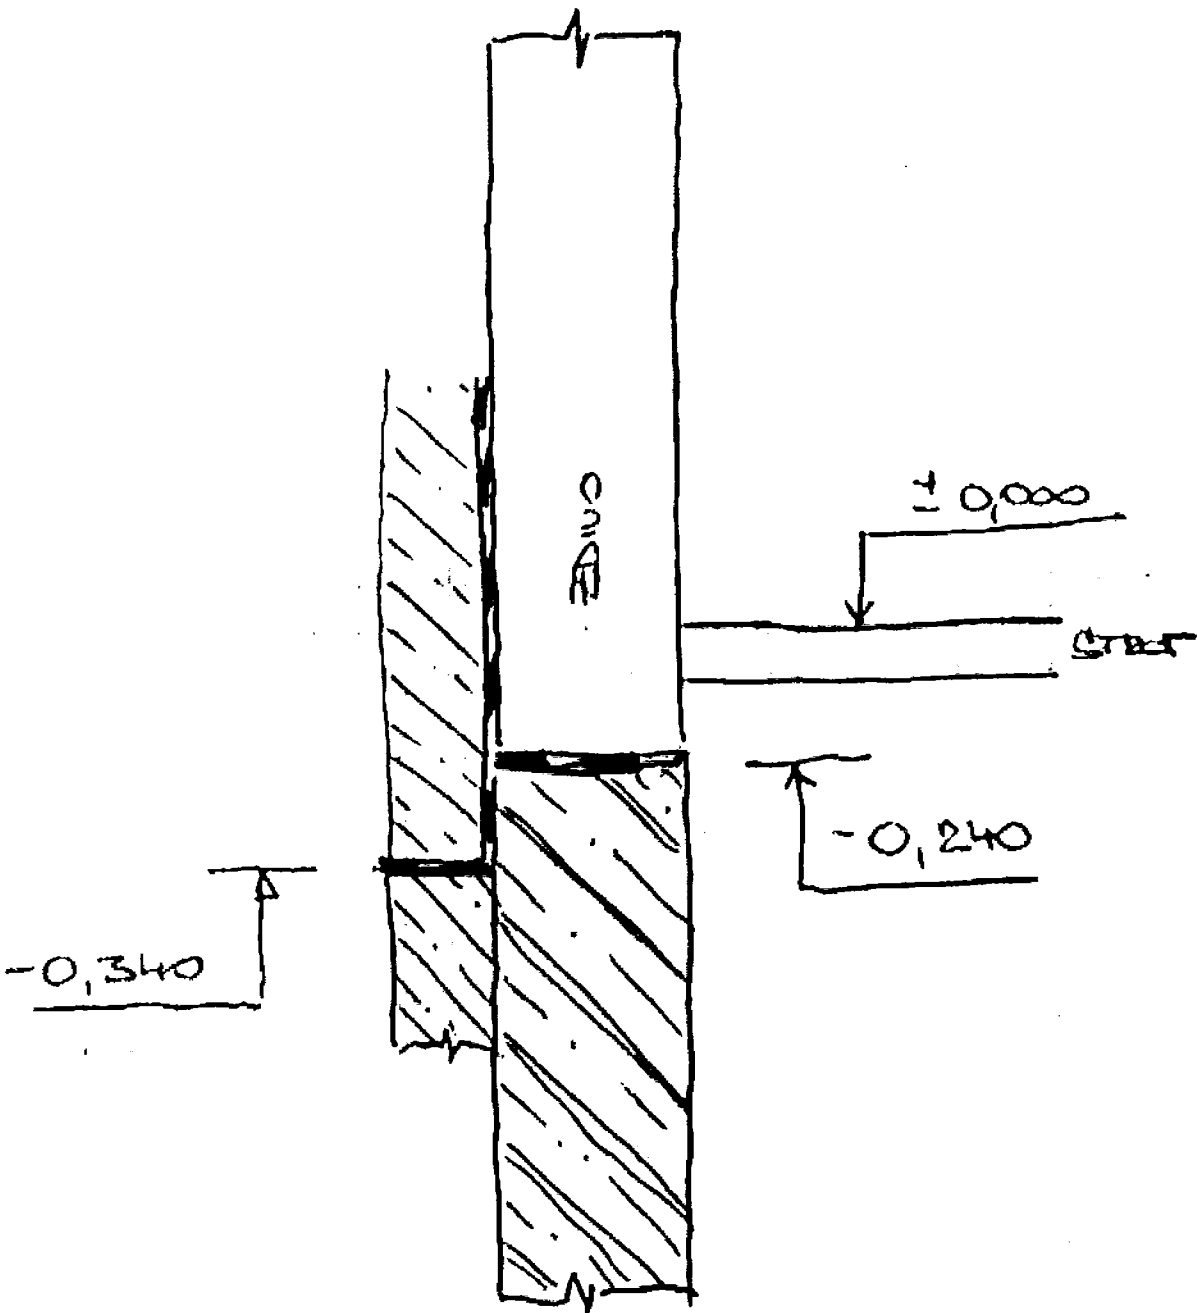

Změnový list č. 1 Příloha č.3 - Fotodokumentace



