

Dodatek č. 1



ke smlouvě o dílo č. 191/2018, jejímž předmětem je přístavba šaten a úprava dispozice chemicko-technické služby v objektu požární stanice v Chrudimi uzavřené dne 21.12.2018 (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1 tohoto znění

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

název: **Chrpa staveb. spol. s. r.o. Pardubice**
sídlo: Raisova 232, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Novotným, PhDr. Robertem Novotným MBA –
jednatelé společnosti
IČO: 25285262
DIČ: CZ25285262
bankovní spojení: 
č. účtu: 
Zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 12861, z 6.3.1998

2. Objednatel

název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
zastoupená: plk. Mgr. Alešem Černožským, ředitelem Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
č. účtu: 6232881/0710

II.

Předmět dodatku

Z důvodů víceprací a méněprací, specifikovaných v níže uvedeném změnovém listu a položkových rozpočtech stavby, které vznikly v průběhu realizace díla a jejich provedení bylo nutné z důvodu zajištění celkové funkčnosti díla, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Část II. Předmět smlouvy bod (2) se položkový rozpočet projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovaný spol. PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM spol. s r.o. doplňuje o následující dokumenty, které vymezují rozsah víceprací a méněprací a které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
 - Změnový list č. 1
 - Rozpočet s výkazem výměr přípočty – vícepráce
 - Rozpočet s výkazem výměr odpočty - méněpráce
- Část VIII. Cena díla se mění následovně:



Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně ve výši:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Původní cena</i>	3 420 822,00 Kč	718 373,00 Kč	4 139 195,00 Kč
<i>Vícepráce</i>	187 086,14 Kč	39 288,09 Kč	226 374,23 Kč
<i>Méněpráce</i>	- 136 307,11 Kč	- 28 624,49 Kč	-164 931,60 Kč
<i>Cena celkem včetně dodatku č. 1</i>	3 471 601,03 Kč	729 036,60 Kč	4 200 637,63 Kč

Cena celkem včetně DPH 4 200 637,63 Kč.

Cena celkem včetně DPH slovy: čtyřmilionydvěstětisícšestsetřicetsedm korun českých a šedesát tři haléřů.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany akceptují skutečnost, že z důvodu výskytu části víceprací/méněprací bezprostředně před termínem dokončení díla – předáním a převzetím díla a časově i administrativně náročným schvalovacím procesem dodatku na straně objednatele, dojde k podpisu dodatku ze strany objednatele až po termínu dokončení díla – předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že i po termínu dokončení díla budou nadále postupovat dle příslušných ustanovení smlouvy.


Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne: 11.11.2019

V Pardubicích dne: 28.11.2019

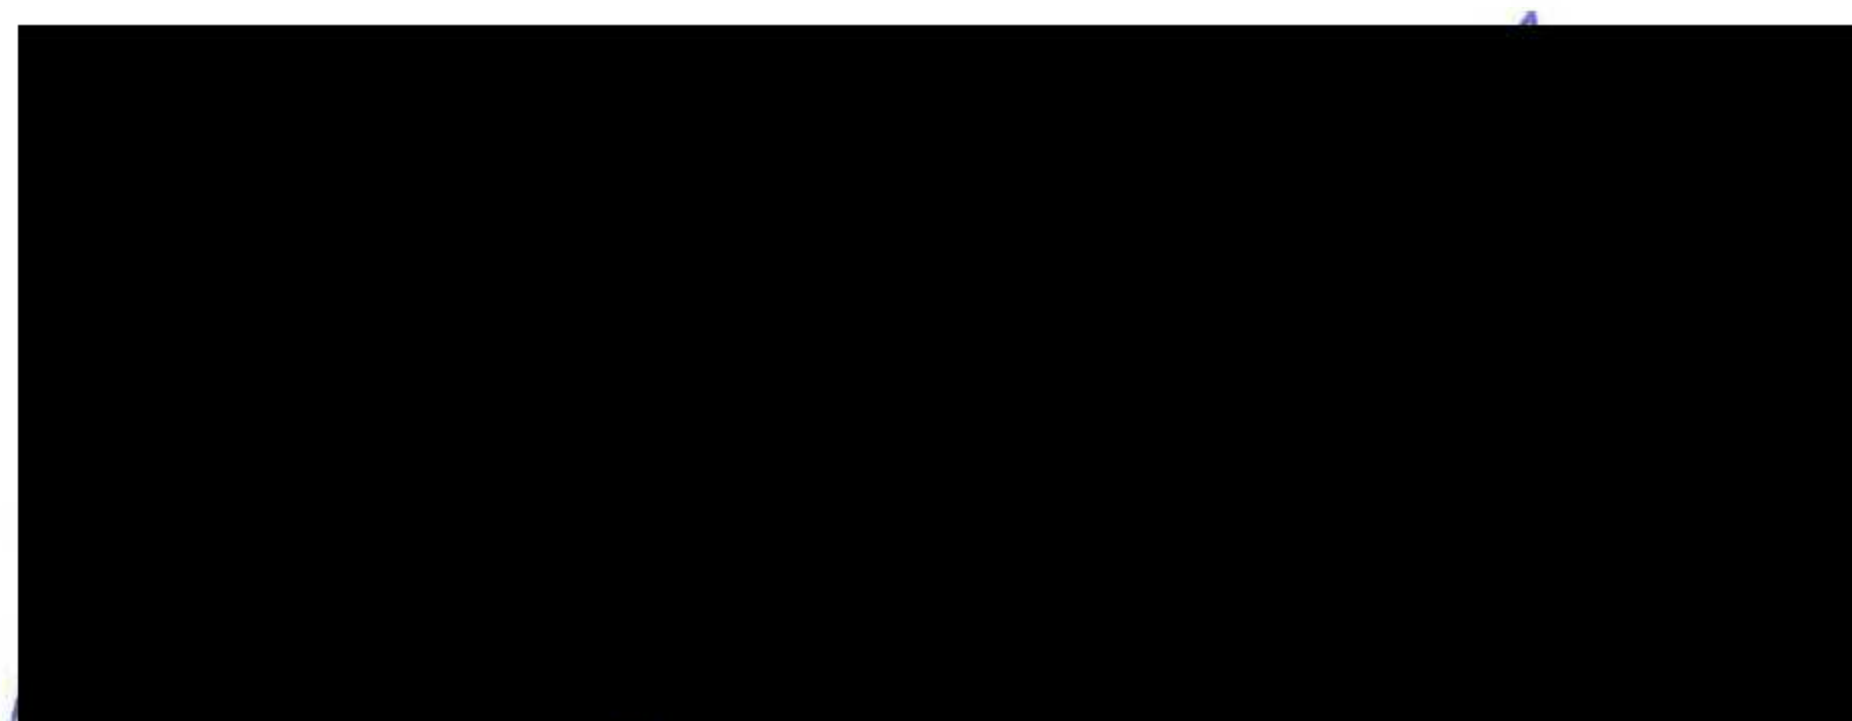

Ing. Jaroslav Novotný
PhDr. Robert Novotný MBA
jednatel

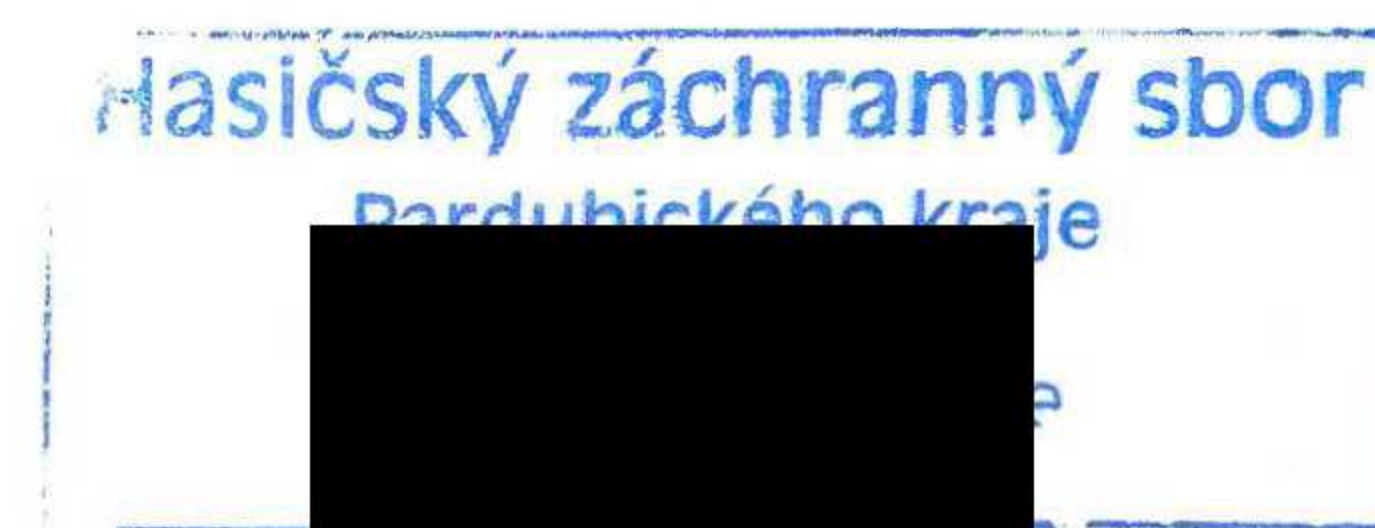

za objednatele

plk. Mgr. Aleš Černohorský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

19/11/2018

Změnový list číslo 1	
Identifikace akce	
Název akce:	PS Chrudim - přístavba šaten směny
Číslo akce SMVS:	014V222008052
Objednatel:	HZS Pardubického kraje
Zhotovitel:	CHRPA staveb.spol. s r.o. Pardubice IČ 252 85 262
Projektant:	Projektový servis Chrudim spol. s r.o. IČ 465 04 401
Předmět změnového listu	
stavební vícepráce	
Část díla dotčená změnovým listem	
práce a dodávky HSV-vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní, ostatní	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Část Práce a dodávky HSV: a) vodorovné konstrukce a úprava povrch vnitřních bylo řešeno jinak, než nyní požaduje investor, b) ostatní konstrukce a bourání - byl zjištěn velký přesah původního betonového základu se kterým nebylo v projektu počítáno a prostup s provedením izolace nebyl projektován c) elektromontáže - nebylo vyprojektováno. Část Práce a dodávky PSV: a) izolace tepelné a konstrukce tesařské - nebylo vyprojektováno, b) konstrukce truhlářské, zámečnické a podlahy z dlaždic - bylo projektováno, investor požádal o změnu oproti projektu	
Nové řešení :	
vytvoření nového železobetonového schodiště, odbourání stávajícího překážejícího betonového základu, úprava projektových nepřesností-doprojektování, výměna dveří s požadovaným panikovým otevíráním	
Zdůvodnění změny :	
požadované změny jsou nutné pro zdarné dokončení díla	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
nemá vliv na projektovou dokumentaci, bude provedena dokumentace skutečného stavu	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
zapsáno 19.3. 2019, 4.4.2019, 24.4.2019, 27.5.2019, 13.6.2019, 31.7.2019, 6.8.2019	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: dílo bude dokončeno v termínu dle smlouvy	
Vliv na kvalitu: bez vlivu	
Vliv na cenu: navýšení ceny	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	187 086,14 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	136 307,11 Kč

Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

50 779,03 Kč

Za projektanta:

Za objednatele:

Projektový servis Chrudim spol. s
r.o.

plk. Mgr. Aleš Černožorský

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Petr Hejzlar, oddělení účetnictví a správy majetku HZS Pardubického kraje

PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM
spol. s r.o.
Poděbradova 909
537 01 CHRUDIM
Zapsán: OR-KS H.Králová, odd. C, vl. 1959
IČO: 465 04 401


ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chrudim-příst.hasič.-odpočty
Objekt:

Objednatel: Čes.republika-HZS Pard.kraje
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o. Pardubice,Raisova 232
Místo: Chrudim

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 17. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-42 015,89	-42 015,89		0,000
2 Zakládání							0,00	-4 255,74	-4 255,74		0,000
1	R	275351215R00	(Pol.15) Bednění stěn základových patek-zřízení	m2	-12,780	275,00	0,00	-3 514,50	-3 514,50	0,000	0,000
2	R	275351215R00	(Pol.16) Bednění stěn základových patek-odstranění	m2	-12,780	58,00	0,00	-741,24	-741,24	0,000	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	-37 760,15	-37 760,15		0,000
61 Úprava povrchů vnitřních							0,00	-37 492,20	-37 492,20		0,000
3	R	611471411R00	(Pol.48)Úprava stropu aktivovaným štukem tl.2-3mm	m2	-95,400	225,00	0,00	-21 465,00	-21 465,00	0,000	0,000
4	R	611481211RT2	(Pol.49) Montáž výztuž.sítě (perlinky) do stěrky stropy vč.sítě a tmelu	m2	-95,400	168,00	0,00	-16 027,20	-16 027,20	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	-94 291,22	-94 291,22		0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,00	-66 504,72	-66 504,72		0,000
5	R	766-03	(pol.145) D+M protipožár.dveří vnitřních se skleněným oknem, vč.zárubně,kování samozavírače 0,9x1,97	kus	-3,000	16 870,00	0,00	-50 610,00	-50 610,00	0,000	0,000
6	R	766-04	(pol.146) D+M dveří vnitř.se skleň oknem, vč.zárubně, kování, samozavír. 0,9x1,97	kus	-1,000	8 480,00	0,00	-8 480,00	-8 480,00	0,000	0,000
7	R	766-5	(pol.147)D+M vnitř.dveří plných, vč.zárubně, kování,samozavír. 0,8x1,97	kus	-1,000	7 360,00	0,00	-7 360,00	-7 360,00		
8	R	998766103R00	(Pol.151) Přesun hmot pro konstr.truhlářské do 24m		-0,060	912,00	0,00	-54,72	-54,72	0,000	0,000
99 Staveništní přesun hmot							0,00	-267,95	-267,95		0,000
9	R	998011001R00	(Pol.109) Přesun hmot pro bud.zděné do 6m	t	-1,150	233,00	0,00	-267,95	-267,95	0,000	0,000
767 Konstrukce zámečnické							0,00	-24 971,50	-24 971,50		0,000
10	R	767134802R00	(Pol.152) Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	-28,200	65,00	0,00	-1 833,00	-1 833,00	0,000	0,000
11	R	767392802R00	(pol.153)Demontáž krytín střech z plechů šroubovaných	m2	-117,950	86,00	0,00	-10 143,70	-10 143,70	0,000	0,000
12	R	767996805R00	(pol.154) Demont.atipických ocel.konstrukcí nad 500kg	kg	-585,650	21,00	0,00	-12 298,65	-12 298,65	0,000	0,000
13	R	998767103R00	(Pol.159)Přesun hmot pro konstr. zámečnické výšky do 24m	t	-0,585	1 190,00	0,00	-696,15	-696,15	0,000	0,000
			-0,585		-0,585						
M21 Elektromontáže							0,00	-2 815,00	-2 815,00		0,000
14	R	VRN	Rezerva rozpočtu - elektroinstalace	kpl	-1,000	2 646,00	0,00	-2 646,00	-2 646,00	0,000	0,000
15	R	VRN	Rezerva rozpočtu - hromosvod	kpl	-1,000	169,00	0,00	-169,00	-169,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	-136 307,11	-136 307,11		0,000



OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chrudim-příst.hasič.-přípočty
Objekt:

Objednatel: Čes.republika HZS Pard.kraje
Zhotovitel: Chrupa stav.spol.s r.o.Pardubice,Raisova 232
Místo: Chrudim

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 17. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	57 889,96	57 889,96		0,000
4 Vodorovné konstrukce							0,00	8 382,24	8 382,24		0,000
1	R	430321314R00	Schodišťové konstrukce železobet. C 20/25 (viz pol.39)-dopočet druhého schodiště ((1,85*0,95)/2*1,25+(0,6*1,25*0,95))*2 odpočet kubatury v rozpočt.pol.39 -1,19 Součet	m3	2,432 3,622 -1,190 2,432	3 250,00	0,00	7 904,00	7 904,00	pož.investora	0,000
2	R	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých-zřízení (viz pol.40)-dopočet druhého schodiště (0,18*1,25)*10 odpočet výměry v rozp.pol.40 -1,13 Součet	m2	1,120 2,250 -1,130 1,120	352,00	0,00	394,24	394,24	pož.investora	0,000
3	R	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých-odstranění (viz pol.41)-dopočet druhého schod.	m2	1,120	75,00	0,00	84,00	84,00	pož.investora	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	8 995,41	8 995,41		0,000
61 Úprava povrchů vnitřních							0,00	8 995,41	8 995,41		0,000
4	R	634661111	Výplň spar šířky do 5mm silikonovým tmelem-spáry mezi panely ve stropě (5,33*5)+(5,36*5)+(6,18*5)+(5,99*5)	m	114,300 114,300	78,70	0,00	8 995,41	8 995,41	pož.investora	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	33 865,69	33 865,69		0,000
5	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého (odbour.bet.stáv.základu podél gar.v nové přístavbě) 0,35*0,55*23,2	m3	4,466 4,466	2 930,00	0,00	13 085,38	13 085,38	skryté překážky	0,000
6	R	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m 8,932	t	8,932 8,932	275,00	0,00	2 456,30	2 456,30	skryté překážky	0,000
7	R	979082121	Příplatek k vnitrostav. dopravě suti zadalších 5m 8,932*4	t	35,728 35,728	35,00	0,00	1 250,48	1 250,48	skryté překážky	0,000
8	R	979081111R00	Odvoz suti a vubour.hmot na skládku do 1 km 5,5	t	5,500 5,500	215,00	0,00	1 182,50	1 182,50	skryté překážky	0,000
9	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,5*14	t	77,000 77,000	9,20	0,00	708,40	708,40	skryté překážky	0,000
10	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 5,5	t	5,500 5,500	250,00	0,00	1 375,00	1 375,00	skryté překážky	0,000
11	R	4-02	Výplň spáry mezi panely a HEB nosníky vč.výplně částí panel.dutin se zavibr.(viz det.Goldbeck) 3,965*5	m	19,825 19,825	385,00	0,00	7 632,63	7 632,63	nepřesnost PD	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chrudim-příst.hasič.-přípočty
Objekt:

Objednatel: Čes.republika HZS Pard.kraje
Zhotovitel: Chrupa stav.spol.s r.o.Pardubice,Raisova 232
Místo: Chrudim

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 17. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	57 889,96	57 889,96		0,000
4 Vodorovné konstrukce							0,00	8 382,24	8 382,24		0,000
1	R	430321314R00	Schodišťové konstrukce železobet. C 20/25 (viz pol.39)-dopočet druhého schodiště ((1,85*0,95)/2*1,25+(0,6*1,25*0,95))*2 odpočet kubatury v rozpočt.pol.39 -1,19 Součet	m3	2,432 3,622 -1,190 2,432	3 250,00	0,00	7 904,00	7 904,00	pož.investora	0,000
2	R	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých-zřízení (viz pol.40)-dopočet druhého schodiště (0,18*1,25)*10 odpočet výměry v rozp.pol.40 -1,13 Součet	m2	1,120 2,250 -1,130 1,120	352,00	0,00	394,24	394,24	pož.investora	0,000
3	R	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých-odstranění (viz pol.41)-dopočet druhého schod.	m2	1,120	75,00	0,00	84,00	84,00	pož.investora	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	8 995,41	8 995,41		0,000
61 Úprava povrchů vnitřních							0,00	8 995,41	8 995,41		0,000
4	R	634661111	Výplň spar šířky do 5mm silikonovým tmelem-spáry mezi panely ve stropě (5,33*5)+(5,36*5)+(6,18*5)+(5,99*5)	m	114,300 114,300	78,70	0,00	8 995,41	8 995,41	pož.investora	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	33 865,69	33 865,69		0,000
5	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého (odbour.bet.stáv.základu podél gar.v nové přístavbě) 0,35*0,55*23,2	m3	4,466 4,466	2 930,00	0,00	13 085,38	13 085,38	skryté překážky	0,000
6	R	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m 8,932	t	8,932 8,932	275,00	0,00	2 456,30	2 456,30	skryté překážky	0,000
7	R	979082121	Příplatek k vnitrostav. dopravě suti zadalších 5m 8,932*4	t	35,728 35,728	35,00	0,00	1 250,48	1 250,48	skryté překážky	0,000
8	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1 km 5,5	t	5,500 5,500	215,00	0,00	1 182,50	1 182,50	skryté překážky	0,000
9	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,5*14	t	77,000 77,000	9,20	0,00	708,40	708,40	skryté překážky	0,000
10	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 5,5	t	5,500 5,500	250,00	0,00	1 375,00	1 375,00	skryté překážky	0,000
11	R	4-02	Výplň spáry mezi panely a HEB nosníky vč.výplně části panel.dutin se zavibr.(viz det.Goldbeck) 3,965*5	m	19,825 19,825	385,00	0,00	7 632,63	7 632,63	nepřesnost PD	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chrudim-příst.hasič.-přípočty

Objekt:

Objednatel: Čes.republika HZS Pard.kraje

Zhotovitel: Chrupa stav.spol.s r.o.Pardubice,Raisova 232

Místo: Chrudim

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 17. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
29	767	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	200,575	15,40	13 308,20	3 088,86	3 088,86	pož.investora	0,000
			U č.10-2x dl.1,5m(hmot.10,6kg/m)+plech 8mm schod 180/250 š.1250-5x 1,5*2*10,6								
			(0,18+0,25)*1,25*5*0,008*7850								
			Součet								
					31,800						
					168,775						
					200,575						
30	R	998767103R00	Přesun hmot pro konstr.zámečnické do24m	t	0,200	1 190,00	0,00	238,00	238,00	pož.investora	0,000
			0,200		0,200						
		771	Podlahy z dlaždic-2x schody-R 10				2 346,00	5 756,65	8 102,65		0,000
31	R	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,794	47,20	0,00	226,28	226,28	pož.investora	0,000
			(10,2*0,27)+(12,75*0,16)		4,794						
32	R	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexi lepidlo š do 300 mm	m	10,200	281,00	0,00	2 866,20	2 866,20	pož.investora	0,000
			(1,25*4)+(1,3*4)		10,200						
33		59661337	schodovka protiskluzná šifky 300mm-Nordic 76s	kus	39,100	28,50	1 114,35	0,00	1 114,35	pož.investora	0,000
			(10,2/0,3)*1,15		39,100						
34	R	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických flexi lepidlo v do 200mm	m	12,750	148,00	0,00	1 887,00	1 887,00	pož.investora	0,000
			(1,25*5)+(1,3*5)		12,750						
35		59761274	dlažba sliutá 30x30 barevná -podstupnice- Sahara 62	m2	2,346	525,00	1 231,65	0,00	1 231,65	pož.investora	0,000
			12,75*0,16*1,15		2,346						
36	R	771591185	Podlahy-řezání keramických dlaždic rovné	kus	36,000	17,90	0,00	644,40	644,40	pož.investora	0,000
			18+18		36,000						
37	R	998771109	Přesun hmot pro podl.z dlaždic do 6m	t	0,235	565,00	0,00	132,78	132,78	pož.investora	0,000
			Celkem				20 309,54	180 084,79	187 086,14		0,000


 Stavební společnost s r.o. CHRUPA
 Raisova 132, 530 02 Pardubice
 IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262
 OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861
