



DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„**Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**“

číslo smlouvy objednatele: 2019000218
číslo smlouvy zhotovitele: 06003/2019
číslo veřejné zakázky: 18243

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupený: Ing. Martin Stašek, Oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
ve věcech technických: Ing. Milan Hromádka, vedoucí projektu
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 5. 3. 2019. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí Rady města České Budějovice ze dne 3. 6. 2019. Dodatek č. 2 uzavřen mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí Rady města České Budějovice ze dne 24. 6. 2019. Dodatek č. 3 uzavřen mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí Rady města České Budějovice ze dne 2. 9. 2019. Smlouva včetně všech dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla
ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Z důvodu požadavků objednatele, budoucího uživatele, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 23.998.306,54 Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1a, 1b, 2a a 2b v položkách, které nejsou měřením ve smyslu čl. V VOP), dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 3a a 3b), dle dodatku č. 3 (tzn. dle změnových listů č. 4a, 5a, 5b, 6a, 7a, 7b, 8a, 9a, 10a v položkách, které nejsou měřením ve smyslu čl. V VOP) a dle dodatku č. 4 (tzn. dle změnových listů č. 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 14a, 15a, 16b, 17a, 18a, 19a, 19b, 20a, 21a, 21b) a na základě měření ve smyslu čl. V VOP činí 27.592.765,19 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	23.998.306,54 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	2.249.295,34 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	839.800,00 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	263.898,34 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	241.464,97 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	875.729,41 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 634.264,44 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	27.592.765,19 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnové listy č. 11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 14a, 15a, 16b, 17a, 18a, 19a, 19b, 20a, 21a, 21b.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 25. 11. 2019, č. 1575/2019.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing.
Martin
Stašek



Digitálně podepsal
Ing. Martin Stašek
Datum: 2019.12.03
11:09:07 +01'00'

Ing. Jiří Svoboda, primátor města

statutární město České Budějovice

Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro
Jihočeský kraj
Metrostav a.s.

Změnový list č. 11 A

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Ocelové konstrukce**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 14. 10. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Oprava objemu dodávky a montáže ocelové konstrukce atletického koridoru a spojovacího krčku podle skutečnosti


Technický popis změny:

Ve změnovém listu je vyčíslena skutečná hmotnost dodávaného materiálu a jeho montáž podle dílenských dokumentací spojovacího krčku a atletického koridoru – ve výkazech je zvýrazněna hmotnost barevně, v cenové nabídce je počítáno s 5% prořezem.


Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 526 325,31 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis: 
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Datum: 15.10.19

Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis: 
(TDI) TDI

Datum: 15.10.19

Schválil: Jana Kubíková, DiS Podpis: 
(INVESTOR) technik investičního oboru
město České Budějovice

Datum: 15.10.19

Přílohy: CN, dílenská dokumentace

Distribuce:



Investor



TDI

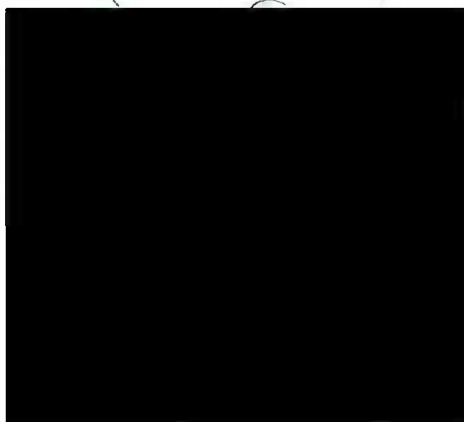


GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
		ZL 011 A	Vícepráce: Ocelové konstrukce				526 325,31
		ZL 002 A	Spojovací krček vícepráce				
Díl:		767	Konstrukce zámečnické				293 752,66
153		767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg 3,313/1,05*1000	kg	3155,238	70,00	220 866,66
					3155,238		
			Materiál	t	3,313	22000,00	72 886,00
			z dílenké dokumentace spojovacího krčku: 3154,9*1,05*0,001		3,313		
			Objekt: 01 - Atletický koridor				
Díl:		767	Konstrukce zámečnické				232 572,65
290	K	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg 2,623/1,05*1000	kg	2498,095	70,00	174 866,65
					2498,095		
			Materiál	t	2,623	22000,00	57 706,00
			z dílenké dokumentace atletického koridoru: 2498,51*1,05*0,001		2,623		
		ZL 011 A	Celkem				526 325,31



Ing. Jakub Valeš, Žižkovo náměstí 18, 390 01 Tábor

č.dokumentace: 2019-07

Povrchová úprava:

Atletický koridor České Budějovice

RAL 9010 (C3)

Pomocná OK fasády

Celkový výpis dílců

<i>Dílec</i>	<i>ks</i>	<i>Hmotnost 1 ks</i>	<i>Hmotnost celk.</i>	<i>Plocha nátěru</i>
Z01	13	76,99	1 000,82	46,97
Z02	1	78,49	78,49	3,68
Z03	1	78,49	78,49	3,68
Z04	3	41,73	125,20	5,88
Z05	1	138,32	138,32	6,60
Z06	1	55,17	55,17	2,59
Z07	1	129,08	129,08	6,06
Z08	1	88,23	88,23	4,25
Z09	1	26,73	26,73	1,16
Z10	1	288,44	288,44	13,40
Z11	1	287,42	287,42	19,08
Z12	106	1,59	168,81	7,42
Z13	1	33,32	33,32	1,25
Celkem	132		2 498,51	122,01
PŘÍDAVEK - 10%			249,85	12,20
CELKOVÁ HMOTNOST			2 748,36	134,22

VALEŠ_ material_list

Ing. Jakub Valeš - Žižkovo náměstí 18, 390 01 Tábor

ZAKÁZKA: SPOJOVACÍ KRČEK Č. ZAKÁZKY: 201/2019 vytvořil: ing. J. Valeš
VÝROBEK: Atletický koridor Datum: 05/22/2019

V Ý P I S M A T E R I Á L U

Strana:1

MATERIÁL	POL.	JAKOST	POČET	DÉLKA	PLOCHA(m2)	HMOTNOST(kg)
CFRHS80*3	1012	S235	2	2950	0.9	21.4
CFRHS80*3	1010	S235	7	2930	0.9	21.3
CFRHS80*3	1017	S235	2	2280	0.7	16.5
CFRHS80*3	1014	S235	2	2180	0.7	15.8
CFRHS80*3	1015	S235	2	1625	0.5	11.8
CFRHS80*3	1018	S235	1	1120	0.4	8.1
CFRHS80*3	1013	S235	2	980	0.3	7.1
CFRHS80*3	1016	S235	2	680	0.2	4.9
CFRHS80*3	1011	S235	3	660	0.2	4.8
SOUHRN:				45000	14.4	326.4
FLT5*50	1026	S235	69	300	0.0	0.6
SOUHRN:				20700	2.3	40.6
FLT10*220	1023	S235	14	220	0.1	3.8
SOUHRN:				3080	1.5	53.2
FLT12*100	1020	S235	2	180	0.0	1.7
FLT12*100	1019	S235	12	180	0.0	1.7
SOUHRN:				2520	0.6	23.7
L40*5	1031	S235	8	100	0.0	0.3
SOUHRN:				800	0.1	2.4
L80*8	1021	S235	1	80	0.0	0.8
L80*8	1021	S235	27	80	0.0	0.8
SOUHRN:				2240	0.7	21.6
L120*80*8	1022	S235	3	150	0.1	1.8
SOUHRN:				450	0.2	5.5
PL3*50	1025	S235	69	300	0.0	0.4
SOUHRN:				20700	2.2	24.4
PL10*190	1024	S235	9	190	0.1	2.8
SOUHRN:				1710	0.7	25.5
SHS100*100*5.01007		S235	7	2950	1.2	43.4
SHS100*100*5.01008		S235	7	2930	1.1	43.1
SHS100*100*5.01009		S235	6	700	0.3	10.3
SOUHRN:				45360	17.7	666.9
UPN120	1005	S235	8	4940	2.1	66.2
UPN120	1006	S235	4	1595	0.7	21.4
UPN120	1001	S235	2	5940	2.6	79.6
UPN120	1003	S235	2	1800	0.8	24.1
UPN120	1004	S235	2	1725	0.7	23.1

VALEŠ_ material_list						
UPN120	1002	S235	4	630	0.3	8.4
V Ý P I S M A T E R I Á L U						Strana:2
MATERIÁL	POL.	JAKOST	POČET	DÉLKA	PLOCHA(m2)	HMOTNOST(kg)
SOUHRN:				67350	29.0	902.5
UPN140	1028	S235	4	5767	2.8	92.3
UPN140	1030	S235	2	6925	3.4	110.9
UPN140	1029	S235	2	5200	2.5	83.3
UPN140	1027	S235	4	4753	2.3	76.1
SOUHRN:				66330	32.5	1062.2
CELKEM:						3154.9 kg

Změnový list č. 11 B

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Ocelové konstrukce**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 14. 10. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Oprava objemu dodávky a montáže ocelové konstrukce atletického koridoru a spojovacího krčku podle skutečnosti




Technický popis změny:

Změnový list řeší odpočet položek týkajících se dodávky a montáže ocelové konstrukce atletického koridoru a spojovacího krčku. Jedná se o konstrukci pro osazení oken v koridoru a spojovacím krčku a nosnou konstrukci střechy a pláště spojovacího krčku.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO – 473 497,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: (GD)	Ing. Milan Hromádka Vedoucí projektu, Metrostav a.s.	Podpis:		Datum: 15.10.19
Ověřil: (TDI)	Bc. Tomáš Baloun TDI	Podpis:		Datum: 15.10.19
Schválil: (INVESTOR)	Jana Kubíková, DiS technik investičního oboru město České Budějovice	Podpis:		Datum: 15.10.19

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI



GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
---	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------

ZL 011 B Méněpráce: Ocelové konstrukce -473 497,00

**ZL 002 A Spojovací krček vícepráce
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -183 501,05**


153		767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	-1 572,90000	70,00	-110 103,00
154		13384340R	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11373	t	-1,12560	22 800,00	-25 663,68
155		13384435R	Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235, 11375	t	-0,90090	23 300,00	-20 990,97
156		14587296Rx	Profil čtvercový uzavř. S235 100 x 5 mm	t	-0,66780	27 600,00	-18 431,28
157		14587291Rxx	Profil čtvercový uzavř. S235 80 x 3 mm	t	-0,31605	26 300,00	-8 312,12

ZL 002 B Spojovací krček méněpráce 0,00

**Objekt: 01 - Atletický koridor
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -289 995,95**

289	K	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	-2015,610	70,00	-141 092,70
290	K	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	-1002,675	70,00	-70 187,25
291	K	14587291R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 80 x 3 mm	t	-1,866	22000,00	-41 052,00
292	K	14587295R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 3 mm	t	-1,412	22000,00	-31 064,00
293	K	15425870RA	Profil U rovnoramenný 11375 160x60x60x4 mm	t	-0,300	22000,00	-6 600,00

ZL 011 B Celkem -473 497,00



Změnový list č. 12 A

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Obklad OSB**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 25. 7. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Doplnění chybějícího materiálu pro kotvení OSB, záměna nátěru OSB desek a nátěr požárně dělící stěny dle požadavku školy.

Technický popis změny:

Ve změnovém listu je vyčíslena vícepráce za dodávku a montáž nosné konstrukce pro kotvení OSB desek (hranoly, kompozitní úhelníky, kotevní materiál).

Dále je vyčísleno provedení povrchové úpravy OSB obklad – 2x nátěr Dulux Satin Matt šedý (původně navržen Variopaint).

V CN je oceněn nátěr požárně dělící stěny mezi koridorem a spojovacím krčkem ze strany koridoru. Nátěr je proveden do výšky OSB obkladu. Jedná se o vícepráci dle požadavku školy.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 179 457,50 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Datum: 1. 10. 19

Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis:
(TDI) TDI

Datum: 1. 10. 19

Schválil: Jana Kublková, DiS Podpis:
(INVESTOR) technik investičního oboru
město České Budějovice

Datum: 1. 10. 19

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI



GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
ZL 012 A			Vícepráce: Obklad OSB				179 457,50
261	K	60515815R	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x160 mm l=5m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% 2,537*2	m3	5,074	13000,00	65 962,00
					5,074		
264	K	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	8,286	500,00	4 143,00
318a	K	783228101	Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí (0,06*2+0,16*2)*(13*6+6,*58)+0,06*4*5*40	m2	248,200	40,00	9 928,00
					248,200		
325a	K	784561010R01	Nátěr konstrukci Dulux Rapidry Satin Matt šedá, 2 vrstvy Záměna za nástřik Variopaint	m2	417,850	210,00	87 748,50
325b	K	784561010R01	Nátěr konstrukci Dulux Rapidry Satin Matt šedá, 2 vrstvy Nátěr požárně dělicí stěny mezi koridorem a spojovacím krčkem do výšky dle OSB obkladu	m2	29,600	210,00	6 216,00
1			Kompozitní úhelníky L50x50/6 pro kotvení KVH profilů, řezání na 250 mm délky	m	19,500	280,00	5 460,00
2			Spojovací prostředky pro kotvení kompozitních úhelníků	kpl	1,000	4500,00	4 500,00
3			Montáž kompozitních úhelníků	hod	40,000	200,00	8 000,00

ZL 012 A Celkem

179 457,50

Změnový list č. 12 B

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Obklad OSB**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 25. 7. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Doplnění chybějícího materiálu pro kotvení OSB, záměna nátěru OSB desek a nátěr požárně dělicí stěny dle požadavku školy.


Technický popis změny:

Změnový list řeší odpočet položek v VV týkajících se změny. Jedná se o odpočet kotevního hranolu, nátěr tesařských konstrukcí a nástřik OSB desek Variopaintem.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO – 140 315,84 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE


Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis: 
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Datum: 1.10.19

Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis: 
(TDI) TDI

Datum: 1.10.19

Schválil: Jana Kubíková, DiS Podpis: 
(INVESTOR) technik investičního oboru
město České Budějovice

Datum: 1.10.19

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI




GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
ZL 012 B			Méněpráce: Obklad OSB				-140 315,84
261	K	60515815R	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x160 mm l=5m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	-2,537	13000,00	-32 981,00
264	K	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-7,086	500,00	-3 543,00
318	K	783781001R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolin 1x	m2	-87,696	40,00	-3 507,84
325	K	784561010R00	Nástřik konstrukcí variopaint	m2	-417,850	240,00	-100 284,00
ZL 012 B			Celkem				-140 315,84



Změnový list č. 13 A

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Branka oplocení**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 22. 8. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Doplnění výkazu výměr




Technický popis změny:

Změnový list řeší doplnění 2 kusů branek oplocení navržených projektovou dokumentací, ale chybějících ve výkazu výměr.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 27 868,80 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: (GD)	<u>Ing. Milan Hromádka</u> Vedoucí projektu, Metrostav a.s.	Podpis:		Datum: 1. 10. 19
Ověřil: (TDI)	<u>Bc. Tomáš Baloun</u> TDI	Podpis:		Datum: 1. 10. 19
Schválil: (INVESTOR)	<u>Jana Kubíková, DiS</u> technik investičního oboru město České Budějovice	Podpis:		Datum: 1. 10. 19

Přílohy: CN

Distribuce:

 Investor TDI GDS


Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
ZL 013 A			Vícepráce: Branka oplocení				27 868,80
1	K	133101101R00	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 0,4*0,4*0,8*4	m3	0,512	600,00	307,20
2	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,512	50,00	25,60
3	K	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,512	3000,00	1 536,00
4	K	553-42603RR02	Branka 1,2x1,4m, žárový pozink včetně sloupků s přípravou pro osazení BEFO, zámek FAB, kliky	kus	2,000	11000,00	22 000,00
5	K	767920230R02	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	2,000	2000,00	4 000,00

ZL 013 A Celkem

27 868,80



Změnový list č. 14 A

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Nerezové lišty**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 25. 8. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Doplnění výkazu výměr


Technický popis změny:

Změnový list řeší doplnění lišt na ukončení obkladů v koupelnách a na WC.


Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 4 410,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE


Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis: 
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Datum: 1. 10. 19

Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis: 
(TDI) TDI

Datum: 1. 10. 19

Schválil: Jana Kubíková, DiS Podpis: 
(INVESTOR) technik investičního oboru
město České Budějovice

Datum: 1. 10. 19

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI

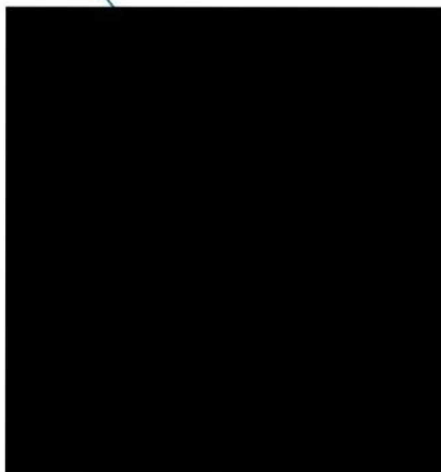


GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
		ZL 014 A	Vícepráce: Nerezové lišty				4 410,00
1			Nerezové lišty na ukončení keramického obkladu L10/250	kus	18,000	245,00	4 410,00
		ZL 014 A	Celkem				4 410,00



Změnový list č. 15 A

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Hasicí přístroje**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 28. 8. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Doplnění výkazu výměr

Technický popis změny:

Změnový list řeší doplnění 6 kusů přenosných hasicích přístrojů podle požadavku požární bezpečnostního řešení.

Jedná se o práškové hasicí přístroje s hasicí schopností 21A včetně revize a montáže.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 5 640,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Datum: 1.10.19

Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis:
(TDI) TDI

Datum: 1.10.19

Schválil: Jana Kubíková, DiS Podpis:
(INVESTOR) technik investičního odboru
město České Budějovice

Datum: 1.10.19

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI



GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
		ZL 015 A	Vícepráce: Hasicí přístroje				5 640,00
1			Práškový přenosný hasicí přístroj, 21 A čteně revize	kus	6,000	840,00	5 040,00
2			Montáž PHP	kus	6,000	100,00	600,00
		ZL 015 A	Celkem				5 640,00



Změnový list č. 16 B

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Svítidla – méněpráce**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 2. 9. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Odečtení svítidla

Technický popis změny:

Změnový list řeší odečtení 1 ks nouzového svítidla, které je zahrnuto ve VV, ale v projektu není požadováno.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO – 950,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá:
(GD) Ing. Milan Hromádka Podpis:
Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.Datum: 4. 10. 19Ověřil:
(TDI) Bc. Tomáš Baloun Podpis:
TDIDatum: 1. 10. 19Schválil:
(INVESTOR) Jana Kubíková, DiS Podpis:
technik investičního oboru
město České BudějoviceDatum: 1. 10. 19

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI



GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
		ZL 016 B	Měněpráce: Svítidla				-950,00
211	K	32	Svítidlo LED přisazené, nouzové, 5W, IP65, 1hod.	kus	-1,000	950,00	-950,00
		ZL 015 B	Celkem				-950,00



Změnový list č. 17 A

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Sokl garáž**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 20. 9. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Doplnění výkazu výměr


Technický popis změny:

Ve změnovém listu je vyčíslena vícepráce na provedení soklu garáže – zateplení XPS tl. 100mm, povrchová úprava marmolit.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 17 550,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE


Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis: 
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.Datum: 1. 10. 19Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis: 
(TDI) TDIDatum: 1. 10. 19Schválil: Jana Kubíková, DiS Podpis: 
(INVESTOR) technik investičního oboru
město České BudějoviceDatum: 1. 10. 19

Přílohy: CN

Distribuce:

 Investor TDI GDS

Ostatní



Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
		ZL 017 A	Vícepráce:Sokl garáž				17 550,00
1	K	622311522R00	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm	m2	13,500	1300,00	17 550,00
		ZL 017 A	Celkem				17 550,00



Změnový list č. 18 A

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Požární ucpávky**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 2. 9. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Doplnění výkazu výměr


Technický popis změny:

Změnový list řeší vyčíslení vícepráce za provedení požárních ucpávek v místech přechodu instalací (EI, ÚT, ZTI) z jednoho požárního úseku do druhého.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 17 400,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE


Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: ing. Milan Hromádka Podpis: 
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Datum: 1. 10. 19

Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis: 
(TDI) TDI

Datum: 1. 10. 19

Schválil: Jana Kubíková, DiS Podpis: 
(INVESTOR) technik investičního oboru
město České Budějovice

Datum: 1. 10. 19

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI




GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
		ZL 018 A	Vícepráce: Požární ucpávky				17 400,00
1			Těsnící materiál	kpl	1,000	12400,00	12 400,00
2			Montáž požární ucpávky	hod	8,000	500,00	4 000,00
3			Zpracování revizní zprávy	ks	1,000	1000,00	1 000,00
		ZL 018 A	Celkem				17 400,00



Změnový list č. 19 A

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Sadové úpravy - vícepráce**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 2. 9. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Doplnění výkazu výměr

Technický popis změny:

Změnový list řeší doplnění 2 kusů stromů, které požaduje Odbor životního prostředí z důvodu rozšíření spojovacího krčku při změně stavby před dokončením.

Dále je doplněna chybějící výměra osetí parkového trávníku.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 12 700,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Datum: 1.10.19

Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis:
(TDI) TDI

Datum: 1.10.19

Schválil: Jana Kubíková, DiS Podpis:
(INVESTOR) technik investičního oboru
město České Budějovice

Datum: 1.10.19

Přílohy: CN

Distribuce:

 Investor TDI GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
ZL 019 A			Vícepráce: Sadové úpravy				12 700,00
26	K	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	2,000	50,00	100,00
27	K	02656032R1	Javor babyka - Acer campestre, OK 12-14 cm	kus	2,000	3000,00	6 000,00
28	K	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	2,000	300,00	600,00
31a	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	300,000	20,00	6 000,00
ZL 019 A			Celkem				12 700,00



Změnový list č. 19 B

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**

Název: **Sadové úpravy - méněpráce**

Předkládá: **Metrostav a.s.**

Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 2. 9. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Narovnání výkazu výměr


Technický popis změny:

Změnový list řeší odpočet plochy trávníku v místě rozšíření spojovacího krčku.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO – 700,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE


Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis: 
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Datum: 1.10.19

Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis: 
(TDI) TDI

Datum: 1.10.19

Schválil: Jana Kubíková, DiS Podpis: 
(INVESTOR) technik investičního oboru
město České Budějovice

Datum: 1.10.19

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI




GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
		ZL 019 B	Měněpráce: Sadové úpravy				-700,00
31	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-35,000	20,00	-700,00
		ZL 019 B	Celkem				-700,00



Změnový list č. 20 A

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**

Název: **Měření a regulace**

Předkládá: **Metrostav a.s.**

Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 14. 9. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Doplnění výkazu výměr


Technický popis změny:

Ve změnovém listu je vyčíslena vícepráce za provedení dodávky měření a regulace, která není součástí projektové dokumentace spojovacího krčku, ale je nezbytně nutná pro funkčnost objektu.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 82 377,80 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE


Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis: 
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Datum: 1.10.19

Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis: 
(TDI) TDI

Datum: 1.10.19

Schválil: Jana Kubíková, DiS Podpis: 
(INVESTOR) technik investičního oboru
město České Budějovice

Datum: 1.10.19

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI



GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice


č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
ZL 020 A			Vícepráce: Měření a regulace				82 377,80
2 Rozvaděčová souprava MaR							27 950,00
1	K		Doplnit do RS silno el.prvky dle svorkové schématické dokumentace	kpl	5,000	670,00	3 350,00
2	K		Úprava aplikačního SW	hod	16,000	540,00	8 640,00
3	M		Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	2400,00	2 400,00
4	K		Úpravy v RS MaR	hod	16,000	420,00	6 720,00
5	M		Aplikační SW pro doplněk	kpl	1,000	3840,00	3 840,00
6	K		SW Vizualizace pro doplněk	kpl	1,000	3000,00	3 000,00
3 VZT ATREA							4 560,00
3	K		Montáž RS	hod	8,000	420,00	3 360,00
4	M		Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	1200,00	1 200,00
4 Kabeláž, vodiče							23 227,80
1	M		Vodič CY, 1 mm ² , rudý	m	50,000	4,56	228,00
2	M		Vodič CY, 1,5 mm ² , rudý	m	50,000	5,40	270,00
3	M		Vodič CY, 1,5 mm ² , tmavomodrý	m	50,000	5,40	270,00
4	M		Vodič CY, 1,5 mm ² , světlemodrý	m	50,000	5,40	270,00
5	M		Vodič CY, 1 mm ² , černý	m	50,000	4,56	228,00
6	M		Vodič CY, 1,5 mm ² , černý	m	50,000	5,40	270,00
8	M		Kabel CYKY 5Jx2,5	m	35,000	39,72	1 390,20
9	M		Kabel CYKY 5Jx1,5	m	35,000	25,92	907,20
10	M		Kabel UTP CAT 5e	m	70,000	11,04	772,80
11	M		Kabel CYKY 3Jx1,5	m	55,000	15,12	831,60
12	M		Kabel CYKY 3Ox1,5	m	55,000	15,12	831,60
13	M		Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	40,000	10,92	436,80
15	M		Elketroinstalační trubky a chráničky DN20, DN32	m	70,000	38,88	2 721,60
16	M		Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	1200,00	1 200,00
17	K		Montáž	hod	30,000	420,00	12 600,00

5 Stavební přípomocce**2 400,00**

1	K		Průrazy zdi	kpl	1,000	1200,00	1 200,00
2	K		Pomocná stavebni činnost	kpl	1,000	1200,00	1 200,00

6 Pomocná činnost**24 240,00**

1	M		Revize elektro	ks	1,000	3000,00	3 000,00
2	M		PD elektro-skutečné provedení	ks	1,000	3600,00	3 600,00
4	K		Oživení a zkušební provoz	hod	20,000	420,00	8 400,00
6	K		Úprava vizualizace na PC	hod	6,000	540,00	3 240,00
7	K		Režie	kpl	1,000	6000,00	6 000,00

ZL 020 A Celkem**82 377,80**

Změnový list č. 21 A

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Úprava položek - vícepráce**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**

Datum vystavení: 2. 9. 2019

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Doplnění výkazu výměr


Technický popis změny:

Ve změnovém listu je vyčíslena dodávka a montáž obložení ocelového sloupku sádrokartonovou protipožární deskou – množství 10 m2.


Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 2 000,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE


Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis: 
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Datum: 1.10.19

Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis: 
(TDI) TDI

Datum: 1.10.19

Schválil: Jana Kubíková, DiS Podpis: 
(INVESTOR) technik investičního oboru
město České Budějovice

Datum: 1.10.19

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI




GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
		ZL 021 A	Vícepráce: Úprava položek				2 000,00
154	K	59590736R	Deska sádrokartonová protipožární tl. 10 mm záměna cementotřískové desky za požární SDK	m2	10,000	200,00	2 000,00
		ZL 021 A	Celkem				2 000,00



Změnový list č. 21 B

Projekt: **Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice**Název: **Úprava položek - méněpráce**Předkládá: **Metrostav a.s.**Investor: **statutární město České Budějovice**Datum vystavení: Požadováno kým: Podklady: **Zdůvodnění změny:**

Narovnání výkazu výměr




Technický popis změny:

Změnový list řeší odpočet nedodávané demontovatelné záslepky odrazového prahu, slevu za změnu třídy betonu betonové mazaniny ve spojovacím krčku, odpočet obkladu ocelových konstrukcí cementotřískovou deskou a slevu na záměnu materiálu zateplených vrat do garáže z hliníku na ocel.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO – 18 801,60 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis: 
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.Datum: 1.10.19Ověřil: Bc. Tomáš Baloun Podpis: 
(TDI) TDIDatum: 1.10.19Schválil: Jana Kubíková, DiS Podpis: 
(INVESTOR) technik investičního oboru
město České BudějoviceDatum: 1.10.19

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI



GDS

Ostatní

Atletický koridor a školní hřiště, ZŠ O. Nedbala, České Budějovice

č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem
ZL 021 B			Měněpráce: Úprava položek				-18 801,60
301a	K	5531.RA	Demontovatelná záslepka	kus	-1,000	2000,00	-2 000,00
15a	K	611312621RT7	Mazanina betonová tl. 5-8 cm, beton C16/20 s vyztužením KARI sítí KY80 záměna betonu C20/25 za C16/20	m2	-4,200	140,00	-588,00
154	K	59590736R	Deska cementotřísková základní tl. 10 mm	m2	-31,068	200,00	-6 213,60
299	K	55344630R1	Vrata ocelová 240 x 210 s rámem zateplená dle PD navržena hliníková	kus	-1,000	10000,00	-10 000,00
ZL 021 B			Celkem				-18 801,60

