

## Změnový list č. 7

Název a evidenční číslo Stavby:	<b>Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 004 + 004.a</b> Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>SO 000 Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>SO 000</b>	<b>7.</b>
Název ZBV:	<b>Variace č.7 - transfer mlžů z plavebního kanálu</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
 Zhotovitel: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 23.5.2019
- Záznam z postupové schůzky č.6 ze dne 14.5.2019
- Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a předložení návrhu Variace dne 24. 5. 2019
- ocenění Variace č. 7 ze dne 26.8.2019

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna se týká zajištění transferu mlžů z plavebního kanálu **stavby 004 - Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou**

Na základě požadavku z postupové schůzky č.6 bodu č. 06.1 ze dne 14.5.2019 musel zhotovitel zajistit sběr chráněných živočichů při vypouštění plavebního kanálu, jinak by došlo k jejich úhynu.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (5) nezbytné práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,-</b>	<b>64.350,-</b>	<b>64.350,-</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>Nemá vliv</b>	

**Charakter změny (nehodící škrtněte)**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
----------	----------	----------	----------	----------

**Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:**

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 3.12.2019 Podpis [redacted]

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy objednatele jméno [redacted] datum 4.12.2019 Podpis [redacted]

Supervize jméno xxxxxxxxxxxxxx datum Podpis [redacted]

Správce stavby jméno [redacted] datum 3.12.2019 Podpis [redacted]

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	číslo smlouvy : S/ŘVC/115/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH	Předpokládaný termín úhrady	31.12.2019
	týká se bodu :	<b>77.863,50</b>	Dle skutečně provedených prací	ANO
<b>Objednatel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 12. 2019	Podpis
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno	[REDACTED]	datum 4. 12. 2019	Podpis
<b>příkazce operace:</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 12. 2019	Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno	[REDACTED]	datum 4. 12. 2019	Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 12. 2019	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	[REDACTED]	datum 3. 12. 2019	Podpis
				Číslo paré:

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,  
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

**Společnost TÝM/INFRAM**  
**Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál**  
**Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje**

TÝM/INFRAM  
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

23.5.2019

**Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:  
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018  
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

**Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a  
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP**

**Předmět: Most 004 + 004a, transfer mlžů z plavebního kanálu**

Objekt: SO 222 Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou - km 6,75

Na základě požadavku z postupové schůzky č.6 bodu č. 06.1 ze dne 14.5.2019 má zhotovitel zajistit sběr chráněných živočichů při vypouštění plavebního kanálu.

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku 1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

- a) Zevrubný popis návrhu variace  
Zhotovitel tento sběr živočichů zajistí u odborné firmy AVES.
- b) Časový dopad  
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.
- c) Ocenění Variace  
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny:  
Záporné změny:  
Saldo:

**STRABAG**


**EUROVIA**  
VINCI

**OK**  
TŘEBESTOVICE

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,  
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem



*ředitel stavby*

*Přílohy:*

1. Záznam z postupové schůzky č.6 ze dne 14.5.2019

# POSTUPOVÁ SCHŮZKA – PS 06

## ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ – I. ETAPA: VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL

**Datum a čas jednání:** 14.5.2019 od 9:00 hod.

**Místo:** zasedací místnost v areálu společnosti Bratři Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec nad Vltavou

**Přítomni:** viz prezenční listina

### HLAVNÍ AGENDY:

- 00. Prohlídka staveniště
- 05. Připomínky k minulému jednání
- 10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)
- 20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)
- 30. Agenda Správce stavby (SpSt)
- 40. Agenda Objednatele (ŘVC ČR)
- 50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)
- 90. Různé

### LEGENDA:

Číslování: 01.1 — 01 = číslo PS

.1 = pořadí problému v rámci Agendy

xxx = Nové body, kontrola/revize předešlých

xxx = Vypuštěné body

Číslování bodů je samostatné pro jednotlivé agendy 00-90.

Investor / Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,  
Konzultant / Správce stavby: „TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál“



ŘEDITELSTVÍ  
VODNÍCH  
CEST  
ČR



TÝM DOPRAVNÍHO  
INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

*Benetton Group of Companies*


**00. Prohlídka staveniště**

Prohlídka staveniště proběhla individuálně před zahájením postupové schůzky.


**05. Připomínky k minulému jednání**

Bez připomínek.


**10. Agenda Projektanta (SUDOP PRAHA a.s., PONTEX s.r.o.)**






**20. Agenda Zhotovitele (Sdružení STRABAG RAIL a.s., EUROVIA CS, a.s. a OK Třebestovice, a.s.)**

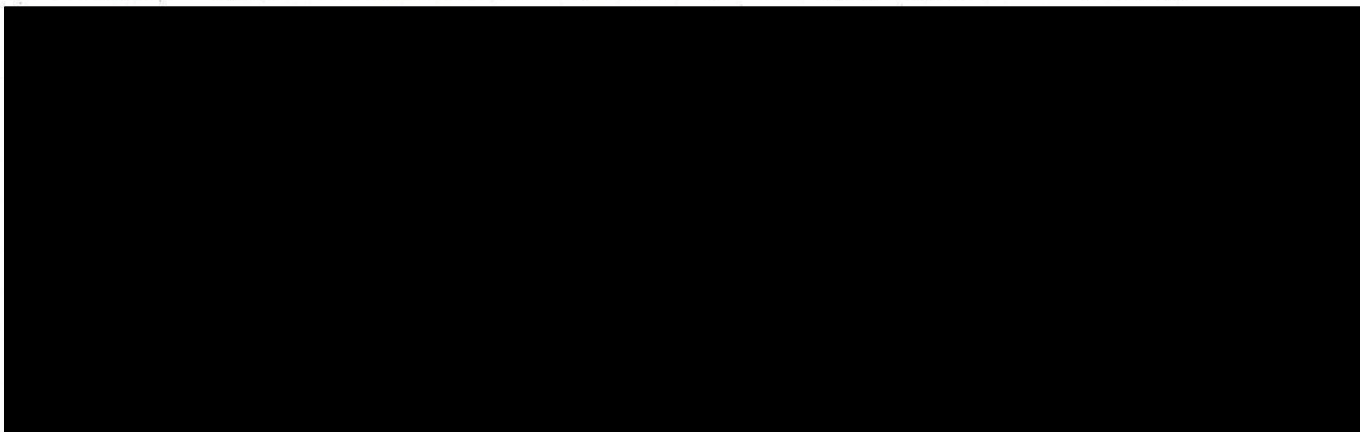

**20-3: Realizace – postup výstavby**



**20-4: Publicita**






06.1. Zhotovitel zajistí sběr chráněných živočichů při vypouštění kanálu. Doporučeno bylo, aby zhotovitel se spojil a uzavřel smlouvu s f. AVES – zuáchranná stanice Kladno. Tato firma má se sběrem živočichů v kanále již zkušenosti.

Úkol pro zhotovitele . při příští postupové schůzce poskytně zhotovitel informace.

**30. Agenda Správce stavby (TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál)**

30-1: Realizační / správní záležitosti



**40. Agenda Objednatele (Ředitelství vodních cest ČR)**




**50. Agenda Správce vodního toku (PVL s.p.)**

Bez připomínek.



**90. Různé**



Zapsal : Ing. Petr Mika

Praha 15.5.2019

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě  
I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B,

## Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek a předložení návrhu Variace

**Předmět jednání:** Stavba 004+004a, transfer mlžů z plavebního kanálu

**Související korespondence:**

- Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 23.5.2019
- Záznam z postupové schůzky č.6 ze dne 14.5.2019

**Datum jednání:** 24.5.2019

**Místo jednání:** Lužec nad Vltavou

**Účastníci jednání:**

**Správce stavby:** Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál  
vedoucí týmu  
specialista

**Zhotovitel:** Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě  
I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,  
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS –  
OK Třebestovice  
ředitel stavby  
specialista

Na základě předloženého oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek, předaného Zhotovitelem Správci stavby dne 23.5.2019 proběhlo na stavbě jednání nad dalším postupem. Správce stavby ověřil sdělené nepředvídatelné fyzické podmínky a souhlasí s provedením transferu mlžů z plavebního kanálu dle návrhu zhotovitele formou Variace č.7 dle Pod-článku 13.1 OP/ZP. Jedná se o doplnění SO 000 Vedlejší a ostatní náklady.

Dle názoru Správce stavby se však nejedná o nepředvídatelné fyzické podmínky, ale jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjadřuje a požaduje, aby Zhotovitel předložil podrobné ocenění variace.

Vzhledem k tomu, že s pozdějším provedením výše zmíněné Variace by došlo k úhynu mlžů, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č.6 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele

Za Správce stavby

**STRABAG**

**EUROVIA**  
VINCI

**IOK**  
TŘEBESTOVICE

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,  
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vyřizuje:

**Společnost TÝM/INFRAM**  
**Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál**  
**Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje**

TÝM/INFRAM

Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

26.8.2019

**Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:  
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-006-JBAB

**Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a  
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP**

**Předmět: Most 004 + 004a, transfer mlžů z plavebního kanálu**

**Věc: Ocenění – transferu živočichů z plavebního kanálu**

Vážený Správce stavby,

posílám Vám na základě dodání faktury od společnosti AVES, která zajišťovala transfer mlžů z plavebního kanálu, ocenění Variace.

c) Ocenění Variace

- transfer mlžů  
společnost AVES (faktura č.: 14/2019)
- přírážky dle článku 12.3 OP/ZP dle SOD
  - zisk 5%
  - správní režie 5%

**CELKEM**

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

přílohy:

- faktura č. 14/2019 společnosti AVES
