

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

jejímž jménem jedná

ředitel Závodu Brno

č. Symbasis 03PT-002479

ISPROFIN 500 155 0003

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

Archeologické centrum Olomouc, p.o.

se sídlem: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc

IČO: 75008271

DIČ: CZ75008271

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr.

jejímž jménem jedná

ředitel

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-002479

(dále jen „**Dodatek č. 4**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 12. 2016 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-002479 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s ním spojených odborných archeologických prací ze strany Zhotovitele při akci „*D1 - 0136 Říkovice - Přerov, záchranný archeologický výzkum*“, a to v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**zákon o památkové péči**“), spočívajícího v provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „**ZAV**“) v lokalitách 1.3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3 a Sídlní areál A, specifikovaných v dokumentu „*Územní archeologická studie pro stavbu dálnice D1 (stavba 0136 Říkovice – Přerov)*“, a v provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu na ostatních

- dotčených plochách připravované stavby úseku dálnice D1 0136 Říkovice – Přerov (dále jen „*Stavba*“).
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, jež je ve Věstníku veřejných zakázek vedeno pod evidenčním číslem 632019.
 - 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.05.2018 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, na základě něhož došlo k navýšení ceny předmětu plnění Smlouvy a prodloužení termínů plnění Smlouvy z důvodu výskytu archeologických nálezů významného charakteru, které svým objemem i lokací významným způsobem překračovaly předpokládaný rozsah nálezů specifikovaný v Územní archeologické studii pro stavbu dálnice D1 (stavba 0136 Říkovice – Přerov).
 - 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 06.08.2018 uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě, na základě něhož došlo k úpravě odst. 7.1 Smlouvy.
 - 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace terénní části záchranného archeologického výzkumu, prováděného v lokalitách plánované a připravované trasy úseku dálnice D1 0136 v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem o památkové péči, došlo oproti stavu, za nějž byly uzavírány Dodatky č. 2 a 3 ke Smlouvě, k podstatnému a nepředvídatelnému navýšení předpokládaného počtu zkoumaných archeologických situací (nálezů) a složitosti a významu záchranného archeologického výzkumu.
 - 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že za účelem objektivního a nezávislého posouzení rozsahu dodatečných archeologických nálezů nad rámec očekávaného množství archeologických nálezů v jednotlivých zkoumaných vrstvách, jež byl podkladem pro uzavření Dodatků č. 2 a 3 ke Smlouvě, bylo zpracováno Expertní stanovisko Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., k dané problematice, které objektivní skutečnost, spočívající v podstatném a nepředvídatelném navýšení předpokládaného počtu zkoumaných archeologických situací (nálezů) a složitosti a významu záchranného archeologického výzkumu oproti stavu, za nějž byly uzavírány Dodatky č. 2 a 3 ke Smlouvě, potvrzuje.
 - 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že v případě, kdy nedojde k zasmluvnění provádění dodatečného ZAV, specifikovaného v předchozích bodech tohoto článku do ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy, bude Zhotovitel povinen ukončit práce v aktuálním stavu rozpracovanosti, uvést zkoumaná místa do stavu dle příslušných ustanovení Smlouvy a opustit předané staveniště. Současně ale Zhotoviteli nevznikne povinnost na lokalitu „Sídelní areál A“ vydat Prohlášení Zhotovitele, určené pro Objednatele a příslušné orgány státní správy (stavební úřad, ústav památkové péče, příp. další), obsahující konstatování Zhotovitele, že terénní výzkumné práce včetně záchranného archeologického výzkumu formou dohledu jsou z hlediska zájmů památkové péče a archeologie skončeny, a že pokračování stavebních prací podle projektu z těchto hledisek nic nebrání, ve smyslu článku 1.1.4 Smlouvy.
 - 1.8. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že v daném případě by došlo k výraznému časovému prodloužení s realizací dodatečného ZAV, jež by mělo prokazatelný vliv na posunutí možné doby zahájení strategické stavby dotčeného úseku dálnice D1 0136.
 - 1.9. Smluvní strany, při respektování svých povinností dodržovat zásady, resp. principy 3E, zakotvené především v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, shodně konstatují, že k zajištění minimalizace dodatečných nákladů a doby nezbytné pro realizaci dodatečného ZAV uzavírají v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek, jež je plně v souladu s již uzavřenou Smlouvou.

Článek 2.

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na žádost Zhotovitele o navýšení objemu prací a prodloužení doby plnění dohody na změně článku 3.2 Smlouvy, jež nově zní:

3.2 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat Objednateli v následujících termínech:

3.2.1. **A) terénní část záchranného archeologického výzkumu do 11 měsíců od zahájení prací na terénní části záchranného archeologického výzkumu v části A (červené plochy) dle Přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 4, přičemž:**

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na terénní části záchranného archeologického výzkumu v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 do pěti (5) pracovních dnů od obdržení pokynu k zahájení prací od Objednatele, přičemž Objednatel může takový pokyn udělit až po písemném potvrzení Zhotovitele o převzetí celého vymezeného prostoru části A, na němž mají být činnosti vykonávány;
- O předání a převzetí vymezeného prostoru bude sepsán předávací protokol. K převzetí vymezeného prostoru je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele v okamžiku dokončeného skrytí nadložních vrstev půdy (ochranná vrstva a deponovaná zemina) na plochách prováděného ZAV vyznačených v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4, které umožňuje následné zahájení prací Zhotovitele na této terénní části záchranného archeologického výzkumu.

B) terénní část záchranného archeologického výzkumu do 8 měsíců od zahájení prací na terénní části záchranného archeologického výzkumu v části B (zelené plochy) dle Přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 4, přičemž:

- Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4 předložit Objednateli požadavek na časový harmonogram provádění skrytí nadložních vrstev půdy (ornice, podorniční vrstvy) Objednatelem na plochách vyznačených v části B (zelené plochy) dle Přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 4, a to s ohledem na části prostoru v části B (zelené plochy) dle Přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 4, u nichž nebylo dosud skrytí nadložních vrstev provedeno, tak, aby byly dodrženy lhůty pro dokončení a předání Díla stanovené v tomto článku Dodatku č. 4;
- Objednatel je povinen zajistit skrytí nadložních vrstev půdy (ornice, podorniční vrstvy) dle časového harmonogramu skrytí nadložních vrstev půdy schváleného oběma smluvními stranami. Objednatel je povinen bezodkladně informovat Zhotovitele o dokončení skrytí půdy u každého vymezeného prostoru této části a vyzvat ho k převzetí takového vymezeného prostoru.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na terénní části ZAV v příslušném prostoru části B (zelené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 do pěti (5) pracovních dnů od obdržení pokynu k zahájení prací v tomto prostoru od Objednatele, přičemž Objednatel může takový pokyn udělit až po písemném potvrzení Zhotovitele o připravenosti vymezeného prostoru části B, na němž mají být činnosti vykonávány, k provádění terénní části ZAV;
- O předání a převzetí vymezeného prostoru bude sepsán předávací protokol, a to pro každý takový prostor zvlášť.

- 3.2.2. záchranný archeologický výzkum formou dohledu ke dni dokončení zemních prací na území dotčeném Stavbou.
- 3.2.3. **zpracování Prohlášení** Zhotovitele do 10 dnů od ukončení **terénní části** ZAV u obou částí dle článku 3.2.1. a 3.2.2. tohoto Dodatku č. 4 nebo od ukončení ZAV formou dohledu, a to podle toho co nastane později.
- 3.2.4. **zpracování ZAV, předání nálezové zprávy** do 2 let od dokončení terénní části ZAV.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na žádost Zhotovitele o navýšení objemu prací a prodloužení doby plnění dohodly aplikací článku 7.2 Smlouvy na změně článku 7.1 Smlouvy, jenž nově zní:
- 7.1 Cena Díla je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených níže, vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem dle odst. 8.3. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění.

Profese	předpokládaný počet hodin celkem	hodinová sazba v Kč bez DPH	Celkem bez DPH
Archeolog			
Vedoucí technik			
Dokumentátor			
Konzervátor			
Terénní pracovník			
Terénní pracovník			
Terénní práce celkem bez DPH			47 004 450,00 Kč

Ostatní venkovní činnosti			
	Plocha ha	Hodinová sazba v Kč bez DPH	Celkem bez DPH
ZAVDo- výzkum formou dohledu na zbytku stavby			
Terénní práce celkem bez DPH			240 000,00

Laboratorní práce a zpracování nálezové zprávy			
Profese	Počet předpokládaných hodin	Hodinová sazba v Kč bez DPH	Celkem bez DPH
Archeolog			
Dokumentátor			
Konzervátor			

Laboratorní práce celkem bez DPH		9 558 000,00
----------------------------------	--	--------------

Rekapitulace	
Terénní část ZAV celkem bez DPH	47 004 450,00Kč
Ostatní venkovní činnosti bez DPH	240 000,00Kč
Laboratorní práce a zpracování náleзовé zprávy bez DPH	9 558 000,00Kč
Celkem bez DPH	56 802 450,00 Kč
DPH 21%	11 928 514,50 Kč
Celkem vč. DPH	68 730 964,50 Kč

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na žádost Zhotovitele o navýšení objemu prací a prodloužení doby plnění dohodly na speciálních pravidlech pro úhradu finančních prostředků, o něž byla navýšena položka „Terénní část ZAV celkem bez DPH“ na základě Dodatku č. 4 (oproti výši této položky stanovené v Dodatku č. 2 ke Smlouvě) (dále jen „*Navýšení ceny*“), které zní takto:

- částka připadající na dokončení terénní části ZAV v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 činí 8 166 400,- Kč bez DPH z Navýšení ceny (dále jen „*Navýšení ceny pro část A*“);
- částka připadající na dokončení terénní části ZAV v části B (zelené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 činí 4 593 600,- Kč bez DPH z Navýšení ceny (dále jen „*Navýšení ceny pro část B*“);
- 30 % finančních prostředků z Navýšení ceny pro část A bude Zhotoviteli uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve tehdy, kdy bude ukončena terénní část ZAV v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 nejméně na 30 % zbývajících ploch prováděného ZAV v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4;
- zbývajících 70 % finančních prostředků z Navýšení ceny pro část A bude Zhotoviteli uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po kompletním dokončení terénní části ZAV v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4;
- 30 % finančních prostředků z Navýšení ceny pro část B bude Zhotoviteli uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve tehdy, kdy bude ukončena terénní část záchranného archeologického výzkumu v části B (zelené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 nejméně na 30 % zbývajících ploch prováděného záchranného archeologického výzkumu v části B (zelené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4;
- zbývajících 70 % finančních prostředků z Navýšení ceny pro část B bude Zhotoviteli uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po kompletním dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu v části B (zelené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4;
- faktury vystavené dle tohoto článku Smlouvy musí být vystaveny v souladu s článkem 8.4 Smlouvy.

2.4. Ostatní finanční prostředky za provádění záchranného archeologického výzkumu budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že navýšení finančních prostředků provedené na základě Dodatku č. 4 je dostatečné pro dokončení ZAV a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele pro dokončení ZAV.
- 2.6. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že ukáže-li se po uzavření tohoto Dodatku č.4, že finanční prostředky ani po jejich navýšení tímto Dodatkem č. 4 nejsou dostatečné k dokončení ZAV, je tato skutečnost rizikem Zhotovitele a jde plně k jeho tíži a na jeho účet, přičemž sjednané termíny plnění zůstávají zachovány.
- 2.7. Zhotovitel současně bere na vědomí, že prodloužení doby relizace Díla bude vyžadovat prodloužení bankovní záruky za řádné provedení Díla v souladu s článkem 10.4 Smlouvy.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 4 se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Tento Dodatek č. 4 je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Zbývající plocha terénní části záchranného archeologického výzkumu

V Brně dne 30-12-2019


V Olomouci dne 17.12.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Archeologické centrum Olomouc, p.o.


ředitel Závodu Brno

ředitel

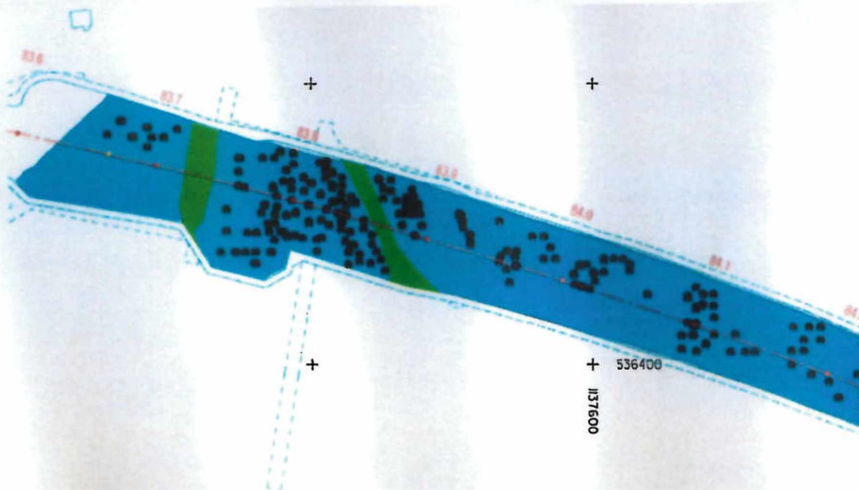

LEGENDA:

- Zásyp jam, rýh, sond, písků
- Prozkoumané plochy - zpětně zahrnuté zeminou
- Nezkoumané plochy
- Skryté nezkoumané plochy
- Osa dálnice
- Trvalý zábor staveb, dočasný zábor staveb
- Obvod digitálního modelu terénu - zaměřená lokalita



GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tr. Kosmonautů 843/88, 779 00 Olomouc
zapsána u KS v Olomouci, oddíl C, v.č. 5555

OVĚŘIL
PŘEDNĚ OPRAVNĚNÝ ZEMĚMĚŘICKÝ INŽENÝR

odštěstí a přesnosti opoví
přímě přeláda a posiláda
samě danodutja s celještěm

28/2019
datum 4.4.2019

Zaměřil:				
Vyhotovil:				
Kontroloval:				
Kraj: Olomoucký	Obec: Přerov	K. úz: Předmostí, Dluhonice	Čís. zakázky	164/2018-0006
Investor:	Raděstevská silnice a dálnice ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, MO 00		Datum	03/2019
Akce:	DIO 156 Rikovice Přerov - ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM		Měřítko	1:4 000
DODATEK č. 4/2019			Souř. systém	S-JTSK
			Výškový systém	Bov
			Formát	A3
Název přílohy:	PŘÍLOHA č. 1 Neprozkoumané a prozkoumané plochy		Čís. soupravy	Čís. přílohy

