

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	46 490 381,53
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	46 910 360,05
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,90%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 15, odst. 2), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	419 978,52
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,90%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 947 114,46

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,90%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	419 978,52
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 245 190,77

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 227 000 Kč	0,00
14=149227000-37		149 227 000

-40=(19/1)*100						Bledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (2), písm. b)						0,00%											
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 227 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+ 37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(36/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa; S-031	0,00	419 978,52	419 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	419 978,52	0,90%	419 978,52	419 978,52	0,00	0,00%
0.1	1	Sáňice II/237 – extravilán – I. etapa / čističní příkopů strojů	0,00	419 978,52	419 978,52			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	419 978,52	0,00%	419 978,52	419 978,52		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby a registrační číslo projektu:	II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa S-0317/DOP/2019
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/237 – extravilán – I. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO120.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO včetně změn	5	
08 Zápis z KD č. 03 (25.7.2019)	2	
09 Zápis z KD č.05 (8.8.2019)	2	
10 Stanovisko AD	1	
11 Stanovisko TDI	1	
12 Oznámení Zhotovitele o změně	1	
13 Přehled vážných lístků	3	
14 Oznámení o změně statutárních org.	1	
Počet listů celkem	16	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/237 N. Strašecí - Mšec, Rekonstrukce - I. etapa

Objekt: 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: SO 120.1 - Silnice II/237 - extravilán - I. etapa

Místo: Nové Strašecí

Datum:

Zadavatel: Středočeský kraj
Uchazeč: HERKUL a.s.

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SoD	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 374 274,47		419 978,52		42 794 252,99
D	1	Zemní práce					11 825 351,46		0,00		11 825 351,46
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	13,500	53,82	726,57	0	0,00	13,500	726,57
2	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	5 000,000	32,50	162 500,00	0	0,00	5 000,000	162 500,00
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	6,000	183,30	1 099,80	0	0,00	6,000	1 099,80
4	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	10,000	330,20	3 302,00	0	0,00	10,000	3 302,00
5	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	2,000	757,90	1 515,80	0	0,00	2,000	1 515,80
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	374,40	2 246,40	0	0,00	6,000	2 246,40
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	10,000	713,70	7 137,00	0	0,00	10,000	7 137,00
8	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	1 807,00	3 614,00	0	0,00	2,000	3 614,00
9	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	7 533,000	48,88	368 213,04	0	0,00	7 533,000	368 213,04
10	K	113154334	Frézování živého korytl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	9 790,000	106,57	1 043 320,30	0	0,00	9 790,000	1 043 320,30
11	K	113154433	Frézování živého korytl 50 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	23 902,000	53,25	1 272 781,50	0	0,00	23 902,000	1 272 781,50
12	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	71,250	171,60	12 226,50	0	0,00	71,250	12 226,50
13	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	8 196,500	45,50	372 940,75	0	0,00	8 196,500	372 940,75
14	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4 510,525	1,30	5 863,68	0	0,00	4 510,525	5 863,68
15	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,000	195,00	7 410,00	0	0,00	38,000	7 410,00
16	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	19,000	1,30	24,70	0	0,00	19,000	24,70
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,000	32,50	1 235,00	0	0,00	38,000	1 235,00
18	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	30,94	185,64	0	0,00	6,000	185,64
19	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	10,000	166,40	1 664,00	0	0,00	10,000	1 664,00
20	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	2,000	679,90	1 359,80	0	0,00	2,000	1 359,80

Místo:		Nové Strašecí			Datum:						
21	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	470,60	2 823,60	0	0,00	6,000	2 823,60
22	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	10,000	997,10	9 971,00	0	0,00	10,000	9 971,00
23	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	2,000	4 043,00	8 086,00	0	0,00	2,000	8 086,00
24	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	6,000	97,89	587,34	0	0,00	6,000	587,34
25	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	10,000	375,70	3 757,00	0	0,00	10,000	3 757,00
26	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	2,000	864,50	1 729,00	0	0,00	2,000	1 729,00
27	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	13,500	70,59	952,97	0	0,00	13,500	952,97
28	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	7 621,750	118,30	901 653,03	0	0,00	7 621,750	901 653,03
29	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 184,000	32,50	38 480,00	0	0,00	1 184,000	38 480,00
30	K	171101103	Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	1 184,000	58,50	69 264,00	0	0,00	1 184,000	69 264,00
31	K	171101111	Uložení sypaniny z homin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(đ) 0,9 v aktivní zóně	m3	4 947,000	58,50	289 399,50	0	0,00	4 947,000	289 399,50
32	M	583441700	<i>vhodný násypový/zásypový materiál pro aktivní zónu</i>	t	10 388,700	299,00	3 106 221,30	0	0,00	10 388,700	3 106 221,30
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7 621,750	7,80	59 449,65	0	0,00	7 621,750	59 449,65
34	K	171201201-1.1	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	1 184,000	7,80	9 235,20	0	0,00	1 184,000	9 235,20
35	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15 243,500	130,00	1 981 655,00	0	0,00	15 243,500	1 981 655,00
36	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	6,000	106,47	638,82	0	0,00	6,000	638,82
37	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	10,000	226,20	2 262,00	0	0,00	10,000	2 262,00
38	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	2,000	967,20	1 934,40	0	0,00	2,000	1 934,40
39	K	181301112	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5 298,667	55,90	296 195,49	0	0,00	5 298,667	296 195,49
40	M	103641010	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	1 589,600	681,20	1 082 835,52	0	0,00	1 589,600	1 082 835,52
41	K	181411131.1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně	m2	5 298,667	99,26	525 945,69	0	0,00	5 298,667	525 945,69
42	M	005724100	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	158,960	100,10	15 911,90	0	0,00	158,960	15 911,90
43	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	14 134,286	10,40	146 996,57	0	0,00	14 134,286	146 996,57
D 2 Zakládání							215 589,78	0,00		215 589,78	
44	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	190,000	289,90	55 081,00	0	0,00	190,000	55 081,00
45	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	342,000	21,06	7 202,52	0	0,00	342,000	7 202,52
46	M	693110050.1	<i>filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min. 2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s</i>	m2	393,300	19,89	7 822,74	0	0,00	393,300	7 822,74
47	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30 - XF4	m3	38,720	3 666,00	141 947,52	0	0,00	38,720	141 947,52
48	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,000	3 536,00	3 536,00	0	0,00	1,000	3 536,00
D 4 Vodorovné konstrukce							4 458,48	0,00		4 458,48	

Místo:		Nové Strašecí	Datum:								
49	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	6,000	256,10	1 536,60	0	0,00	6,000	1 536,60
50	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,600	1 060,80	636,48	0	0,00	0,600	636,48
51	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,600	3 809,00	2 285,40	0	0,00	0,600	2 285,40
D 5		Komunikace pozemní					26 806 005,45	0,00		26 806 005,45	
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10 311,840	105,90	1 092 023,86	0	0,00	10 311,840	1 092 023,86
53	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	8 725,725	110,53	964 454,38	0	0,00	8 725,725	964 454,38
54	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	23,750	129,06	3 065,18	0	0,00	23,750	3 065,18
55	K	567521151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy přes 10000m2	m2	23 902,000	24,79	592 530,58	0	0,00	23 902,000	592 530,58
56	K	567522151	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 160 mm přes 10000 m2	m2	23 902,000	39,00	932 178,00	0	0,00	23 902,000	932 178,00
57	M	589811000-1	asfaltové pojivo + cement + kamenivo pro recyklaci podkladu za studena tl. 160 mm	m2	23 902,000	245,60	5 870 331,20	0	0,00	23 902,000	5 870 331,20
58	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	5 190,000	81,38	422 362,20	0	0,00	5 190,000	422 362,20
59	K	572531122-1	Oprava podélných a příčných trhlin, vyčištění, základní nátěr a zalití polymerem modifikovanou asfaltovou zálivkou, překrytí reflexních trhlin geokompozitem,	m	293,700	286,00	83 998,20	0	0,00	293,700	83 998,20
60	K	573231107-1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	33 692,000	9,17	308 955,64	0	0,00	33 692,000	308 955,64
61	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	33 692,000	12,35	416 096,20	0	0,00	33 692,000	416 096,20
62	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33 692,000	195,00	6 569 940,00	0	0,00	33 692,000	6 569 940,00
63	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33 692,000	280,54	9 451 953,68	0	0,00	33 692,000	9 451 953,68
64	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	71,250	725,40	51 684,75	0	0,00	71,250	51 684,75
65	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	14,113	2 860,00	40 363,18	0	0,00	14,113	40 363,18
66	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu C20/25 XF3	m2	6,000	1 011,40	6 068,40	0	0,00	6,000	6 068,40
D 8		Trubní vedení					5 993,00	0,00		5 993,00	
67	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	0	0,00	1,000	1 170,00
68	M	286619330	poklop šachtový litinový 600 B125	kus	1,000	4 823,00	4 823,00	0	0,00	1,000	4 823,00
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					3 200 445,46	71 791,20		3 272 236,66	
69	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	64,000	2 145,00	137 280,00	0	0,00	64,000	137 280,00
70	K	911331111-2	Výšková rektifikace ocelového jednostranného zádržnosti N2 typ JSNH4/N2	m	360,000	650,00	234 000,00	0	0,00	360,000	234 000,00
71	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m	m	175,000	1 716,00	300 300,00	0	0,00	175,000	300 300,00
72	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	4,000	4 680,00	18 720,00	0	0,00	4,000	18 720,00
73	K	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	63,000	3 913,00	246 519,00	0	0,00	63,000	246 519,00
74	K	911381124-1	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky výšky 1,2 m vč. přechodových dílů na ocelové svodidlo	m	176,000	5 115,50	900 328,00	0	0,00	176,000	900 328,00
75	K	913311111	Montáž a demontáž dočasného dopravního kužele reflexního v 600 mm	kus	192,000	8,14	1 562,88	0	0,00	192,000	1 562,88

Místo:		Nové Strašecí		Datum:							
76	K	913311211	Příplatek k dočasnému kuželu reflexnímu v 600 mm za první a ZKD den použití	kus	1 536,000	18,46	28 354,56	0	0,00	1 536,000	28 354,56
77	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	96,000	59,02	5 665,92	0	0,00	96,000	5 665,92
78	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	768,000	18,72	14 376,96	0	0,00	768,000	14 376,96
79	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 n XF3 včetně vyspárování cementovou maltou	m	95,000	221,00	20 995,00	0	0,00	95,000	20 995,00
80	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	95,000	130,00	12 350,00	0	0,00	95,000	12 350,00
81	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	206,000	91,91	18 933,46	0	0,00	206,000	18 933,46
82	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	206,000	77,48	15 960,88	0	0,00	206,000	15 960,88
83	K	919551110-1	Seřiznutí čel propustku do DN 400	kus	5,000	4 550,00	22 750,00	0	0,00	5,000	22 750,00
84	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	15,000	184,60	2 769,00	0	0,00	15,000	2 769,00
85	M	562411110	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 400 mm SN16	m	15,225	874,90	13 320,35	0	0,00	15,225	13 320,35
86	K	919726124-1	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 500 g/m2	m2	16 321,500	53,30	869 935,95	0	0,00	16 321,500	869 935,95
87	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	88,000	188,50	16 588,00	0	0,00	88,000	16 588,00
88	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š do 800 mm	m	100,000	297,70	29 770,00	0	0,00	100,000	29 770,00
89	M	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	305,000	74,10	22 600,50	0	0,00	305,000	22 600,50
90	K	938902152	Čistění příkopů strojně příkopovou frézou š dna přes 400 mm	m	40,000	20,28	811,20	3 540,00	71 791,20	3 580,000	72 602,40
ZBV č.1: 3 540m 8 642m (dle TZ PDPS) - 80m (dle soupisu prací PDPS SO120.1 a SO120.3) - 5 022m (sanace krajnic dle PDPS)											
91	K	938902400-1	Vyčištění horské vpusti strojně tlakovou vodou D do 500 mm	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	0	0,00	2,000	5 200,00
92	K	938902421	Čistění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 50% DN	m	83,350	60,71	5 060,18	0	0,00	83,350	5 060,18
93	K	938902423	Čistění propustků strojně tlakovou vodou D do 1500 mm při tl nánosů do 50% DN	m	44,000	87,23	3 838,12	0	0,00	44,000	3 838,12
94	K	938909311	Čistění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	16 846,000	5,85	98 549,10	0	0,00	16 846,000	98 549,10
95	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,153	3 464,73	35 177,40	0	0,00	10,153	35 177,40
96	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	270,000	427,70	115 479,00	0	0,00	270,000	115 479,00
97	K	977151118-1	Vrt do hloubky 200 mm do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	0	0,00	1,000	3 250,00
D 997 Přesun sutě							269 938,50	223 197,00		493 135,50	
98	K	997013811-1	Likvidace biologického odpadu	t	406,000	585,00	237 510,00	0	0,00	406,000	237 510,00
99	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	55,560	325,00	18 057,00	686,76	223 197,00	742,320	241 254,00
ZBV č.1: 3 540 x 0,194 (měr. hmotnost)											
100	K	997221815.1	Poplatek za uložení betonového a ostatního odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,220	325,00	14 371,50	0	0,00	44,220	14 371,50
D 998 Přesun hmot							46 492,34	0,00		46 492,34	
101	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35 763,339	1,30	46 492,34	0	0,00	35 763,339	46 492,34

Místo:			Nové Strašecí			Datum:							
N			Nové položky			0,00			124 990,32		124 990,32		
102	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)			t	0,000	182,00	0,00	686,76	124 990,32	686,760	124 990,32
ZBV č.1: 3.540 x 0,194 (měr. hmotnost) Cena převzata z SO120.3 = ÚRS 2017 02													

AKCE: II/237 N.Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. Etapa

KONTROLNÍ DEN č. 3

Datum: 25.7.2019

Místo: Nové Strašecí

Přítomni: dle podpisů v SD a prezenční listiny

1. Práce provedené ze období 18.7.-25.7.2019
 - Pokračování odkopů krajnic
 - Sanace krajů vozovky v úseku cca 16,9 – 17,4km PS
2. Práce předpokládané na další období od 25.7. do 1.8.2019:
 - Odkopy krajnic
 - Sanace krajů vozovky v dalších úsecích
3. Zhotovitel provedl další 4 sondy, které potvrdily nesoulad ve skladbě stáv. Vozovky oproti předpokladu v PDPS (RDS). Tato skutečnost bude řešena s AD, projektantem a objednatelem (viz zápis zhotovitele v SD z jednání konaného na stavbě dne 24.7.2019 za účasti AD)
4. Větší množství asfaltu na krajích stáv. Vozovky oproti PDPS (RDS) bylo zhotovitelem geodeticky zaměřeno, zdokumentováno (fotodokumentace zhotovitele i TDI) a bude řešeno formou ZBV s objednatelem
5. Na pláni sanované krajnice v km cca 17,4 PS byly dne 24.7.2019 provedeny zkoušky únosnosti pláně za účasti TDI (viz zápis geotechnika zhotovitele – SD list č. 192509). Výsledky zkoušek jsou nevyhovující. Zhotovitel navrhne výměnu materiálu aktivní zóny v souladu se schválenou RDS a ČSN 736133
6. Zhotovitel upozorňuje na chybu v soupisu prací schválené RDS, a to v položce č. 938 902152-čištění příkopů strojně. Neodpovídá množství v TZ – PDPS tab. Str. 7 a 8.
Zhotovitel bude toto řešit prostřednictvím TDS s AD a objednatelem formou ZBV

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 1.8.2019 od 8,30 hod. Sraz na stavbě.

Zapsala Vladislava Smetanová - TDI




Prezenční listina

Název stavby: **II/237 N.Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I.etapa**

Datum: **25.4.2019**

Kontrolní den stavby č: **3**

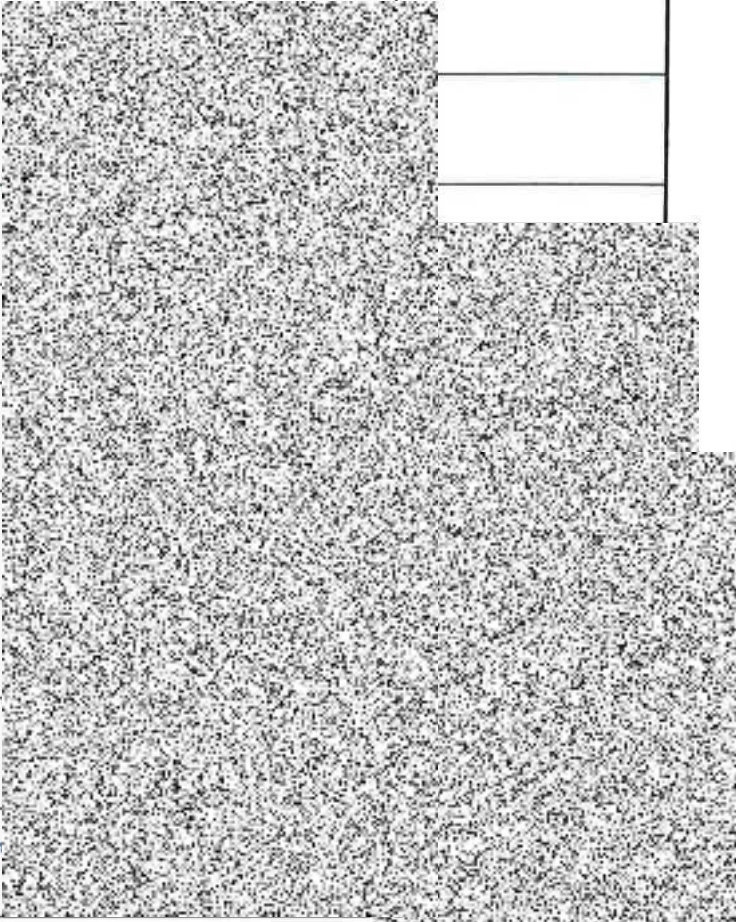Organizace	Jméno, příjmení	Telefon e-mail	Podpis
KSÚS SK	Martin Staněk		
SHP TS	Michal Pietsch		
PROSAFETY	Jan Pošvic		
SHP TS	Vladislava Smetanová		
HERKUL	Václav Roth		
HERKUL	Roman Král		
HERKUL	Jan Galbavý		
KSÚS	Zdeněk Englický		
<i>KSÚS</i>	<i>MARTIN DROBÍK</i>		

AKCE : II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I.etapa

KONTROLNÍ DEN č. 5

DATUM : 8.8.2019


MÍSTO : Nové Strašecí

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD a prezenční listiny

1. Práce provedené za období od 1.8. do 8.8. 2019 :
 - odkop krajnice
 - sanace krajů vozovky - zásyp
2. Práce předpokládané na další období od 8.8. do 15.8.2019 :
 - odkop krajnice
 - sanace krajů vozovky
3. Recyklace bude provedena dle původního návrhu v PDPS. Zhotovitel předloží ke schválení recepturu. Bude proveden zkušební úsek pro ověření dosažení předepsaných parametrů.
4. Zhotovitel předložil návrh oceněných víceprací na čištění příkopu a odstranění nepředpokládaných vrstev živců v krajnicích. Bude řešeno do příštího KD 16.8.2019.

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 15.8.2019 od 8,30 hod. Sraz na stavbě.

Zapsal Ing. Michal Pietsch





Prezenční listina

Název stavby: II/237 N.Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I.etapa

Datum: 8.8. 2019

Kontrolní den stavby č: 5

Organizace	Jméno, příjmení	Telefon e-mail	Podpis
KSÚS SK	Martin Staněk		
SHP TS	Michal Pietsch		
PROSAFETY	Jan Pošvic		
SHP TS	Vladislava Smetanová		
HERKUL	Václav Roth		
HERKUL	Roman Král		
HERKUL	Jan Galbavý		
KSÚS	Zdeněk Englický		
PROMIKA	Tomáš Roztočil		

HERKUL a.s.
Obrnice 228
435 21 Obrnice

Váš dopis značky/ze dne
180434011/01
27.9.2019

Naše značka
Nostrasdur_do012/19

Vyřizuje
Ctibor

Místo a datum odeslání
Praha, 30.9.2019

Věc: „II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa“ – deficit v rozpočtu na pročištění příkopů u SO 120.1 - stanovisko AD

Na Vaši e-mailovou žádost ze dne 27.9.2019 o sdělení stanoviska k „Oznámení o deficitu v rozpočtu na pročištění příkopů u SO 120.1“ výše uvedené akce, Vám jako Autorský dozor sdělujeme následující stanovisko.

Po prostudování dostupných podkladů Autorský dozor prohlašuje, že bere na vědomí informace obsažené v tomto oznámení a nebude mít námitek proti ZBV, spočívající ve změně příslušné položky v soupisu prací.

S pozdravem

Přílohy: bez příloh

Ing. Jiří Ctibor
Atelier PROMIKA s.r.o.



atelierpromika s.r.o.
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273



Stanovisko TDI k ZBV č.1

Prodloužení úseku strojně pročištěných příkopů u SO 120.1

Stavba:	II/237 Nové Strašecí – Mšec, Rekonstrukce – I.etapa
Místo stavby:	Komunikace II/237 mezi N.Strašecí a Mšecí
Název ZBV č.1 :	Prodloužení úseku strojně pročištěných příkopů u SO 120.1
Objednatel:	Středočeský kraj zastoupený KSÚS Středočeského kraje příspěvkovou organizací
Konzultant:	Sdružení „MORAVA:RS SD+BOZP- Středočeský kraj“ Zastoupené spol.SHP TS, s.r.o.
Zhotovitel:	HERKUL, a.s. Č.p.228, 435 21 Obrnice

Popis ZBV

Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude nutné strojně pročištit delší úsek příkopů, než s jakým bylo počítáno ve výkazu výměr; projednáváno na KD č.3 a KD č.5). V technické zprávě zadávací PDPS byl uveden rozsah pročištění příkopů správně; došlo k opomenutí v soupisu prací zadávací PD. Zhotovitel provedl na základě upřesnění objednatelem celý rozsah prací dle technické části zadávací PDPS.


Stanovisko TDI

Popsané vícepráce vznikly v průběhu realizace díla, PDPS a RDS je neobsahuje a ani nejsou součástí rozpočtu, který je součástí SoD. Provedení prací je nutné k řádnému dokončení díla. Vícepráce jsou oprávněné a nebylo možné je dopředu předpokládat.

S předloženým ZBV č.1 souhlasíme.

V Praze dne 5.10.2019

Vypracoval: Ing. Michal Pietsch, TDI



HP TS s. r. o.

Č. j. 11/2019
 12.10.2019
 Ing. Michal Pietsch
 11.10.2019 12:01

Bc. Martin Staněk
Krajská správa a údržba silnic
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Naše značka: 180434011/01 Vyřizuje: Jan Galbavý Vaše značka: S-0317/DOP/2019

V Obrnicích dne 3.10. 2019


Oznámení o deficitu v rozpočtu na pročištění příkopů u SO120.1

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „**II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa**“, tímto ve smyslu článku 1 odstavce 1.1 smlouvy o dílo č. S-0317/DOP/2019 uzavřené dne 1.3.2019, oznamuje objednateli, že během provádění stavebních prací, byl zjištěn rozpor mezi množstvím metrů strojně čištěných příkopů uvedených v projektové dokumentaci a rozpočtem. Jedná se o rozdíl ve výši 3620m.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.

O návrhu změny bylo jednáno a tato skutečnost je uvedena v zápisu z kontrolního dne č. 3 ze dne 25.7.2019 a č. 5 ze dne 8.8.2019.



Přílohy:
Stanovisko AD
Stanovisko TDS
Zápisy z kontrolních dnů



653/2019

Faktura - daňový doklad č. 19421233

Strana 1

Datum vystavení: 08.10.19

Reference:

Prodávce: České lupkové závody, a. s. Pecínov 1171 27101 Nové Strašecí Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6958 Tel. 313332111 Fax: 313572922 DIČ CZ28423367 IČ 26423367	Zástupce:
Příjemce: HERKUL a.s. Obníc 228 43521 Obníc	Půjčí: HERKUL a.s. Obníc 228 43521 Obníc IČ 25004638 DIČ CZ25004638
Dodací podmínky: - Dopravní podmínky: Železniční vlečka Název stanice	Platební podmínky: 15 dní od vystavení faktury Datum splatnosti 23.10.19 Datum uskutečnění 30.09.19 Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 540529319/0800 v IBAN CZ0608000000000540529319 Kód SWIFT . . GIBACZPX

Převzatý odpad byl využit v zařízení dle níže uvedeného identifikačního kódu.

Číslo	Popis	Měrná Množství jednotka	Země původu	Číslo seznamu	Jednotková cena	Částka
	Fakturuje Vám za převzetí odpadů v souladu se smlouvou z 1.7.2019 v období ZÁŘÍ 2019 Zemina a kámení neuvedené pod č. 17 05 03 kat. č. 17 05 04 CZS01831	1 228,100	t		80,00	98 248,00

Celkem CZK bez DPH	98 248,00
21% DPH	20 632,08
Celkem CZK včetně DPH	118 880,08

Specifikace částky DPH

Identifikátor DPH	DPH %	Základ DPH	Částka DPH
SLUŽBY 21%	21	98 248,00	20 632,08
Celkem		98 248,00	20 632,08

České luptkové závody, s.s.
Pecňov 1171
271 01 Nové Strašecí

ZÁKAZNÍK	ČÍSLO VL	DATUM UH	KZ	KÓD GDPA	NÁZEV ODPAKU	HMOTNOST (T)
HERKUL a.s.	PE19114324	09.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	13,68
HERKUL a.s.	PE19114312	09.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	15,28
HERKUL a.s.	PE19114276	06.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	17,1
HERKUL a.s.	PE19114313	09.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	18,1
HERKUL a.s.	PE19114323	09.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	19,42
HERKUL a.s.	PE19114237	06.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	19,96
HERKUL a.s.	PE19114326	09.09.2019	1AN 8135/1au	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	26,3
HERKUL a.s.	PE19114340	06.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	15,36
HERKUL a.s.	PE19114192	06.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	16,92
HERKUL a.s.	PE19114308	06.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	18,54
HERKUL a.s.	PE19114234	06.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	20,04
HERKUL a.s.	PE19114194	06.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	23,16
HERKUL a.s.	PE19114172	06.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	24,18
HERKUL a.s.	PE19114216	06.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	26,36
HERKUL a.s.	PE19114245	06.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	26,9
HERKUL a.s.	PE19114139	05.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	15,42
HERKUL a.s.	PE19114120	05.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	15,76
HERKUL a.s.	PE19114099	05.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	17,44
HERKUL a.s.	PE19114158	05.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	19,88
HERKUL a.s.	PE19114148	05.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	23,14
HERKUL a.s.	PE19114114	05.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	25,84
HERKUL a.s.	PE19114082	05.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	28,1
HERKUL a.s.	PE19114056	05.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	15,12
HERKUL a.s.	PE19114058	05.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	16,88
HERKUL a.s.	PE19114004	04.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	17,4
HERKUL a.s.	PE19114024	04.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	17,52
HERKUL a.s.	PE19114033	04.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	17,94
HERKUL a.s.	PE19113998	04.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	18,48
HERKUL a.s.	PE19114018	04.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	21,3
HERKUL a.s.	PE19114055	05.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	21,48
HERKUL a.s.	PE19114019	04.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	27,78

České lupkové závody, a.s.

Pecínov 1171

271.01 Nová Strázeň

HERKUL a.s.	PE19113927	04.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	16
HERKUL a.s.	PE19113992	04.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	16,3
HERKUL a.s.	PE19113970	04.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	17,06
HERKUL a.s.	PE19113954	04.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	18
HERKUL a.s.	PE19113939	04.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	18,48
HERKUL a.s.	PE19113968	04.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	18,88
HERKUL a.s.	PE19113952	04.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	19,74
HERKUL a.s.	PE19113933	04.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	22,14
HERKUL a.s.	PE19113995	04.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	27,64
HERKUL a.s.	PE19113928	04.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	28,46
HERKUL a.s.	PE19113948	04.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	28,58
HERKUL a.s.	PE19113964	04.09.2019	9U4 8267/1ap	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	28,62
HERKUL a.s.	PE19114809	13.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	12,06 /
HERKUL a.s.	PE19114797	13.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	16,32 /
HERKUL a.s.	PE19114715	12.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	13,6 /
HERKUL a.s.	PE19114748	12.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	15,72 /
HERKUL a.s.	PE19114750	12.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	21,2 /
HERKUL a.s.	PE19114653	11.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	16,88 /
HERKUL a.s.	PE19114502	10.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	19,12
HERKUL a.s.	PE19114572	11.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	19,42
HERKUL a.s.	PE19114564	11.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	26,08
HERKUL a.s.	PE19114482	10.09.2019	1AN 8135	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	11,2
HERKUL a.s.	PE19114467	10.09.2019	1AN 8135	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	11,78
HERKUL a.s.	PE19114459	10.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	13,8
HERKUL a.s.	PE19114349	09.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	14,4
HERKUL a.s.	PE19114386	09.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	16,08
HERKUL a.s.	PE19114368	09.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	16,4
HERKUL a.s.	PE19114348	09.09.2019	9U1 9208	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	16,44
HERKUL a.s.	PE19114373	08.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	17,72
HERKUL a.s.	PE19114399	09.09.2019	4U5 3416	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	18,88
HERKUL a.s.	PE19114371	08.09.2019	1AN 8135/1au	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	21,6
HERKUL a.s.	PE19114392	08.09.2019	1AN 8135/1au	170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	28,12
						1228,1

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

Na základě usnesení valné hromady společnosti HERKUL a. s. ze dne 18.7.2019 dochází ke změně statutárních orgánů společnosti.

Provedení změn v obchodním rejstříku probíhá podle zákonných lhůt.

V Obřích dne 22.07.2019

.....
Ing. Radek Braum
Předseda představenstva

...
Ing. Václav Kohn
Mistopředseda představenstva

...
Na
Člen představenstva

Příloha: Zápis a usnesení z valné hromady spol. HERKUL a.s. ze dne 18.7.2019

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/237 – extravilán – I. etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 120.1/2

Číslo ZBV:

2

Objednatel:

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-92 474,85	282 129,53	189 654,68

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-92 474,85	282 129,53	189 654,68

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/237 – extravilán – I. etapa		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 120.1/2	Číslo ZBV: 2
Strany smlouvy o dílo č. S-0317/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 01.03.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice			
Přílohy Změnového listu:		Paré č. Příjemce	
1. Krycí list	1	počet listů	1 Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5 Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	
Další doklady	30	počet listů	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:			
Odstranění přebytečné vrstvy asfaltu Během stavby bylo zjištěno, že se pod vrstvou ohumusované krajnice nachází množství AC (doklad č. 11 - Fotodokumentace a doklady 08, 09 a 10 - Zápis z KD č. 2, 3 a 5) . Jedná se pravděpodobně o zbytek z „přebalení“ šifky komunikace během původní realizace. Tyto zbytky musely být vzhledem k charakteru materiálu samostatně odstraněny a uloženy na skládce. Množství materiálu bylo určeno geodetickým zaměřením (doklad č. 12 - Geodetický protokol). Změna byla odsouhlasena TDI (doklad č. 14) a AD (doklad č. 13). Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Z hledis Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-92 474,85	282 129,53	189 654,68	374 604,38
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Roth	datum 28. 01. 2020 podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Ctibor	datum 30. 1. 2020 podpis
Stavební dozor	jméno	Michal Pietsch	datum 31. 1. 20 podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Václav Roth	datum 28. 01. 2020 podpis
	jméno	Ing. Radek Braum	datum 29. 01. 2020 podpis
			Číslo paré: 1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 120.1/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/237 – extravilán – I. etapa	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
42 374 274,47

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	419 978,52	42 794 252,99	419 978,52

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-92 474,85	282 129,53	702 108,05	1,66%


Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-92 474,85	42 983 907,67	609 633,20	1,44%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Václav Roth	28. 01. 2020	Souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jiří Ctibor	30.1. 2020	Souhlasím
Stavební dozor:	Michal Pietsch	31.1. 20	Souhlasím
Zástupce Objednatele:	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA		Souhlasím
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil		Souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jan Fidler, DiS.	17.2.20	Souhlasím



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa Číslo a název SO/PS: SO120.1 Silnice II/237 – extravilán – I. etapa Číslo a název rozpočtu: 8320C II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 2 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	8 196,50	7 893,80	-302,70	45,50	372 940,75	-13 772,85	0,00	359 167,90	-13 772,85	-4%
35	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15 243,50	14 638,10	-605,40	130,00	1 981 655,00	-78 702,00	0,00	1 902 953,00	-78 702,00	-4%
		Nové položky											
102	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,00	712,87	712,87	182,00	0,00	0,00	129 742,16	129 742,16	129 742,16	100%
103	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	0,00	1 190,98	1 190,98	96,30	0,00	0,00	114 691,37	114 691,37	114 691,37	100%
104	113107245	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	0,00	304,00	304,00	124,00	0,00	0,00	37 696,00	37 696,00	37 696,00	100%
		Celkem						2 354 595,75	-92 474,85	282 129,53	2 544 250,43	189 654,68	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Roth

Datum: 28. 01. 2020


Podpis:



Za Objednatele: Michal Pietsch

Datum: 31. 1. 2020

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	46 490 381,53
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	47 100 014,73
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,31%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	-0,20%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	609 633,20
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,31%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 947 114,46

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,81%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,80%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	794 582,90
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 245 190,77

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 227 000 Kč	0,00
14=149227000-37		149 227 000,00

40=(19/1)*100		Předpokládaná limita 16 % při podstatnou změnu před Změny záporné dle § 16, odst. (b), písm. b)		-0,20%	

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby a registrační číslo projektu:	II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/237 – extravilán – I. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO120.1/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací včetně změn	5	
08 Zápis z KD č. 2 (ze dne 18.7.2019)	2	
09 Zápis z KD č. 3 (ze dne 25.7.2019)	2	
10 Zápis z KD č. 5 (ze dne 8.8.2019)	2	
11 Fotodokumentace	2	
12 Geodetický protokol	13	
13 Stanovisko AD	1	
14 Stanovisko TDI	1	
15 Oznámení Zhotovitele o změně	1	
16 Oznámení o změně statutárních org.	1	
Počet listů celkem	30	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/237 N. Strašecí - Mšec, Rekonstrukce - I. etapa

Objekt:

100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 120.1 - Silnice II/237 - extravilán - I. etapa

Místo:

Nové Strašecí

Zadavatel:

Středočeský kraj

Uchazeč:

HERKUL a.s.

Datum:

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] SoD	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 374 274,47		609 633,20		42 983 907,67
D	1	Zemní práce					11 825 351,46		-92 474,85		11 732 876,61
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	13,500	53,82	726,57	0	0,00	13,500	726,57
2	K	111301111	Sejmutí dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	5 000,000	32,50	162 500,00	0	0,00	5 000,000	162 500,00
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	6,000	183,30	1 099,80	0	0,00	6,000	1 099,80
4	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	10,000	330,20	3 302,00	0	0,00	10,000	3 302,00
5	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	2,000	757,90	1 515,80	0	0,00	2,000	1 515,80
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	374,40	2 246,40	0	0,00	6,000	2 246,40
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	10,000	713,70	7 137,00	0	0,00	10,000	7 137,00
8	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	1 807,00	3 614,00	0	0,00	2,000	3 614,00
9	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	7 533,000	48,88	368 213,04	0	0,00	7 533,000	368 213,04
10	K	113154334	Frézování živichého krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	9 790,000	106,57	1 043 320,30	0	0,00	9 790,000	1 043 320,30
11	K	113154433	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	23 902,000	53,25	1 272 781,50	0	0,00	23 902,000	1 272 781,50
12	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 100 m3	m3	71,250	171,60	12 226,50	0	0,00	71,250	12 226,50
13	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	8 196,500	45,50	372 940,75	-302,7	-13 772,85	7 893,800	359 167,90
ZBV č.2: -302,70m3 (výměra stanovená geodetem - doklad č.12)											
14	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v homině tř. 1 až 3	m3	4 510,525	1,30	5 863,68	0	0,00	4 510,525	5 863,68
15	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,000	195,00	7 410,00	0	0,00	38,000	7 410,00
16	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3	m3	19,000	1,30	24,70	0	0,00	19,000	24,70
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,000	32,50	1 235,00	0	0,00	38,000	1 235,00
18	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	30,94	185,64	0	0,00	6,000	185,64
19	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	10,000	166,40	1 664,00	0	0,00	10,000	1 664,00

Místo:		Nové Strašecí				Datum:						
20	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	2,000	679,90	1 359,80	0	0,00	2,000	1 359,80	
21	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	470,60	2 823,60	0	0,00	6,000	2 823,60	
22	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	10,000	997,10	9 971,00	0	0,00	10,000	9 971,00	
23	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	2,000	4 043,00	8 086,00	0	0,00	2,000	8 086,00	
24	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	6,000	97,89	587,34	0	0,00	6,000	587,34	
25	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	10,000	375,70	3 757,00	0	0,00	10,000	3 757,00	
26	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	2,000	864,50	1 729,00	0	0,00	2,000	1 729,00	
27	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	13,500	70,59	952,97	0	0,00	13,500	952,97	
28	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	7 621,750	118,30	901 653,03	0	0,00	7 621,750	901 653,03	
29	K	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 184,000	32,50	38 480,00	0	0,00	1 184,000	38 480,00	
30	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	1 184,000	58,50	69 264,00	0	0,00	1 184,000	69 264,00	
31	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	4 947,000	58,50	289 399,50	0	0,00	4 947,000	289 399,50	
32	M	583441700	vhodný násypový/zásypový materiál pro aktivní zónu	t	10 388,700	299,00	3 106 221,30	0	0,00	10 388,700	3 106 221,30	
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7 621,750	7,80	59 449,65	0	0,00	7 621,750	59 449,65	
34	K	171201201-1.1	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	1 184,000	7,80	9 235,20	0	0,00	1 184,000	9 235,20	
35	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15 243,500	130,00	1 981 655,00	-605,4	-78 702,00	14 638,100	1 902 953,00	
ZBV č.2: -302,7 x 2,0 (měr. hmotnost)												
36	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	6,000	106,47	638,82	0	0,00	6,000	638,82	
37	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	10,000	226,20	2 262,00	0	0,00	10,000	2 262,00	
38	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	2,000	967,20	1 934,40	0	0,00	2,000	1 934,40	
39	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5 298,667	55,90	296 195,49	0	0,00	5 298,667	296 195,49	
40	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1 589,600	681,20	1 082 835,52	0	0,00	1 589,600	1 082 835,52	
41	K	181411131.1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně	m2	5 298,667	99,26	525 945,69	0	0,00	5 298,667	525 945,69	
42	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	158,960	100,10	15 911,90	0	0,00	158,960	15 911,90	
43	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	14 134,286	10,40	146 996,57	0	0,00	14 134,286	146 996,57	
D 2 Zakládání							215 589,78	0,00		215 589,78		
44	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	190,000	289,90	55 081,00	0	0,00	190,000	55 081,00	
45	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	342,000	21,06	7 202,52	0	0,00	342,000	7 202,52	
46	M	693110050.1	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s	m2	393,300	19,89	7 822,74	0	0,00	393,300	7 822,74	
47	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30 - XF4	m3	38,720	3 666,00	141 947,52	0	0,00	38,720	141 947,52	

Místo:		Nové Strašecí			Datum:						
48	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,000	3 536,00	3 536,00	0	0,00	1,000	3 536,00
D 4		Vodorovné konstrukce					4 458,48		0,00		4 458,48
49	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	6,000	256,10	1 536,60	0	0,00	6,000	1 536,60
50	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,600	1 060,80	636,48	0	0,00	0,600	636,48
51	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,600	3 809,00	2 285,40	0	0,00	0,600	2 285,40
D 5		Komunikace pozemní					26 806 005,45		0,00		26 806 005,45
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10 311,840	105,90	1 092 023,86	0	0,00	10 311,840	1 092 023,86
53	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	8 725,725	110,53	964 454,38	0	0,00	8 725,725	964 454,38
54	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	23,750	129,06	3 065,18	0	0,00	23,750	3 065,18
55	K	567521151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy přes 10000m2	m2	23 902,000	24,79	592 530,58	0	0,00	23 902,000	592 530,58
56	K	567522151	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 160 mm přes 10000 m2	m2	23 902,000	39,00	932 178,00	0	0,00	23 902,000	932 178,00
57	M	589811000-1	asfaltové pojivo + cement + kamenivo pro recyklaci podkladu za studena tl. 160 mm	m2	23 902,000	245,60	5 870 331,20	0	0,00	23 902,000	5 870 331,20
58	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	5 190,000	81,38	422 362,20	0	0,00	5 190,000	422 362,20
59	K	572531122-1	Oprava podélných a příčných trhlin, vyčištění, základní nátěr a zalití polymerem modifikovanou asfaltovou zálivkou, překrytí reflexních trhlin geokompozitem,	m	293,700	286,00	83 998,20	0	0,00	293,700	83 998,20
60	K	573231107-1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	33 692,000	9,17	308 955,64	0	0,00	33 692,000	308 955,64
61	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	33 692,000	12,35	416 096,20	0	0,00	33 692,000	416 096,20
62	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33 692,000	195,00	6 569 940,00	0	0,00	33 692,000	6 569 940,00
63	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33 692,000	280,54	9 451 953,68	0	0,00	33 692,000	9 451 953,68
64	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	71,250	725,40	51 684,75	0	0,00	71,250	51 684,75
65	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	14,113	2 860,00	40 363,18	0	0,00	14,113	40 363,18
66	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu C20/25 XF3	m2	6,000	1 011,40	6 068,40	0	0,00	6,000	6 068,40
D 8		Trubní vedení					5 993,00		0,00		5 993,00
67	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	0	0,00	1,000	1 170,00
68	M	286619330	poklop šachtový litinový 600 B125	kus	1,000	4 823,00	4 823,00	0	0,00	1,000	4 823,00
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					3 200 445,46		71 791,20		3 272 236,66
69	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	64,000	2 145,00	137 280,00	0	0,00	64,000	137 280,00
70	K	911331111-2	Výšková rektifikace ocelového jednostranného zádržnosti N2 typ JSNH4/N2	m	360,000	650,00	234 000,00	0	0,00	360,000	234 000,00
71	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m	m	175,000	1 716,00	300 300,00	0	0,00	175,000	300 300,00
72	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	4,000	4 680,00	18 720,00	0	0,00	4,000	18 720,00

Místo:			Nové Strašecí		Datum:						
73	K	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	63,000	3 913,00	246 519,00	0	0,00	63,000	246 519,00
74	K	911381124-1	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky výšky 1,2 m vč. přechodových dílů na ocelové svodidlo	m	176,000	5 115,50	900 328,00	0	0,00	176,000	900 328,00
75	K	913311111	Montáž a demontáž dočasného dopravního kužele reflexního v 600 mm	kus	192,000	8,14	1 562,88	0	0,00	192,000	1 562,88
76	K	913311211	Příplatek k dočasnému kuželu reflexnímu v 600 mm za první a ZKD den použití	kus	1 536,000	18,46	28 354,56	0	0,00	1 536,000	28 354,56
77	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	96,000	59,02	5 665,92	0	0,00	96,000	5 665,92
78	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	768,000	18,72	14 376,96	0	0,00	768,000	14 376,96
79	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 n XF3 včetně vyspárování cementovou maltou	m	95,000	221,00	20 995,00	0	0,00	95,000	20 995,00
80	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	95,000	130,00	12 350,00	0	0,00	95,000	12 350,00
81	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	206,000	91,91	18 933,46	0	0,00	206,000	18 933,46
82	K	919122122	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	206,000	77,48	15 960,88	0	0,00	206,000	15 960,88
83	K	919551110-1	Seřiznutí čel propustku do DN 400	kus	5,000	4 550,00	22 750,00	0	0,00	5,000	22 750,00
84	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	15,000	184,60	2 769,00	0	0,00	15,000	2 769,00
85	M	562411110	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 400 mm SN16	m	15,225	874,90	13 320,35	0	0,00	15,225	13 320,35
86	K	919726124-1	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 500 g/m2	m2	16 321,500	53,30	869 935,95	0	0,00	16 321,500	869 935,95
87	K	919735114	Řezání stávajícího živiněho krytu hl do 200 mm	m	88,000	188,50	16 588,00	0	0,00	88,000	16 588,00
88	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š do 800 mm	m	100,000	297,70	29 770,00	0	0,00	100,000	29 770,00
89	M	592275130	tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	305,000	74,10	22 600,50	0	0,00	305,000	22 600,50
90	K	938902152	Čistění příkopů strojně příkopovou frézou š dna přes 400 mm	m	40,000	20,28	811,20	3540	71 791,20	3 580,000	72 602,40
ZBV č.1: 3.540m 8 642m (dle TZ PDPS) - 80m (dle soupisu prací PDPS SO120.1 a SO120.3) - 5 022m (sanace krajnic dle PDPS)											
91	K	938902400-1	Vyčištění horské vpusti strojně tlakovou vodou D do 500 mm	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	0	0,00	2,000	5 200,00
92	K	938902421	Čistění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 50% DN	m	83,350	60,71	5 060,18	0	0,00	83,350	5 060,18
93	K	938902423	Čistění propustků strojně tlakovou vodou D do 1500 mm při tl nánosů do 50% DN	m	44,000	87,23	3 838,12	0	0,00	44,000	3 838,12
94	K	938909311	Čistění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m2	16 846,000	5,85	98 549,10	0	0,00	16 846,000	98 549,10
95	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,153	3 464,73	35 177,40	0	0,00	10,153	35 177,40
96	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	270,000	427,70	115 479,00	0	0,00	270,000	115 479,00
97	K	977151118-1	Vrt do hloubky 200 mm do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	0	0,00	1,000	3 250,00
D	997	Přesun sutě					269 938,50		223 197,00		493 135,50
98	K	997013811-1	Likvidace biologického odpadu	t	406,000	585,00	237 510,00	0	0,00	406,000	237 510,00
99	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	55,560	325,00	18 057,00	686,76	223 197,00	742,320	241 254,00
ZBV č.1: 3.540 x 0,194 (měr. hmotnost)											

Místo:		Nové Strašecí		Datum:							
100	K	997221815.1	Poplatek za uložení betonového a ostatního odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,220	325,00	14 371,50	0	0,00	44,220	14 371,50
D 998		Přesun hmot				46 492,34		0,00		46 492,34	
101	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35 763,339	1,30	46 492,34	0	0,00	35 763,339	46 492,34
N		Nové položky				0,00		407 119,85		407 119,85	
102	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,000	182,00	0,00	1399,63	254 732,48	1 399,629	254 732,48
		ZBV č.1: 3.540 x 0,194 (měr. hmotnost)									
		ZBV č.2: 1.494,98 x 0,477 (měr. hmotnost)									
		JC převzata z SO120.3									
103	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	0,000	96,30	0,00	1190,98	114 691,37	1 190,980	114 691,37
		ZBV č.2: výpočet vychází z výměr stanovených geodetem (doklad č.12) převodem z m3									
		JC stanovena ÚRS 2019									
104	K	113107245	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	0,000	124,00	0,00	304	37 696,00	304,000	37 696,00
		ZBV č.2: výpočet vychází z výměr stanovených geodetem (doklad č.12) převodem z m3									
		JC stanovena ÚRS 2019									



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace



AKCE : II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I.etapa

KONTROLNÍ DEN č. 2

DATUM : 18.7.2019


MÍSTO : Nové Strašecí

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD a prezenční listiny

1. Práce provedené za období od 11.7. do 18.7. 2019 :
 - dokončení frézování stávajících živ.vrstev
 - zahájení sanace krajů vozovky v rozsahu PD
2. Práce předpokládané na další období od 18.7. do 25.7. 2019 :
 - odkop krajnice
 - sanace krajů vozovky
3. Při odtěžení krajnice bylo zjištěno, že stávající skladba původní vozovky nesouhlasí s předpoklady PDPS. Není zde předpokládaných 16 cm živice, z které se předpokládala provézt recyklace za studena. Další postup realizace nutné řešit projektantem RDS (resp.technologem zhotovitele) v součinnosti s AD. Stávající stav bude ještě prověřen na dalších min.čtyřech sondách. Výsledné řešení bude předloženo prostřednictvím TDS objednateli k odsouhlasení.
4. Na okrajích vozovky bylo zjištěno větší množství živice, než předpokládala PDPS. Toto množství bude prostřednictvím TDS evidováno a následně vyčísleno. Bude řešeno jako vícepráce.

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 25.7.2019 od 8,30 hod. Sraz na stavbě.

Zapsal Ing. Michal Pietsch




Prezenční listina

Název stavby: **II/237 N.Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I.etapa**

Datum: **18.7.2019**

Kontrolní den stavby č: **2**

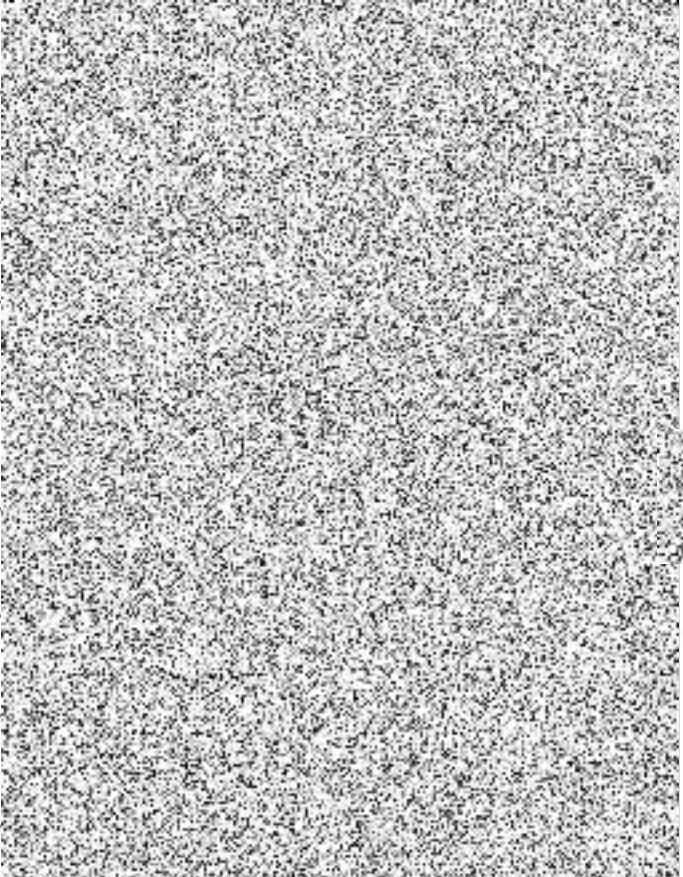Organizace	Jméno, příjmení	Telefon e-mail	Podpis
KSÚS SK	Martin Staněk		
SHP TS	Michal Pietsch		
PROSAFETY	Jan Pošvic		
SHP TS	Vladislava Smetanová		
HERKUL	Václav Roth		
HERKUL	Roman Král		
HERKUL	Jan Galbavý		
KSÚS	Zdeněk Englický		

AKCE: II/237 N.Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. Etapa

KONTROLNÍ DEN č. 3

Datum: 25.7.2019

Místo: Nové Strašecí

Přítomni: dle podpisů v SD a prezenční listiny

1. Práce provedené ze období 18.7.-25.7.2019
 - Pokračování odkopů krajnic
 - Sanace krajů vozovky v úseku cca 16,9 – 17,4km PS
2. Práce předpokládané na další období od 25.7. do 1.8.2019:
 - Odkopy krajnic
 - Sanace krajů vozovky v dalších úsecích
3. Zhotovitel provedl další 4 sondy, které potvrdily nesoulad ve skladbě stáv. Vozovky oproti předpokladu v PDPS (RDS). Tato skutečnost bude řešena s AD, projektantem a objednatelem (viz zápis zhotovitele v SD z jednání konaného na stavbě dne 24.7.2019 za účasti AD)
4. Větší množství asfaltu na krajích stáv. Vozovky oproti PDPS (RDS) bylo zhotovitelem geodeticky zaměřeno, zdokumentováno (fotodokumentace zhotovitele i TDI) a bude řešeno formou ZBV s objednatelem
5. Na pláni sanované krajnice v km cca 17,4 PS byly dne 24.7.2019 provedeny zkoušky únosnosti pláně za účasti TDI (viz zápis geotechnika zhotovitele – SD list č. 192509). Výsledky zkoušek jsou nevyhovující. Zhotovitel navrhne výměnu materiálu aktivní zóny v souladu se schválenou RDS a ČSN 736133
6. Zhotovitel upozorňuje na chybu v soupisu prací schválené RDS, a to v položce č. 938 902152-čištění příkopů strojně. Neodpovídá množství v TZ – PDPS tab. Str. 7 a 8.
Zhotovitel bude toto řešit prostřednictvím TDS s AD a objednatelem formou ZBV

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 1.8.2019 od 8,30 hod. Sraz na stavbě.

Zapsala Vladislava Smetanová - TDI




Prezenční listina

Název stavby: II/237 N.Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I.etapa

Datum: 25.4.2019

Kontrolní den stavby č: 3

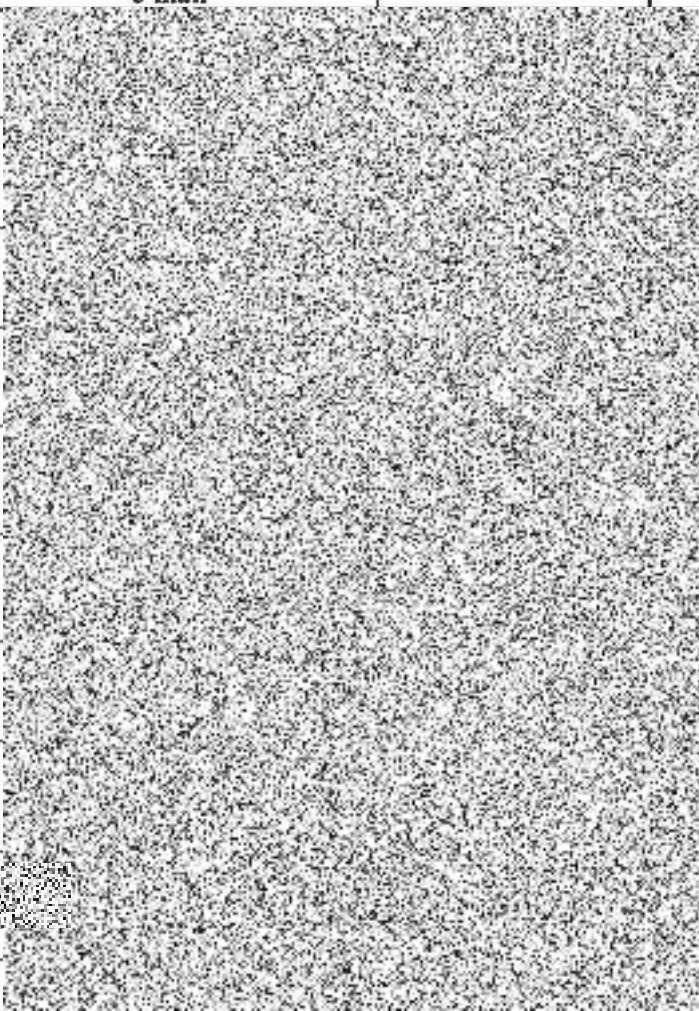Organizace	Jméno, příjmení	Telefon e-mail	Podpis
KSÚS SK	Martin Staněk		
SHP TS	Michal Pietsch		
PROSAFETY	Jan Pošvic		
SHP TS	Vladislava Smetanová		
HERKUL	Václav Roth		
HERKUL	Roman Král		
HERKUL	Jan Galbavý		
KSÚS	Zdeněk Englický		
KSÚS	Martin Dvořák		

AKCE : II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I.etapa

KONTROLNÍ DEN č. 5

DATUM : 8.8.2019


MÍSTO : Nové Strašecí

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD a prezenční listiny

1. Práce provedené za období od 1.8. do 8.8. 2019 :
 - odkop krajnice
 - sanace krajů vozovky - zásyp
2. Práce předpokládané na další období od 8.8. do 15.8.2019 :
 - odkop krajnice
 - sanace krajů vozovky
3. Recyklace bude provedena dle původního návrhu v PDPS. Zhotovitel předloží ke schválení recepturu. Bude proveden zkušební úsek pro ověření dosažení předepsaných parametrů.
4. Zhotovitel předložil návrh oceněných víceprací na čištění příkopu a odstranění nepředpokládaných vrstev živců v krajnicích. Bude řešeno do příštího KD 16.8.2019.

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 15.8.2019 od 8,30 hod. Sraz na stavbě.

Zapsal Ing. Michal Pietsch




Prezenční listina

Název stavby: II/237 N.Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I.etapa

Datum: 8.8. 2019

Kontrolní den stavby č: 5

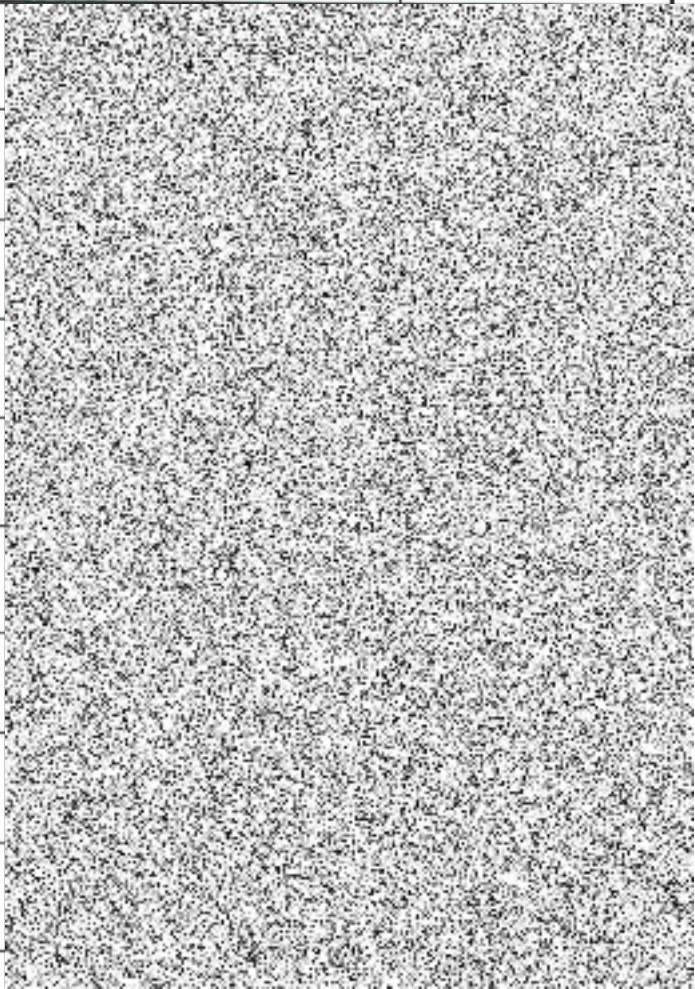Organizace	Jméno, příjmení	Telefon e-mail	Podpis
KSÚS SK	Martin Staněk		
SHP TS	Michal Pietsch		
PROSAFETY	Jan Pošvic		
SHP TS	Vladislava Smetanová		
HERKUL	Václav Roth		
HERKUL	Roman Král		
HERKUL	Jan Galbavý		
KSÚS	Zdeněk Englický		
PROMIKA	Tomáš Roztočil		





**GEPOINT s.r.o.**

Lomená 308/30, Praha 6 162 00

IČ: 04381025

Spisová značka C 246720 vedená u Městského soudu v Praze

mobil: +420 733 723 480

cipera@gepoint.cz

www.gepoint.cz

GEODETICKÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 201900083DSS-12

Věc: Odstranění přebytečné vrstvy asfaltu v krajnici Název zakázky: N. Strašecí-Mšec Lokalita: Obrnice Objednatel: HERKUL a.s. Dodavatel: GEPOINT s.r.o.	Zaměřil: Ing. Ondřej Němeček Spolupracoval:
Datum měření: 21.08.2019 Souřadnicový systém: ZVS-JTSK Výškový systém: ZVS-BpV	Číslo zakázky: 201900083 Číslo nabídky: Číslo objednávky:

Technická zpráva:

Dne 21.8.2019 byla zaměřena přebytečná vrstva asfaltu v krajnicích. Kubatury v jednotlivých úsecích (sanacích) jsou uvedeny v tabulce. Celková kubatura činí 302,7 m³.
 Měření připojeno na ZVS vytvořenou f. Geopoint
 Celkem zaměřeno 130 bodů.

Použité přístroje a vybavení

2 Totální stanice Trimble S9 HP

směrodatná odch. délky: 0.8mm + 1PPM ; směrodatná odchylka směru: 3cc

Seznam příloh

situace zaměření

seznam souřadnic

PŘEDAL Podpis: _____ Datum: _____ Jméno: _____	PŘEVZAL Podpis: _____ Datum: _____ Jméno: _____	OVĚŘIL Ev. číslo 2019 \ 5043 Datum: 02.10.2019 Jméno: Ing. Michal Čipera 
--	---	---

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně.


Kubatura odebrání krajnice vozovky


Levá strana							
	Staničení			Délka	Hloubka	Šířka	Kub
Km	15,036	-16,400,	dl.	1364	0,20	0,37	100,9
Km	16,55	-16,650,	dl.	100	0,23	0,38	8,7
Km	17,08	-17,320,	dl.	240	0,22	0,39	20,6
Km	18,6	-18,970,	dl.	370	---	---	---
Celkem							130,3


Pravá strana							
	Staničení			Délka	Hloubka		Kub
Km	15,036	-16,400,	dl.	1364	0,20	0,35	95,5
Km	16,62	-16,670,	dl.	50	0,18	0,37	3,3
Km	16,88	-17,000,	dl.	120	0,22	0,39	10,3
Km	17,08	-17,360,	dl.	280	0,20	0,33	18,5
Km	17,4	-17,600,	dl.	200	0,23	0,40	18,4
Km	17,8	-17,920,	dl.	120	0,21	0,38	9,6
Km	18	-18,250,	dl.	250	0,17	0,36	15,3
Km	18,5	-18,520,	dl.	20	0,20	0,40	1,6
Km	18,6	-18,950,	dl.	350	---	---	---
Km	19	-19,050,	dl.	50	---	---	---
Km	19,211	-19,355,	dl.	144	---	---	---
Celkem							172,46


Kubatura celkem

302,7

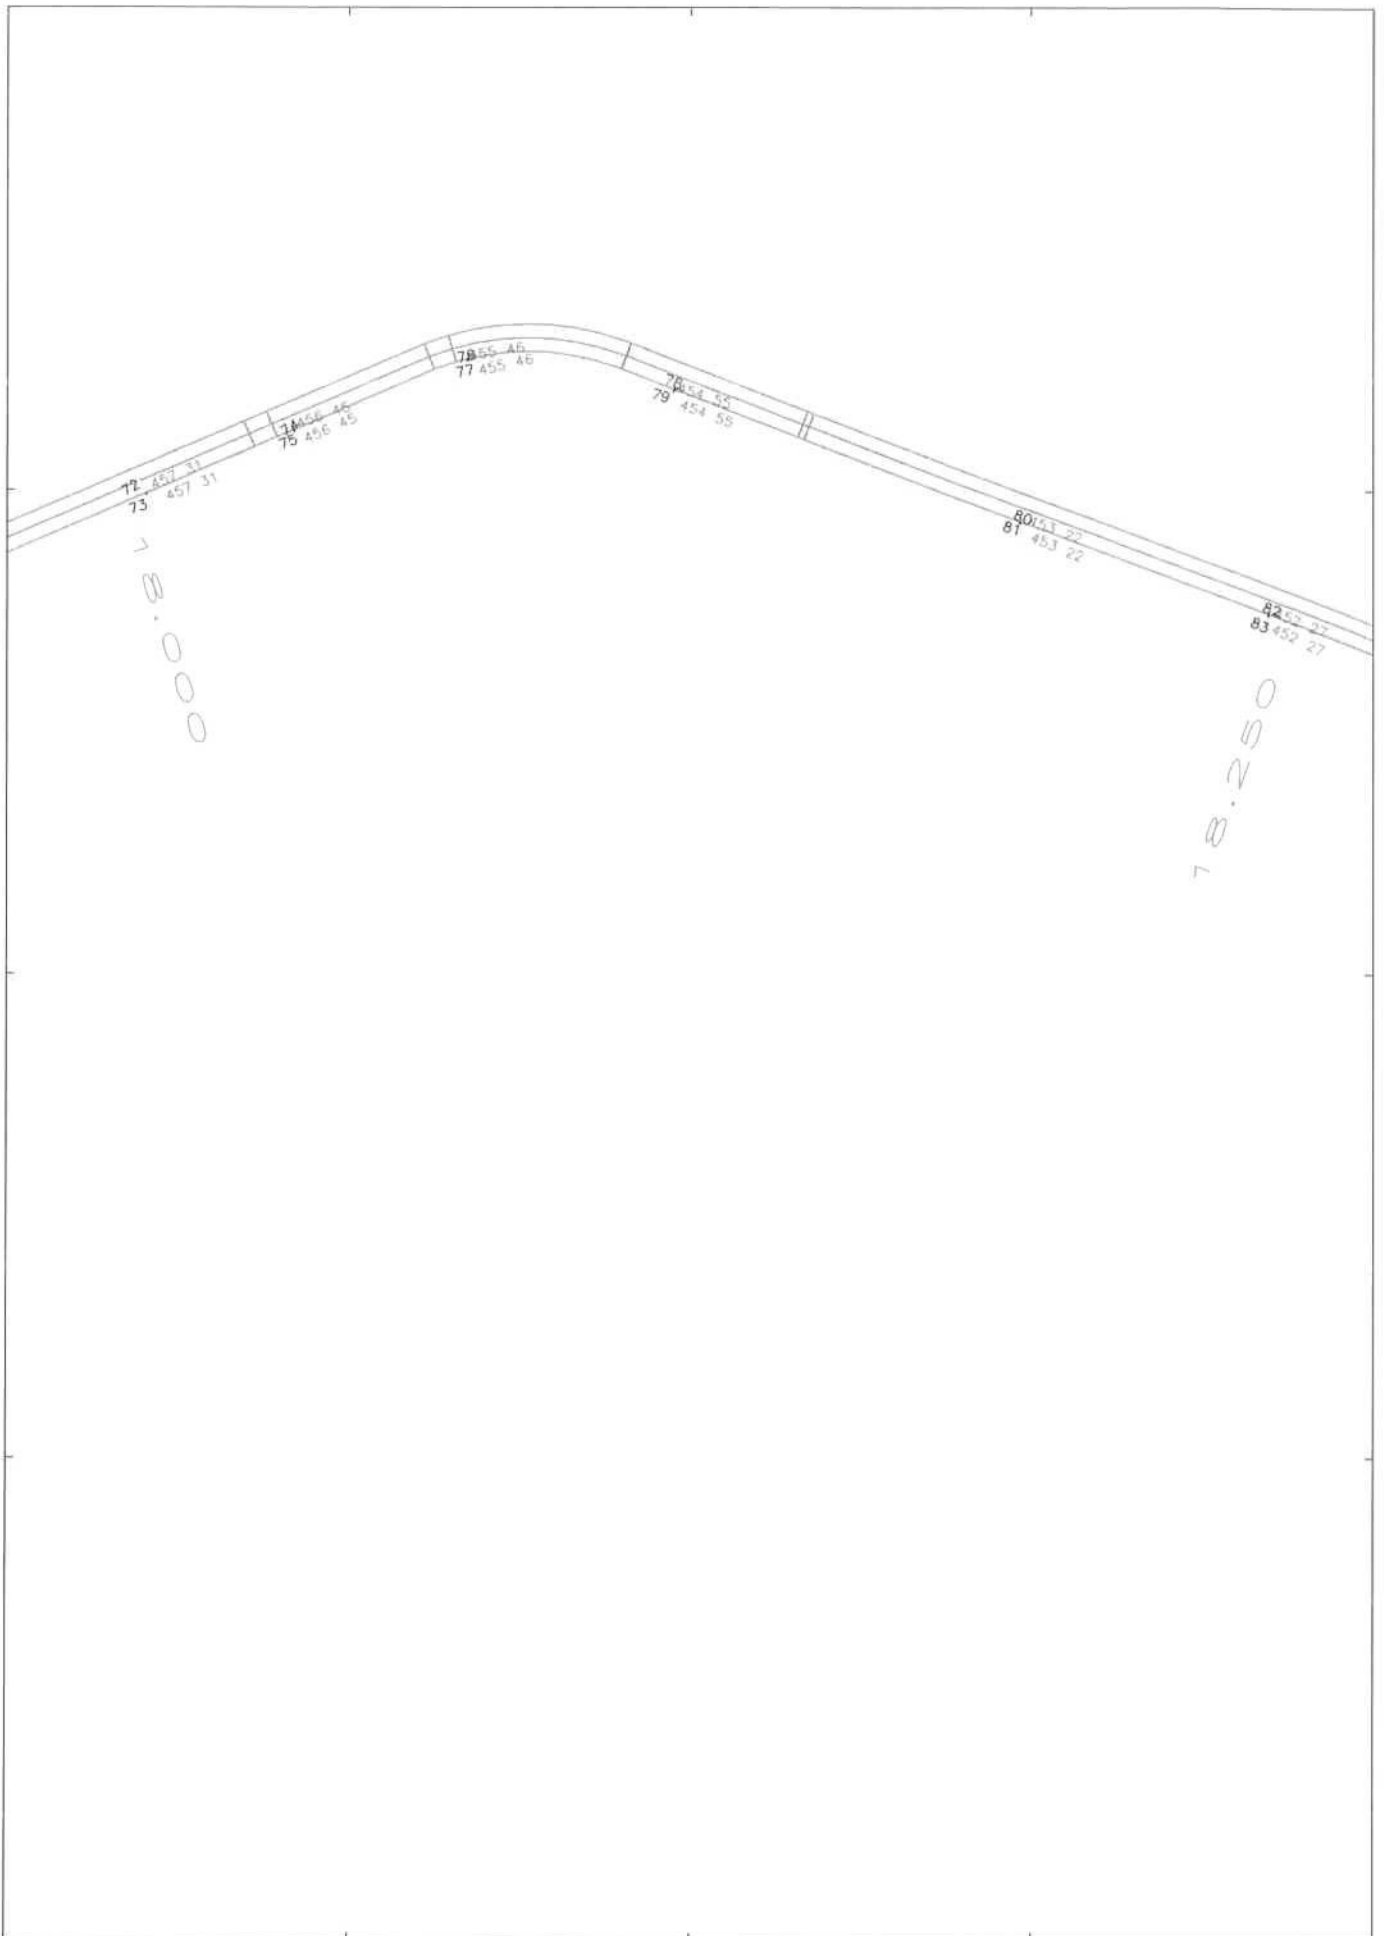

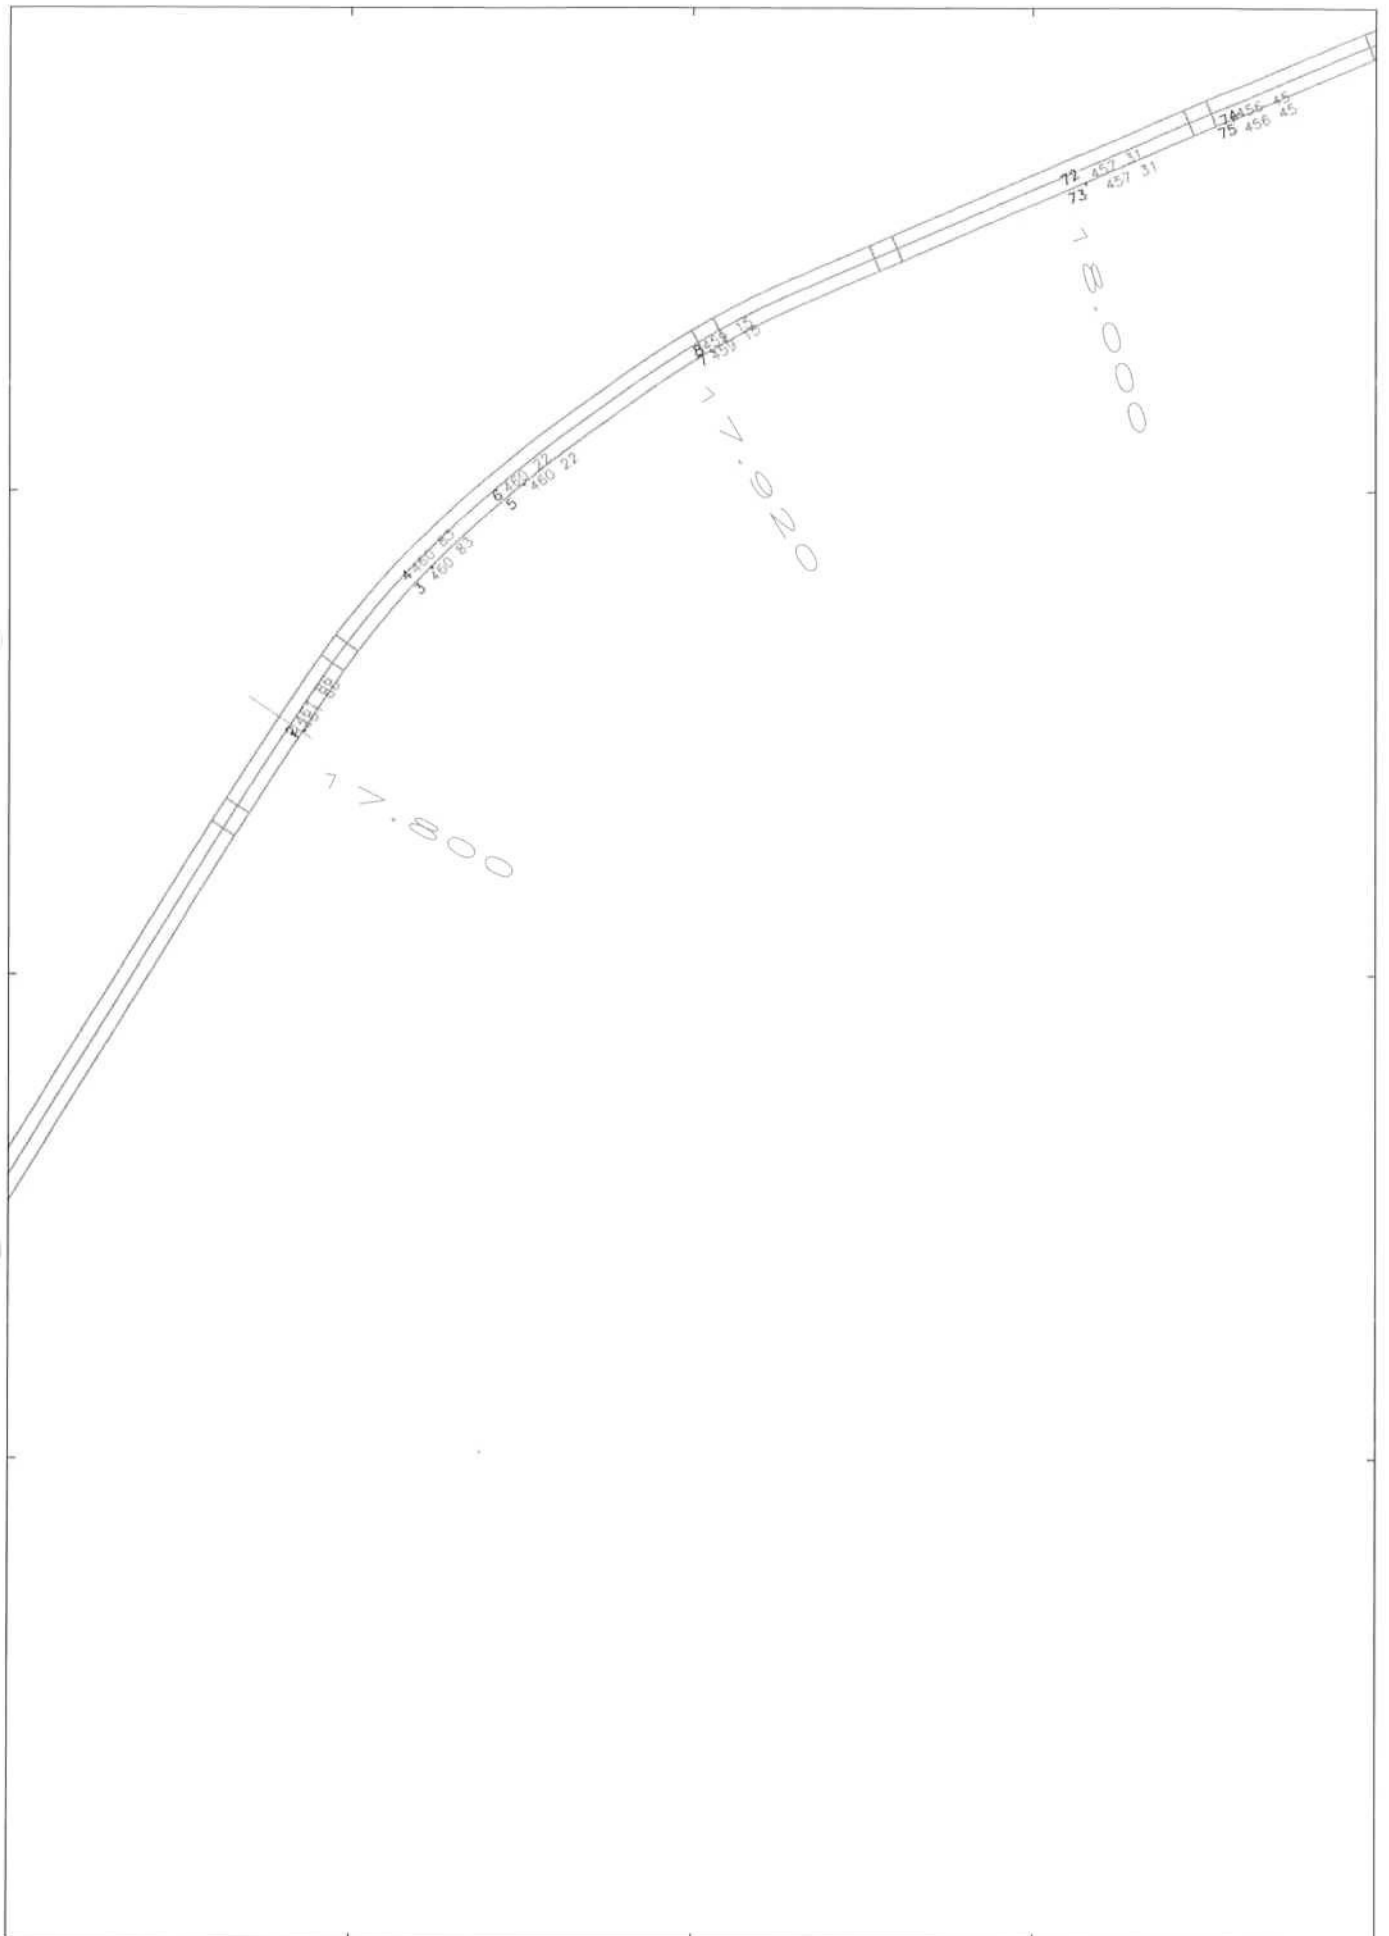

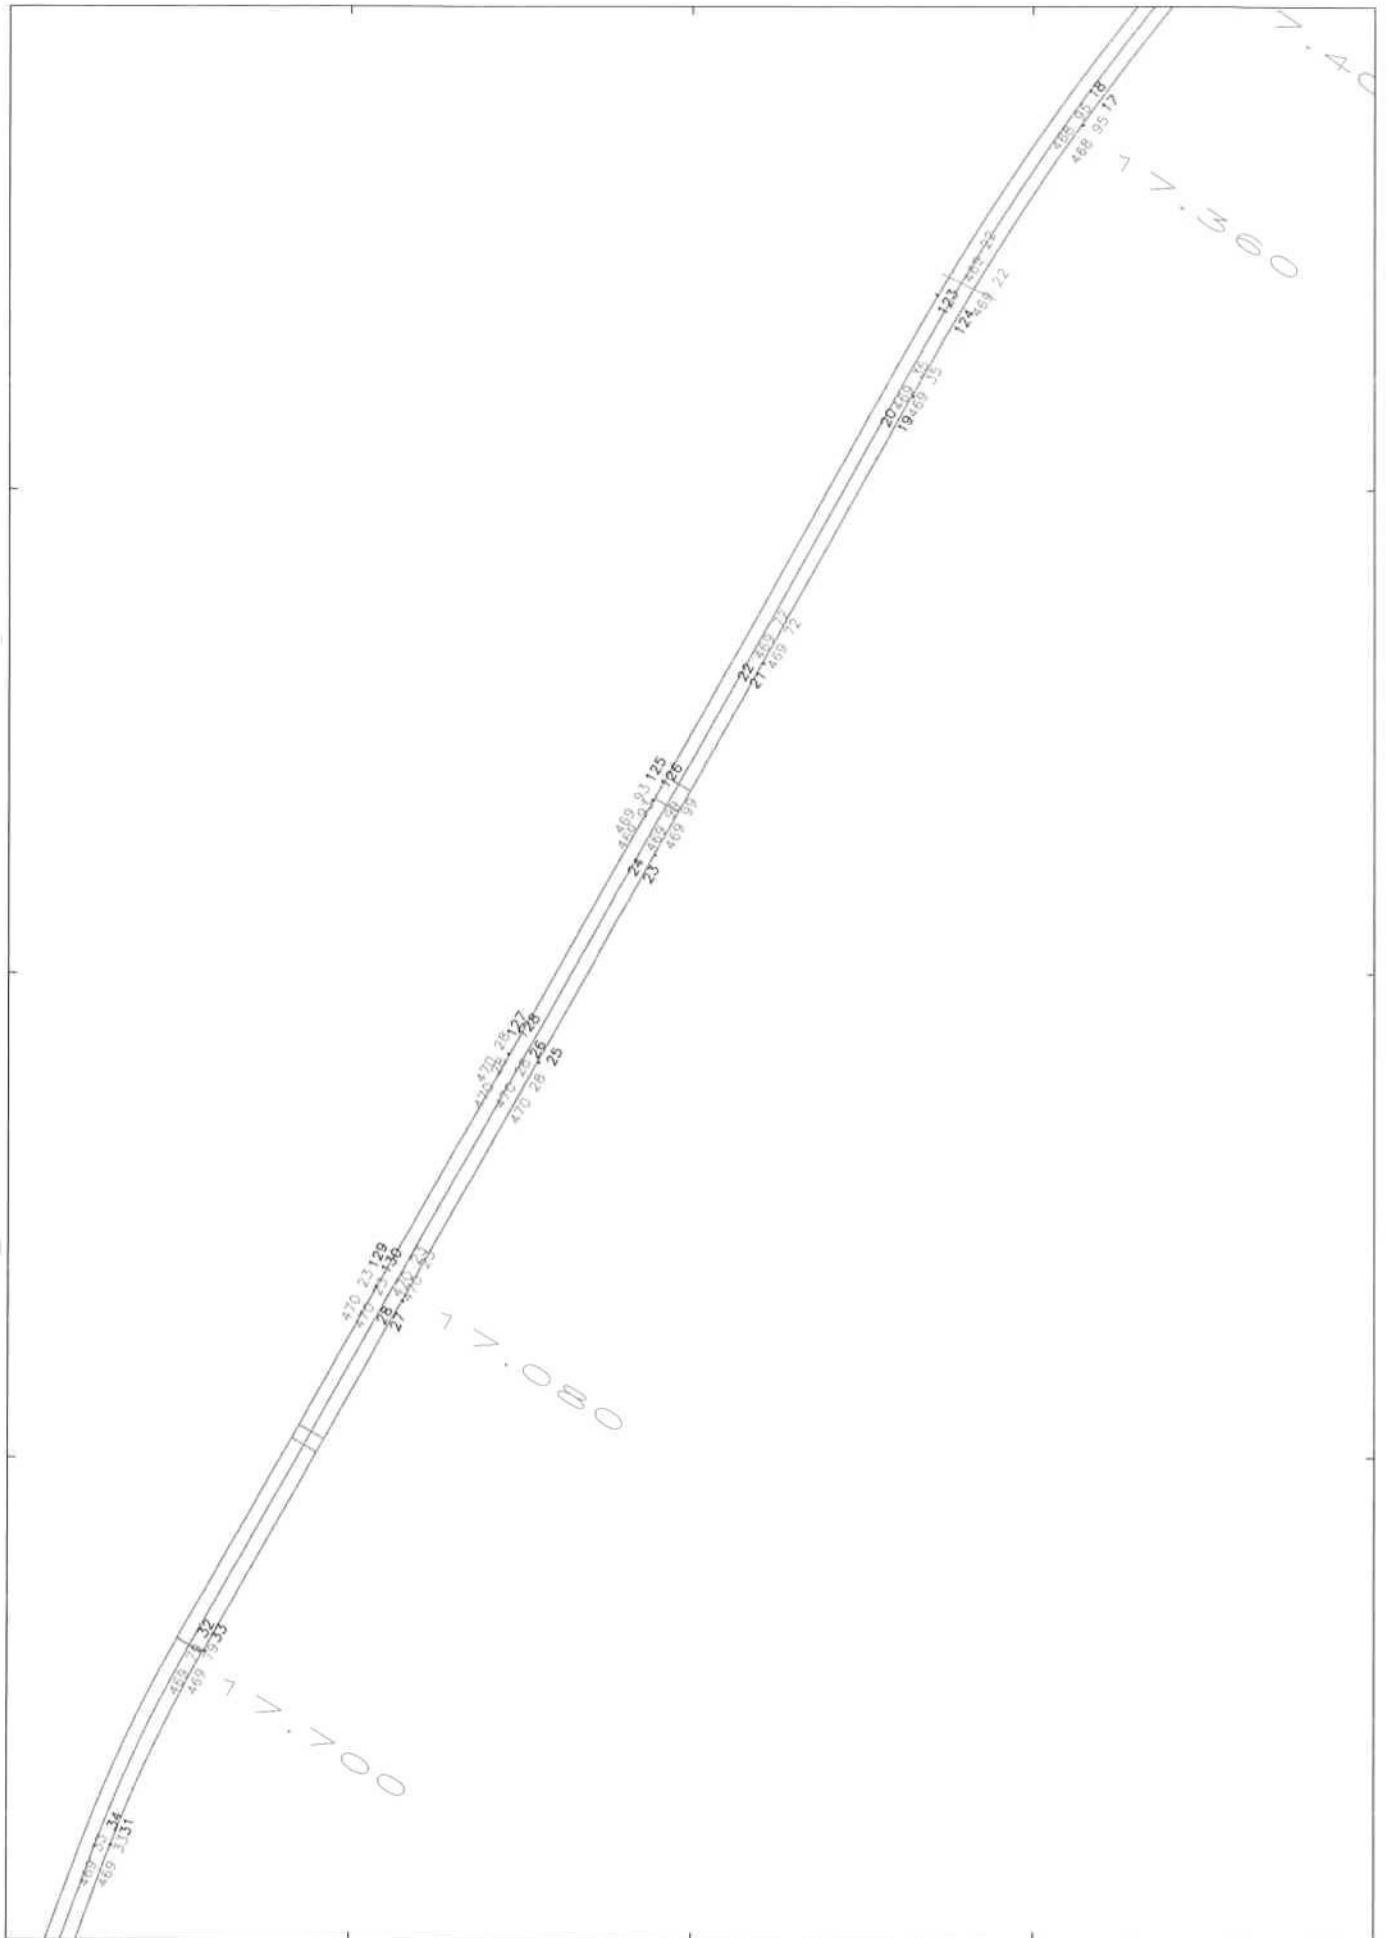

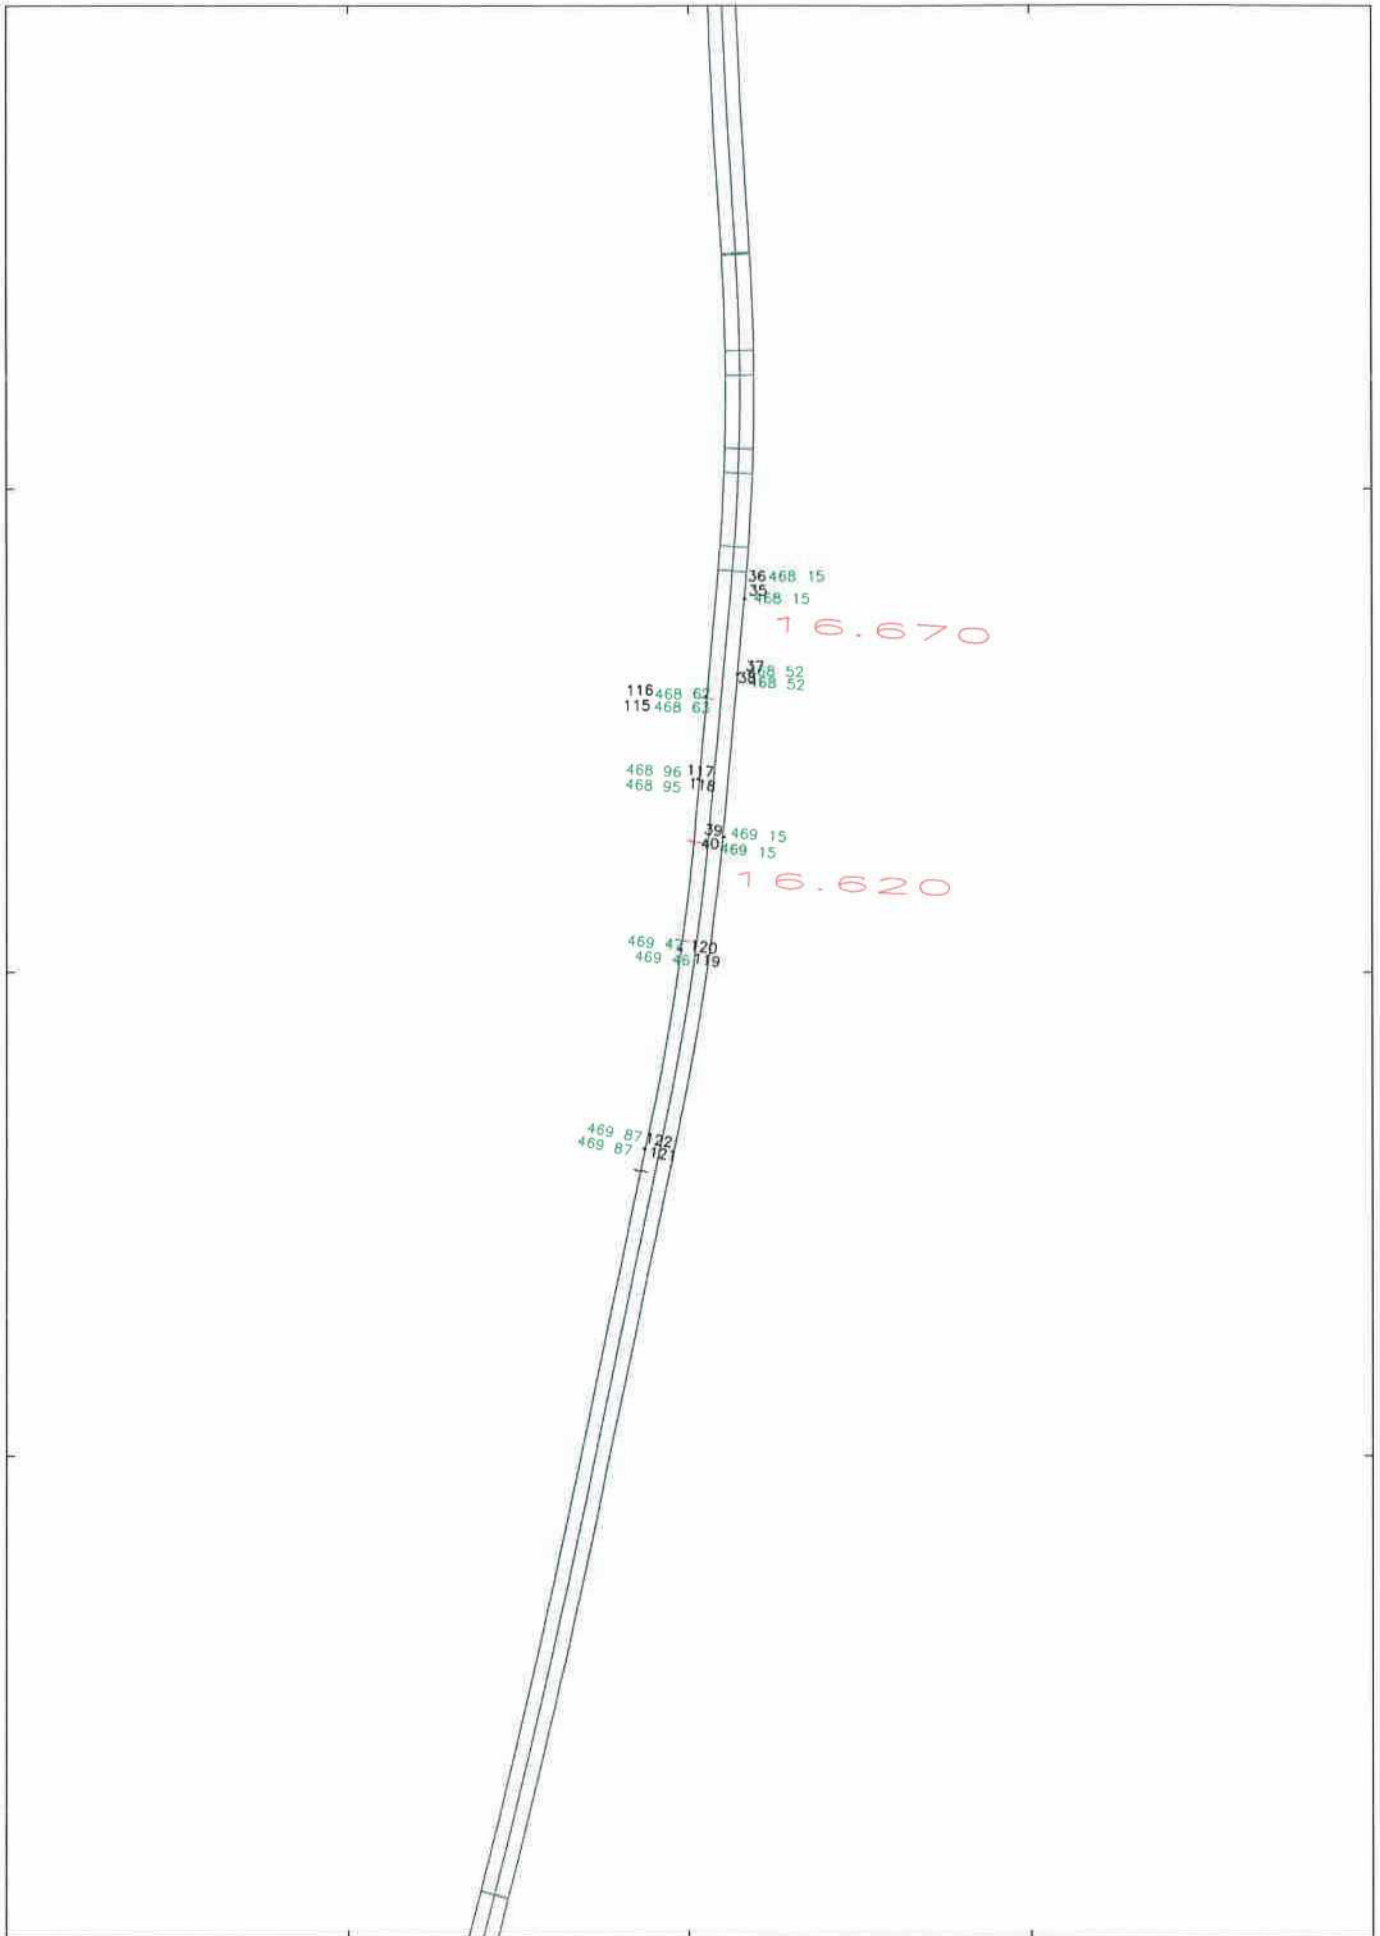

87 472 06
86 472 06
70 472 03
69 472 03

16.400

67 473 30
68 473 30


89 473 58
88 473 58


91 474 75
90 474 75

65 474 69
66 474 69

93 474 08
92 474 08

64 473 66
63 473 66

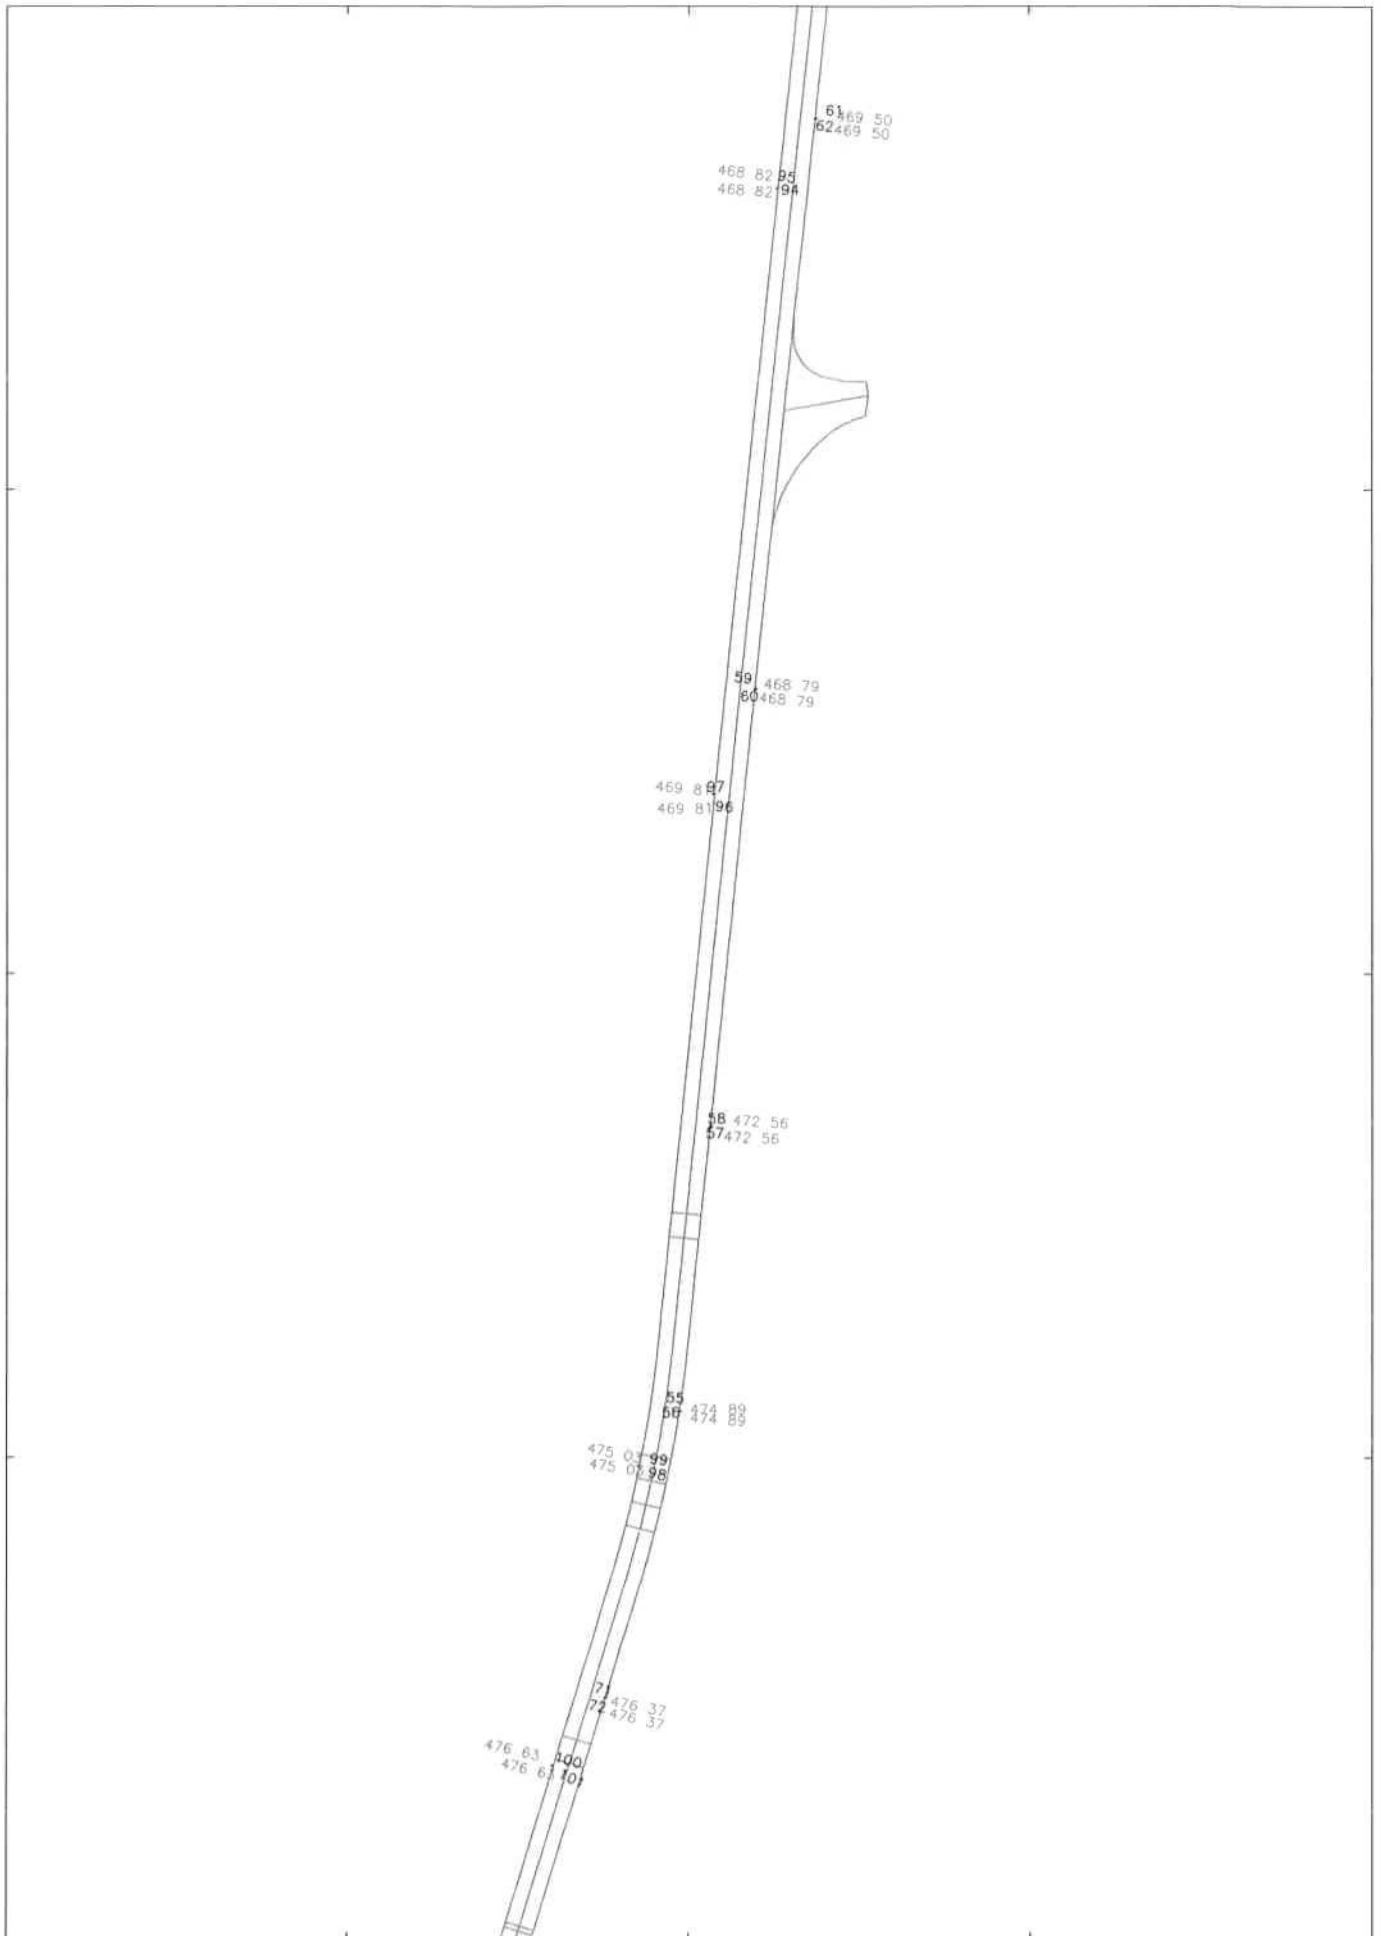

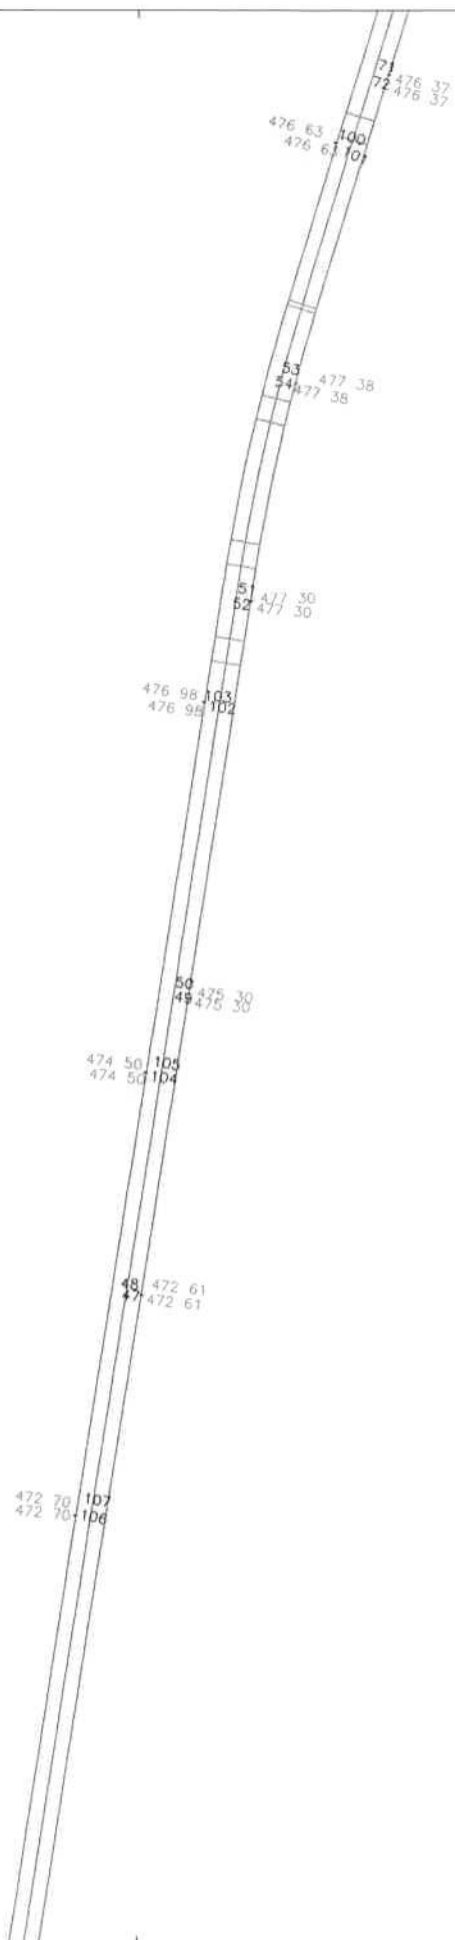

45 475 28
46 475 28

475 43 108
475 43 108

474 13 110
474 13 110
44 43 474 30
474 30

113 469 61
112 469 61
12 469 61
15.036

GROMA v. 8.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 1/2
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	1	777 853.360	1 026 680.994	461.865			
	2	777 853.035	1 026 681.191	461.865			
	3	777 827.168	1 026 647.929	460.830			
	4	777 827.492	1 026 647.732	460.830			
	5	777 808.227	1 026 630.874	460.220			
	6	777 808.552	1 026 630.677	460.220			
	7	777 770.100	1 026 603.779	459.154			
	8	777 770.425	1 026 603.582	459.154			
	9	777 959.713	1 026 852.301	466.019			
	10	777 960.020	1 026 852.045	466.019			
	11	778 004.845	1 026 923.751	467.572			
	12	778 005.152	1 026 923.495	467.572			
	13	778 047.283	1 026 980.710	468.244			
	14	778 047.590	1 026 980.454	468.244			
	15	778 074.078	1 027 014.712	468.612			
	16	778 074.385	1 027 014.456	468.612			
	17	778 099.669	1 027 047.813	468.951			
	18	778 099.965	1 027 047.666	468.951			
	19	778 134.375	1 027 103.147	469.347			
	20	778 134.671	1 027 103.001	469.347			
	21	778 165.023	1 027 157.693	469.722			
	22	778 165.319	1 027 157.547	469.722			
	23	778 187.157	1 027 196.885	469.992			
	24	778 187.453	1 027 196.738	469.992			
	25	778 211.027	1 027 239.139	470.277			
	26	778 211.323	1 027 238.993	470.277			
	27	778 238.545	1 027 287.852	470.229			
	28	778 238.841	1 027 287.705	470.229			
	29	778 322.881	1 027 467.553	468.183			
	30	778 323.262	1 027 467.469	468.183			
	31	778 297.732	1 027 398.915	469.325			
	32	778 279.203	1 027 359.028	469.792			
	33	778 278.822	1 027 359.112	469.792			
	34	778 298.113	1 027 398.831	469.325			
	35	778 323.762	1 027 677.474	468.152			
	36	778 324.130	1 027 677.433	468.152			
	37	778 325.155	1 027 692.748	468.518			
	38	778 325.522	1 027 692.707	468.518			
	39	778 328.190	1 027 726.033	469.152			
	40	778 328.558	1 027 725.992	469.152			
	41	778 614.854	1 029 281.525	469.607			
	42	778 615.201	1 029 281.477	469.607			
	43	778 597.961	1 029 172.435	474.296			
	44	778 598.308	1 029 172.387	474.296			
	45	778 579.655	1 029 053.733	475.283			
	46	778 580.002	1 029 053.685	475.283			
	47	778 558.317	1 028 916.911	472.607			
	48	778 558.663	1 028 916.864	472.607			
	49	778 548.236	1 028 852.698	475.296			
	50	778 548.582	1 028 852.651	475.296			
	51	778 536.078	1 028 775.254	477.303			
	52	778 536.425	1 028 775.207	477.303			
	53	778 526.880	1 028 730.835	477.383			
	54	778 527.227	1 028 730.788	477.383			
	55	778 492.715	1 028 609.416	474.891			
	56	778 493.062	1 028 609.368	474.891			
	57	778 486.463	1 028 551.280	472.558			
	58	778 486.810	1 028 551.232	472.558			
	59	778 477.343	1 028 462.148	468.787			
	60	778 477.690	1 028 462.101	468.787			
	61	778 464.905	1 028 345.746	469.501			
	62	778 465.252	1 028 345.698	469.501			
	63	778 453.966	1 028 246.563	473.659			
	64	778 454.312	1 028 246.516	473.659			
	65	778 435.183	1 028 180.600	474.691			
	66	778 435.530	1 028 180.552	474.691			
	67	778 398.026	1 028 044.479	473.304			
	68	778 398.373	1 028 044.431	473.304			
	69	778 376.561	1 027 959.986	472.030			
	70	778 376.908	1 027 959.939	472.030			
	71	778 507.817	1 028 667.866	476.369			
	72	777 693.659	1 026 569.136	457.307			
	72	778 508.164	1 028 667.818	476.369			
	73	777 693.530	1 026 569.472	457.307			
	74	777 663.454	1 026 556.144	456.449			
	75	777 663.324	1 026 556.480	456.449			
	76	777 628.083	1 026 541.715	455.461			
	77	777 627.954	1 026 542.051	455.461			

GROMA v. 8.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 2/2
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	78	777 585.670	1 026 547.785	454.548			
	79	777 585.816	1 026 548.114	454.548			
	80	777 514.730	1 026 574.788	453.216			
	81	777 514.876	1 026 575.117	453.216			
	82	777 464.114	1 026 593.557	452.273			
	83	777 464.260	1 026 593.886	452.273			
	84	777 225.666	1 026 703.909	446.540			
	85	777 225.866	1 026 704.255	446.540			
	86	778 383.081	1 027 960.608	472.063			
	87	778 383.446	1 027 960.547	472.063			
	88	778 408.164	1 028 058.766	473.578			
	89	778 408.529	1 028 058.705	473.578			
	90	778 431.836	1 028 148.342	474.751			
	91	778 432.201	1 028 148.282	474.751			
	92	778 458.427	1 028 236.509	474.082			
	93	778 458.792	1 028 236.448	474.082			
	94	778 472.794	1 028 359.985	468.824			
	95	778 473.159	1 028 359.925	468.824			
	96	778 485.921	1 028 483.575	469.813			
	97	778 486.286	1 028 483.515	469.813			
	98	778 501.162	1 028 620.597	475.028			
	99	778 501.527	1 028 620.536	475.028			
	100	778 518.736	1 028 681.791	476.630			
	101	778 519.101	1 028 681.731	476.630			
	102	778 545.759	1 028 795.976	476.978			
	103	778 546.124	1 028 795.916	476.978			
	104	778 557.612	1 028 871.478	474.496			
	105	778 557.977	1 028 871.418	474.496			
	106	778 571.792	1 028 961.805	472.697			
	107	778 572.157	1 028 961.744	472.697			
	108	778 589.437	1 029 075.402	475.431			
	109	778 589.802	1 029 075.342	475.431			
	110	778 605.628	1 029 176.928	474.128			
	111	778 605.993	1 029 176.868	474.128			
	112	778 622.576	1 029 279.883	469.636			
	113	778 622.941	1 029 279.822	469.636			
	115	778 331.770	1 027 697.356	468.631			
	116	778 332.146	1 027 697.299	468.623			
	117	778 333.307	1 027 714.209	468.962			
	118	778 333.682	1 027 714.152	468.954			
	119	778 337.077	1 027 748.972	469.467			
	120	778 337.452	1 027 748.915	469.459			
	121	778 344.461	1 027 789.597	469.874			
	122	778 344.837	1 027 789.540	469.866			
	123	778 129.764	1 027 082.299	469.225			
	124	778 129.427	1 027 082.496	469.225			
	125	778 187.982	1 027 185.476	469.935			
	126	778 187.646	1 027 185.673	469.935			
	127	778 217.362	1 027 237.253	470.285			
	128	778 217.026	1 027 237.451	470.285			
	129	778 244.251	1 027 284.641	470.231			
	130	778 243.915	1 027 284.838	470.231			



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

HERKUL a.s.
Obrnice 228
435 21 Obrnice

Váš dopis značky/ze dne
180434011/02
27.9.2019

Naše značka
Nostrasdur_do013/19

Vyřizuje
Ctibor

Místo a datum odeslání
Praha, 2.10.2019

Věc: „II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa“ – odstranění přebytečného asfaltu u SO 120.1 - stanovisko AD

Na Vaši e-mailovou žádost ze dne 27.9.2019 o sdělení stanoviska k „Oznámení o nutnosti odstranění přebytečného asfaltu u SO 120.1“ výše uvedené akce, Vám jako Autorský dozor sdělujeme následující stanovisko.

Po prostudování dostupných podkladů Autorský dozor prohlašuje, že bere na vědomí informace obsažené v tomto oznámení a nebude mít námitek proti ZBV, spočívající ve změně příslušné položky (položek) v soupisu prací.

S pozdravem



atelierpromika s.r.o.
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Ing. Jiří Ctibor
Atelier PROMIKA s.r.o.

Přílohy: bez příloh



Stanovisko TDI k ZBV č.2

Odstranění přebytečné vrstvy asfaltu

Stavba:	II/237 Nové Strašecí – Mšec, Rekonstrukce – I.etapa
Místo stavby:	Komunikace II/237 mezi N.Strašecí a Mšecí
Název ZBV č.2 :	Odstranění přebytečné vrstvy asfaltu
Objednatel:	Středočeský kraj zastoupený KSÚS Středočeského kraje příspěvkovou organizací
Konzultant:	Sdružení „MORAVA:RS SD+BOZP- Středočeský kraj“ Zastoupené spol.SHP TS, s.r.o.
Zhotovitel:	HERKUL, a.s. Č.p.228, 435 21 Obrnice

Popis ZBV

Během stavby bylo zjištěno, že se pod vrstvou ohumusované krajnice nachází množství AC. Jedná se pravděpodobně o zbytek z „přebalení“ šířky komunikace během původní realizace. Tyto zbytky musely být vzhledem k charakteru materiálu samostatně odstraněny a uloženy na skládce.


Stanovisko TDI

Popsané práce vznikly v průběhu realizace díla, PDPS a RDS je neobsahuje a ani nejsou součástí rozpočtu, který je součástí SoD. Provedení prací je nutné k řádnému dokončení díla. Vícepráce jsou oprávněné a nebylo možné je dopředu předpokládat.

S předloženým ZBV č.2 souhlasíme.

V Praze dne 10.10. 2019

Vypracoval: Ing. Michal Pietsch, TDI





Bc. Martin Staněk
Krajská správa a údržba silnic
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Naše značka: 180434011/02 Vyřizuje: Jan Galbavý Vaše značka: S-0317/DOP/2019

V Obrnicích dne 4.10. 2019

Oznámení o nutnosti odstranění přebytečného asfaltu u SO120.1

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „**II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa**“, tímto ve smyslu článku 1 odstavce 1.1 smlouvy o dílo č. S-0317/DOP/2019 uzavřené dne 1.3.2019, oznamuje, že během realizace stavby bylo zjištěno, že se pod vrstvou ohumusované krajnice nachází množství AC, které musí být, vzhledem k charakteru materiálu, samostatně odstraněny, nakládány a uloženy na skládce.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.
O návrhu změny bylo jednáno a tato skutečnost je uvedena v zápisu z kontrolního dne č. 2 ze dne 18.7.2019, č. 3 ze dne 25.7.2019 a č. 5 ze dne 8.8.2019.



Jan Galbavý
stavbyvedoucí

Přílohy:
Stanovisko AD
Stanovisko TDS
Zápisy z kontrolních dnů
Geodetické zaměření
Fotodokumentace

HERKUL a.s., Obrnice 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638, DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1820
info@herkul.cz, +420 476 440 710, ID datové schránky: 9u7eeav

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

Na základě usnesení valné hromady společnosti HERKUL a. s. ze dne 18.7.2019 dochází ke změně statutárních orgánů společnosti.

Provedení změn v obchodním rejstříku probíhá podle zákonných lhůt.

V Obnících dne 22.07.2019


Ing. Radek Braum
Předseda představenstva
Ing. Václav Roth
Místopředseda představenstva
Naďa Váňková
Člen představenstva

Příloha: Zápis a usnesení z valné hromady spol. HERKUL a.s. ze dne 18.7.2019

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Silnice II/237 – extravilán – I. etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO120.1/3

Číslo ZBV:

3

Objednatel:

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-12 270,96	133 330,08	121 059,12

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-12 270,96	133 330,08	121 059,12

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa	SO120.1/3	3.
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Silnice II/237 – extravilán – I. etapa		

Strany smlouvy o dílo č. S-0317/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 01.03.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	25	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Nevyužití stávajícího materiálu z krajnicDle PD bylo uvažováno s tím, že se 124,2 m³ materiálu získaného z odtěžování krajnic zpětně použije do aktivní zóny.

Při odtěžení krajnice bylo zjištěno, že stávající skladba původní vozovky nesouhlasí s předpoklady PDPS a nelze ji do aktivní zóny využít. Geotechnik po vizuální kontrole (doklad 08) a provedení laboratorní zkoušky konstatoval, že se jedná o podmínečně vhodný materiál (použitelný pouze v případě zlepšení příměsí) a nedoporučil materiál použít do aktivní zóny (doklad 09 - Protokoly laboratorních zkoušek).

Odtěžený materiál musel být odvezen na skládku (doklad č. 14 - Přehled vážních listků) a nahrazen vhodným materiálem.

Změna je odsouhlasena TDI (doklad č. 11), AD (doklady č. 10) a zástupcem objednatele (doklad č. 13)

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-12 270,96	133 330,08	121 059,12	145 601,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Roth	datum	28. 01. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Ctibor	datum	30.1.2020	podpis
Stavební dozor	jméno	Michal Pietsch	datum	31.1.20	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou pod-
 zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu
 upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho
 připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Martin Herman	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Václav Roth	datum	28. 01. 2020	podpis
	jméno	Ing. Radek Braum	datum	29. 01. 2020	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO120.1/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/237 – extravilán – I. etapa	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
42 374 274,47

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-92 474,85	702 108,05	42 983 907,67	609 633,20

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-12 270,96	133 330,08	835 438,13	1,97%


Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-104 745,81	43 104 966,79	730 692,32	1,72%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Václav Roth	28. 01. 2020	Souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jiří Ctibor	30.1.2020	Souhlasím
Stavební dozor:	Michal Pietsch	31.1.20	Souhlasím
Zástupce Objednatele:	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA		Souhlasím
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil		Souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jan Fidler, DiS.	17.2.20	Souhlasím



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3													
Evidenční číslo a název stavby: II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa Číslo a název SO/PS: SO120.1 Silnice II/237 – extravilán – I. etapa Číslo a název rozpočtu: 8320C II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 3 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	7 621,75	7 745,95	124,20	118,30	901 653,03	0,00	14 692,86	916 345,89	14 692,86	2%
29	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 184,00	1 059,80	-124,20	32,50	38 480,00	-4 036,50	0,00	34 443,50	-4 036,50	-10%
30	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	1 184,00	1 059,80	-124,20	58,50	69 264,00	-7 265,70	0,00	61 998,30	-7 265,70	-10%
31	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	4 947,00	5 071,20	124,20	58,50	289 399,50	0,00	7 265,70	296 665,20	7 265,70	3%
32	583441700	vhodný násypový/zásypový materiál pro aktivní zónu	t	10 388,70	10 649,94	261,24	299,00	3 106 221,30	0,00	78 110,76	3 184 332,06	78 110,76	3%
33	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7 621,75	7 745,95	124,20	7,80	59 449,65	0,00	968,76	60 418,41	968,76	2%
34	171201201-1.1	Uložení sypaniny na meziskládky	m3	1 184,00	1 059,80	-124,20	7,80	9 235,20	-968,76	0,00	8 266,44	-968,76	-10%
35	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15 243,50	15 491,90	248,40	130,00	1 981 655,00	0,00	32 292,00	2 013 947,00	32 292,00	2%
		Celkem						6 455 357,68	-12 270,96	133 330,08	6 576 416,80	121 059,12	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Roth

Datum: 28. 01. 2026

Podpis:



Za Objednatele: Michal Pietsch

Datum: 27. 1. 2026

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	46 490 381,53
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	47 221 073,85
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,57%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (b), písm. b)	-9,23%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	730 692,32
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,57%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 947 114,46

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,12%
10=(38A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,90%
10A=(32A+38A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	940 183,94
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 245 190,77

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 227 000 Kč	0,00
14=149227000-37		149 227 000,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 227 000 Kč)	limit 15 %
18	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(20/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa; S-031	- 104 745,81	835 436,13	730 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 104 745,81	415 459,61	0,69%	310 713,80	520 205,42	0,00	419 978,52	0,90%	419 978,52	419 978,52	0,00	0,00%
0.1	1	Silnice II/237 – extravián – I. etapa / čistič přikopů strojů	0,00	419 978,52	419 978,52			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	419 978,52	0,90%	419 978,52	419 978,52		0,00%
120.1	2	Silnice II/237 – extravián – I. etapa / odstranění podkladu vozovek s asfaltovým povrchem	- 92 474,85	282 129,53	189 654,68			0,00			0,00	- 92 474,85	282 129,53	0,61%	189 654,68	374 604,38			0,00%	0,00	0,00		0,00%
120.1	3	Silnice II/237 – extravián – I. etapa / novoužití stávajícího máti z krajnice	- 12 270,96	133 330,06	121 059,12			0,00			0,00	- 12 270,96	133 330,06	0,29%	121 059,12	145 601,04			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby a registrační číslo projektu:	II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/237 – extravilán – I. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO120.1/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací včetně změn	5	
08 Fotodokumentace	1	
09 Protokoly laboratorních zkoušek	11	
10 Stanovisko AD	1	
11 Stanovisko TDS	1	
12 Oznámení Zhotovitele o změně	1	
13 Souhlas zástupce objednatele	2	
14 Přehled vážných lístků	2	
15 Oznámení o změně statutárních org.	1	
Počet listů celkem	25	
