



Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

| | |
|--|--|
| Změnový list číslo | 14 |
| Identifikace akce | |
| Název akce: | Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203 |
| Číslo akce SMVS: | 114V222008005 |
| Objednatel: | CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje |
| Zhotovitel: | Zlínstav, a.s. |
| Projektant: | Ateliér Velehradský, s.r.o. |
| Předmět změnového listu | |
| Protipožární ošetření ocelových prvků | |
| Část díla dotčená změnovým listem | |
| Objekt SO-01 Požární stanice a SO-02 Garáže | |
| Popis změny, popis technického řešení | |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace : | |
| Dle smluvní dokumentace a rozpočtu nebyla navržena protipožární ochrana ocelových prvků. | |
| Nové řešení, zdůvodnění změny : | |
| Pro zajištění plné funkčnosti a technické proveditelnosti bylo navrženo protipožární ošetření ocelových prvků. | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci : | |
| Beze změny. | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: | |
| Zápis z KD č.33 až 44, bod 2. Projekt pod bod 33.2.3. | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | |
| Vliv na termín: | Beze změny. |
| Vliv na kvalitu díla: | Beze změny. |
| Vliv na cenu: | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | |
| DPH: | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: | |
| | Datum: 09. 01. 2020 |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: | |
| | Datum: 09. 01. 2020 |

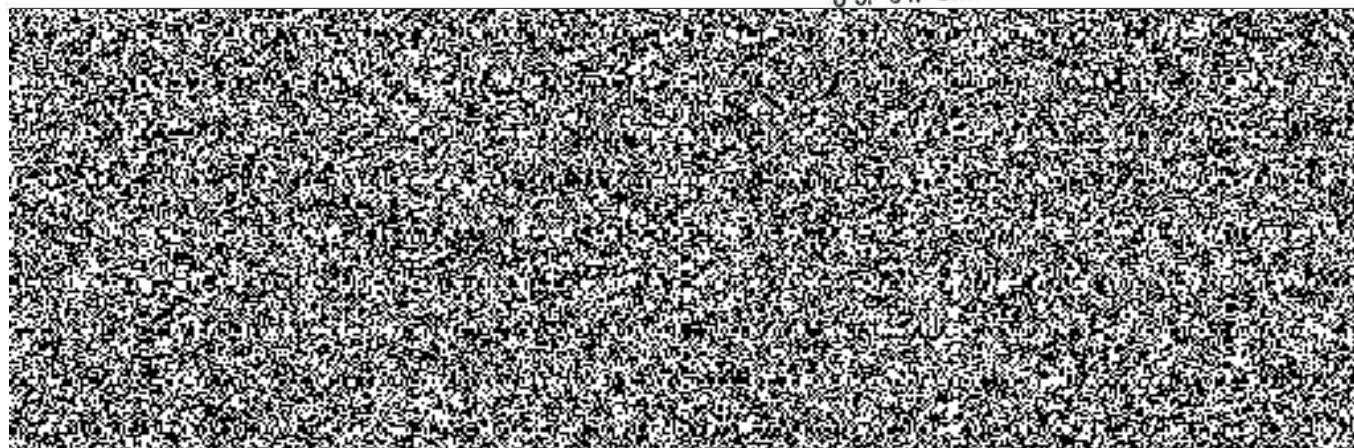

Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

| | | |
|---|--|-------------------|
| Změnový list číslo | | 15 |
| Identifikace akce | | |
| Název akce: | Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203 | |
| Číslo akce SMVS: | 114V222008005 | |
| Objednatel: | CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje | |
| Zhotovitel: | Zlínstav, a.s. | |
| Projektant: | Ateliér Velehradský, s.r.o. | |
| Předmět změnového listu | | |
| Kotvení příček do stropu | | |
| Část díla dotčená změnovým listem | | |
| SO-01 Objekt požární stanice | | |
| Popis změny, popis technického řešení | | |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace : | | |
| Dle smluvní dokumentace a rozpočtu nebylo navrženo kotvení volně stojících zděných příček. Tyto příčky nejsou staticky zajištěny (provázány s jinými příčkami a nemohou být ukotveny do stropu). Při bočním zatížení může dojít k jejich vyvrácení. | | |
| Nové řešení, zdůvodnění změny : | | |
| Pro zajištění plné funkčnosti a technické proveditelnosti bylo navrženo kotvení těchto příček. | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci : | | |
| Beze změny. | | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: | | |
| Zápis z KD č.44 bod 2. Projekt, podbod 31.2.2. | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | | |
| Vliv na termín: | Beze změny. | |
| Vliv na kvalitu díla: | Beze změny. | |
| Vliv na cenu: | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | | |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | | |
| DPH: | | |
| DPH vč. DPH: | | |
| Datum: 09.01.2020 | Datum: 09.01.2020 | Datum: 09.01.2020 |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: | | |



Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

| | |
|---|--|
| Změnový list číslo | 16 |
| Identifikace akce | |
| Název akce: | Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203 |
| Císlo akce SMVS: | 114V222008005 |
| Objednatel: | CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje |
| Zhotovitel: | Zlínstav, a.s. |
| Projektant: | Ateliér Velehradský, s.r.o. |
| Předmět změnového listu | |
| Změny v důsledku revize PD elektronické komunikace | |
| Část díla dotčená změnovým listem | |
| SO-01 Objekt požární stanice, SO 02 Garáže | |
| Popis změny, popis technického řešení | |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace : | |
| Dle smluvní dokumentace a rozpočtu nejsou součástí všechny položky k části místní rozhlas, nejsou zkoordinovány systémy EKV, docházkový systém a systém PZTS. | |
| Nové řešení, zdůvodnění změny : | |
| S ohledem na výše uvedené byla provedena revize PD elektronické komunikace včetně zapracování uživatelských požadavků, současně byly doplněny chybějící položky v rozpočtu, změna zahrnuje: | |
| 1. Místní rozhlas (MR) - doplněny chybějící položky v rozpočtu č.9,10,11,12, | |
| 2. Docházkový systém a elektronická kontrola vstupu (EKV) – původní PD počítala s docházkovým systémem na čip Dallas, což neodpovídá současně zaváděnému systému pracujícímu se služebními průkazy, kontrola vstupu bude sloučena se systémem PZTS. | |
| 3. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) – zapracovány požadavky uživatele. | |
| 4. Pobočková telefonní ústředna (PbÚ) - odečteny nepotřebné telefony, v současnosti jsou u zadavatele používány jiné typy telefonních přístrojů. | |
| 5. Nebude dodáváno zařízení PCO NAM a tablo LED, neboť objednatel využije stávající z objektu stanice Přerov, Šířava (pol. 180, 242). | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci : | |
| Beze změny. | |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: | |
| Zápis z KD č.13 až 18, bod 6. Ostatní pod bod 13.6.4. a zápis z KD č.23 až 56, bod 6. Ostatní pod bod 23.6.1. | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | |
| Vliv na termín: | Beze změny. |
| Vliv na kvalitu díla: | Beze změny. |
| Vliv na cenu: | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | |
| DPH: | |
| Cena díla vč. DPH: | |
| Datum: 27.1.2020 | Datum: 27.1.2020 |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: | |
| | Datum: 27.1.2020 |
