

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 426/00066001/2016/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **DOT servis s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim

IČ: 28893492

DIČ: CZ28893492

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 151531

Jednající: Ing. Tomáš Kaftan, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kaftan, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.8.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/338 HORUŠICE – přestavba havarijního mostu 338-x na propustek**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu realizace stavebních prací došlo ke změnám v soupisu prací a výkazu výměr, konkrétně ke zrušení SO 501 Přeložka STL Plynovodu (dále jen „**Méněpráce**“).
3. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se v souladu s články 6.6. a 8.2. Smlouvy o dílo Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
4. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací jak je stanoveno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Články 8.2. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:
2. Plnění v podobě SO 431 Přeložka veřejného osvětlení Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel Zhotovitel uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Objednatel předpokládá rozsah těchto nákladů pro potřeby Zakázky činí 86 617,25 Kč včetně DPH. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí odsouhlasení výše nákladů Objednatel a (ii) předložení příslušných daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených majitelem příslušné sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH. Pokud má být skutečná výše nákladů na SO 431 Přeložka veřejného osvětlení vyšší, než předpokládaný rozsah uvedený v tomto odst. Smlouvy, je podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotovitel rovněž předchozí realizace potřebné změny během výstavby postupem obdobně dle odst. 6.6 Smlouvy.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby 1 – SO 501 Přeložka STL Plynovodu

V Říčanech dne 30.9.2016  
Objednatel:

V Praze dne  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**DOT servis s.r.o.**  
Ing. Tomáš Kaftan, jednatel

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>II/338 HORUŠICE-přestavba havarijního mostu 338-x na propustek</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 501 Přeložka STL Plynovodu</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO-501 / 1</b>	Číslo změny stavby:  <b>1</b>
Objednatel:      název: <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b> adresa: <b>Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov</b> IČ: <b>000 66 001</b>  Zastoupený:     název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:      název: <b>DOT servis, s.r.o.</b> adresa: <b>Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim</b> IČ: <b>28893492</b>		

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„II/338 HORUŠICE-přestavba havarijního mostu 338-x na propustek“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 501 Přeložka STL Plynovodu

Číslo změny stavby:

1

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:  
SO-501 / 1

Strany smlouvy o dílo č. 355/KSUS/2016 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.6.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: 3K značkys.r.o.

Obsah:

Krycí list

Evidenční list změny stavby

Zápis o změně stavb

Pasport změn

1
1
1
1

Paré č.

Příjemce

1,2,3

Objednatel

4,5

Zhotovitel

Iniciátor změny: Objednatel na základě jednání na místě stavby a dle vydaného stanoviska správce IS nepožaduje provádět realizaci výškové přeložky STL Plynovodu.







Popis a zdůvodnění změny:

Přeložka STL plynovodu, která byla obsahem plnění zhotovitele v rámci SO 501 nebude realizována. Důvodem je stanovisko správce plynovodu - RWE Distribuční služby, s.r.o., které dle vyjádření autorizovaného dozoru č. 1415-15-3 RO ze dne 22.9.2016 nepožaduje realizovat plánovanou výškovou přeložku dle stanoviska PDS 5001264360. Přesná výšková poloha plynovodu a vzájemná poloha s budovaným propustkem byla zjištěna až po provedení výkopových prací a vyměření základové spáry budovaného propustku. Objekty nejsou v kolizi. Odstoupení od realizace přeložky bylo objednatelem akce oznámeno společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. dopisem dne 15.11.2016. Zhotoviteli stavby na tomto SO 501 nevznikly žádné náklady.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
160 483,05	0,00	-160 483,05

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Vaja	datum	30.9.2016	podpis	
Objednatel MT KSUS Sk oblast Kutná Hora	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	30.9.2016	podpis	
Objednatel - TDI	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum	30.9.2016	podpis	
Objednatel - vedoucí mostních techniků	jméno	Miroslav Dostál Jr.	datum	30.9.2016	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel - ředitel KSUS Sk	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	30.9.2016	podpis	
Zhotovitel - jednatel společnosti	jméno	Ing. Tomáš Kaftan	datum	30.9.2016	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3

# ZAPIS

Příloha č. 3

## o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č. 1

Název stavby:

**„II/338 HORUŠICE-přestavba havarijního mostu 338-x na propustek“**

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 501 Přeložka STL Plynovodu**

Údaje v Kč bez DPH

**Cena stavby dle smlouvy**

1 - zadat

**5 844 858,18**

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 844 858,18</b>	<b>0,00</b>

**Číslo změny SO/PS:**

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
	<b>-160 483,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Nová cena SO/PS po této změně:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena stavby po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	<b>-160 483,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 684 375,13</b>	<b>-160 483,05</b>


**Vyjádření - souhlas se změnou**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):      Ing. Petr Vaja      souhlasím

Zástupce objednatele (stavební dozor):      Ing. Jan Pavlita      souhlasím


Zástupce objednatele (mostní technik):      Ing. Milan Jeřábek      souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:      Miroslav Dostál Jr.      souhlasím



**DOT servis s.r.o.**  
Průmyslová 1513  
258 01 Vlasina  
IČO: 28893492 DIČ: CZ28893492

**ATEM PROJEKTOVÁNÍ**  
STAVEBNÍ PRÁCE STAVEB s.r.o.  
Průmyslová 34B  
Praha 4 - Michle



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
příspěvková organizace  
Zborovská 11      150 21 Praha 5  
IČO: 00088091      DIČ: CZ00088091

<b>PASPORT ZMĚNY V PDPS - MĚNĚPRÁCE</b>		Počet příloh: 3
<b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby) II/338 HORUŠICE-přestavba havarijního mostu 338-x na propustek		<b>SO/PS:</b> (číslo a název) SO 501 - most
<b>Název změny:</b> ZBV č. 1		<b>Kategorie <sup>*)</sup></b> <b>A, D</b>
<b>Kdo požadoval:</b> (organizace, jméno) KSÚS Středočeského kraje, p.o.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. Stanovisko provozovatele (PDS) - RWE ze dne 23.9.2016	
<b>Podrobný technický popis změny/úpravy:</b> SO 501 Přeložka STL Plynovodu nebude realizována		
<b>Zdůvodnění změny/úpravy:</b> Po odstranění havarijní k-ce mostu bylo zjištěno, že budovaný propustek není ve výškové kolizi se stávajícím plynovodem. Přeložku stávajícího vedení STL Plynovodu není třeba realizovat.		
<b>Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:</b> SO 501 Přeložka STL Plynovodu		
<b>Genový dopad změny/úpravy v rámci objektu:</b>		-160 483,05 Kč
<b>Genové ovlivnění sousedních objektů:</b>		ne
<b>Poznámky:</b>		
<b>Příloha:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stanovisko RWE zn. 5001382707</li> <li>2. Vyjádření projektanta - AD zn 1415-15-3 RO</li> <li>3. Oznámení o nerealizaci přeložky - zn 11.15.1/KSUS/KHT/JER</li> </ol>	

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření



The energy to lead

MDS PROJEKT s.r.o.  
Försterova 175  
566 01 Vysoké Mýto

naše značka  
5001382707

vyřizuje  
Daniel Bělohávek

datum  
23.09.2016

Věc:

**II/338 Horušice-přestavba havarijního mostu 338-XX na propustek  
SO 501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU, Horušice p.č. 1992/1**  
Obec: Horušice

Ulice: Horušice

K.ú. - p.č.: Horušice-1992/1, 2020/4, 1982/1, 122

Stavebník: Středočeský kraj, Zborovská 81, 15000 Praha

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Na základě jednání na místě stavby a vyjádření autorizovaného dozoru č. 1415-15-3 RO ze dne 22.9.2016 PDS nepožaduje realizaci výškové přeložky odsouhlasené dne 7.3.2016 stanoviskem PDS 5001264360. V souladu s čl.VI. odst.3 smlouvy 2000163490 (16/291/KH/Jer/VP) je stavebník oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeložky PZ s distribuční soustavou.

Podmínky pro realizaci stavby v ochranném pásmu plynárenského zařízení 5001263581 z 8.3.2016 tímto nejsou dotčeny. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T +42053221111  
F +420545578571  
E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

# RWE

The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001382707 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Daniel Bělohávek  
technik přípoj. a rozvoje PZ-Čechy východ  
odbor přípoj. a rozvoj PZ-Čechy východ  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420495060461  
[daniel.belohlavek@rwe.cz](mailto:daniel.belohlavek@rwe.cz)

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



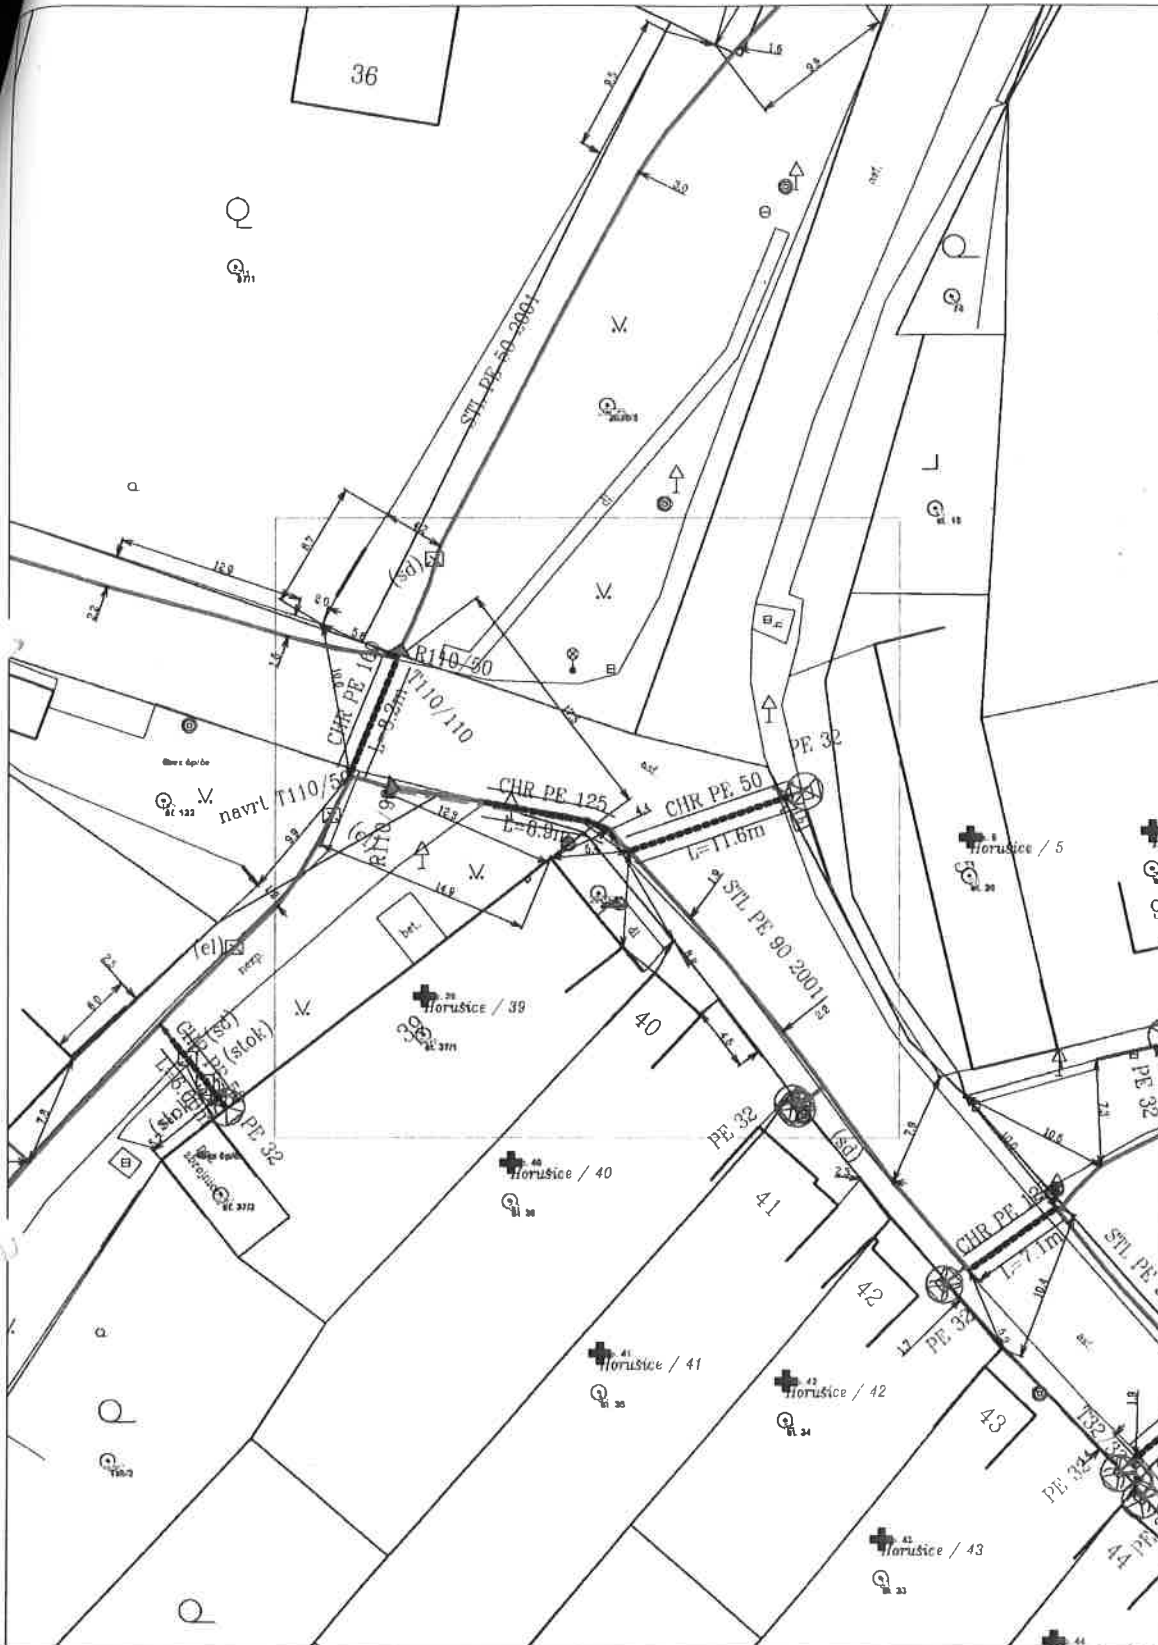

**Legenda:**

	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	NTU/STU/VTU		kabel		anodové uzemnění
	VVTL		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				

**Ing. Jan Dobrovolný****DOT servis s.r.o.**  
Průmyslová 1813  
258 01 VlašimVaše značka / Your reference  
[ABCD1234]Naše značka / Our reference  
1415-15-3 RODatum / Date  
22.9.2016**II/338 Horušice – přestavba havarijního mostu ev. č. 388-xx na propustek****2016-9-22: Vyjádření AD k přeložce plynovodu (SO 501 – Přeložka plynovodu)**

V projektové dokumentaci DUR, DSP a následně i PDPS akce „II/338 Horušice – přestavba havarijního mostu ev. č. 388-xx na propustek“ byla z důvodu kolize vedení STL plynovodu s konstrukcí mostu navržena přeložka plynovodu. V době projektování totiž nebyly známi podklady o výškovém vedení trasy STL plynovodu, takže z důvodu budoucí kolize s novou konstrukcí propustku byla naprojektována jeho výšková přeložka.

Po odhalení základové spáry nové konstrukce propustku bylo zjištěno, že stávající vedení STL plynovodu se nachází pod touto základovou sparou, tzn. nebude v kolizi s konstrukcí propustku.


Pokud budou dodrženy podmínky správce sítě STL plynovodu, tzn. RWE Distribuční služby s.r.o. (zhotovitel musí vyzvat správce sítě k písemnému vyjádření), požadavky investora a TDI, lze od přeložky plynovodu upustit. Správce sítě musí vydat stanovisko, že přeložku není nutné provádět.

Výše uvedené změna nemá vliv na vlastní konstrukci propustku ani stavební práce.

**Ing. Martin Roušar**  
Projektant

Ve Vysokém Mýtě dne: 22.9.2016

Razítko a podpis:



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**RWE Distribuční služby, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno**

Váš dopis značky/ze dne  
5001382707(D.Bělohávek)

Naše značka  
11.15.1/16/KSUS/KHT/JER

Vyřizuje  
Ing. M.Jeřábek

Telefon  
724 342 788

**Věc: Realizace přeložky STL plynovodu ID 986059 při realizaci naší stavby – dle Smlouvy o zajištění přeložky č. 2000163490 (č.stavebníka 16/291/KH/Jer/VP)**

**Stavba: II/338 Horušice – přestavba havarijního stavu mostu 338-xxx**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje na základě jednání na místě stavby a vyjádření autorizovaného dozoru č. 1415-15-3 RO ze dne 22.9.2016 PDS a stanoviskem vydaným pod Zn. 5001382807 nepožaduje, v souladu s čl. VI. odst.3 smlouvy 2000163490 (č.stavebníka 16/291/KH/Jer/VP) realizaci výškové přeložky odsouhlasené dne 7.3.2016 stanoviskem PDS 5001264360. Důvodem je zjištění, že stávající vedení STL plynovodu není v kolizi se stavbou – konstrukcí budovaného propustku.

V souvislosti s touto realizovanou stavbou stavbou dále předávám **informaci o záměru stavbu „II/338 Horušice – přestavba havarijního stavu mostu 338-xxx“ uvést do provozu – kolaudačním řízením dne 20.12.2016.**

Zřízení Věcného břemene bude provedeno v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. oprávněného – 8800083306/2/BVB/P (povinného 16/292/KH/Jer/BS) po dodání zaměření skutečného stavu dotčeného plynárenského zařízení a zaměření skutečného provedení stavby (propusku) s geometrickým plánem pro oddělení pozemků. Zaměření skutečného stavu plynárenského zařízení dodá budoucí oprávněný a geometrický plán pro oddělení (právo služebnosti) dodá potom stavebník stavby „II/338 Horušice – přestavba havarijního stavu mostu 338-xxx“ – Krajská správa a údržba silnic.

V Kolíně dne 15.11.2016

Příloha:

1. Titulní listy smluv „...O zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ a „... O budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“
2. Dopis Zn. 5001382707 RWE ze dne 23.9.2016
3. Vyjádření projektanta stavby – MDS PROJEKT – Zn.1415-15-3 RO

S pozdravem

Ing. Milan Jeřábek  
Mostní technik – oblast Kutná Hora

Bank. spoj.: 7730161/0100  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (107)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Telefon: +420 724 342 788

E-mail: milan.jerabek@ksus.cz
