

DODATEK č.3

ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2016

na akci „Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/482“
zak.č. stavby 23 519 01

mezi objednatelem **Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené**
Praha 1, Maltézské nám. 14
a zhotovitelem **KONSIT, a.s.**
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Tímto dodatkem se mění a doplňuje uzavřená smlouva následovně :

ad III. Doba plnění:

Doba plnění díla se prodlužuje do 28.2.2017 , dle aktualizovaného časového harmonogramu prací – příloha č.1.

Přílohy : příloha č.1 – aktualizovaný časový harmonogram prací

Ostatní podmínky základní smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.


V Praze dne *6.1.2017*
Za objednatele

Za zhotovitele :


MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka

Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva

**KONZERVATOŘ JANA DEYLA
A STŘEDNÍ ŠKOLA
PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ**
Maltézské náměstí 14
118 44 Praha 1 - Malá Strana



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Květen 2016	červen 2016	červenec 2016	srpen 2016	září 2016	říjen 2016	listopad 2016	prosince 2016	2017	leden 2017	únor 2017	březen 2017	
1	Konzevace Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené - celková rekonstrukce	287 dny	18.8.16	28.2.17													
2	Podpis smlouvy o dílo	1 den	18.8.16	18.8.16													
3	Převzetí staveniště, přípravné práce	14 dny	19.8.16	1.9.16													
4	Bourací práce, demoliže	108 dny	28.8.16	5.9.16													
5	Zaměření oken, vyhotovení výrobní dokumentace	10 dny	6.9.16	15.9.16													
6	Statické úpravy, systémy konstrukce a přízdoby	120 dny	15.9.16	12.10.16													
7	Profese (ZTI, ÚT, ELEKTRO, VZT, MARI)	166 dny	10.9.16	22.1.17													
8	Vnitřní povrchové úpravy	64 dny	28.8.16	30.10.16													
9	Hrubé podlahy	72 dny	17.9.16	27.11.16													
10	Podlahy SDK	42 dny	24.10.16	4.12.16													
11	Technologická přestávka na vyschnutí betonové mrazeni	30 dny	29.10.16	27.11.16													
12	Nová konstrukce střešy	82 dny	20.7.16	9.10.16													
13	Dodávka a osazení oken	21 dny	15.8.16	4.9.16													
14	Náštavné plochy	40 dny	28.11.16	6.1.17													
15	Akustické obklady a podhledy	40 dny	5.12.16	13.1.17													
16	Kompletace, dokončovací práce	41 dny	13.12.16	22.1.17													
17	Zkušební provoz, oživení	28 dny	15.1.17	11.2.17													
18	Údání vad a nedodátek	2 dny	7.2.17	8.2.17													
19	Odstranění vad a nedodátek	17 dny	9.2.17	25.2.17													
20	Kontrola odstranění vad a nedodátek	7 dny	21.2.17	27.2.17													
21	Předání a převzetí - dokončení díla	1 den	28.2.17	28.2.17													

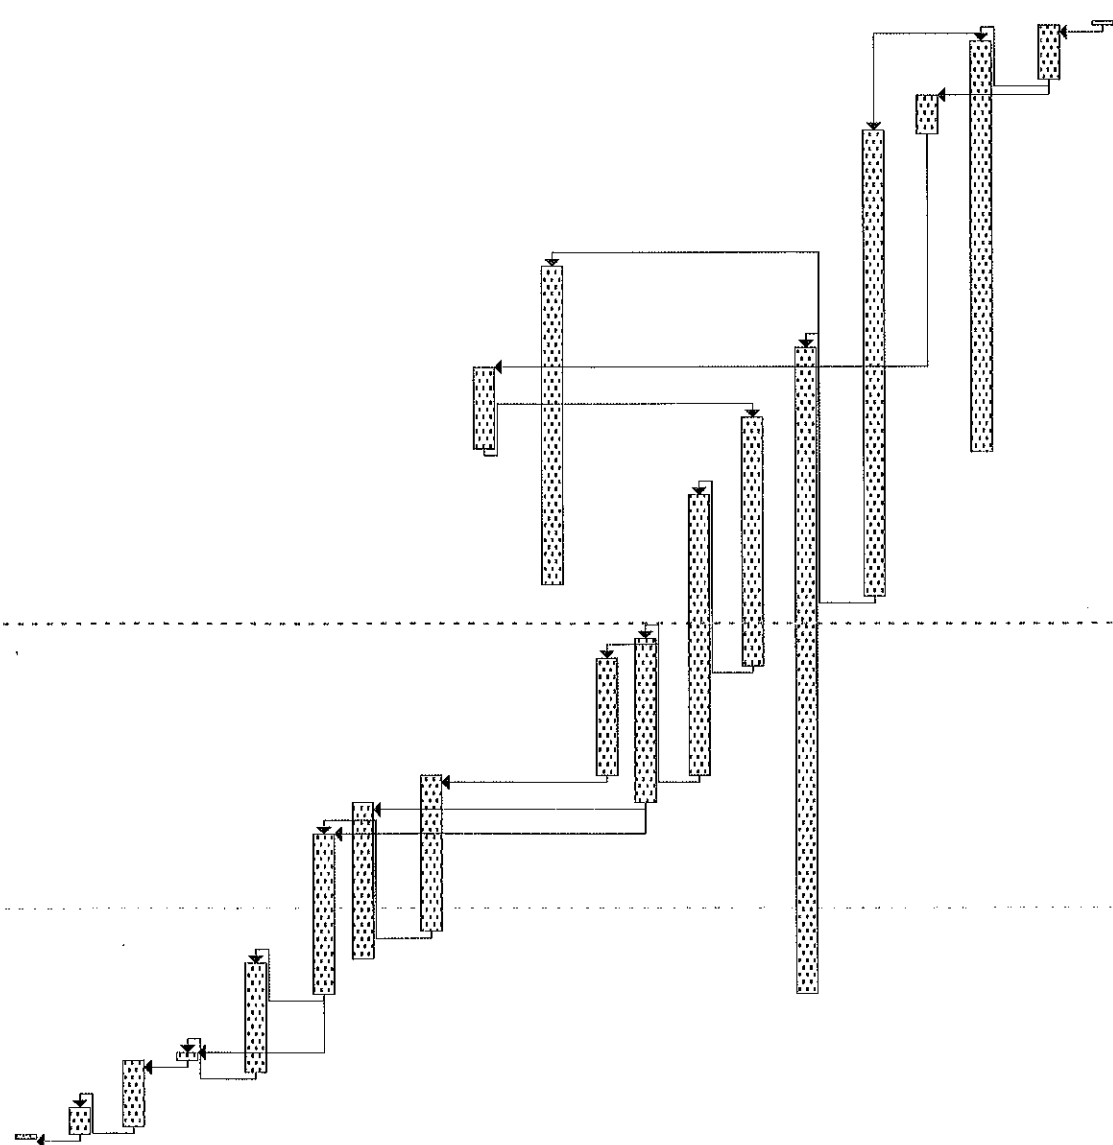

Úkol Souhrnny
 Průběh Zahnutý úkol
 Mínik Zahnutý mínik
 Zahnutý průběh
 Rozdělení
 Vnější úkoly
 Souhrnny projekt
 Seeskupit podle souhrnu
 Konečný termín
