

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL25

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer

Datum: 18. 2. 2020

Předmět změny: Střecha nad JS č. 7 doplnění krovu a zdíva po obvodu.
Dotčené místo: **Budova "A" - střecha JS č. 7**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **53,592.97 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Střecha nad JS č. 7 doplnění krovu a zdíva po obvodu.
Důvod: Při bourání stávající střechy bylo zjištěno, že atikové zdivo nevykazuje soudržnost a pevnost; tesařské práce v podobě nového krovu byly nutné z důvodu možného zatékání vody do zdíva přilehlé budovy KS
Výsledek: Demontáž konstrukce krovu a následná nová montáž krovu vč. záklopu, tepelné izolace a zednických prací

Cena:

Přípočty: 53,592.97 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	53,592.97 Kč	(bez DPH)
DPH	11,254.52	(DPH)
CENA VC. DPH	64,847.49 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.

Podpis souhlas *AKO* Datum: 20.2.2020

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

souhlas *AKO* Datum: 20.2.2020

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas *AKO* Datum: 20.2.2020

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

souhlas *AKO* Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

25 - Střecha nad JS č. 7 doplnění krovu a zdiva po obvodu.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXX XXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53,592.97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

25 - Střecha nad JS č. 7 doplnění krovu a zdiva po obvodu.

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53,592.97

HSV - Práce a dodávky HSV

24,960.53

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15,899.04

4 - Vodorovné konstrukce

1,364.00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

261.36

99 - Staveništní přesun hmot

4,780.78

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

2,046.05

96 - Bourání konstrukcí

609.30

PSV - Práce a dodávky PSV

28,632.44

713 - Izolace tepelné

1,073.50

762 - Konstrukce tesařské

27,558.94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síní č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

25 - Střecha nad JS č. 7 doplnění krovu a zdiva po obvodu.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

53,592.97

D		HSV	Práce a dodávky HSV				24,960.53
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				15,899.04
0	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	4.39200	3,620.00	15,899.04
D		4	Vodorovné konstrukce				1,364.00
0	K	411386621	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	2.00000	682.00	1,364.00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				261.36
136	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0.60000	355.00	213.00
137	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0.60000	80.60	48.36
D		99	Staveništní přesun hmot				4,780.78
128	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8.07428	592.10	4,780.78
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2,046.05
40	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1.06766	253.00	270.12
41	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2.13532	57.50	122.78
42	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1.06766	148.96	159.04
43	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20.28554	6.47	131.25
44	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1.06766	241.50	257.84
45	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10.67660	34.50	368.34
46	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1.06766	172.50	184.17
47	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr	t	1.06766	517.50	552.51
D		96	Bourání konstrukcí				609.30
15	K	96-004.RXX	Průrazy stropem/ střechou pro potrubí pl. do 0,25 m2	kus	2.00000	224.65	449.30
17	K	96-006.RXX	Úpravy potrubí	m	2.00000	80.00	160.00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				28,632.44
D		713	Izolace tepelné				1,073.50
129	K	713141124R00	Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrstvá	m2	3.45000	96.97	334.55
133	M	63166771	pás tepelně izolační mezi krokve $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	3.79500	190.00	721.05
118	K	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	8.07428	2.22	17.90
D		762	Konstrukce tesařské				27,558.94
123	K	762330112RAA	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn. hranoly 10 x 14 cm, včetně dodávky	m	77.75000	296.61	23,061.43
134	K	762351911	Výměna u komínu	m	1.80000	675.05	1,215.09
127	K	762810024	Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	6.90000	338.00	2,332.20
33	K	762900030RAB	Demontáž krovu (púdorysná plocha)	m2	3.45000	260.40	898.38
124	K	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	8.07428	6.42	51.84

Príloha č. 1-2L25

 - doplnení zotava a krovu

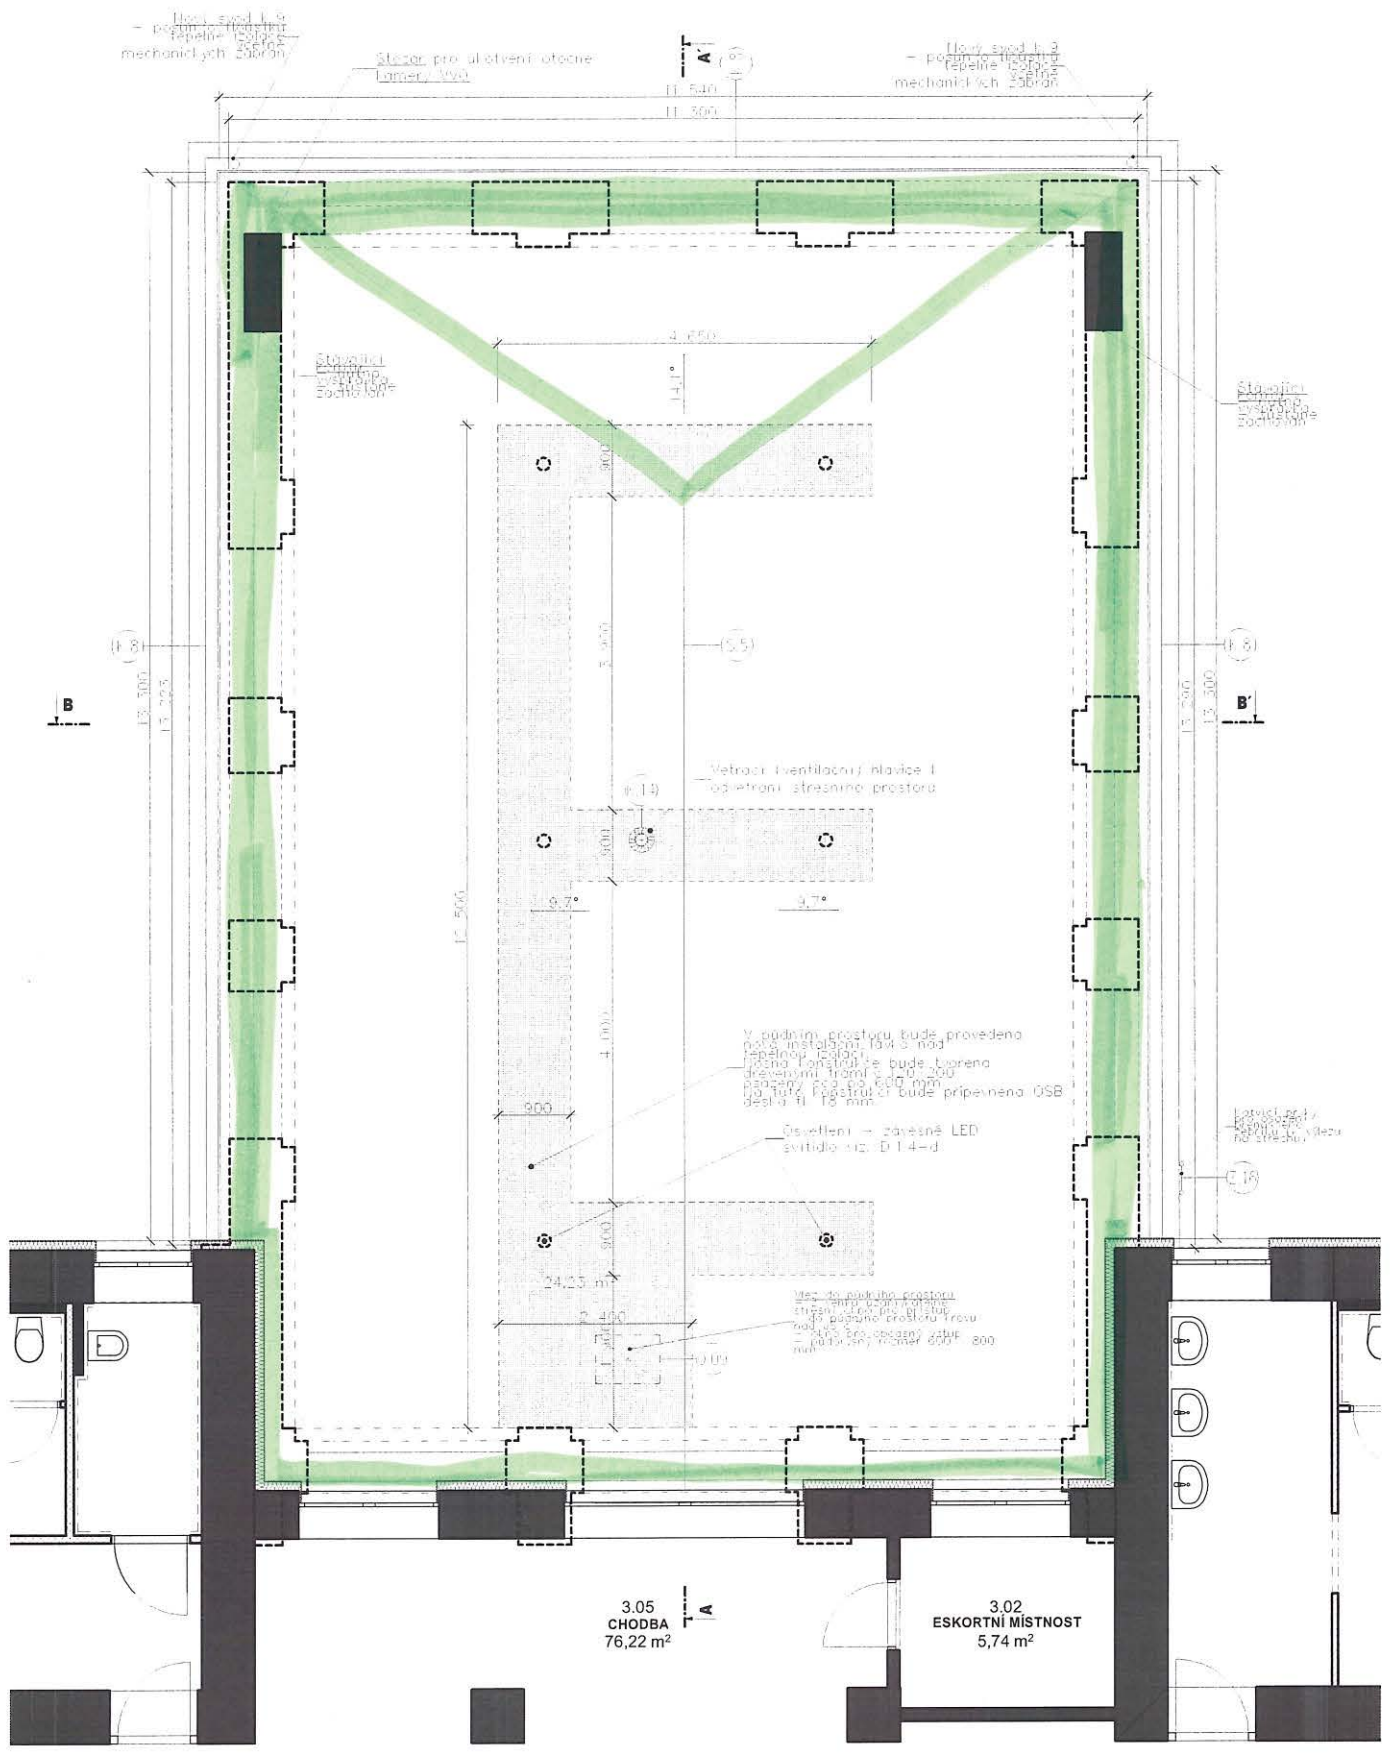

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL26**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Doplnění schůdků na střechu z místnosti č. 2.04.
 Dotčené místo: **Budiva "A" - střecha JS č. 7**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **3,600.00 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Doplnění schůdků na střechu z místnosti č. 2.04

Na základě provedení nové skladby střešní konstrukce, bylo zjištěno, že výstup na střechu z prostoru místnosti č. 2.04 není bezpečný proto bylo nutné provést doplnění schůdků, které jsou trvale uchyceny na obvodovou kci objektu.

Důvod: místnosti č. 2.04 není bezpečný proto bylo nutné provést doplnění schůdků, které jsou trvale uchyceny na obvodovou kci objektu.

Výsledek: Dodávka a montáž ocelových schůdků.

Cena:

Přípočty: 3,600.00 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	3,600.00 Kč	(bez DPH)
DPH	756.00	(DPH)
CENA VC. DPH	4,356.00 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.Podpis *AWO* Datum: 20.2.2020**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravěsouhlas *AWO* Datum: 20.2.2020**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdinasouhlas *AWO* Datum: 20.2.2020**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.souhlas *AWO* Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

26 - Doplnění schůdků na střechu z místnosti č. 2.04.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXX XXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3,600.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL 2

Soupis: **26 - Doplnění schůdků na střechu z místnosti č. 2.04.**

Místo:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3,600.00

N00 - Nepojmenované práce

3,600.00

N01 - Nepojmenovaný díl

3,600.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

26 - Doplnění schůdků na střechu z místnosti č. 2.04.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3,600.00
D	N00		Nepojmenované práce				3,600.00
D	N01		Nepojmenovaný díl				3,600.00
0	K	767010003	D+M schůdků na střechu	sb	1.00000	3,600.00	3,600.00

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL27**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Zvětšení ocelového rámu pro světla výrobek Z13.
 Dotčené místo: **Budova "A" - střecha**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **8,150.00 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Zvětšení ocelového rámu pro světla výrobek Z13.
 Důvod: S ohledem na umístění světel a jejich velikost, natočení je nutné zvětšit ocelový rám světel. Světla osvětlují celý vazební věznice - požadavky na osvětlení VVO.
 Výsledek: Úprava ocelového rámu pro osazení světel.

Cena:

Přípočty: 8,150.00 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	8,150.00 Kč	(bez DPH)
DPH	1,711.50	(DPH)
CENA VC. DPH	9,861.50 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.odpis souhlas *AKO* Datum: 20.2.2020**Obíednatel:** CR - Krajský soud v Ostravěsouhlas *AKO* Datum: 20.2.2020**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdinasouhlas *AKO* Datum: 20.2.2020**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.souhlas *AKO* Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

27 - Zvětšení ocelového rámu pro světla výrobek Z13.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXX XXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8,150.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL 2

Soupis: **27 - Zvětšení ocelového rámu pro světla výrobek Z13.**

Místo:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8,150.00

767 - Konstrukce zámečnické

8,150.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: 27 - Zvětšení ocelového rámu pro světla výrobek Z13.

Místo: Datum:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8,150.00

D		767	Konstrukce zámečnické				8,150.00
0	K	767010002	Rozšíření rámu pro pár světél Z/13	ks	5.00000	1,630.00	8,150.00

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL28**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změn: Profilace SDK kazetového stropu v JS č. 7.
 Dotčené místo: **Budova "A" - JS č. 7**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **45,100.00 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Profilace SDK kazetového stropu v JS č. 7.
 Skutečnost zjištěná na stavbě tj. rozdílné prostorové řešení stěny jednací síně (proto je nutná profilace po obvodu místnosti) a kolize šikmého ztužení ocelové konstrukce (pro zakrytí ocelové konstrukce je nutné snížení SDK podhledu o 120 mm).
 Důvod: po obvodu místnosti) a kolize šikmého ztužení ocelové konstrukce (pro zakrytí ocelové konstrukce je nutné snížení SDK podhledu o 120 mm).
 Výsledek: Zhotovení SDK "pilířů" po obvodu jednací síně a snížení SDK podhledu.

Cena:

Přípočty: 45,100.00 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	45,100.00 Kč	(bez DPH)
DPH	9,471.00	(DPH)
CENA VC. DPH	54,571.00 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.podpis souhlas *AWO* Datum: 20.2.2020**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravěsouhlas *AWO* Datum: 20.2.2020**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdinasouhlas *AWO* Datum: 20.2.2020**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.souhlas *AWO* Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

28 - Profilace SDK kazetového stropu v JS č. 7.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXX XXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45,100.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: **28 - Profilace SDK kazetového stropu v JS č. 7.**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45,100.00
PSV - Práce a dodávky PSV	45,100.00
763 - Konstrukce suché výstavby	45,100.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

28 - Profilace SDK kazetového stropu v JS č. 7.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45,100.00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45,100.00
D	763		Konstrukce suché výstavby				45,100.00
0	K	76301R001	D+M SDK pilířů po obvodu jednací síně	bm	41.00000	1,100.00	45,100.00

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL29**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Dodatečná úprava střechy v místě okapové části.
 Dotčené místo: **Budova "A" - střecha S4**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **22,172.34 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Dodatečná úprava střechy v místě okapové části.
 Při provádění nového souvrství střechy - S4 bylo zjištěno, že okapová část nevykazuje pevnost a soudržnost (při osazování dřevěného hranolu střechy dochází k uvolňování betonu, který je nutné vybourat).
 Důvod: soudržnost (při osazování dřevěného hranolu střechy dochází k uvolňování betonu, který je nutné vybourat).
 Výsledek: Úprava okapové části spodní střechy - S4.

Cena:

Přípočty: 22,172.34 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	22,172.34 Kč	(bez DPH)
DPH	4,656.19 Kč	(DPH)
CENA VC. DPH	26,828.53 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.Podpis souhlas *ANO* Datum: *20.2.2020***Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravěsouhlas *ANO* Datum: *20.2.2020***Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.souhlas *ANO* Datum: *20.2.2020*

Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.souhlas *ANO* Datum: *20.2.2020*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

29 - Dodatečná úprava střechy v místě okapové části.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22,172.34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí


Objekt: ZL 2

Soupis: **29 - Dodatečná úprava střechy v místě okapové části.**

Místo:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22,172.34

HSV - Práce a dodávky HSV

1,605.43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,605.43

PSV - Práce a dodávky PSV

20,566.91

712 - Powlakové krytiny

345.35

764 - Konstrukce klempířské

20,221.56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

29 - Dodatečná úprava střechy v místě okapové části.

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

22,172.34

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1,605.43
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1,605.43
0	K	952903008	Čištění odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst	m2	1.00000	20.20	20.20
6	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0.86400	1,432.00	1,237.25
8	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	1.08000	322.20	347.98
D		PSV	Práce a dodávky PSV				20,566.91
D		712	Povlakové krytiny				345.35
30	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	10.80000	31.00	334.80
0	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3.34800	3.15	10.55
D		764	Konstrukce klempířské				20,221.56
0	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	3.00000	63.10	189.30
0	K	767-001.RXX	Doplnění dřevěné obvodové kce pod startovací hranol	soub	54.00000	364.48	19,681.92
146	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	196.82000	1.78	350.34

Priloha č. 1-21-29

úprava
okrajové časti
strechy

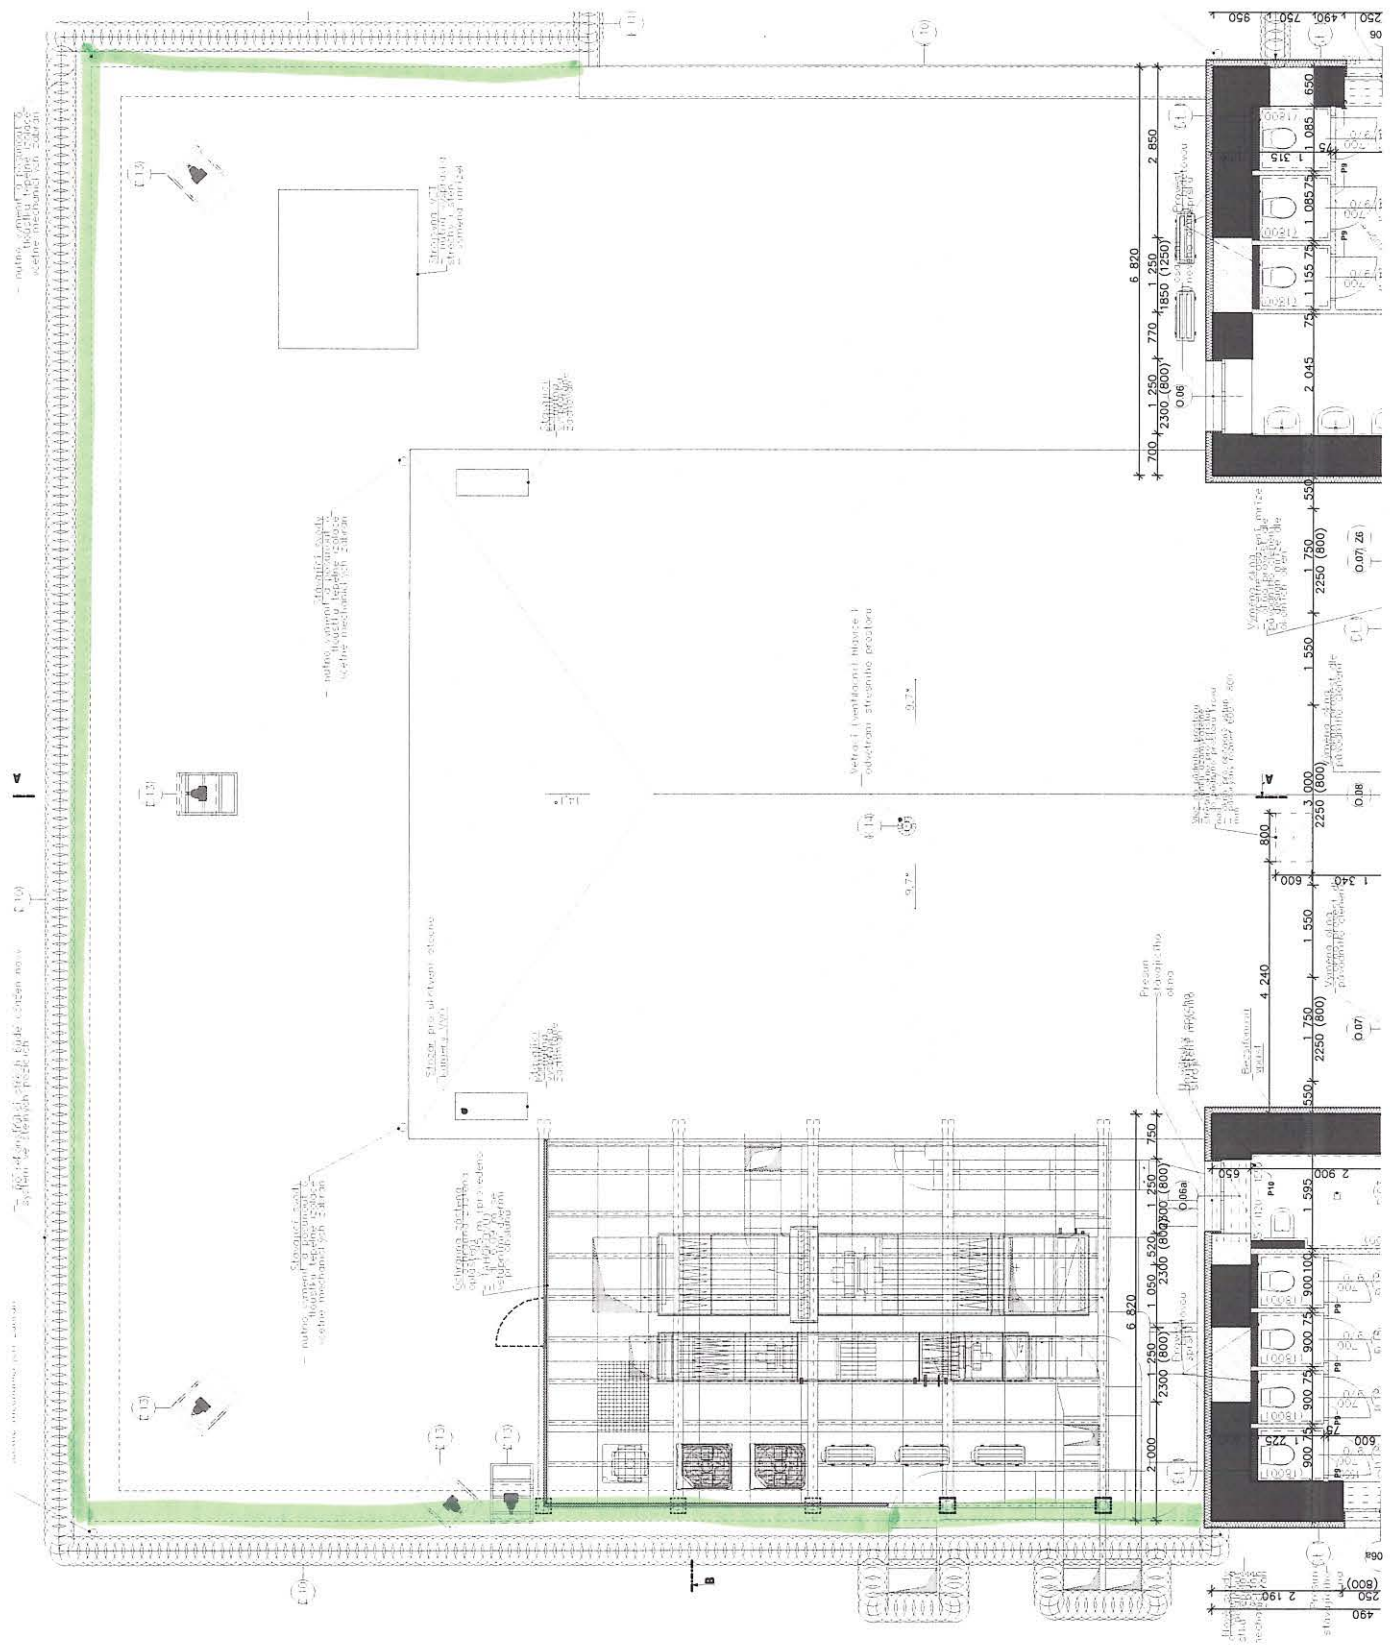

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL30

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer

Datum: 18. 2. 2020

Předmět změny: Změna nahrávání / pořízení záznamu zvuku a ozvučení jednací síně č.
Dotčené místo: Budova "A" - JS č. 7
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby:
Dopad do ceny díla dle SOD: (bez DPH)
Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Změna nahrávání / pořízení záznamu zvuku a ozvučení jednací síně č. 7.
Na základě uzavření rámcové dohody o poskytování plnění č. 40/2019-MSP-CES s firmou AV MEDIA, a.s. k datu 7. 5. 2019, která řeší jednotné nasazení záznamu zvuku pro jednací síně v rámci resortu MSP. Došlo k provedení změny návrhu oproti PD v nasazení stejného systému záznamu zvuku pro jednací síň č. 7, kdy dodavatel systému záznamu zvuku doporučil upravit i ozvučení JS č.7, z důvodu celkového sjednocení a dodávky jedním dodavatelem, za který bude tento dodavatel ručit.
Důvod: MSP. Došlo k provedení změny návrhu oproti PD v nasazení stejného systému záznamu zvuku pro jednací síň č. 7, kdy dodavatel systému záznamu zvuku doporučil upravit i ozvučení JS č.7, z důvodu celkového sjednocení a dodávky jedním dodavatelem, za který bude tento dodavatel ručit.
Výsledek: Změna systému záznamu zvuku a ozvučení JS č. 7.

Cena:

Přípočty: 1,412,699.00 Kč

Odpočty: -751,986.87 Kč

CENA CELKEM
DPH
CENA VC. DPH

660,712.13 Kč (bez DPH)
138,749.55 (DPH)
799,461.68 Kč (vč. DPH)

Přílohy:			
Krycí list		1	listů
Rekapitulace změn		1	listů
Specifikace změn		1	listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

Podpis		
Souhlas	AWO	Datum: 20.2.2020
Souhlas	AWO	Datum: 20.2.2020
Souhlas	AWO	Datum: 20.2.2020
Souhlas	AWO	Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích sálů č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

30 - Změna nahravání / pořízení záznamu zvuku a ozvučení jednacích sálů č. 7.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě


Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

660,712.13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

30 - Změna nahrávání / pořízení záznamu zvuku a ozvučení jednací síně č. 7.

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

660,712.13

M - Práce a dodávky M

660,712.13

21-M - Elektromontáže

660,712.13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

30 - Změna nahravání / pořízení záznamu zvuku a ozvučení jednací síně č. 7.

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							660,712.13
D	M		Práce a dodávky M				660,712.13
D	21-M		Elektromontáže				660,712.13
1	K	M21	AV Media x SKS X KSO	sb	1.00000	660,712.13	660,712.13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

30 - Změna nahrávání / pořízení záznamu zvuku a ozvučení jednací síně č. 7.

Úroveň 3:

a - Slaboproud odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-751,986.87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

30 - Změna nahrávání / pořízení záznamu zvuku a ozvučení jednací síně č. 7.

Úroveň 3:

a - Slaboproud odpočet

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-751,986.87

D19 - AV2 - Záznam zvuku a ozvučení

-751,986.87

D21 - ZÁZNAM ZVUKU

-751,986.87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

30 - Změna nahrávání / pořízení záznamu zvuku a ozvučení jednací síně č. 7.

Úroveň 3:

a - Slaboproud odpočet

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-751,986.87

D D19

AV2 - Záznam zvuku a ozvučení

-751,986.87

D D21

ZÁZNAM ZVUKU

-751,986.87

3	M	Pol614	Záznamový systém vč. základního příslušenství (1ks mikrofonu a identifikačního klíče obsluhy ID KEY budou dodány v základní ceně systému), čtyři synchronní zvukové soubory typu MP3 odděleně pro hlavní i záložní záznam, nastavitelná komprese a volitelný li	ks	-1.00000	36,300.00	-36,300.00
0	K	Pol615	Montáž a zapojení	ks	-1.00000	580.64	-580.64
0	K	Pol616	Konfigurace a zprovoznění	ks	-1.00000	580.64	-580.64
0	K	Pol617	Školení obsluhy	ks	-1.00000	290.84	-290.84
0	K	Pol618	Uživatelská nastavení, zkušební provoz	ks	-1.00000	290.84	-290.84
0	K	Pol619	Identifikační a aktivací klíč obsluhy, obsahuje SW aplikaci pro pořízení a zpracování záznamů	ks	-3.00000	9,900.00	-29,700.00
0	K	Pol620	HW USB klíč obsahující SW aplikaci pro zpracování čtyřstopových záznamů	ks	-3.00000	4,165.88	-12,497.64
0	K	Pol621	Přepisovací set - sluchátka a nožní pedál	ks	-1.00000	5,832.23	-5,832.23
4	M	Pol622	Mikrofon kompatibilní pro záznamové zařízení a vyvolávací systém	ks	-25.00000	7,500.00	-187,500.00
0	K	Pol623	Montáž a zapojení mikrofonu	ks	-25.00000	290.84	-7,271.00
0	K	Pol624	Instalace a zapojení kabeláže, včetně uložení	kpl	-25.00000	290.84	-7,271.00
0	K	Pol625	Mikrofonní napájení a vedení mikrofonních signálů, včetně uložného materiálu	kpl	-1.00000	580.64	-580.64
5	K	OZVUČENÍ	OZVUČENÍ		0.00000	0.00	0.00
6	M	Pol626	Mixážní pult včetně koncových zesilovačů	ks	-1.00000	245,000.00	-245,000.00
0	K	Pol615	Montáž a zapojení	ks	-1.00000	580.64	-580.64
0	K	Pol627	Konfigurace a zprovoznění	ks	-1.00000	298.08	-298.08
0	K	Pol628	Školení obsluhy	ks	-1.00000	357.08	-357.08
7	M	Pol629	Reproduktor dvoupásmový 20W, frekvenční rozsah 70Hz-20kHz, citivost 91dB, rozměry š160 x v230 x h145 mm, včetně nástěnného držáku, otočný přepínač pro volbu 100V/20W/10W/5W	ks	-20.00000	3,000.00	-60,000.00
0	K	Pol624	Instalace a zapojení kabeláže, včetně uložení	kpl	-11.00000	290.84	-3,199.24
0	K	Pol630	Montáž a zapojení reproduktoru	ks	-20.00000	309.47	-6,189.40
0	K	Pol631	Kabel reproduktorový průřez min. 2x1,5, včetně uložného materiálu., délka trasy cca 12m/reproduktor - dle akustické zkoušky a řešení umístění reproduktor	kpl	-20.00000	357.08	-7,141.60
8	M	Pol632	Reproduktor dvoupásmový 40W, frekvenční rozsah 70Hz-20kHz, citivost 91dB, rozměry š215 x v300 x h195 mm, včetně nástěnného držáku, otočný přepínač pro volbu 100V/40W/20W/10W	ks	-16.00000	4,200.00	-67,200.00
0	K	Pol630	Montáž a zapojení reproduktoru	ks	-16.00000	309.47	-4,951.52
0	K	Pol624	Instalace a zapojení kabeláže, včetně uložení	kpl	-16.00000	290.84	-4,653.44
0	K	Pol633	Kabel reproduktorový průřez min. 2x1,5, včetně uložného materiálu., délka trasy cca 12m/reproduktor - dle akustické zkoušky a řešení umístění reproduktorů	kpl	-16.00000	357.08	-5,713.28
11	K	vyv.systém	VYVOLÁVACÍ SYSTÉM		0.00000	0.00	0.00
12	M	Pol636	Modul vyvolávacího zařízení s integrovaným napájecím zdrojem a modul vyvolávacího tlačítka integrovaného do mikrofonní patice	ks	-1.00000	2,850.00	-2,850.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol637	Montáž a zapojení	ks	-1.00000	144.90	-144.90
0	K	Pol638	Konfigurace a zprovoznění	ks	-1.00000	238.05	-238.05
0	K	Pol617	Školení obsluhy	ks	-1.00000	290.84	-290.84
13	M	Pol639	<i>Mikrofon kompatibilní pro záznamové zařízení a vyvolávací systém</i>	ks	-1.00000	7,000.00	-7,000.00
0	K	Pol625	Mikrofonní napájení a vedení mikrofonních signálů, včetně úložného materiálu	kpl	-1.00000	580.64	-580.64
0	K	Pol623	Montáž a zapojení mikrofonu	ks	-1.00000	290.84	-290.84
0	K	Pol624	Instalace a zapojení kabeláže, včetně uložení	kpl	-1.00000	290.84	-290.84
14	M	Pol640	<i>Reproduktor dvoupásmový 40W, frekvenční rozsah 70Hz-20kHz, citlivost 91dB, rozměry š215 x v300 x h195 mm, včetně nástěnného držáku, otočný přepínač pro volbu 100V/40W/20W/10W</i>	ks	-1.00000	4,300.00	-4,300.00
0	K	Pol641	Kabel reproduktorový průřez min. 2x1,5, včetně uložného materiálu,, délka trasy cca 60m - dle akustické zkoušky a řešení umístění reproduktorů	kpl	-1.00000	11,664.45	-11,664.45
0	K	Pol630	Montáž a zapojení reproduktoru	ks	-1.00000	309.47	-309.47
0	K	Pol624	Instalace a zapojení kabeláže, včetně uložení	kpl	-1.00000	290.84	-290.84
15	M	Pol642	<i>UTAJOVANÝ SVĚDĚK - AUDIO ČÁST</i>		0.00000	0.00	0.00
16	M	Pol643	<i>Audio komponenty stávajícího systému utajovaného svědka (1x reproduktor, 1x zkreslovač hlasu, 1x mikrofon)</i>	kpl	0.00000	0.00	0.00
0	K	Pol645	Montáž a zapojení audio komponentů utajovaného svědka	kpl	-1.00000	28,566.00	-28,566.00
0	K	Pol646	Oživení a zprovoznění audio částí systému utajovaného svědka, včetně propojení s audiosystémem a záznamem zvuku jednací síně	kpl	-1.00000	1,190.25	-1,190.25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

30 - Změna nahravání / pořízení záznamu zvuku a ozvučení jednací síně č. 7.

Úroveň 3:

b1 - Slaboproud připočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1,412,699.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: 30 - Změna nahrávání / pořízení záznamu zvuku a ozvučení jednací síně č. 7.
Úroveň 3:
b1 - Slaboproud přípočet

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,412,699.00

HSV - HSV	0.00
D10 - Dodávka AV MEDIA položky z přílohy č.3 Rámcové dohody	1,412,699.00
D1 - Jednací síň	311,530.00
D3 - Protokolující úřednice	3,800.00
D4 - Školení na soudě	11,200.00
D6 - Ozvučení a vyvolávací systém	974,834.00
D12 - Dodávka -SKS s.r.o.	69,456.00
D18 - AV2 Záznam zvuku a ozvučení - ostatní náklady	41,879.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

30 Změna nahrávání / pořízení záznamu zvuku a ozvučení jednací síně č. 7.

Úroveň 3:

b1 - Slaboproud přípočet

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1,412,699.00

D	HSV	HSV					0.00
D	D10	Dodávka AV MEDIA položky z přílohy č.3 Rámcové dohody					1,412,699.00
D	D1	Jednací síň					311,530.00

2	K	Pol12	Mikrofon s husím krkem	ks	23.00000	4,205.00	96,715.00
3	K	Pol16	Mikrofon pro montáž do ohrádky pro řečníště	ks	1.00000	4,577.00	4,577.00
4	K	Pol23	Mikrofon pro sekundární záznam	ks	1.00000	5,338.00	5,338.00
5	K	Pol25	Mikrofon se stojanem pro mobilní stanoviště	ks	1.00000	4,296.00	4,296.00
6	K	Pol27	FAPS velký	ks	1.00000	96,561.00	96,561.00
7	K	Pol40	Ovládací panel	ks	1.00000	3,175.00	3,175.00
8	K	Pol41	Audiomonitor do JS	ks	2.00000	2,482.00	4,964.00
9	K	Pol42	Systém pro vyvolávání	ks	1.00000	3,300.00	3,300.00
10	K	Pol43	Informační cedule záznamu	ks	1.00000	2,425.00	2,425.00
11	K	Pol44	Sluchátka	ks	5.00000	1,220.00	6,100.00
12	K	Pol45	Záložní zdroj UPS	ks	1.00000	4,072.00	4,072.00
13	K	Pol46	Rack se zámkem nebo vestavný rack do stávající skříňky.	ks	1.00000	13,800.00	13,800.00
14	K	Pol47	Reprosoustava určena k montáži mimo JS na stěnu s možností nasměrování	ks	1.00000	3,300.00	3,300.00
15	K	Pol48	Audiokabel	m	630.00000	50.00	31,500.00
16	K	Pol49	Utajený svědek	ks	1.00000	26,501.00	26,501.00
17	K	Pol50	Mikrofon pro utajeného svědka	ks	1.00000	3,106.00	3,106.00
18	K	Pol51	DSP periferie do FAPS	ks	1.00000	1,800.00	1,800.00

D	D3	Protokolující úřednice					3,800.00
19	K	Pol52	USB nožní ovládací pedál	ks	1.00000	3,800.00	3,800.00

D	D4	Školení na soudě					11,200.00
20	K	Pol53	Školení na soudě	kpl	1.00000	11,200.00	11,200.00

D	D6	Ozvučení a vyvolávací systém					974,834.00
---	----	------------------------------	--	--	--	--	------------

21	K	1	Utajený svědek, doplnění 2xPoE switch v případě, že nejsou zajištěny nárokové porty s PoE	set	1.00000	5,460.00	5,460.00
2	K	Pol54	Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 12 symetrických vstupů / 8 symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC), digitální sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a 4	ks	3.00000	107,412.00	322,236.00
3	K	Pol55	8-port Desktop Gigabit Web Smart switch / 8x Gigabit metal / 4x PoE / PoE 60W	ks	1.00000	2,600.00	2,600.00
4	K	Pol56	Adaptér USB 3.0 na Giga LAN.	ks	1.00000	650.00	650.00
5	K	Pol57	Propojovací kabeláž audio mixážní matice.	set	1.00000	2,600.00	2,600.00
6	K	Pol58	Instalace rozšířeného audio systému.	set	1.00000	46,800.00	46,800.00
7	K	Pol59	Programování audio mixážní DSP matice a FAPS.	set	1.00000	74,100.00	74,100.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	Pol60a	"Pasivní sloupová line-array reprosoustava s minimální konfigurací: 8x1" + 4x2,25" 500W / 8Ω, 60 Hz - 16 kHz, pokrytí 150°x20° HxV, citlivost SPL 87 dB, rozměry do 990x200x250 mm, systémová EQ, vč. polohovatelného nástěnného držáku ±60° do stran a ±15°	ks	4.00000	52,125.00	208,500.00
9	K	Pol60	Sloupová line-array reprosoustava min 14x2", min. 300W / 8Ω, citlivost min 95 dB, freq. Rozsah min 80 Hz - 18 kHz, pokrytí min 140°x40° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 1100x100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do stran	ks	4.00000	36,959.00	147,836.00
10	K	Pol61	Koncový zesilovač 4x 600W_70/100V a 8/4Ω, 4x 300W_2/16Ω, DSP 96kHz, 32bit = vstupní router, zpoždění na vstupu 0-1000ms, zpoždění na výstupu 0-100ms, parametrický EQ na vstupu i výstupu, výhybka, limiter/, max. hluk chlazení 51 dBA SPL@1m, odstup signál/	ks	1.00000	78,252.00	78,252.00
11	K	Pol62	Kabeláž a konektory pro reproduktory.	set	1.00000	9,100.00	9,100.00
12	K	Pol63	Instalace reproduktorů, včetně pokládky kabeláže.	set	1.00000	41,600.00	41,600.00
13	K	Pol64	Úpravy v nastavení DSP a FAPS při instalaci reprosoustav.	set	1.00000	35,100.00	35,100.00

D D12 Dodávka -SKS s.r.o. 69,456.00

22	K	Pol613	Odpojení a demontáž prvků stávajícího ozvučení jednacích síní	kpl	1.00000	2,200.00	2,200.00
23	K	Pol65	Mikrofonní napájení a vedení mikrofonních signálů, včetně úložného materiálu	kpl	24.00000	537.00	12,888.00
24	K	Pol66	Ozvučení, instalace, včetně uložení	kpl	9.00000	268.00	2,412.00
25	K	Pol67	Kabelové trasy systému utajovaného svědka	kpl	1.00000	4,950.00	4,950.00
26	K	5	Ostatní nespecifikovaný materiál pro potřeby instalace AV systému	kpl	1.00000	3,150.00	3,150.00
27	K	6	Montáž ostatního materiálu	kpl	1.00000	3,416.00	3,416.00
28	K	Pol68	Drobný instalační a zapojovací materiál, montážní příslušenství	kpl	1.00000	2,625.00	2,625.00
29	K	8	Montáž drobného instalačního materiálu	kpl	1.00000	2,733.00	2,733.00
30	K	Pol69	Zesilovač pro indukční smyčku, výkon 300 VA, pro buzení plochy smyčky 400 – 800 m ² , 2 + 1 vstup, 250 – 12 000 Hz, nastavitelné úrovně všech vstupů + nastavení celkového zesílení	ks	1.00000	9,990.00	9,990.00
31	K	Pol651	Přijímač signálu indukční smyčky, vč. sluchátka, filtr pro omezení nízkých kmitočtů, nastavitelná hlasitost, indikace vybuzení, frekv. rozsah 85 – 6 000 Hz, doba provozu 100 h	ks	4.00000	2,770.00	11,080.00
32	K	Pol567	Montáž a zapojení	ks	1.00000	1,366.00	1,366.00
33	K	Pol568	Konfigurace a zprovoznění	ks	1.00000	2,255.00	2,255.00
34	K	Pol595	Školení obsluhy	ks	1.00000	627.00	627.00
35	K	Pol70	Indukční smyčka - kabel 7x1 (resp. využito 6x1), délka smyčky cca 60m,	kpl	1.00000	2,590.00	2,590.00
36	K	Pol654	Instalace a zapojení kabeláže, včetně uložení	kpl	1.00000	7,174.00	7,174.00

D D18 AV2 Záznam zvuku a ozvučení - ostatní náklady 41,879.00

37	K	Pol71	Realizační dokumentace (dokumentace zhotovitele stavby) - dle řešení a technologie dodavatele, montážní a výrobní dokumentace, svorková schémata, změny v projektu v průběhu stavby pro potřeby realizace	hod	12.00000	196.00	2,352.00
38	K	Pol656	Akustická zkouška audiosystému v jednacích síních s komponenty dle návrhu zhotovitele, včetně řešení umístění reproduktorů a případně dalších komponentů AV systému	kpl	1.00000	10,248.00	10,248.00
39	K	Pol72	Koordinační činnost, účast na kontrolních dnech v průběhu realizace	hod	12.00000	421.00	5,052.00
40	K	Pol73	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	6.00000	342.00	2,052.00
41	K	Pol74	Montážní práce, neuvedené v rozpočtových položkách	hod	6.00000	342.00	2,052.00
42	K	Pol75	Příprava pracoviště	hod	6.00000	256.00	1,536.00
43	K	Pol76	Úklid pracoviště	hod	6.00000	256.00	1,536.00
44	K	Pol610	Dopravní náklady, čas na cestě, přeprava materiálu	kpl	1.00000	7,183.00	7,183.00
45	K	Pol503	Zařízení staveniště	kpl	1.00000	2,050.00	2,050.00
46	K	Pol612	Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (fungování krajského soudu)	kpl	1.00000	5,466.00	5,466.00
47	K	Pol77	Dokumentace skutečného provedení	hod	12.00000	196.00	2,352.00

