

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: DIO / 1	Číslo ZBV: 2
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **ROBSTAV k.s.**
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4

IČ: 27430774

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	74 178,10	74 178,10

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	74 178,10	74 178,10

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

DIO / 1

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo č. 2086/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.s., mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	list
2. Změnový list	1	list
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	list
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	list
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	list
6. Přehled dalších dokladů	1	list
Další doklady	22	listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

DIO - upřesnění skutečného rozsahu dopravního značení

Při projednávání DIO před zahájením stavby nebyla úprava objízdných tras, která byla navržena v PDPS, odsouhlasena. Návrh musel být upraven a doplněn. Návrh dle ústních připomínek byl přepracován a dne 8.3.2019 schválen Policií ČR (Doklad č. 9). Jednalo se o doplnění SDZ a o 2 ks světelných výstražných ramp pro zabezpečení staveniště, z nichž každá obsahuje 3 výstražná světla. Následně toto bylo schváleno Rozhodnutím MÚ Votice - povolením navržené objízdné trasy (Doklad č. 10), kde je daná délka uzavírky od 1.4.2019- 31.7.2019.

Tato změna vznikla na základě požadavku třetí strany oprávněné změnu požadovat dle rozhodnutí Odboru dopravy Města Votice.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	74 178,10	74 178,10	74 178,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Petr Dusbaba	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Pešata	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jitka Kaštánková	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Stanislav Pohůnek	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák MPA	datum	podpis
--	-------	------------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	Ing. Michal Tichovský	datum	podpis
-------------------	-------	-----------------------	-------	--------

Číslo paré: 1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	DIO / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
156 389,52

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	156 389,52	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	74 178,10	74 178,10	47,43%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	230 567,62	74 178,10	47,43%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		jméno	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Petr Dusbaba		
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Jan Pešata		
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Jitka Kaštánková		
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Stanislav Pohůnek		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	souhlasím	Petr Heinrich		

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov													
Číslo a název SO/PS: DIO													
Číslo a název rozpočtu: DIO													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S	KUS	30,000	35,000	5,000	100,69	3 020,70		503,45	3 524,15	503,45	16,67
6	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	35,000	5,000	62,93	1 887,90		314,65	2 202,55	314,65	16,67
7	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KS/DEN	3 600,000	4 200,000	600,000	10,95	39 420,00		6 570,00	45 990,00	6 570,00	16,67
		NOVÉ POLOŽKY - JC dle OTSKP CÚ 2018											
9	916121	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	14 200,00	0,00		28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00
10	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	529,00	0,00		1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00
11	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KUS	0,000	244,000	244,000	153,00	0,00		37 332,00	37 332,00	37 332,00	100,00
		Celkem						44 328,60	0,00	74 178,10	118 506,70	74 178,10	167,34

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Dusbaba, stavbyvedoucí

Za Objednatele: Stanislav Pohůn

Datum: _____

Datum: _____

PŘEHLED ZAŘAZENÍ

Název a evidenční číslo Stavby: III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	8 575 343,93
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 432 119,34
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	11 412 864,40
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,72%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 1% pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (II), písm. b)	-0,05%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	756 775,41
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 602 603

- 1 -			- 2 -		
Vyhrazená změna (Doplňky)			Změna položek (Z)		
Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	
23	24	25=23+24	26	27	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27
		III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 přes potok u obce	- 4 411,83	761 187,24	756 775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1	Most - oprava RDS, kácení, úprava výměry živitních vrstev	- 4 411,83	687 009,14	682 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO	2	DIO - dla RDS	0,00	74 178,10	74 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		

oznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

ZMĚNY DO SKUPIN

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	5,46%
$10=(33A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupinu 4	3,37%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	765 599,07
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 337 671,97

$12=(37/1)*100$	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	149 224 000 Kč	0,00
$14=142688000/37$		149 224 000,00

	- 3 -				- 4 -				- 5 -	
	Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny do minimis	
Změny	Změny záporné (zadávat se změnou mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se změnou mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny do minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	Limit 15 %
$2p=23+27$	29	30	$32=29+30$	$32A=ABS(29)+30$	33	34	$36=33+34$	$36A=ABS(33)+34$	37	$38=(37/1)*100$
0,00	- 4 411,83	865 977,26	861 565,42	473 389,08	0,00	292 209,99	292 209,99	292 209,99	0,00	0,00%
0,00	- 4 411,83	394 789,15	390 387,31	398 210,98	0,00	292 209,99	292 209,99	292 209,99	0,00	0,00%
0,00	0,00	74 178,10	74 178,10	74 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%

Ev. č. a název stavby: III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

Číslo a název SO/PS: DIO

Číslo a název rozpočtu: DIO

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Komunikace</i>				
1	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	350,000	350,000	0,000
		<i>Komunikace</i>				
		<i>Ostatní konstrukce a práce</i>				
2	914462	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,000	8,000	0,000
3	914463	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000
4	914469	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	960,000	960,000	0,000
5	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM ZBV 2: navýšení výměry určuje odsouhlasené DIO (doklad č.9)	KUS	30,000	35,000	5,000
6	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ ZBV 2: navýšení výměry určuje odsouhlasené DIO (doklad č.9)	KUS	30,000	35,000	5,000
7	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ ZBV 2: navýšení výměry určuje odsouhlasené DIO (doklad č.9)	KSDEN	3 600,000	4 200,000	600,000
8	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	6,000	6,000	0,000
		<i>Ostatní konstrukce a práce</i>				
		<i>Nové položky - JC dle OTSKP 2018</i>				
9	916121	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ ZBV 2: výměru určuje odsouhlasené DIO (doklad č.9)	KUS	0,000	2,000	2,000
10	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ ZBV 2: výměru určuje odsouhlasené DIO (doklad č.9)	KUS	0,000	2,000	2,000
11	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ ZBV 2: výměru určuje odsouhlasené DIO (doklad č.9) a Rozhodnutí MÚ Votice (doklad č. 10) 4 měsíce (od 04 do 07) * 2 soupravy = 2*(30*2+31*2) -	KUS	0,000	244,000	244,000


ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
8	9	10	11	12	13	14
244,16	85 456,00	0,00	0,00	85 456,00	0,00	0,000
	<i>85 456,00</i>			<i>85 456,00</i>		
100,69	805,52	0,00	0,00	805,52	0,00	0,000
62,94	503,52	0,00	0,00	503,52	0,00	0,000
25,17	24 163,20	0,00	0,00	24 163,20	0,00	0,000
100,69	3 020,70	0,00	503,45	3 524,15	503,45	16,667
62,93	1 887,90	0,00	314,65	2 202,55	314,65	16,667
10,95	39 420,00	0,00	6 570,00	45 990,00	6 570,00	16,667
188,78	1 132,68	0,00	0,00	1 132,68	0,00	0,000
	<i>70 933,52</i>			<i>78 321,62</i>		
14 200,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,000
529,00	0,00	0,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,000
153,00	0,00	0,00	37 332,00	37 332,00	37 332,00	100,000
	156 389,52	0,00	74 178,10	230 567,62	74 178,10	47,43

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2	
Název a evidenční číslo stavby:	III/00331 Slavkov, most ev.č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	DIO / 1	
Součást dokumentace ZBV		
Doklad	ANO	
	(počet stran)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 RDS		přiloženo pouze na CD
09 DIO - Souhlas DI Policie ČR	13	
10 Rozhodnutí MÚ Votice	4	
11 Vyjádření AD	1	
12 Vyjádření TDS	1	
13 Výpis z obchodního rejstříku	2	
počet listů celkem	22	

Název akce: III/00331 Slavkov, most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov	Vypracoval: Quo s.r.o.
	Datum: 8/2018
Název výkresu: Přehledná situace křižovatek, kde je navržena úprava stávajícího dopravního značení nebo dočasného dopravní značení	List č.: 1

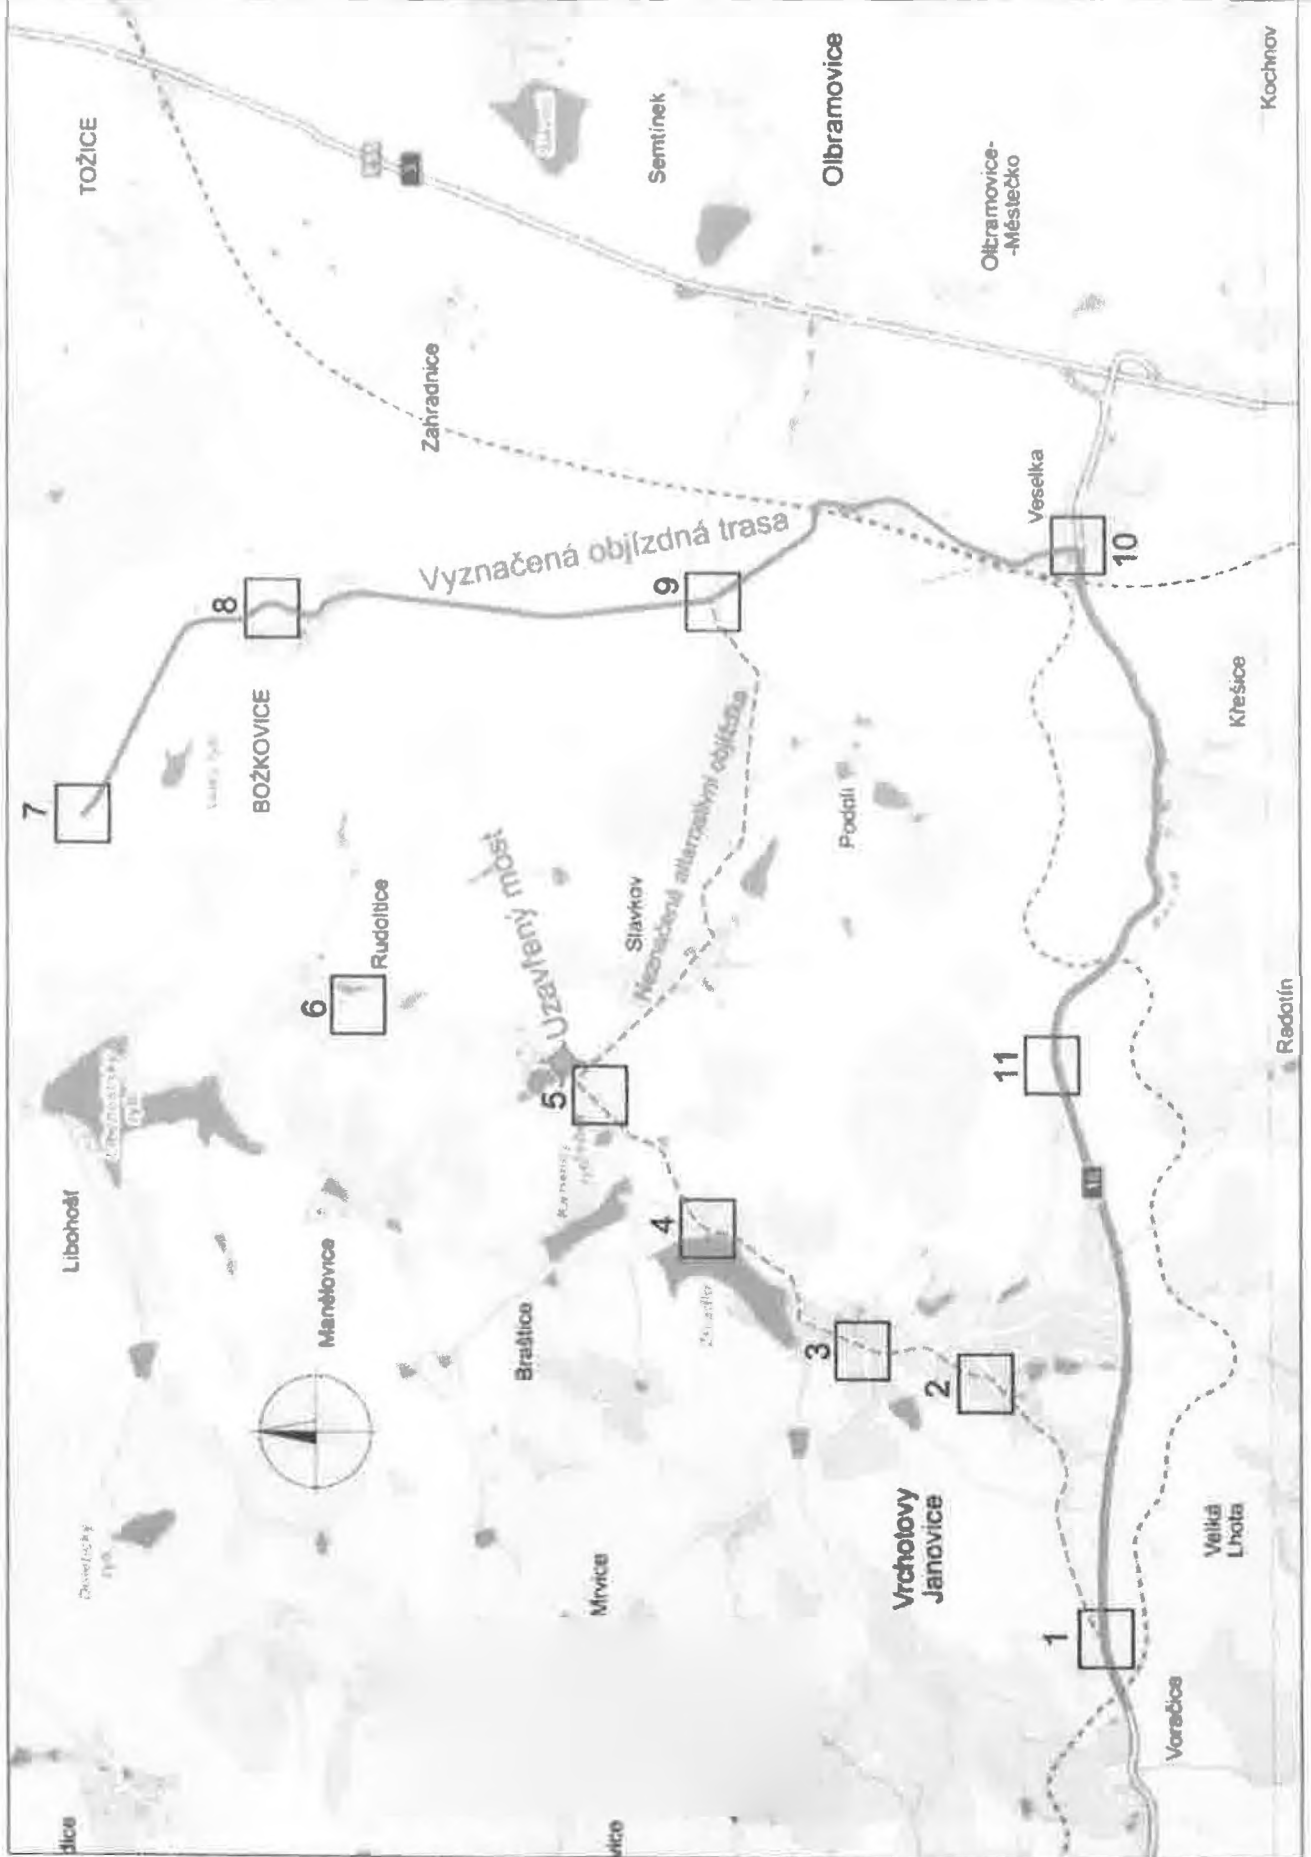

Název akce:


III/00331 Slavkov,
most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

Název výkresu: Situace č. 1
Odbočka ze sil. č. I/18

List č.: 2

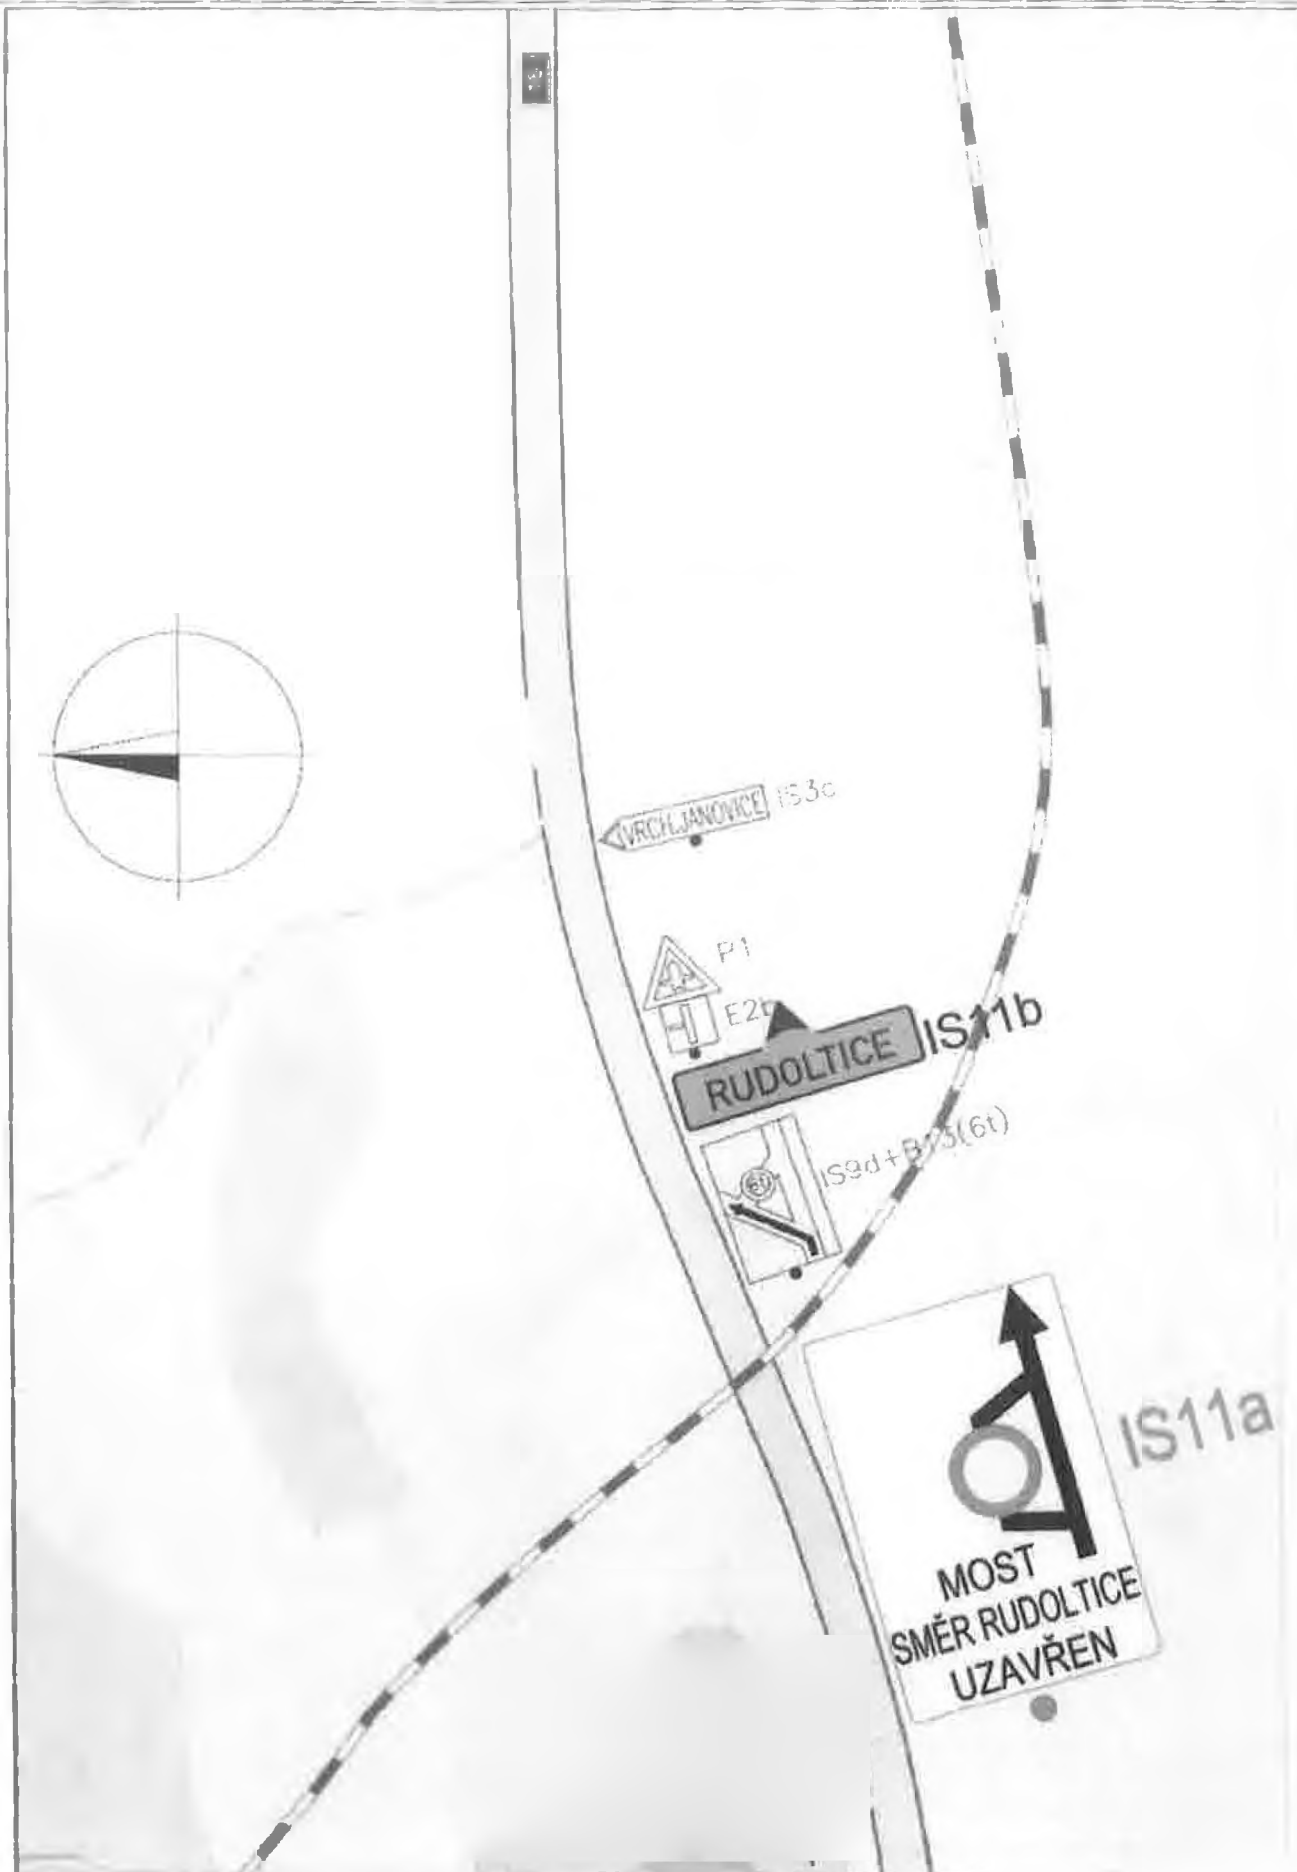

Název akce: III/00331 Slavkov, most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov	Vypracoval: Quo s.r.o.
	Datum: 8/2018
Název výkresu: Situace č. 2 Křižovatka v obci Vrchotovy Janovice	List č.: 3



Název akce:

III/00331 Slavkov,
most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

Název výkresu: Situace č. 3

Odbočka na Mrvice v blízkosti zastávky BUS Vrchotovy Janovice

List č.: 4



Název akce:

III/00331 Slavkov,
most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov


Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018


Název výkresu: Situace č. 4

Odbočka na Manělovice v blízkosti zastávky BUS Vrchotovy Janovice

Líst č.: 5



Název akce:	III/00331 Slavkov, most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov	Vypracoval: Quo s.r.o.
		Datum: 8/2018
Název výkresu:	Situace č. 5 Odbočka ze sil. III/00331 na Slavkov v blízkosti uzavíraného mostu	List č.: 6

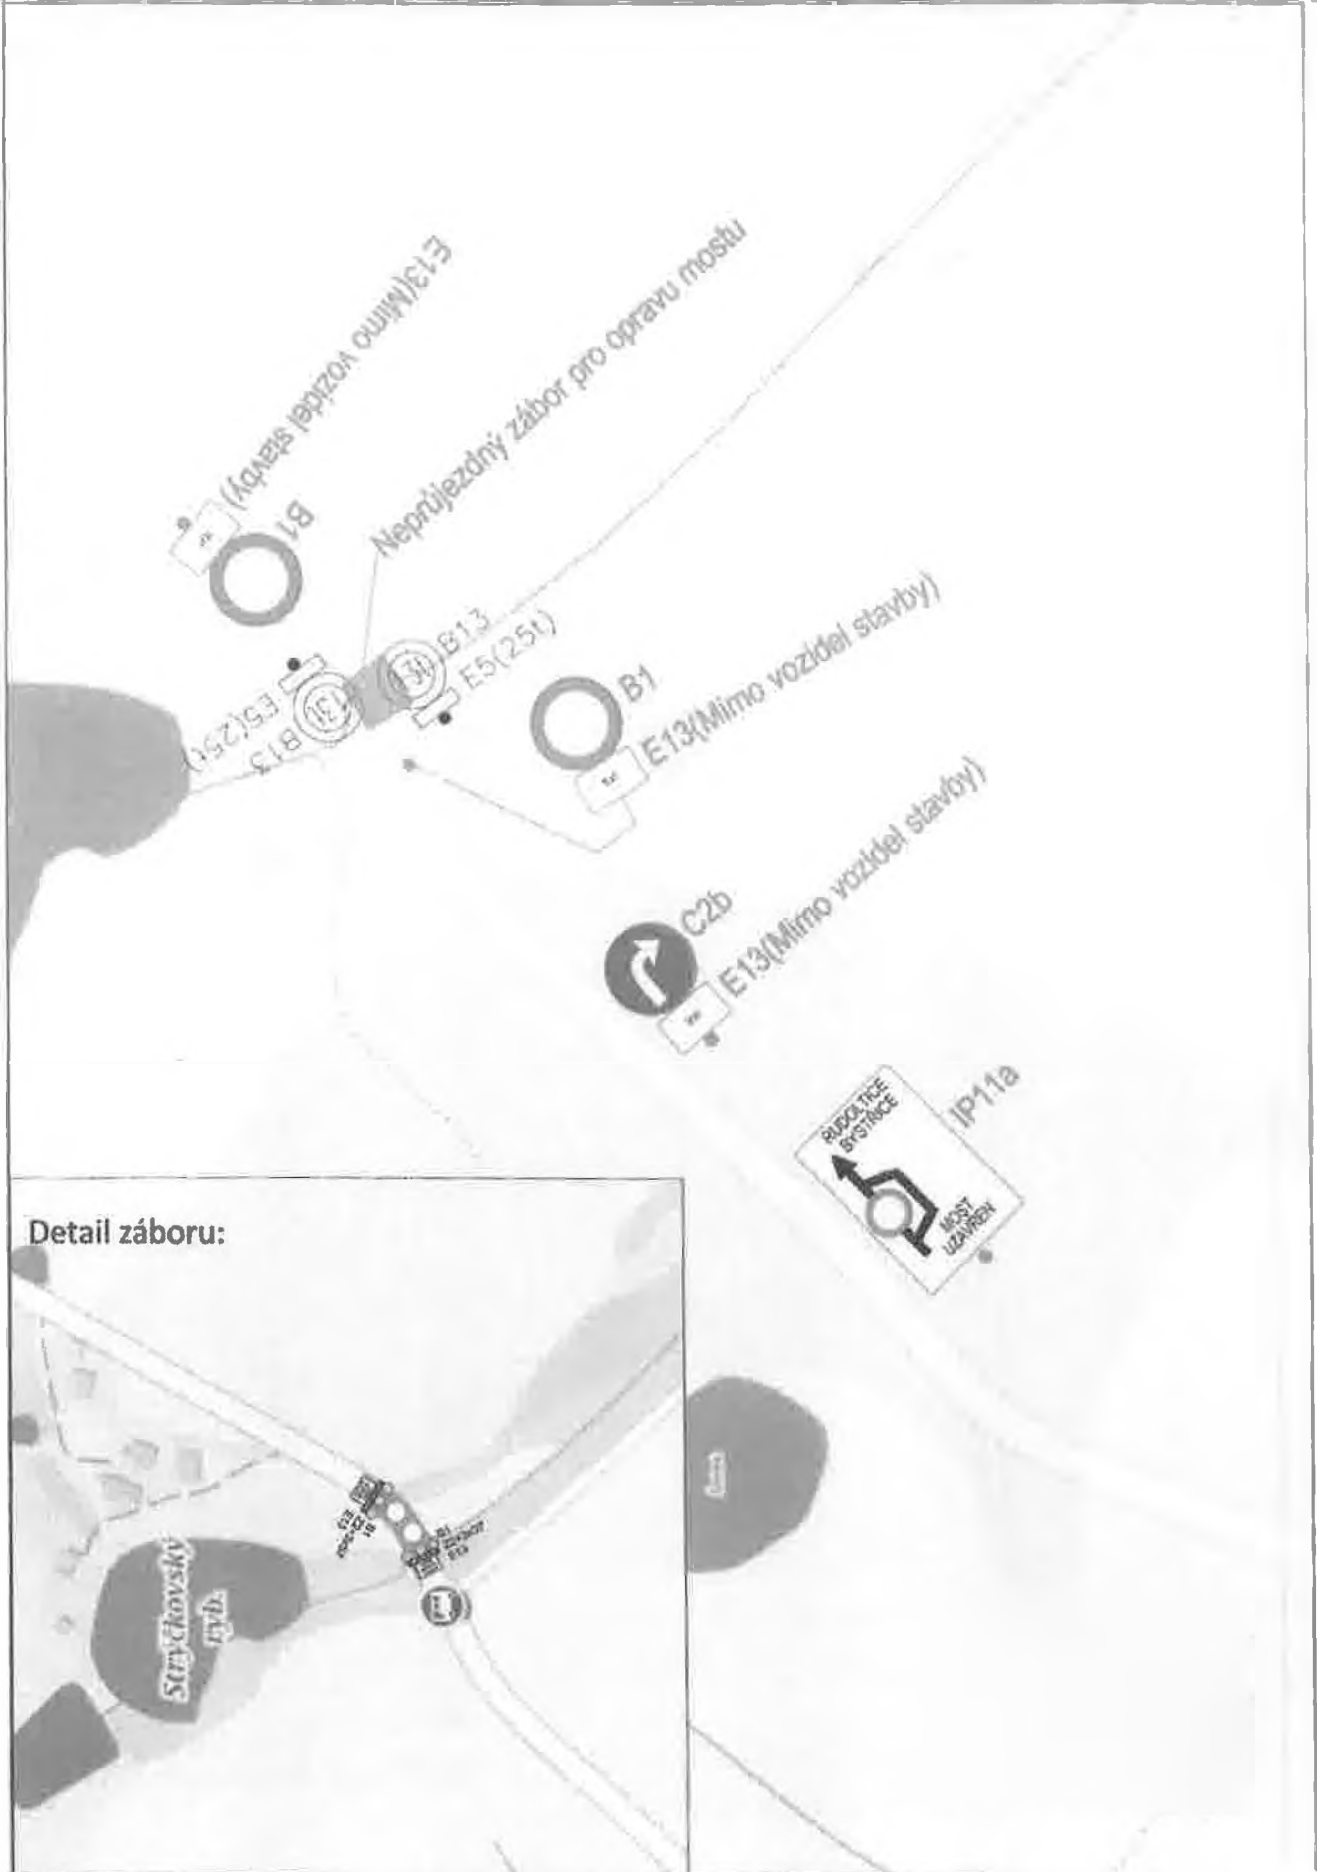

Název akce:

III/00331 Slavkov,
most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

Název výkresu: Situace č. 6

Upozornění na neprůjezdnost úseku sil. č. III/00331

List č.: 7



Název akce:

III/00331 Slavkov,

most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

Vypracoval:

Quo s.r.o.

Datum:


8/2018

Název výkresu: Situace č. 7

Křižovatka sil. III/00331 a III/11447

List č.:

8

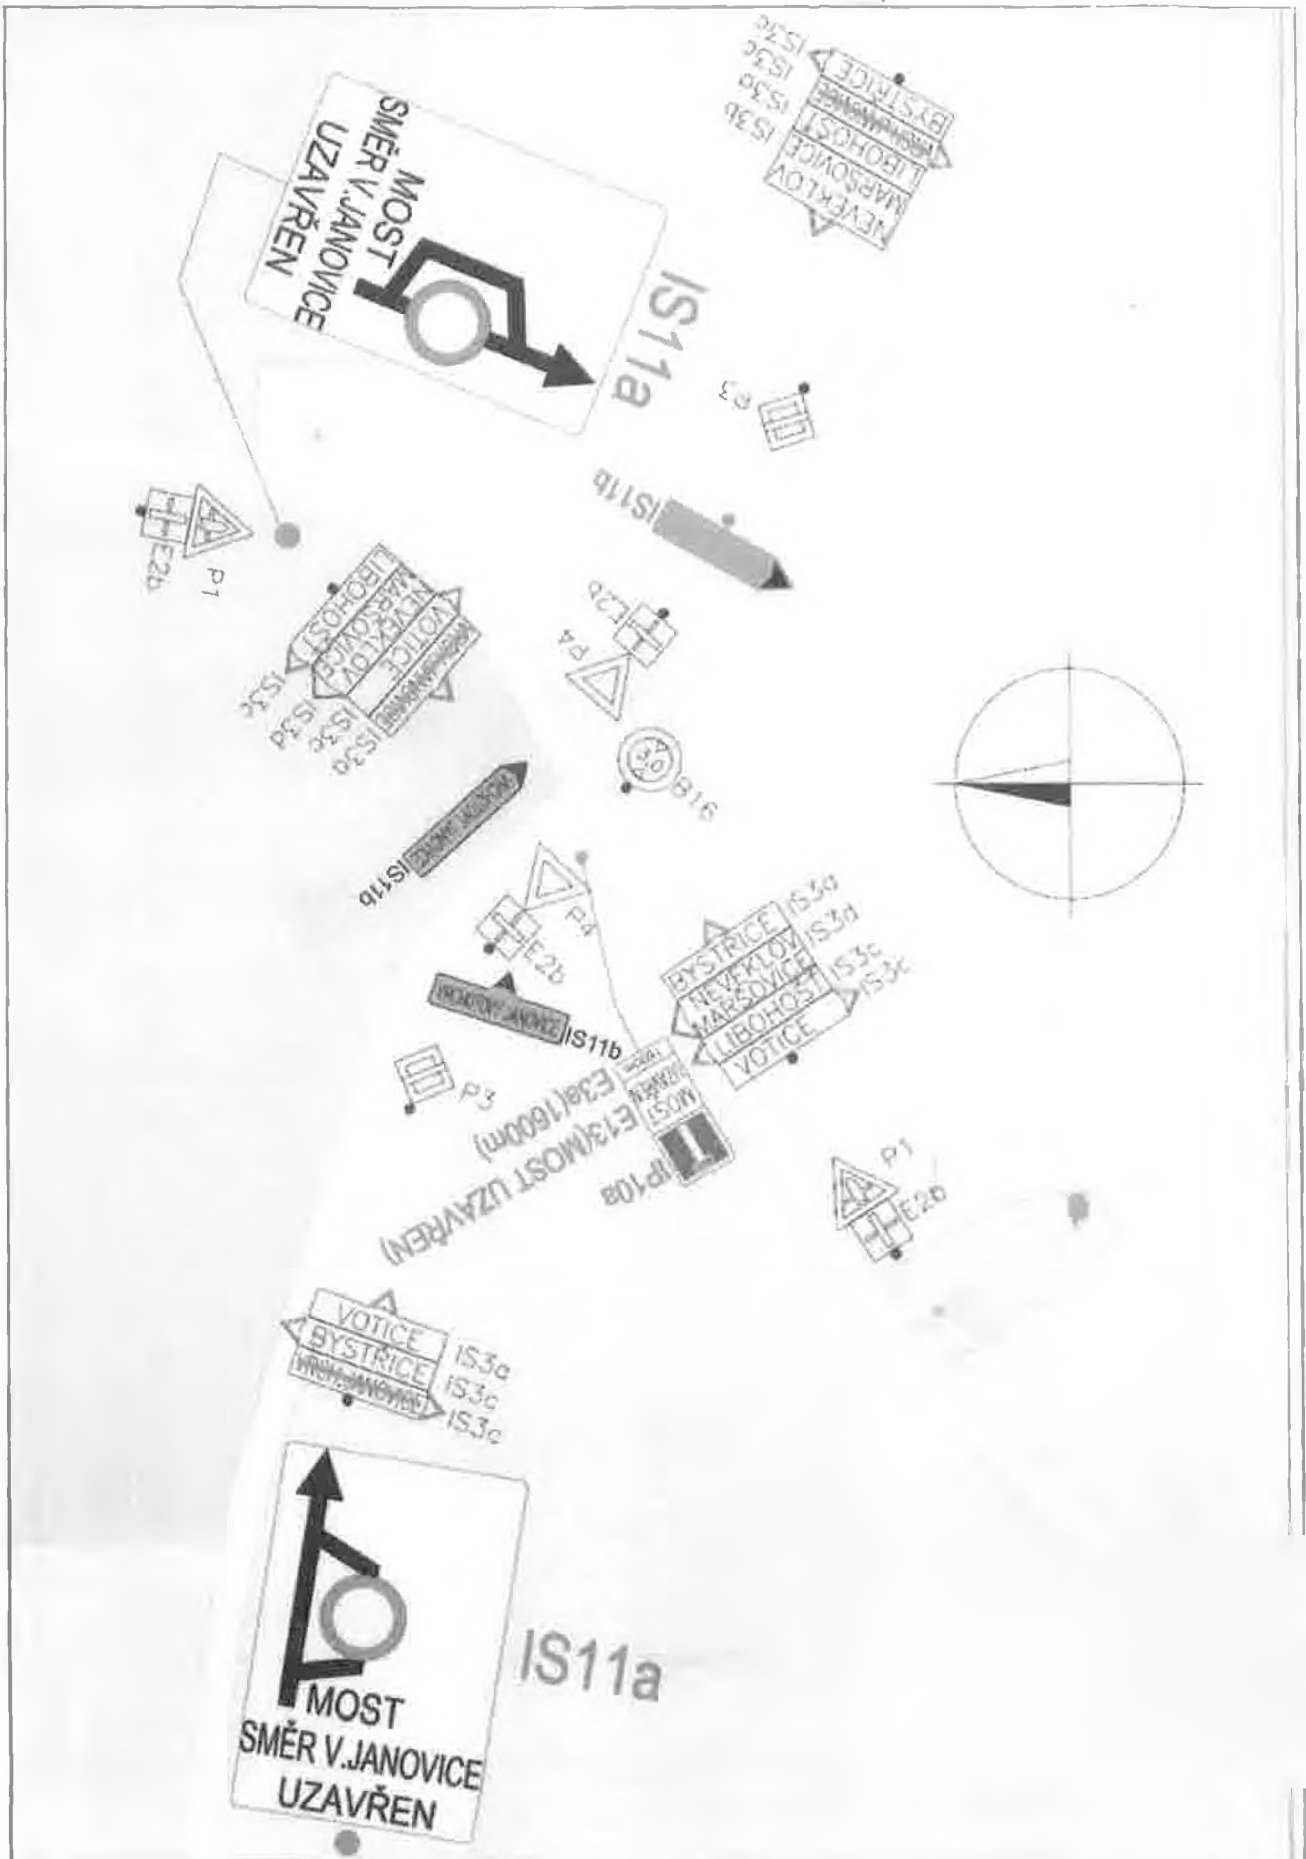

Název akce:

III/00331 Slavkov,
most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

Název výkresu: Situace č. 8
Božkovice - probíhající objízdná trasa

List č.: 9



Název akce:	III/00331 Slavkov, most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov	Vypracoval:	Quo s.r.o.
Název výkresu:	Situace č. 9 Odbočka do Slavkova. Bude zde vedena náhradní trasa BUS	Datum:	8/2018
		List č.:	10



V blízkosti křižovatky není osazeno žádné trvalé dopravní značení.

Název akce:

III/00331 Slavkov,
most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov


Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018


Název výkresu: Situace č. 10

Odbočka ze sil. I/18 ve Veselce na objízdnu trasu přes Božkovice

List č.: 11

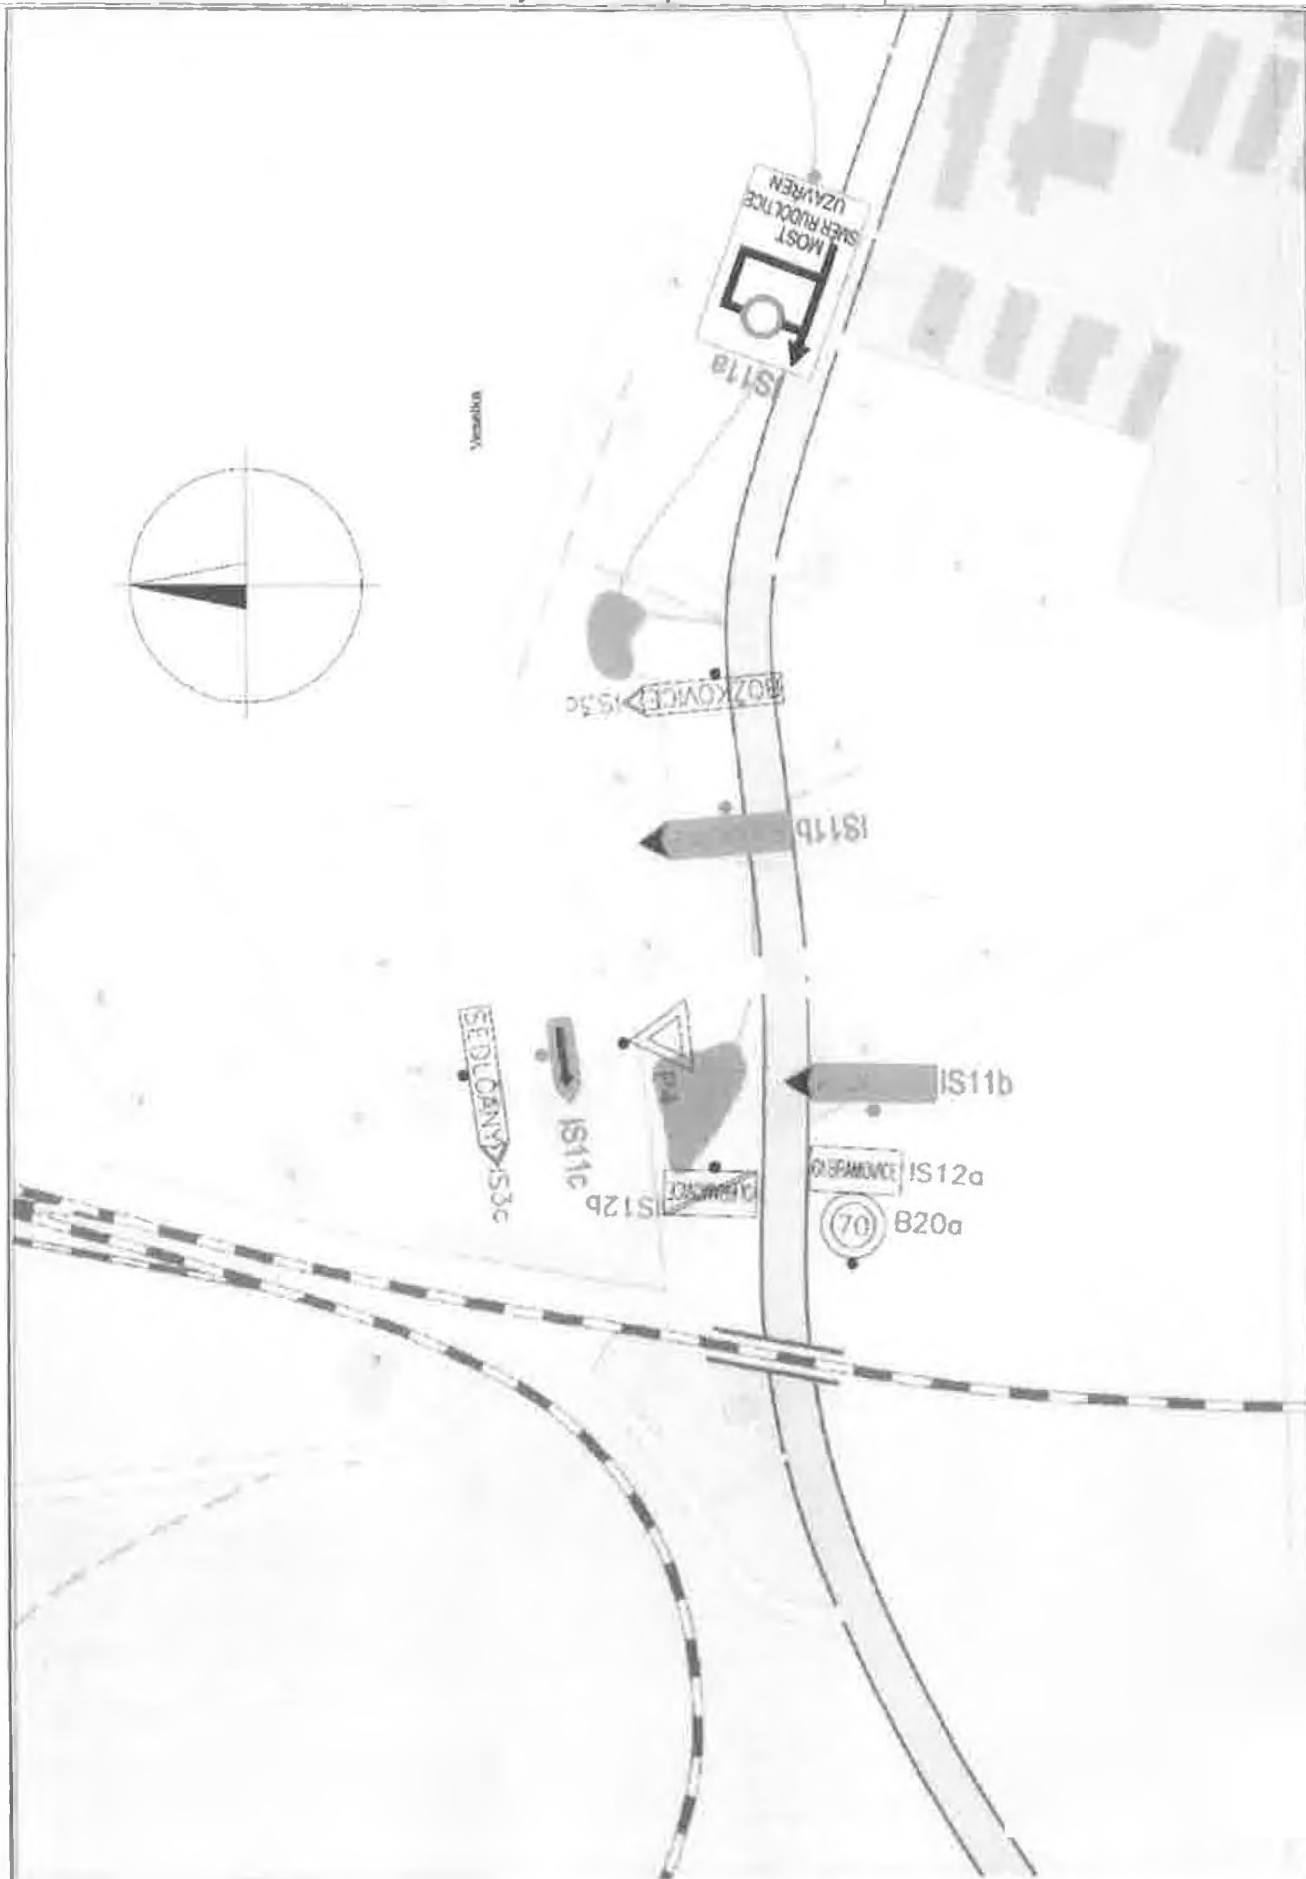

Název akce: III/00331 Slavkov, most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov	Vypracoval: Quo s.r.o.
	Datum: 8/2018
Název výkresu: Situace č. 11 Objízdná trasa směrem od Vrchotových Janovic	List č.: 12

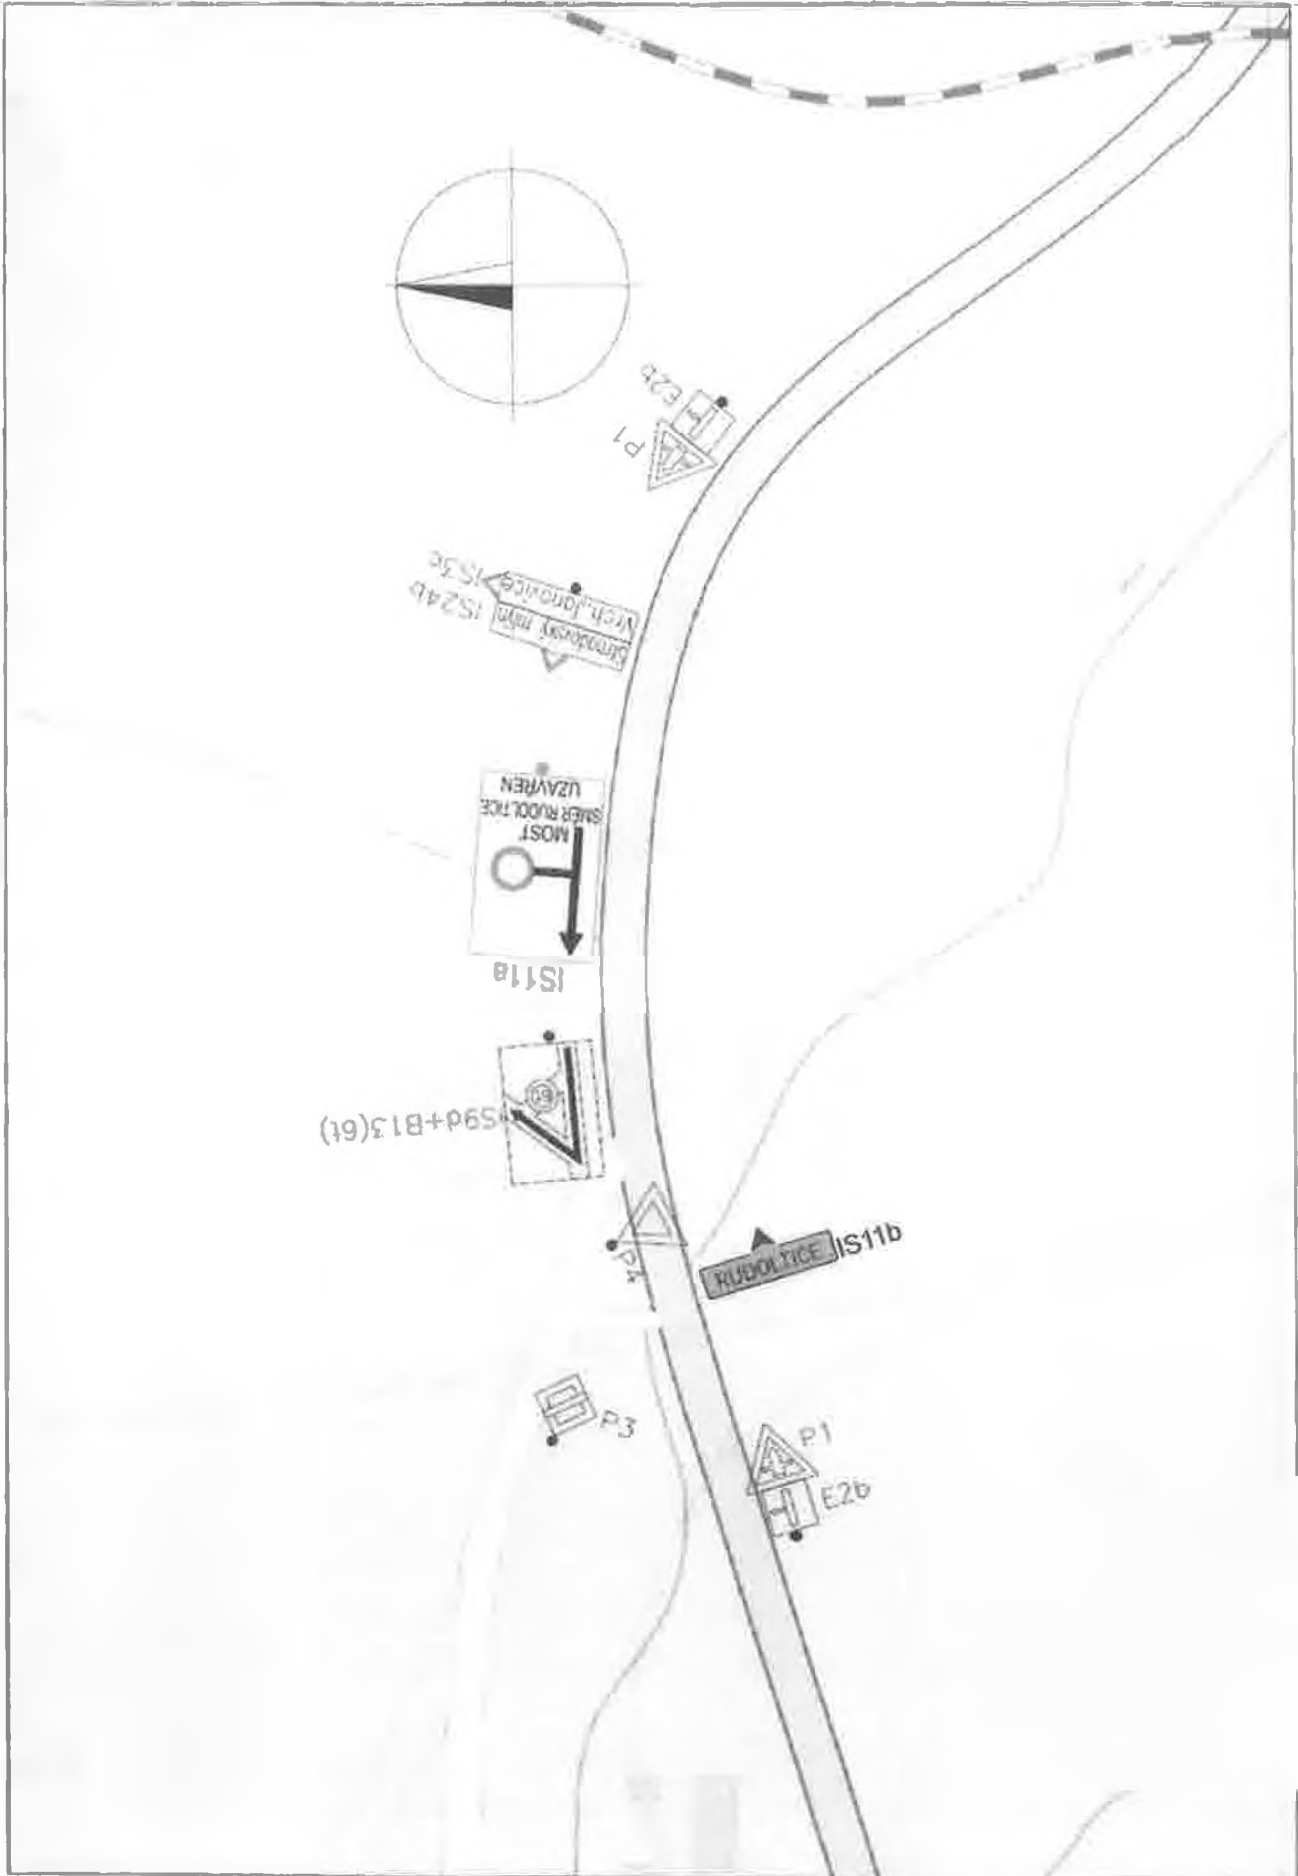

Název akce:


III/00331 Slavkov,
most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018


Název výkresu: Náhradní trasa pravidelné autobusové linky

List č.: 13

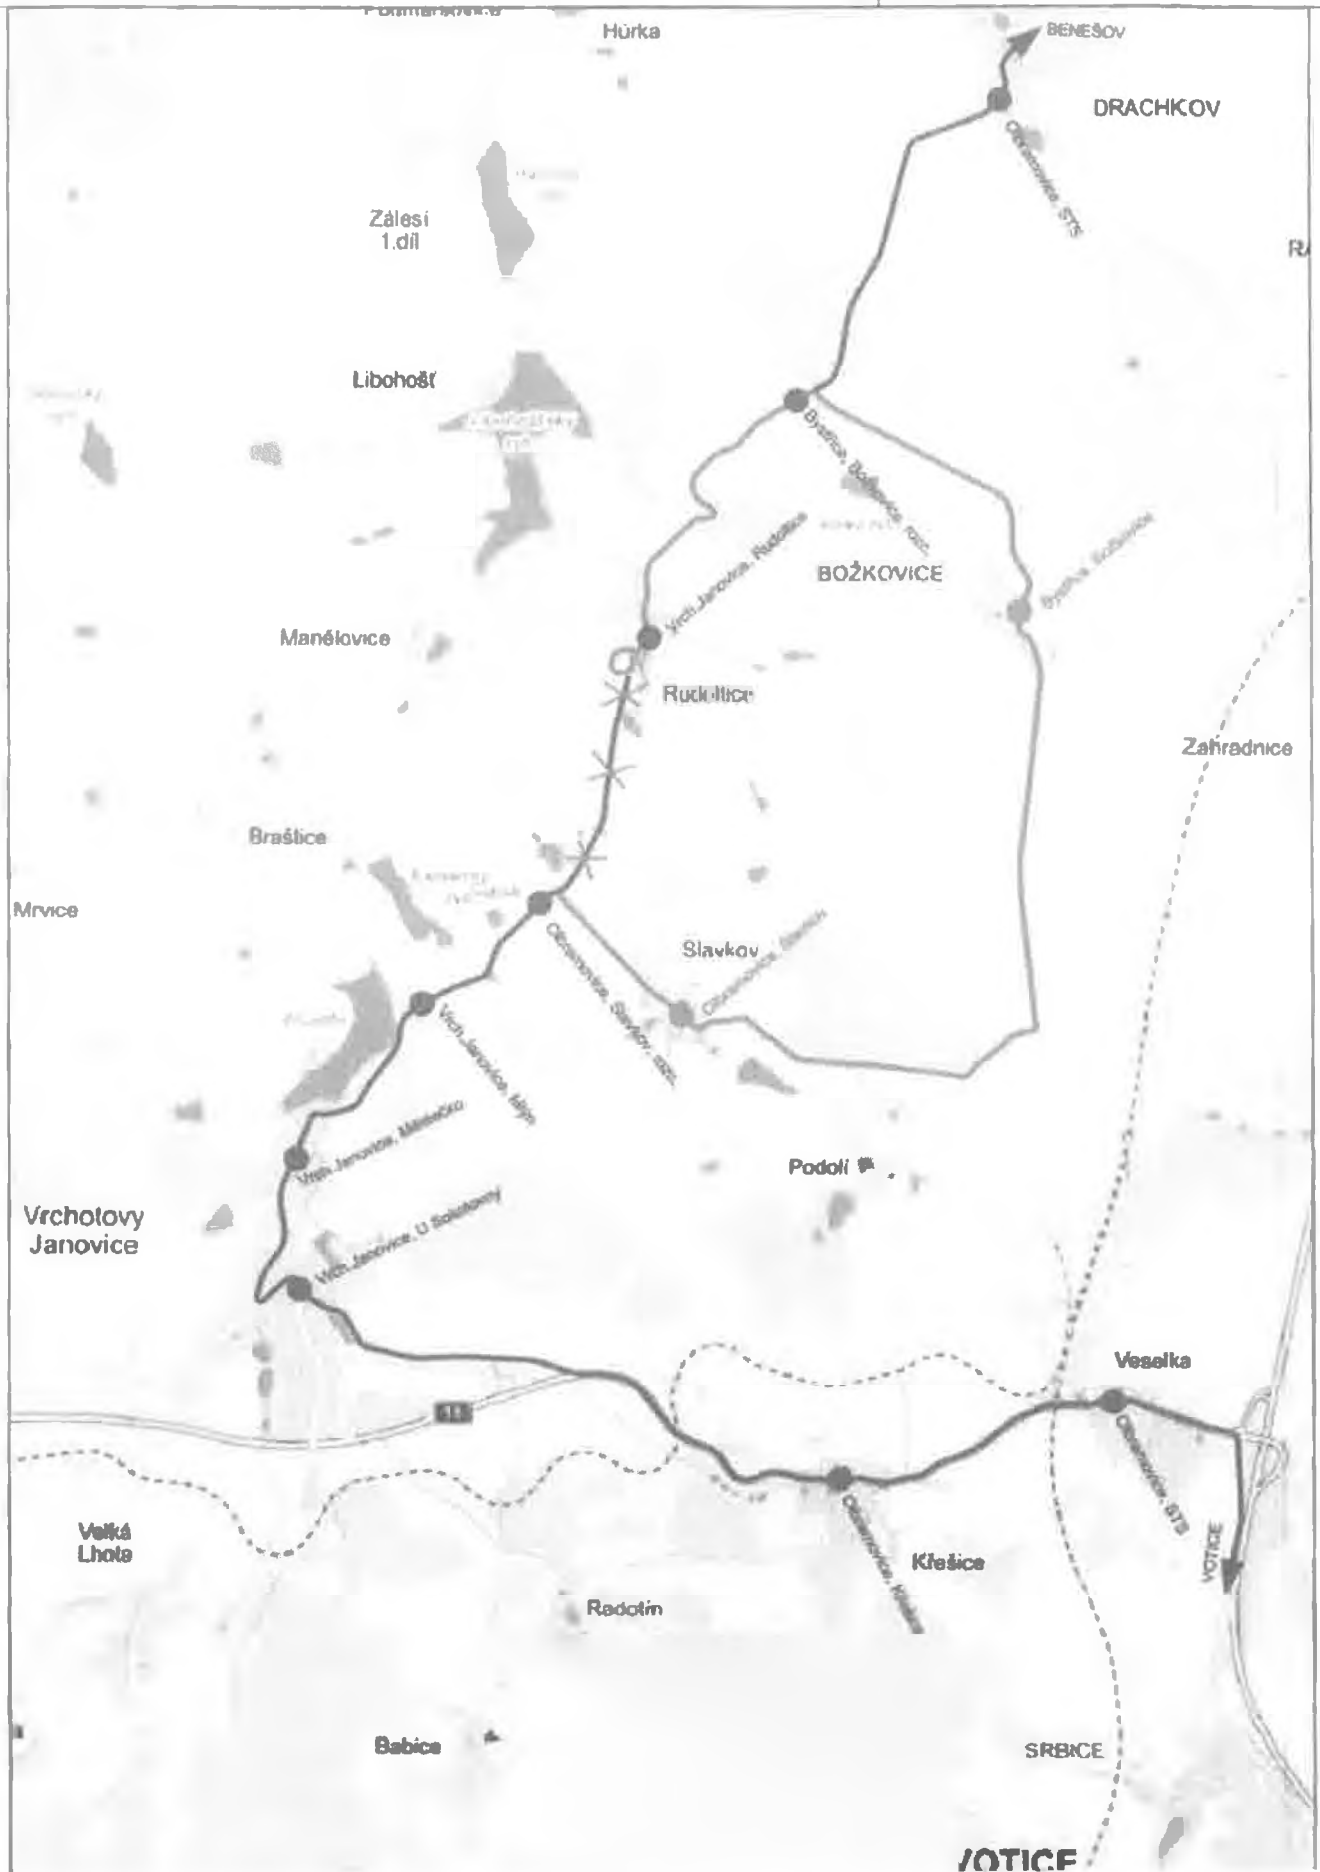



Městský úřad Votice
Odbor správních činností a dopravy
Komenského náměstí 700
259 17 Votice



MVOTX00952WD

ROBSTAV, k.s.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha Modřany
IČO: 274 30 774

v zast.: Quo s.r.o.
Křížíkova 2158
256 01 Benešov
IČO: 264 87 985

Číslo jednací:
10132/2019/SD-SL

Spisová značka:
8776/2019/SD-SL

Vyřizuje/linka:
Ing. M. Slunečková/317830121

Votice
27. 3. 2019

Počet stran: 3
Počet příloh: 1

Číslo správního rozhodnutí: 12/2019/SL

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy (dále jen správní orgán), jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), na základě žádosti spol. ROBSTAV, k.s., se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha Modřany, IČO 274 30 774, zastoupené na základě plné moci spol. Quo s.r.o., se sídlem Křížíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ 264 87 985, obdržené dne 13. 3. 2019

povoluje

podle ust. § 24 odst. 2 a 4 zákona o pozemních komunikacích **úplnou uzavírkou silnice č. III/00331 a nařizuje objížďku** z důvodu opravy mostu ev. č. III/00331-5 přes potok u obce Slavkov, takto:

Termín uzavírky: 1. 4. 2019 – 31. 7. 2019

Objízdná trasa: Obousměrná objízdná trasa vede po silnicích I/18, III/11448 a III/11448 .

Dopravně-inženýrské opatření s vyznačením objízdné trasy zpracované spol. Quo s.r.o. je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.

Autobusová doprava:

Všechny následující změny budou pro linku 200070 (E70) Benešov – Jankov.

- **Při úplné uzavírcce bude autobusová linková doprava vedena obousměrně po navržené objízdné trase takto:** z Drachkova po III/00331, na Božkovice a na Olbramovice po III/11447, na Veselku po III/11448, po I/18, do Vrchotových Janovic po III/00331a.
- **Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky:**
 - „Vrchotovy Janovice, mlýn“
- **Budou přemístěny autobusové zastávky:**
 - Autobusová zastávka „ Vrchotovy Janovice, Rudoltice“ bude přemístěna na křižovatku silnic III/00331 a III/11447 do zastávky „Bystřice, Božkovice, rozc.“ směrem na Božkovice
 - Autobusová zastávka „Olbramovice, Slavkov, rozc.“ bude přemístěna na křižovatku silnice III/11447 a MK do obce Slavkov (u Olbramovic)
 - Autobusová zastávka „Vrchotovy Janovice, Městečko“ bude přemístěna k parkovišti zámek Vrchotovy Janovice
- **Po dobu uzavírky se vkládá autobusová zastávka „Bystřice, Božkovice“.**

Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení akce: ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 274 30 774, kontaktní osoba Petr Dusbaba, tel.: 778 760 077

Stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky:

Přechodné dopravní značení bude provedeno odborně, provedením musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12 899-1, kterou doplňují vzorové listy VL 6.1, zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí být v souladu s dopravně inženýrským opatřením vypracovaným spol. Quo s.r.o., Křížíkova 2158, 256 01 Benešov, odsouhlaseným PČR DI Benešov.

Dopravní značení uzavřeného úseku a objížděné trasy bude provedeno dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydanými Odborem správních činností a dopravy MěÚ Votice pod č.j. 9431/2019/SD SL, Odborem dopravy KÚSK pod č.j. 038557/2019/KUSK-DOP/Bry a Odborem výstavby a územního plánování MěÚ Benešov pod č.j. MUBN/31042/2019/VÝST.

Podmínky uzavírky:

1. Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky (dle § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích).
2. Po celou dobu uzavírky bude značení kontrolováno, případně doplněno. Orgány Policie ČR mají právo dopravní značení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo důležitý veřejný zájem.
3. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou a po skončení uzavírky bude neprodleně odstraněno.
4. **Uživatelům sousedních nemovitostí v uzavřeném úseku silnice bude umožněn odpovídající přístup. Zástupce žadatele zjistí před uzavřením silnice konkrétní potřeby uživatelů přilehlých nemovitostí a dohodne se s nimi na optimálním způsobu zajištění přístupu.**
5. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky (dle § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích).
6. **Žadatel o povolení uzavírky zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem včasnou informovanost všech osob dotčených uzavírkou a dále zajistí zveřejnění informací o uzavírce v místě způsobem obvyklým (např. vyvěšením informací o uzavírce na úřední desce či vyhlášení obecním rozhlasem).**
7. Na začátku uzavírky žadatel o povolení uzavírky **umístí informační tabule** s uvedením dat o zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce popř. další vhodný údaj související se stavební akcí.
8. V případě, že omezení provozu na silnici č. III/00331 bude zahájeno nebo ukončeno v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení akce a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí **BEZODKLADNĚ** na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na 596663550-3, nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.
9. Správnímu orgánu zůstává vyhrazeno právo tyto podmínky doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem a vydat nové rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- ROBSTAV, k.s., Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha Modřany

O d ů v o d n ě n í :

Správní orgán obdržel dne 13. 3. 2019 žádost spol. ROBSTAV, k.s., se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha Modřany, IČO 274 30 774, zastoupené na základě plné moci spol. Quo s.r.o., se sídlem Křížíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ 264 87 985, o povolení úplné uzavírky silnice č. III/00331 a nařízení objížďky z důvodu opravy mostu ev. č. III/00331-5 přes potok u obce Slávkov.

Po posouzení žádosti a předložených podkladů, po projednání s účastníky řízení, kterými jsou vlastníci pozemní komunikace, která má být uzavřena, vlastníci pozemních komunikací, po nichž má být vedena

objížďka a obce, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, po souhlasu PČR DI Benešov s navrženou objížďnou trasou, se souhlasem dopravního úřadu s dočasným přemístěním autobusových zastávek a po projednání s dotčenými dopravci v linkové osobní dopravě, dospěl správní orgán k závěru, že omezení provozu lze povolit, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Účastníky řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2, 3 správního řádu vymežil správní orgán následovně:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Ředitelství silnic a dálnic ČR, městys Vrchotovy Janovice, město Bystřice a obec Olbramovice.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Votice, Odboru správních činností a dopravy, Komenského nám. 700, 259 17 Votice.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odkladný účinek.

Ing. Miluše Slunečková
referentka Odboru správních činností a dopravy

Příloha: Dopravně inženýrské opatření –1 strana

Obdrží:

účastníci řízení:

- ROBSTAV, k.s., Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha Modřany, v zastoupení Quo s.r.o., Křížíkova 2158, 256 01 Benešov
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 – Nusle
- Obec Olbramovice, Olbramovice 158, 259 01 Votice
- Městys Vrchotovy Janovice, 257 53 Vrchotovy Janovice 2
- Město Bystřice, Dr. E. Beneše, 257 51 Bystřice

dotčené orgány a ostatní:

- PČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, K Pazderně 906, 256 01 Benešov
- Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a úz. plánování, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov.
- KÚSK, Odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- ČSAD Benešov s.r.o., Blanická 960, 258 01 Vlašim
- Zdravotnická záchranná služba, Máchova 400, 256 01 Benešov.
- Hasičský záchranný sbor, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov.

III/00331 Slavkov,


most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

Vypracoval: Quo s.r.o.

Datum: 8/2018

Název výkresu: Přehledná situace křižovatek, kde je navržena úprava stávajícího dopravního značení nebo dočasného dopravního značení

List č.: 1

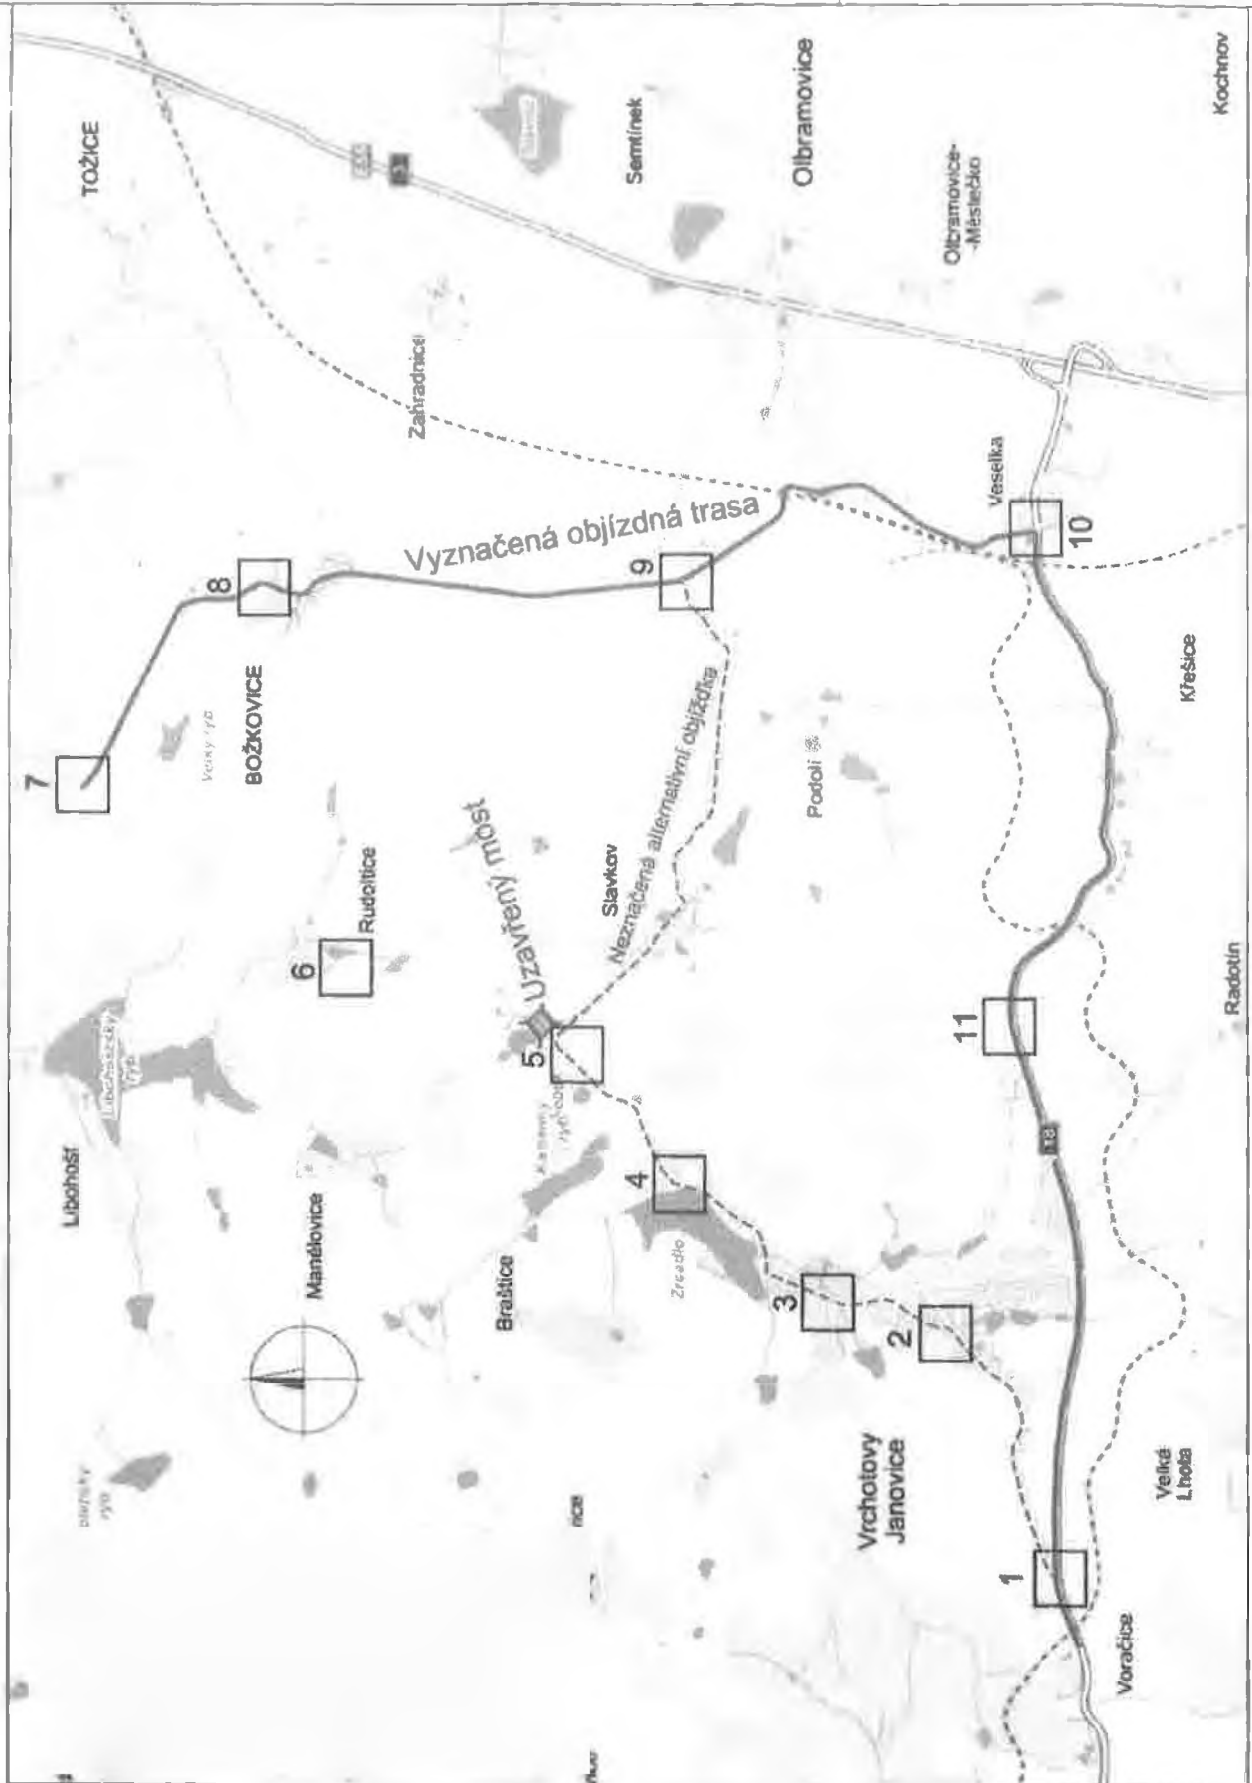

**Krajská správa a údržba silnic StČ kraje
p. Stanislav Pohunek
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

NAŠE ZNAČKA
52-066/19

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Pešata / 311

STŘEDIŠKO
S-52

V PRAZE DNE
4. 07. 2019

^{VEC} **STANOVISKO AD - ZBV1, ZBV2**

**Akce: III/00331 Slavkov, most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov
AD**

Zakázkové číslo:

Číslo SD:

6818/MP

Objednatel: KSÚS StČ kraje

Druh dokumentace:

AD

S přeloženými ZBV 1 a ZBV 2 výše uvedené akce z hlediska AD souhlasím.

Ing. Jan Pešata (AD)

Stanovisko TDI k provádění dodatečných stavebních prací a méněprací.

Silnice III/0331, Slavkov, most ev.č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov

SO DIO

Změna během výstavby č. 2

- 1) Vzhledem neodsouhlasení ze strany PČR dopravního opatření a schémat navržených v PDPS, bylo nutno na základě připomínek schémata upravit na nový návrh, který byl v rámci projednání uzavírky v 03/2019 ze strany PČR schválen. Jednalo se o doplnění SDZ a doplnění 2 ks světelných výstražných ramp pro zabezpečení staveniště

Výše uvedené nemohlo být zapracováno do návrhu PDPS, protože vznikly na základě dodatečných požadavků ze strany PČR.

TDI souhlasí

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaných dodatečných požadavků třetích stran PČR, které byly nezbytné pro povolení uzavírky, zahájení provádění díla. Tyto byly odsouhlaseny a přiloženy do dokumentace změny, která je zpracována v souladu s aktuálním zněním Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017

Veškeré změnové položky v soupisu prací byly ze strany TDI připomínkovány a konečná verze pak odsouhlasena.

V Praze dne 29. 7 2019.....za TDI Ing. Jitka Kaštánková

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 76014

Datum vzniku a zápisu:	6. března 2006
Spisová značka:	A 76014 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	ROBSTAV k.s.
Sídlo:	Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4
Identifikační číslo:	274 30 774
Právní forma:	Komanditní společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvlřat nebo věcí výkon zeměměřičských činností projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán - komplementář:	
komplementář:	Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921 Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 2. února 2016
při výkonu funkce zastupuje:	RADEK KOZÁK, dat. nar. 18. listopadu 1972 Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Komplementář jedná jménem společnosti samostatně.
Společníci - komplementáři:	Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921 Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Společníci - komanditisté:	RADEK KOZÁK, dat. nar. 18. listopadu 1972 Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6 Vklad: 24 000,- Kč Splaceno: 24 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	V důsledku rozdělení společnosti ROBSTAV stavby s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČO: 274 30 774 odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jejího jmění a k jejímu přechodu na nástupnickou společnost OLEARIA s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 242 55 076. Společnost ROBSTAV stavby s. r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost s obchodní firmou ROBSTAV stavby k.s. V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti ROBSTAV stavby k.s. se sídlem Písek, Pražské Předměstí, Pražská 483, PSČ 397 01, IČ 274 30 774, a sloučení takto odštěpené části jmění s nástupnickou společností REMVIKO k.s. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 263 59 324, tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení ze dne 20.01.2016.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **2576**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **KULLOVÁ PETRUŠE**

Zruč-Senec dne 17.06. 2019

Podpis/.....
