

[REDACTED]

Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Lítožnice"
(dále jen "Smlouva o dílo")

uzavřené dne 18. 10. 2019 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitel organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. Nowastav akciová společnost

se sídlem: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 00565679 DIČ: CZ00565679
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené: [REDACTED]
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.
zn. B 393.
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla z důvodu zajištění nezbytných stavebních prací, spočívajících v provádění dodatečné betonáže vzhledem k zjištění neúnosnosti základové spáry. V souvislosti s těmito úpravami byl současně odsouhlasen nutný větší rozsah dodání a instalace kamenných obkladů. Veškeré tyto okolnosti jsou sepsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Objednatel prohlašuje, že vzhledem k těžko předvídatelné situaci ohledně neúnosné základové spáry bylo doporučeno snížit základovou spáru konstrukce bezpečnostního přelivu. Tímto krokem narostly objemy betonových konstrukcí. Jelikož je třeba upravit pozici hráze vzhledem k pozici bezpečnostního přelivu, byla zjištěna dodatečná místa betonových konstrukcí, která budou vyčnívat nad okolní terén. Bylo rozhodnuto, že tyto konstrukce, které jsou původně navrženy bez obkladu, budou obloženy v souladu s celkovým dílem. Objednatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, prohlašuje, že výše uvedená fakta a zjištění, která vznikla až při realizaci zakázky nemohl předvídat, úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto: "Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací, dle oceněného rozpočtu dodatečných stavebních prací zhotovitele, který je jako nedílná součást tohoto dodatku č. 1 a tvoří přílohu č.2. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 8 963 684,00 Kč vč. DPH** (slovy: osm milionů devět set šedesát tři tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých). Dochází tedy k navýšení původní ceny celkem o **2 066 684,00 Kč vč. DPH**.

Původní cena ze smlouvy vč. DPH	6 897 000,00 Kč
Cena celkem navýšená o dodatečné stavební práce vč. DPH dle Dodatku č.1	8 963 684,00 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH dle Dodatku č. 1	1 708 003,30 Kč
Cena dodatečných prací vč. DPH dle Dodatku č. 1	2 066 684,00 Kč
Cena celkem navýšená o dodatečné stavební práce vč. DPH dle Dodatku č.1 - slovy	osm milionů devět set šedesát tři tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

-
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
 3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 25.3.2020




Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička

ředitel organizace

V Praze dne 31.3.2020

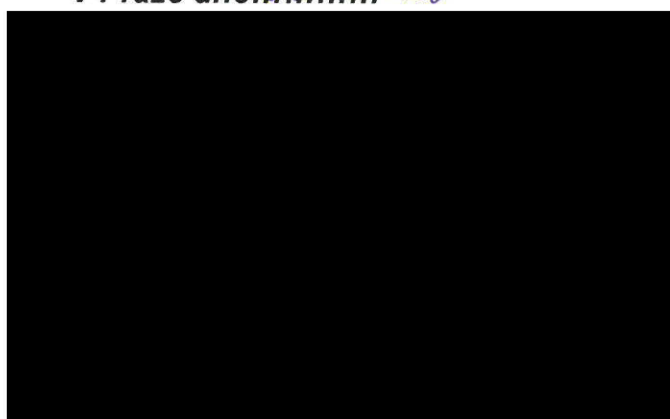

Příloha č.1: zápisy ze stavebního deníku

č.2: oceněný rozpočet dodatečných stavebních prací



