

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL64

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 1. 4. 2020

Předmět změny: Vytvoření prostoru a kvalitního povrchu pro rozvod vzduchu pod podlahou v jednací síni.

Dotčené místo: Budova "A" - 1.NP - JS č. 7

Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:**přípočet****77 236,00 Kč**

(bez DPH)

Změnu vyvolal:**dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Vytvoření prostoru a kvalitního povrchu pro rozvod vzduchu pod podlahou v jednací síni.

Důvod: Na základě bouracích prací v místě realizované dvojité podlahy byl zjištěn nevhodný povrch a také další dutiny a prostupy, které bylo nutno upravit. Jedná se o časově náročné práce.

Výsledek: Úprava prostoru a povrchu pro vedení vzduchu.

Cena:

Přípočty: 77 236,00 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM
DPH
CENA VC. DPH

77 236,00 Kč
16 219,56
93 455,56 Kč

(bez DPH)
(DPH)
(vč. DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

1
1
1

listů
listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

Podpis
souhlas

ANO

Datum:

1. 04. 2020

souhlas

ha

Datum:

1. 04. 2020

souhlas

AWO

Datum:

1. 04. 2020

souhlas

Bt10

Datum:

1. 04. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

64 - Vytvoření prostoru a kvalitního povrchu pro rozvod vzduchu pod podlahou v jednací síni.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

77 236,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: 64 - Vytvoření prostoru a kvalitního povrchu pro rozvod vzduchu pod
podlahou v jednací síni.
Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	77 236,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	77 236,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
 Objekt: ZL-3
 Soupis: 64 - Vytvoření prostoru a kvalitního povrchu pro rozvod vzduchu pod podlahou v jednací síni.

Místo: Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
 Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava


Datum: Projektant: ateliér 38
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 236,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	77 236,00				
0	K	HZS1302/1	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - podezdění, doomitání stěn u podlah po demontážích původních VZT šterbin	hod	16,00000	302,00	4 832,00	
	VV		2lidi, 2dny, 4 hodiny					
	VV		2*2*4		16,00000			
	VV		Součet		16,00000			
0	K	HZS1302/2	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - vyspravení podlahy komor po odstranění násypu a jacklové k-ci	hod	16,00000	302,00	4 832,00	
	VV		2lidi, 2dny, 4 hodiny					
	VV		2*2*4		16,00000			
	VV		Součet		16,00000			
0	K	HZS1302/3	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - protiprašný nátěrasádní barvou podlah komor, bočnic komor a fabionů	hod	8,00000	302,00	2 416,00	
	VV		1 člověk, 2dny, 4 hodiny					
	VV		1*2*4		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
0	M	58562001	omítka silikonová tenkovrstvá pastovitá probarvená zrnitost 1,5	t	0,06000	59 000,00	3 540,00	CS ÚRS 2018 02
0	M	58562230	nátěrová hmota podkladní akrylátová	kg	12,00000	72,50	870,00	CS ÚRS 2018 02
0	K	HZS2112/4	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný - vytvoření bočnic na stolicích z OSB desek zamezení falešného tahu do mezery za ponechaných obkladem na stěnách	hod	32,00000	358,00	11 456,00	
	VV		2lidi, 4dny, 4 hodiny					
	VV		2*4*4		32,00000			
	VV		Součet		32,00000			
0	K	HZS1302/5	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - vytvoření fabionu ve styku "bočnice" a dno komory z betonu	hod	32,00000	302,00	9 664,00	
	VV		2 lidi, 4dny, 4 hodiny					
	VV		2*4*4		32,00000			
	VV		Součet		32,00000			
0	K	HZS1301/6	Hodinová zúčtovací sazba zedník - dofoukání všech možných děr a spár pro zamezení falešného tahu vzduchu	hod	8,00000	273,00	2 184,00	
	VV		1 člověk, 2dny, 4 hodiny					
	VV		1*4*2		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
0	M	WBR.MPP001	PUR - pistolová montážní PUR pěna 750ml	kus	12,00000	190,00	2 280,00	
0	K	HZS2112/7	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný - kotvení "stolice" do stropní konstrukce chemickou kotvou, vrty, závit, tyče, chem. kotvy	hod	32,00000	358,00	11 456,00	
	VV		2lidi, 4dny, 4 hodiny					
	VV		2*4*4		32,00000			
	VV		Součet		32,00000			
0	M	548materiál	ocel.kotvy, závitové tyče, chem. kotvy	sb	1,00000	10 000,00	10 000,00	
0	K	HZS2111/8	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	16,00000	324,00	5 184,00	
	VV		2 lidi, 4dny, 2 hodiny					
	VV		2*4*2		16,00000			
	VV		Součet		16,00000			
0	M	28376591	Akustická pěnová páska	m	210,00000	4,00	840,00	CS ÚRS 2018 02
0	K	HZS1302/9	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - vytvoření vzduchotěsných prostor pro výstup husích krků AV Media	hod	8,00000	302,00	2 416,00	
	VV		2 lidi, 1 den, 4 hodiny					
	VV		2*1*4		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
0	K	HZS1302/10	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - dobetonávka podlah po demontáži VZT šterbin mimo komor(levá část JS7, vrchní část za dveřma na protější straně taktéž)	hod	8,00000	302,00	2 416,00	
	VV		2lidi, 1 den, 4 hodiny					
	VV		2*1*4		8,00000			
	VV		Součet		8,00000			
0	M	58564005.KMB	beton B 20 (pytel 40kg)	ks	30,00000	95,00	2 850,00	

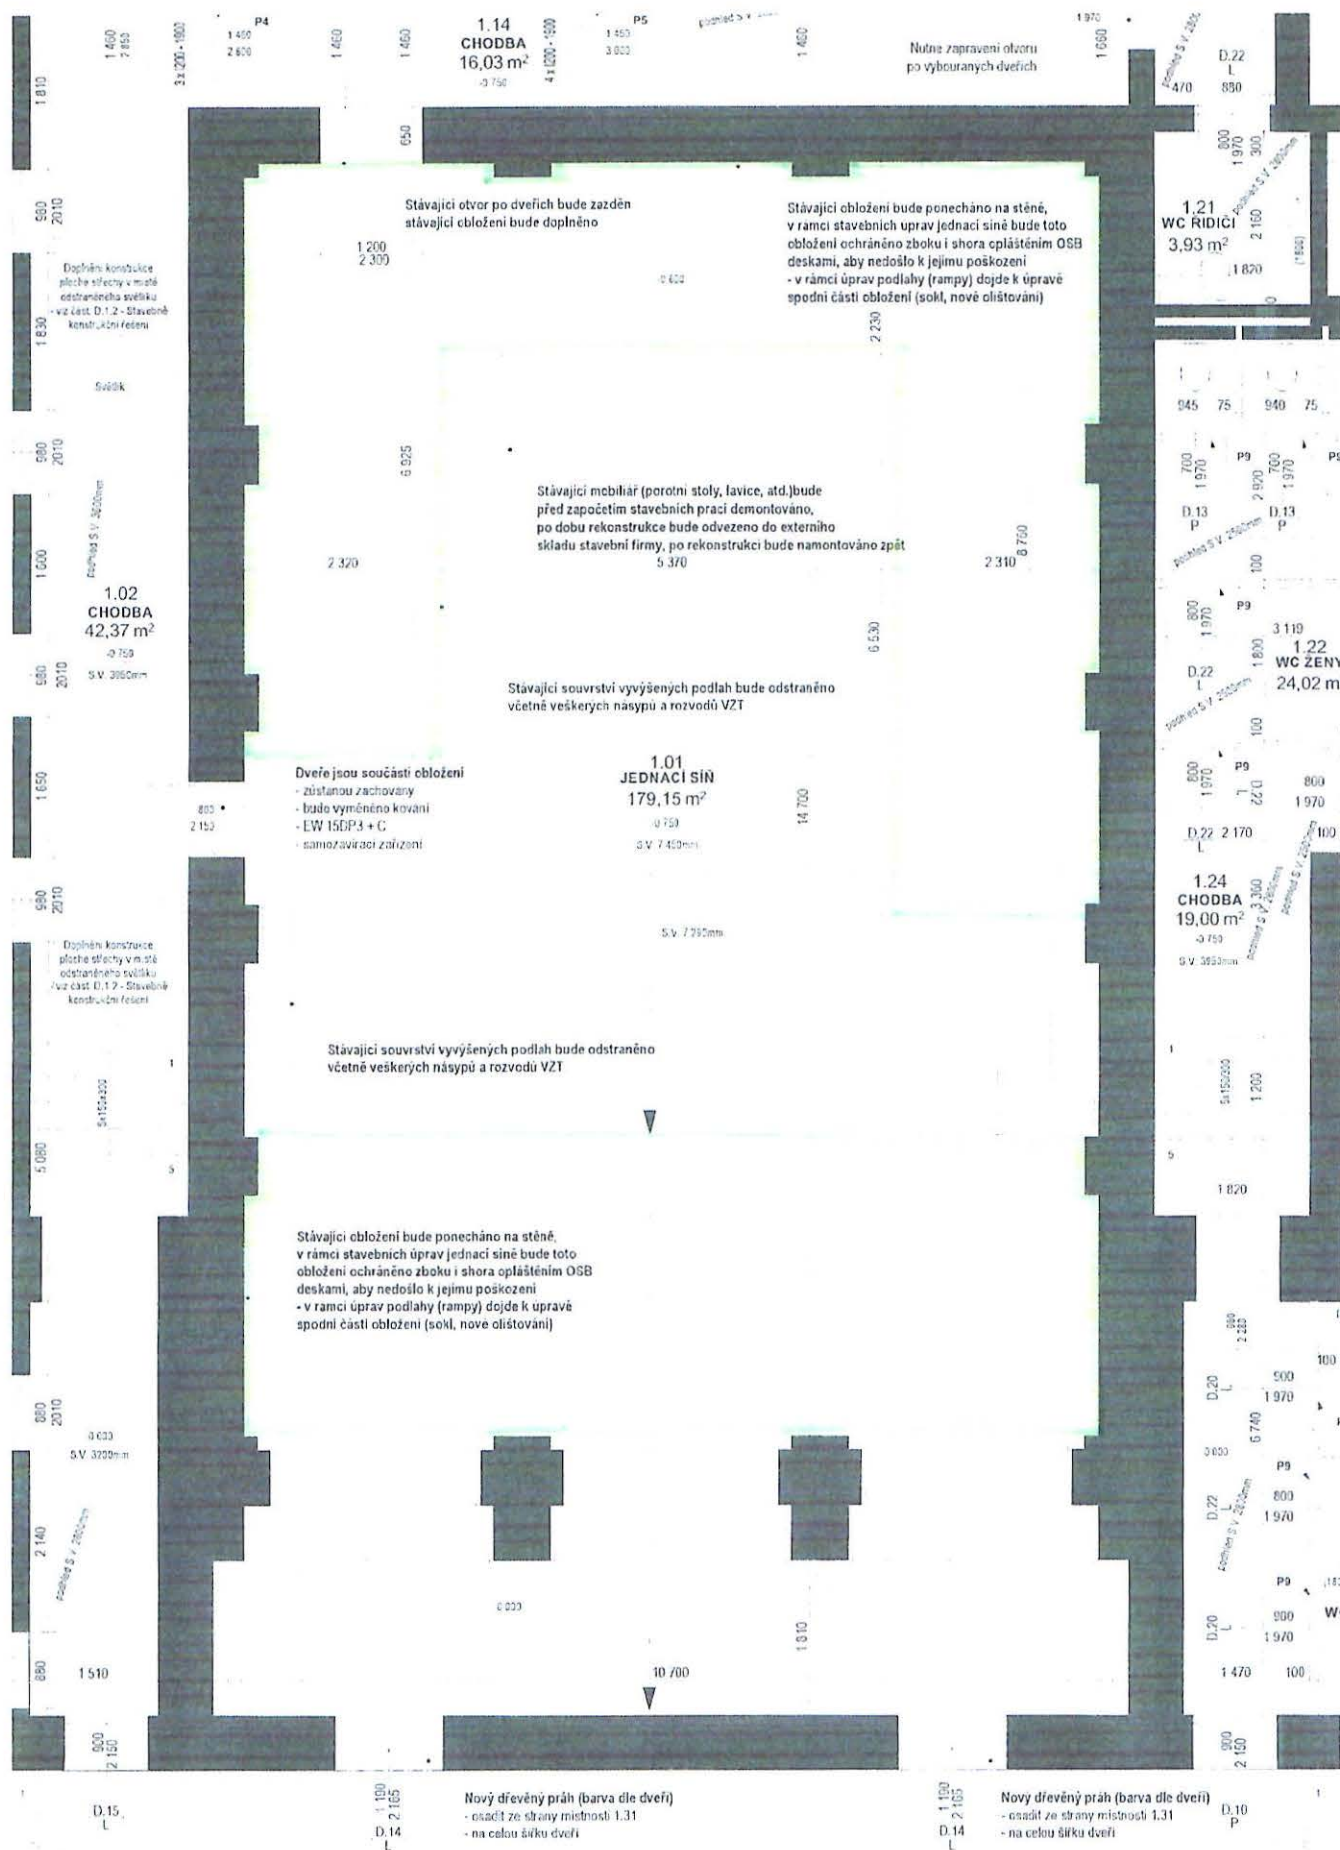

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL65

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer

Datum: 1. 4. 2020

Předmět změny: Oprava živičných ploch kolem kanalizační šachty a lapače střešních

Dotčené místo: Budova "A" - Dvůr KSO

Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

29 012,28 Kč

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

dodavatel, v reakci na stav objektu

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Oprava živičných ploch kolem kanalizační šachty a lapače střešních splavenin.

Důvod: Nutnost řešit doplnění živičných ploch/vrácení do původního stavu v místě realizace prací.

Výsledek: Dodávka živice.

Cena:

Přípočty: 29 012,28 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM

DPH

CENA VC. DPH

29 012,28 Kč

6 092,58

35 104,86 Kč

(bez DPH)

(DPH)

(vč. DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

1
1
1

listů
listů
listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

Podpis
souhlas ANO

Datum:

1. 04. 2020

souhlas ANO

Datum:

1. 04. 2020

souhlas ANO

Datum:

1. 04. 2020

souhlas ANO

Datum:

1. 04. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

65 - Oprava živičných ploch kolem kanalizační šachty a lapače střešních splavenin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 012,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: 65 - Oprava živičných ploch kolem kanalizační šachty a lapače střešních splavenin

Místo:		Datum:	
Zadavatel:	ČR-KS v Ostravě	Projektant:	ateliér 38
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s. Ostrava	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	29 012,28
5 - Komunikace	26 380,72
99 - Staveništní přesun hmot	2 631,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3

Soupis: 65 - Oprava živičných ploch kolem kanalizační šachty a lapače střešních splavenin

Místo: Datum:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: [redacted]


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 012,28

D 5		Komunikace					26 380,72	
4	K	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	11,60000	295,55	3 428,38	
	vv		stav dle PD					
	vv		"PD šachta" -7		-7,00000			
	vv		skutečnost					
	vv		"geigr u vrat VVO x KSO " 1,6		1,60000			
	vv		"geigr na rohu garáže" 1		1,00000			
	vv		"šachta" 16		16,00000			
	vv	plocha	Součet		11,60000			
5	K	113108415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm	m2	11,60000	500,25	5 802,90	
	vv		plocha		11,60000			
6	K	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	11,60000	352,55	4 089,58	
	vv		plocha		11,60000			
7	K	577141312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	11,60000	587,65	6 816,74	
	vv		plocha		11,60000			
8	K	577141322R00	Beton asfalt.ACL 22 (ABL III), ložný, do 3 m, 5 cm	m2	11,60000	538,20	6 243,12	
	vv		plocha		11,60000			
D 99		Staveništní přesun hmot					2 631,56	
3	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,44446	592,10	2 631,56	

OPRAVA ŽIVĚNÝCH PLOCH

5 720

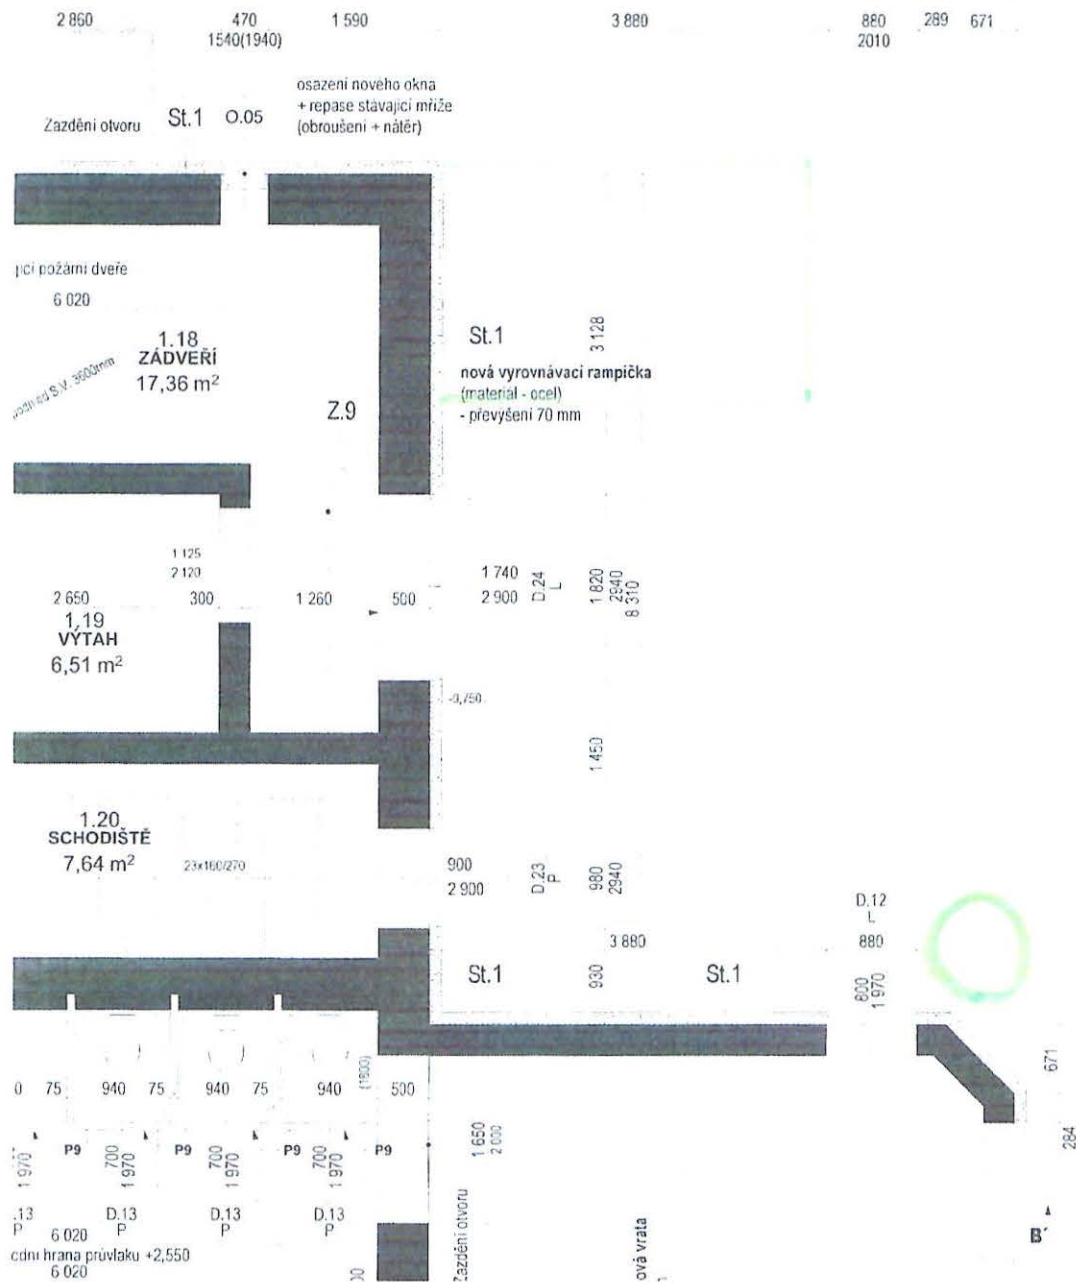

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20)č.: **ZL66***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 1. 4. 2020

Předmět změny: Úprava niky pro skříň v jednací síni.
Dotčené místo: **Budova "A" - 1.NP - JS č.7**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **17 323,53 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **objednatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Úprava niky pro skříň v jednací síni.
Důvod: Na základě neprovedení celkové zazdivky po otvoru, který vedl mimo jednací síň dojde k vytvoření niky, která bude využita jako skříň na odkládání spisů.
Výsledek: Vytvoření niky - skříň v jednací síni.

Cena:

Přípočty: 22 498,19 Kč

Odpočty: -5 174,66 Kč

CENA CELKEM

DPH

CENA VC. DPH**17 323,53 Kč**

3 637,94

20 961,47 Kč

(bez DPH)

(DPH)

(vč. DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

1
1
1listů
listů
listů**Stanovisko:**

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

Podpis
souhlas *ANO*

Datum:

1. 04. 2020

souhlas *ANO*

Datum:

1. 04. 2020

souhlas *ANO*

Datum:

1. 04. 2020

souhlas *ANO*

Datum:

1. 04. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

66 - Úprava niky pro skřín v jednací síni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 323,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

66 - Úprava niky pro skřín v jednací síni

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 323,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 319,89
96 - Bourání konstrukcí	186,16
99 - Staveništní přesun hmot	386,78
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 115,39
HSV - Práce a dodávky HSV	541,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	541,80
784 - Malby	198,17
PSV - Práce a dodávky PSV	9 575,34
766 - Konstrukce truhlářské	9 575,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
 Objekt: ZL-3
 Soupis: 66 - Úprava niky pro skřín v jednací síni

Místo: Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
 Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava


Datum: Projektant: ateliér 38
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 323,53

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					5 319,89	
16	K	3-002.RXX	D+M+DMTZ a likvidace provizorní SDK stěna	m2	3,75000	901,23	3 379,61	
	vv		1,5*2,5		3,75000			
	vv		Součet		3,75000			
0	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	2,76000	703,00	1 940,28	CS ÚRS 2018 02
	vv		1,2*2,3		2,76000			
	vv		Součet		2,76000			
D 96		Bourání konstrukcí					186,16	
2	K	962031133RXX	Bourání příček cihelných vč. případných obkladů	m2	2,76000	67,45	186,16	
	vv		1,2*2,3		2,76000			
	vv		Součet		2,76000			
D 99		Staveništní přesun hmot					386,78	
99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,65324	592,10	386,78	
D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					1 115,39	
42	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,72036	148,96	107,30	
43	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,68684	6,47	88,55	
	vv		0,72036*19 *Přepočtené koeficientem množství		13,68684			
44	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,72036	241,50	173,97	
45	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,20360	34,50	248,52	
	vv		0,72036*10 *Přepočtené koeficientem množství		7,20360			
46	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,72036	172,50	124,26	
47	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	0,72036	517,50	372,79	
D HSV		Práce a dodávky HSV					541,80	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					541,80	
0	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	8,40000	64,50	541,80	CS ÚRS 2018 02
	vv		2,8*1,5*2		8,40000			
D 784		Malby					198,17	
230	K	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	5,52000	6,00	33,12	
	vv		1,2*2,3*2		5,52000			
	vv		Součet		5,52000			
231	K	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	5,52000	29,90	165,05	
D PSV		Práce a dodávky PSV					9 575,34	
D 766		Konstrukce truhlářské					9 575,34	
232	K	766-003.RXX	D+M dřevěné obložení - viz stávající vč. konečné povrchové úpravy a kotvení	m2	-2,70000	1 916,54	-5 174,66	
0	K	766-1	D+M regály na spisy+posuvné dveře na obě strany	sb	1,00000	14 750,00	14 750,00	

ÚPRAVA NIKY

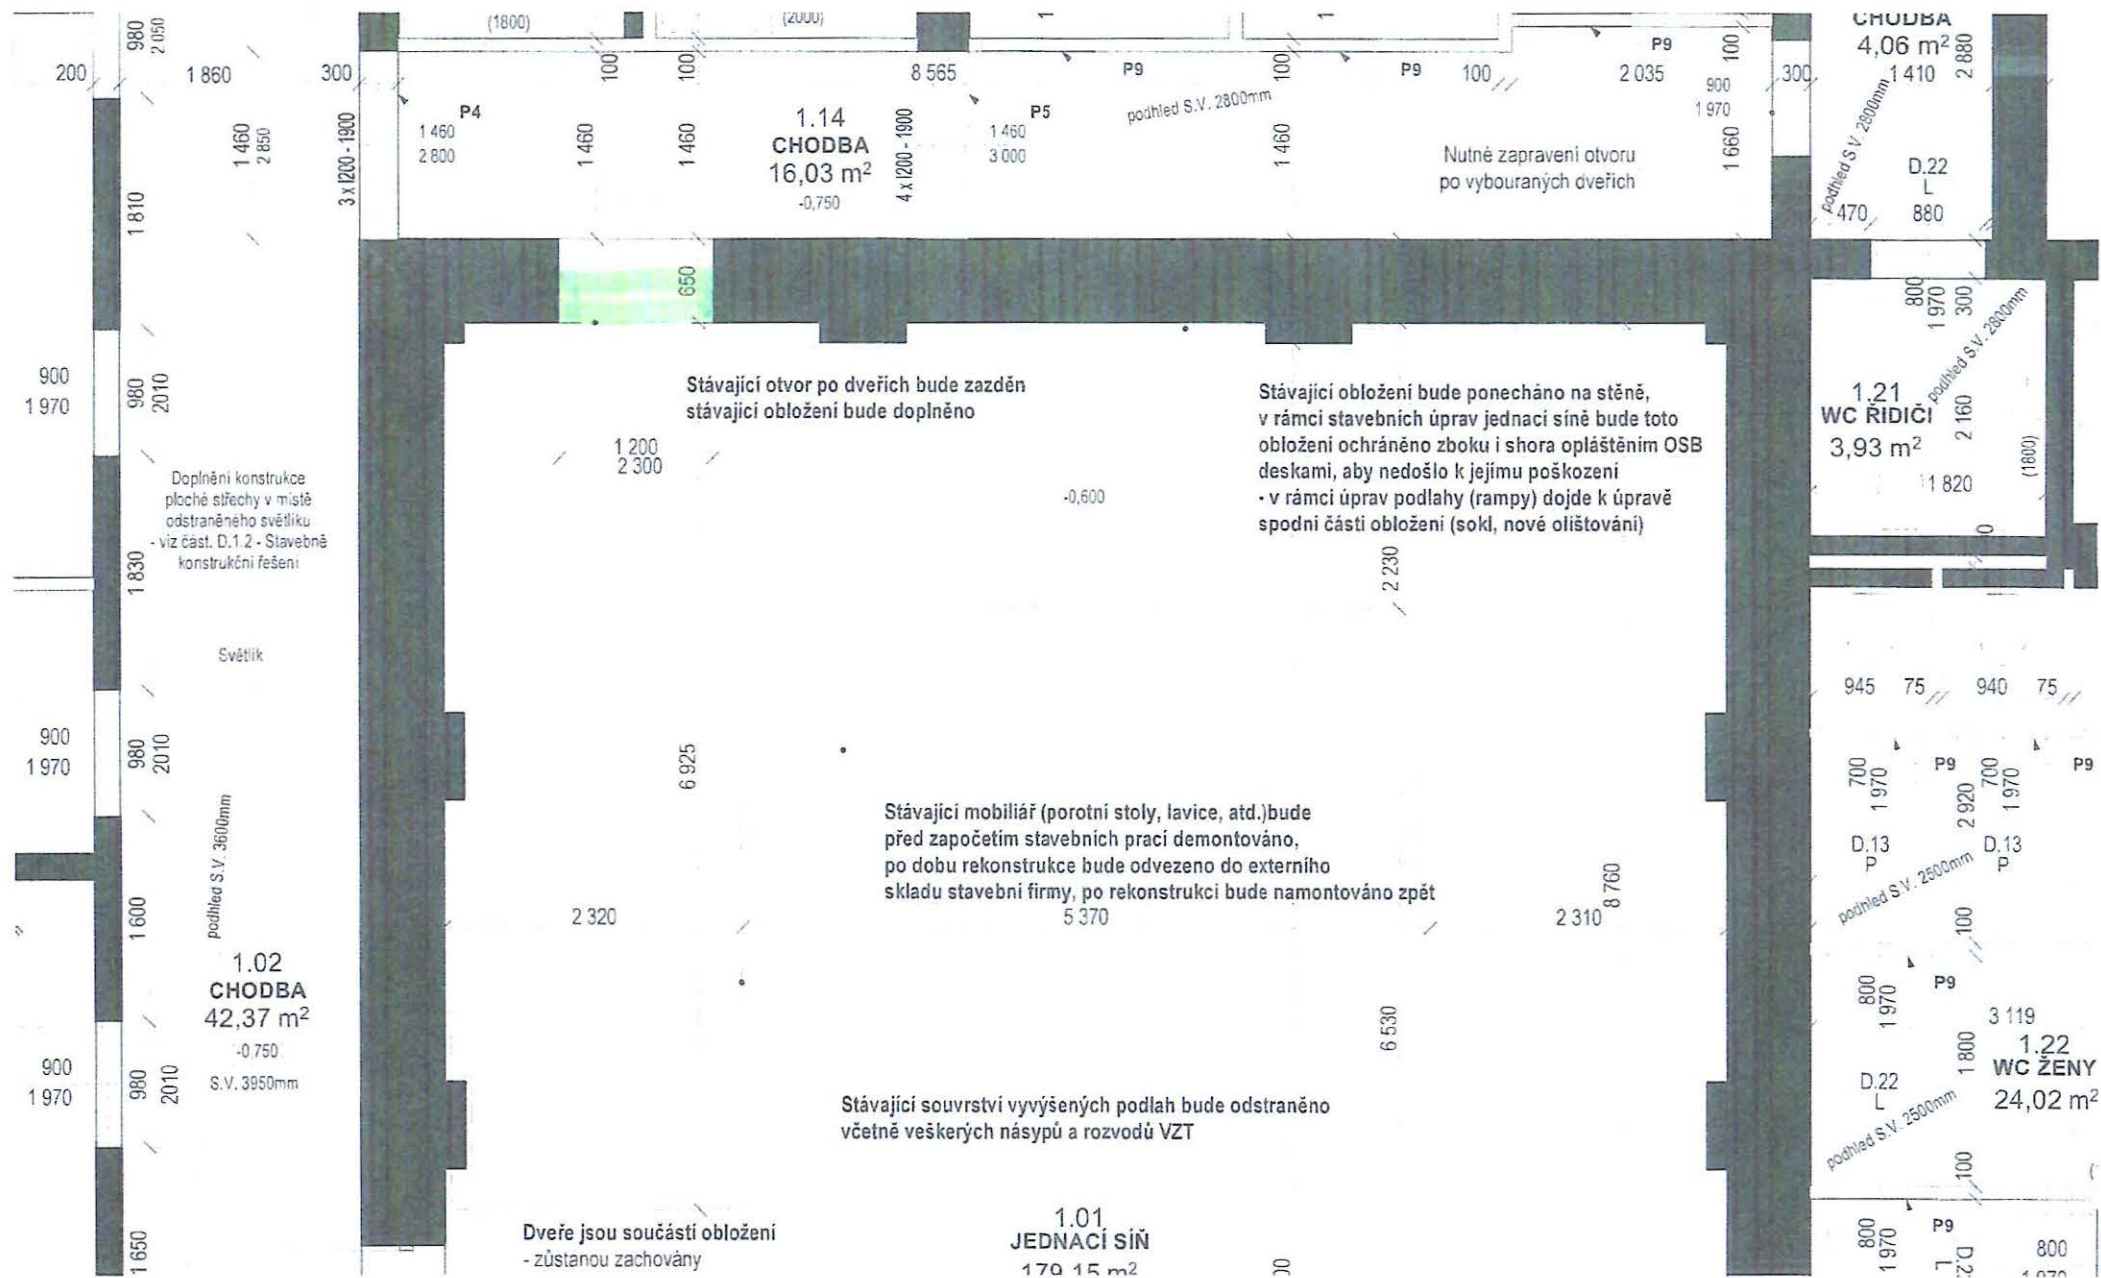

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL67

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer

Datum: 1. 4. 2020

Předmět změny: Sanační omítky - strojovna výtahu.
Dotčené místo: Budova "A" - 1.PP strojovna výtahu
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

3 173,83 Kč

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

dodavatel, v reakci na stav objektu

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Sanační omítky - strojovna výtahu.

Důvod: Jedná se o navýšení množství sanačních omítek v prostoru strojovny výtahu.

Výsledek: Realizace větší výměry sanačních omítek.

Cena:

Přípočty: 3 173,83 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM

3 173,83 Kč

(bez DPH)

DPH

666,50

(DPH)

CENA VC. DPH

3 840,33 Kč

(vč. DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

1
1
1

listů
listů
listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Podpis
souhlas

ANO

Datum:

1. 04. 2020

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

souhlas

ANO

Datum:

1. 04. 2020

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas

ANO

Datum:

1. 04. 2020

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

souhlas

ANO

Datum:

1. 04. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

67 - Sanační omítky - srovnávací výtah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 173,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

67 - Sanační omítky - srokovna výtahu

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 173,83

61 - Upravy povrchů vnitřní

2 482,85

97 - Prorážení otvorů

232,70

99 - Staveništní přesun hmot

102,14

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

356,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: 67 - Sanační omítky - srokovna výtahu

Místo: Datum:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 173,83

D	61	Úpravy povrchů vnitřní					2 482,85	
37	K	612433212R00	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm	m2	5,00000	496,57	2 482,85	
	VV		5		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			

D	97	Prorážení otvorů					232,70	
24	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,00000	46,54	232,70	
	VV		5		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			

D	99	Staveništní přesun hmot					102,14	
99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,17250	592,10	102,14	

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					356,14	
42	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23000	148,96	34,26	
43	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,37000	6,47	28,27	
	VV		0,23*19 'Přepočtené koeficientem množství		4,37000			
44	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23000	241,50	55,55	
45	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,30000	34,50	79,35	
	VV		0,23*10 'Přepočtené koeficientem množství		2,30000			
46	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,23000	172,50	39,68	
47	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	0,23000	517,50	119,03	

PROVEDENÍ SANAČNÍ DMÍTKY

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL68

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázei

Datum: 1. 4. 2020

Předmět změny: Hliníkové lišty - obklady.

Dotčené místo: Budova "A" - Hygienické zařízení 1.NP

Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet

47 355,20 Kč

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

dodavatel, v reakci na stav objektu

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Hliníkové lišty - obklady.

Důvod: Jedná se o navýšení množství hliníkových lišt v prostoru toalet.

Výsledek: Větší výměra hliníkových lišt obkladů s ohledem na rozsah.

Cena:

Přípočty: 47 355,20 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM

47 355,20 Kč

(bez DPH)

DPH

9 944,59

(DPH)

CENA VC. DPH

57 299,79 Kč

(vč. DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

1
1
0

listů
listů
listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.
Ing. Luděk Valík

Podpis souhlas **ANO** Datum:

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

souhlas **ANO** Datum: 1. 04. 2020

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas **ANO** Datum: 1. 04. 2020

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

souhlas **ANO** Datum: 1. 04. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL-3

Soupis:

68 - Hliníkové lišty - obklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 355,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: 68 - Hliníkové lišty - obklady

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 355,20
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	47 355,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL-3
Soupis: 68 - Hliníkové lišty - obklady

Místo: Datum:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě Projektant: ateliér 38
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 355,20	
D	771	Podlahy z dlaždic a obklady					47 355,20	
211	K	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k soklíkům	m	259,58300	169,59	44 022,68	
	vv		622-362,417		259,58300			
	vv		Součet		259,58300			
213	K	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	440,22680	7,57	3 332,52	
