

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek č. 1“

Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov

číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 0192A20

číslo smlouvy objednatele: 6/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace

Tel: **387 021 010**

E-mail: **sekretariat@susjk.cz**

IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**

ID datové schránky: **cadk8eb**

Bankovní spojení: **[redacted]**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha** tel.: **387 021 010**

Zástupce ve věcech technických: **[redacted]** tel.: **[redacted]**

Technický dozor stavebníka (dále TDS): **[redacted]** tel.: **[redacted]**

Koordinátor bezpečnosti práce: **[redacted]** tel.: **[redacted]**

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**

Sídlo: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

Zastoupený: **[redacted]**, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb,
Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci) a

[redacted], vedoucím provozu Jih na úseku Dopravních a
inženýrských staveb, Oblast Čechy - Střed

IČO: **43005560** DIČ: **CZ43005560**

Bankovní spojení: **[redacted]**

Zápis v OR: **Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006**

Zástupce ve věcech technických: **[redacted]**, vedoucím provozu Jih, tel.: **[redacted]**

Odpovědný stavbyvedoucí: **[redacted]**, tel.: **[redacted]**, (č. autorizace 0011394)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Preamble

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 8.4.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov**“, (dál jen „**Smlouva o dílo**“).

Smluvní strany souhlasně konstatují, že v průběhu realizace díla předložil zhotovitel Dopisem ze dne 20. 4. 2020 objednateli návrh (variantu) způsobu nového řešení realizace stavby. Předložený návrh nového způsobu řešení spočívá v provedení recyklace za studena namísto výměny původních konstrukčních vrstev. Tato záměna technologie prací má významný pozitivní vliv na celkovou cenu při zachování stejné kvality díla. Dalším dopadem změny je i zkrácení celkové doby výstavby díla.

Na základě výše uvedeného a přiloženého změnového list č. 1, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, který upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

3. Předmět dodatku č. 1

3.1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo.

3.2. Znění článku 2. Předmět plnění, odst. 2.2. se nahrazuje následujícím zněním:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 6/VZ/2020, dále projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce silnic v průtahu obcí Kraselov**“ zpracovanou projekční kanceláří **VPÚ DECO PRAHA a.s.**, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo a dále změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí dodatku č. 1.

3.3. Znění článku 3. Termín plnění, odst. 3.1 se nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad duben 2020)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **105 kal. dnů** ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 150 kal. dnů** ode dne předání staveniště včetně (viz bod SoD 3.6.)

3.4. Znění článku 3. Termín plnění, odst. 3.6 se nahrazuje následujícím zněním:

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 150 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

3.5. Příloha č. 2 (Závazný časový harmonogram stavebních prací) Smlouvy o dílo, uvedená v článku 10. bodě 10.11. Smlouvy o dílo, se nahrazuje novým aktualizovaným harmonogramem stavebních prací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

3.6. Znění článku 4. Cena díla, odst. 4.1. se nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	8 566 974,84 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH	1 764 900,00 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	-2 706 494,88 Kč

Smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	7 625 379,96 Kč
DPH 21%	1 601 329,79 Kč

Smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	9 226 709,75 Kč
--	------------------------

slovy: devět milionů dvě stě dvacet šest tisíc sedm set devět korun českých a sedmdesát pět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven zhotovitelem ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá 2 stejnopisy, zbylé 2 řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.
- 4.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující.
- 4.6. Přílohou tohoto dodatku č. 1 jsou:
 - Aktualizovaný harmonogram stavebních prací
 - Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích, dne: 15. 05. 2020

V Praze, dne: 14. 05. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Šticha,
ředitel organizace

ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb,
Oblast Čechy
PORR a.s.
(na základě plné moci)

vedoucí provozu Jih na úseku
Dopravních a inženýrských
staveb, Oblast Čechy
PORR a.s.
(na základě plné moci)

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



OPIS

PORR a.s.

PLNÁ MOC ev.č.20/2020

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu [REDAKCE] vedoucímu provozu jih na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, [REDAKCE]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15. 1. 2020.

[REDAKCE]
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

[REDAKCE]
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[REDAKCE]

OVĚŘENÍ – VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listu. -----

V Praze dne 28. ledna 2020





PORR a.s.

OPIS

PLNÁ MOC
ev.č.16/2020

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu [REDACTED] řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, [REDACTED]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020

[REDACTED]
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

[REDACTED]
Josef Husar
člen představenstva


Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


[REDACTED]

OVĚŘENÍ – VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listu. -----

V Praze dne 23. dubna 2020



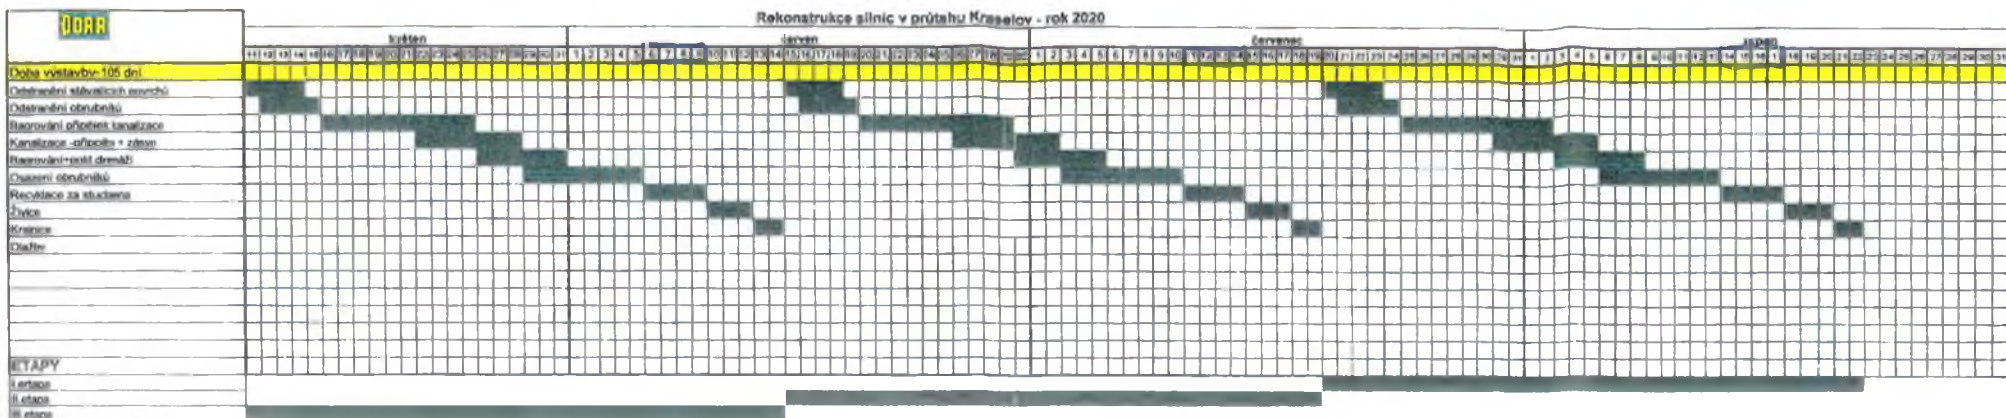

Stavba: Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov

č. smlouvy objednatele:

Úsek: SO 101,SO 180

č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:** STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. - [REDACTED]**AD:** SAGASTA S.R.O. - [REDACTED]**Zhotovitel:** PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Předmět změny:**Zkrácení délky výstavby a změna provádění**

Odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu – 100 mm a v místech kde nejsou AC vrstvy odtěžení vrstvy PM na niveletu - 100 mm

- provedení rozdrůžení (rozfrézování) stávajících vrstev vhodnou technikou v tl. 200mm
- provedení recyklace za studena dle TP 208 na místě s reprofilací v tl. 200mm s pojivem cement, zhutnění adekvátní hutnicí technikou.

- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,6-1,0kg/m²

- Pokládka AHV ACL 22+ v tl. 70mm (ČSN EN 13108-1)

- Provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m²

- Pokládka AHV ACO 11+ v tl. 40mm (ČSN EN 13108-1)

V důsledku této změny by se neprováděl odkop stávajících konstrukčních vrstev a následné skládkování nevhodného materiálu. Na základě místního šetření není třeba provádět zlepšení pláňe.

Dotčené místo:

SO 101,SO 180

Odkaz na výkresy:**Odkaz na soupis prací:**

viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

odst.IV čl. 4

Návrh ocenění:

méněpráce

-2 706 494,88

více práce

1 764 900,00

Celkem bez DPH**-941 594,88**

Nová cena bez DPH

7 625 379,96

DPH 21%

1 601 329,79

Nová cena s DPH

9 226 709,75

Podpis navrhovatele:**Datum:**

7.5.2020

Vyjádření:**TDS:** souhlasí dle AD

datum:

AD: souhlasí při vhodném podloží

datum:

Investor :

datum:

7.5.2020
15.05.2020

podpis

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 2

Název projektu: Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov					Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 101 - rekonstrukce silnic									
poř. číslo po	popis a kód položky	máma jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	cena/měr jednotku v Kč	rozdíl množství	cena ve smlouvě Kč	cena po změně Kč	rozdíl cena po změně
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t							
5	ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	m3							
8	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	m3							
13	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	m3							
20	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	m3							
21	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3							
X	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM TL DO 200MM - 567541	m2							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:			-806 710,18						

Změnový list - část 2

Název projektu: Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov					Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 180 - Dopravní inženýrská opatření									
poř. číslo pol.	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	cena/měr. jednotku v Kč	rozdílné množství	cena ve smlouvě Kč	cena po změně Kč	rozdíl cena po změně
8	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN							
9	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN							
12	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN							
15	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN							
20	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN							
21	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN							
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:		-134 884,70							

PORR a.s. , Oblast Čechy
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

se sídlem: Nemanická 2133/10
České Budějovice, 370 10
IČ: 70971641, DIČ: CZ70971641

Borek Růžek

vedoucí provozu JIH

K rukám: Ing. Jan Štícha

V Praze, dne 30.4.2020

Věc: - **Průvodní dopis ke změnovému listu č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“**

Vážený pane řediteli,

jakožto zástupce zhotovitele stavby si Vám dovoluji předložit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podepsanou dne 08.04.2020, který by měl vliv na realizaci díla „Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“ (číslo smlouvy objednatele 6/VZ/2020).

Nový návrh způsobu řešení spočívá v provedení „studené recyklace“ namísto výměny původních konstrukčních vrstev. Dne 26.3.2020 si zhotovitel dovolil nechat udělat místní šetření za účasti zástupce firmy **TPA ČR, s.r.o.**, kde je doporučeno nové možné souvrství.

Na základě místního šetření doporučujeme tento způsob opravy komunikace:

- Odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu – 100 mm a v místech kde nejsou AC vrstvy odtěžení vrstvy PM na niveletu - 100 mm
- provedení rozdržení (rozfrézování) stávajících vrstev vhodnou technikou v tl. 200mm
- provedení recyklace za studena dle TP 208 na místě s reprofilací v tl. 200mm s pojivem cement, zhutnění adekvátní hutní technikou.
- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,6-1,0kg/m²
- Pokládka AHV ACL 22+ v tl. 70mm (ČSN EN 13108-1)
- Provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m²
- Pokládka AHV ACO 11+ v tl. 40mm (ČSN EN 13108-1)

Doporučené souvrství:

ACO 11+ (50/70)	40mm	ČSN 736121, TKP kap.7
PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m ²		ČSN 736129, TKP kap.26
ACL 22+ (50/70)	70mm	ČSN 736121, TKP kap.7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m²

RS 0/63 CA

200mm

Stávající konstrukce

ČSN 736129, TKP kap.26

TP 208

V důsledku této změny by se neprováděl odkop stávajících konstrukčních vrstev a následné skládkování nevhodného materiálu. Na základě místního šetření není třeba provádět zlepšení pláně. Tyto změny nijak neovlivní životnost komunikace.

Tvorba ceny položky „studené recyklace“ vyplívá ze smlouvy čl.4 bod 4.6. – Položka „studené recyklace“ je novou položkou, tudíž je doplněna z aktuální cenové soustavy.

KÓD P.	NÁZEV	MJ	CENA/MJ
567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	

V rámci dlouhodobých obchodních vztahů, Vám dáváme obchodní slevu na tuto položku. Jednotková cena po slevě

Tato změna má dopad do SoD, zejména čl.3.1 a čl.4.1. Vznikne časová úspora (viz příložený HMG) pro bod 3.1:

Původní znění:

Dokončení prací a předání stavby: **240 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 270 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.6.)

Zde by zhotovitel navrhoval nové znění pro bod 3.1:

Dokončení prací a předání stavby: **105 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně (uvedení do provozu)**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.6.)

Dále by vznikla finanční úspora celého díla (viz návrh změnového listu) jako celku, která by měla dopad pro bod 4.1:

Původní znění:

Smluvní cena díla bez DPH

8 566 974,84 Kč

DPH 21%

1 799 064,72 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH

10 366 039,56 Kč

Zde by zhotovitel navrhoval nové znění pro bod 4.1:

Smluvní cena díla bez DPH

7 625 379,96 Kč

DPH 21%

1 601 329,79 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH

9 226 709,75 Kč

S přátelským pozdravem



vedoucí provozu Jih na úseku Dopravních a
inženýrských staveb, Oblast Čechy
PORR a.s.

Přílohy:

- Návrh dodatku č.1
- HMG stavby po etapách
- Změnová list č.1 + soupisy prací
- zpráva CB-007-2020 od firmy TPA ČR, s.r.o.



SAGASTA

PROJEKČNÍ, INŽENYRSKÁ
A KONSULTAČNÍ SPOLEČNOST

Elektronická Tiskárna - 142 00 Praha 4 - info@sagasta.cz

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka: SG/./....

Vyřizuje/tel.: [REDACTED]

PORR a.s.

[REDACTED]
Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 - Strašnice

Praha 07. 05. 2020

Věc: „Vyjádření AD ke změně konstrukce vozovky na akci Rekonstrukce silnic v průtahu obcí Kraselov“

Vážený pane,

navrženou opravu konstrukce vozovky dle doporučení zpracované TPA ČR s.r.o. ze dne 30.3.2020, lze realizovat na podloží vozovky ze zemin vhodných dle ČSN 73 6133 při dodržení požadavku na kvalitní a funkční povrchové i podpovrchové odvodnění konstrukce vozovky. Vhodnost zemin v podloží vozovky bude prokázána laboratorními zkouškami a dále bude doplněno posouzení konstrukce na odolnost proti mrazovým zdvihům.

S pozdravem [REDACTED]



TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 1821/31
370 06 Č. Budějovice

PORR,a.s.
Ladislav Zach
Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10

České Budějovice, 30.3.2020
Vyřizuje: [REDACTED]
Zpráva č. CB-007-2020

Sil.III/1709, 1726, 1712 Kraselov Doporučení způsobu opravy komunikace

Dne 26.3.2020 bylo provedeno místní šetření za účelem posouzení aktuálního stavu vozovky a ověření platnosti návrhu opravy Zprávou o diagnostice vozovky č.8/2019 provedené firmou RODOS Praha.

Na základě výsledků místního šetření doporučuji tento způsob opravy komunikací:

- odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 100 mm a a v místech kde nejsou AC vrstvy odtěžení vrstvy PM na na niveletu – 100 mm
- provedení rozdružení (rozfrézování) stávajících vrstev vhodnou technikou v tloušťce 200 mm
- provedení recyklace za studena dle TP 208 na místě s reprofilací v tl. 200 mm s pojivem cement + asfaltová emulze, zhutnění adekvátní hutnicí technikou
- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,6-1,0 kg/m²
- pokládka AHV ACL 22+ v tloušťce 70 mm (ČSN EN 13108-1)
- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m²
- pokládka AHV ACO 11+ v tloušťce 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Doporučené souvrství:

ACO 11+ (50/70)	40 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7
PS C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,6 kg/m ²		ČSN 736129, TKP kap. 26
ACL 22+ (50/70)	70 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7
PI C v množství zbytk.pojiva 0,2-0,6 kg/m ²		ČSN 736129, TKP kap. 26
RS 0/63 CA	200 mm	TP 208

stávající konstrukce



TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 1821/31
370 06 Č. Budějovice

Predikce životnosti 25 let – recyklace a obnova asfaltových vrstev s navýšením nivelety.

ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem. Předpokládaný odhad dávkování pojiva je - cement min. 4 % , asfaltová emulze min.2%

Stavební práce je nutné realizovat ve vhodných klimatických podmínkách. Pro zaručení dlouhodobé funkčnosti opravené konstrukce vozovky je **zcela nezbytné a zásadní provést kvalitní a funkční povrchové i podpovrchové odvodnění konstrukce dle VL MD ČR.**

Práce doporučuji provádět za úplné uzavírky pro ideální homogenizaci vrstvy RS.

Souvrství stávající vozovky a doporučené způsoby stavební úpravy dotčené pozemní komunikace jsou navrženy na období minimálně 25 let. To je podmíněno funkčním systémem hospodaření s vozovkou dle TP 87 MD ČR, jak na síťové tak i projektové úrovni.

Diagnostický průzkum vozovky nenahrazuje projektovou dokumentaci ve smyslu Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Zprávu jsme provedli na základě Certifikace ISO pro Diagnostické a průzkumné práce č. 45098 a Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací č. 407/2017

V Českých Budějovicích 30.3.2020

