



Číslo účtu: 30320881/0710

Stavební příprava a napojení mobilních datových center – realizace

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO  
„Stavební příprava a napojení mobilních  
datových center – realizace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. 12. 2019  
pod. č.j. Objednatele: ZSM-106-26/OVZ-2019  
(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**


Se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  
(dále jen „Objednatel“)  
č.j. Dodatku č. 1: ZSM-106-33/OVZ-2019

**a**

**TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.**

Se sídlem: Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15  
IČO: 25740253  
DIČ: CZ25740253  
Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 5803  
Datová schránka: ffjsu3c  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu: 5060014300/5500  
Zastoupená: Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva  
(dále jen „Zhotovitel“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.



## 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 90 101,60 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 13 224,00 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 30 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o dílo.
- 1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnových listech č. 1 až 4 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“).

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 76 877,60 Kč  
(slovy: sedmdesát šest tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých a šedesát haléřů),
  - b) DPH 21 % ve výši 16 144,30 Kč  
(slovy: šestnáct tisíc sto čtyřicet čtyři korun českých a třicet haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 93 021,90 Kč  
(slovy: devadesát tři tisíc dvacet jedna korun českých a devadesát haléřů).


## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i

na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha:  
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 4.



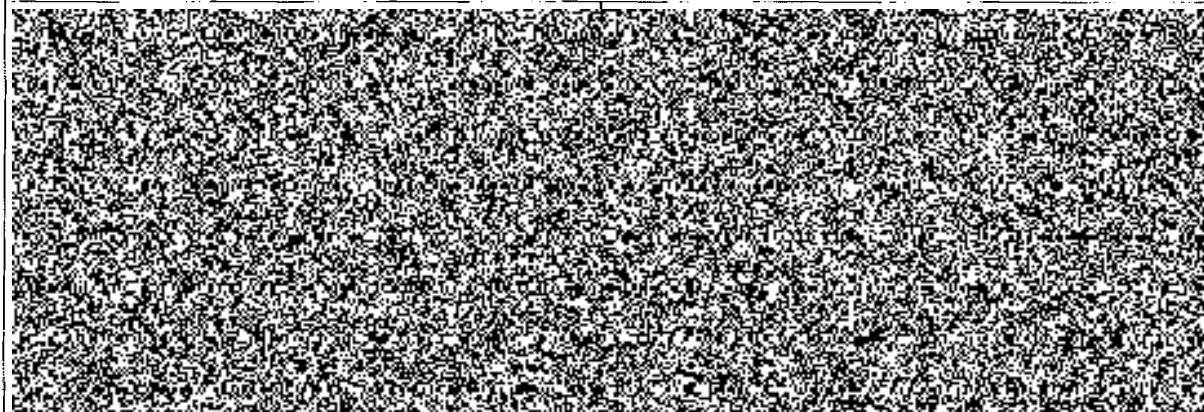

**ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN**



**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>1</b>	
<b>Identifikace akce:</b>			
Název akce:	Stavební příprava a napojení mobilních datových center - realizace		
Číslo akce FDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114VS1400-9013		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10		
Zhotovitel:	Temo-Telekomunikace a.s., U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10		
Projektant:	[redacted]		
<b>Předmět změnového listu:</b>			
Terénní úpravy plochy pod kontejnery v části zeleně.			
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>			
Stavební řešení			
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
Plochu zeleně pod kontejnery PD neřeší			
<b>Nové řešení:</b>			
Stržení zeminy, likvidace pařozu, položení geotextílie, zasypaní štěrkem			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Prorůstání zeleně pod kontejnery.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>			
Zanesení do DSPS a vyznačení plochy.			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>			
Řešeno v zápise z KD č.5 ze dne 29.1.2020			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: ANO			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		27 128,44 Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		- Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		27 128,44 Kč	
<b>DPH 21%</b>		5 696,97 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		32 825,41 Kč	
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za projektanta:</b>	<b>Za technický dozor investora:</b>
[redacted]		-	[redacted]
Datum:		Datum:	Datum:
<b>Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:</b>			
[redacted]		[redacted]	
Datum:			





**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>2</b>	
<b>Identifikace akce:</b>			
Název akce:	Stavební příprava a napojení mobilních datových center		
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V51400-9013		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10		
Zhotovitel:	Temo-Telekomunikace a.s., U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10		
Projektant:			
<b>Předmět změnového listu:</b>			
Úprava betonových patek			
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>			
Stavební řešení			
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
Neřeší se			
<b>Nové řešení:</b>			
Betonové patky pro uložení kontejnerů budou zakončeny a výškově vyrovnány betonem s rozptýlenými ocelovými vlákny.			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Vyrovnání výšky patek a jejich začištění			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>			
NE			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>			
Řešeno v zápise z KD č.5 ze dne 29.1.2020			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: ANO			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		18 699,66 Kč	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		- Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		18 699,66 Kč	
<b>DPH 21%</b>		3 926,93 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		22 626,59 Kč	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>	<b>Za technický dozor investora:</b>	
	-		
<b>Datum:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Datum:</b>	
<b>Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:</b>			
			
<b>Datum:</b>			

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>3</b>	
<b>Identifikace akce:</b>			
Název akce:	Stavební příprava a napojení mobilních datových center		
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V51400-9013		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10		
Zhotovitel:	Temo-Telekomunikace a.s., U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10		
Projektant:			
<b>Předmět změnového listu:</b>			
Náhrada za zemní pásek FeZn 40/5			
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>			
Silnoproudá elektroinstalace			
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
Natažení zemního pásku FeZn 40/5 od PS1 do rozvodny pole č.5 v celé délce napájecích kabelů			
<b>Nové řešení:</b>			
Nahrazení zemního pásku FeZn 40/5 kabelem CYA 50mm od vstupu do anglického dvorku do rozvodny pole č.5			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Nemožná (nevyhovující) montáž zemního pásku FeZn 40/5 na nové nebo stávající žlaby v kabelových trasách (kanálech)			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>			
Zanesení do DSPS a vyznačení trasy.			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>			
Řešeno v zápise z KD č.5 ze dne 29.1.2020			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: ANO			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>17 018,50 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>13 224,00 Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>3 794,50 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>		<b>796,85 Kč</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>4 591,35 Kč</b>	
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za projektanta:</b>	<b>Za technický dozor investora:</b>	
	-		
<b>Datum:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Datum:</b>	
<b>Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:</b>			
			
<b>Datum:</b>			

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>4</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Stavební příprava a napojení mobilních datových center	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V51400 9013	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Terno Telekomunikace a.s. , U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10	
Projektant:		
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Napájení místnosti č.012		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Sílnoproudá elektroinstalace		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
Nebylo řešeno		
<b>Nové řešení:</b>		
Natažení napájecího kabelu CYKY 5x6 od PS1 do m.č.012		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Požadavek investora. Přivedení napájecího kabelu z mobilních kontejnerů pro zabezpečovací a tishové signalizace místnosti č.012.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
Zanesení do DSPS a vyznačení trasy.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Řešeno v zápise z KD č.2 ze dne 8.1.2020		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ANO (30 dnů)		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		27 255,00 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		- Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		27 255,00 Kč
<b>DPH 21%</b>		5 723,55 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		32 978,55 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
	-	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum:		
