

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jako „Dodatek č. 5“)

u objednatele evidované pod číslem TS-1818/2019

název akce: „MV - Praha 6, Markéta – rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch - stavební práce – 2“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Název: Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna 2009

Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

IČO: 75151898

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ing. Jirím Beranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV

(dále jen „objednatel“)

a

Název: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Sídlo: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Kontaktní adresa: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

IČO: 27967638

DIČ: CZ27967638

Její jménem jedná: Jaroslav Karásek, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

E-mail:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně rovněž označení „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo evidované pod číslem TS-1818/2019

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21. 5. 2019 uzavřena smlouva o dílo, č.j. TS-1818/2019 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „MV - Praha 6, Markéta – rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch - stavební práce – 2“ (dále též jako „**Dílo**“); dne 6. 9. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy č.j. TS-2973/2019 a dodatek č. 2 Smlouvy č.j. TS-3003/2019; dne 24. 1. 2020 byl uzavřen dodatek č. 3 Smlouvy č. j.: TS-220/2020; dne 20. 4. 2020 byl uzavřen dodatek č. 4 Smlouvy č. j.: TS-1024/2020;
- (B) v čl. I. odst. 2 dodatku č. 4 Smlouvy smluvní strany sjednaly, že se termín dokončení a předání Díla dle Smlouvy ve znění pozdějších dodatků prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel v době ode dne účinnosti dodatku č. 4 Smlouvy přeruší realizaci Díla z důvodu nemožnosti dopravit do ČR umělý trávník z Itálie z důvodu probíhajícího onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Cov-2; v souladu s čl. I. odst. 2 dodatku č. 4 Smlouvy pak zhotovitel v období od 28. 4. 2020 do 6. 5. 2020 přerušil realizaci Díla v části umělého trávníku (toto přerušení realizace díla bylo zaznamenáno ve stavebním deníku); zhotovitel nemohl z důvodu uzavření provozů v Itálii dopravit do ČR umělý trávník od výrobce; přerušení realizace Díla v části umělého trávníku trvalo po dobu 9 dnů;
- (C) smluvní strany se dále dohodly, že případná změna termínu plnění dle čl. I. odst. 2 dodatku č. 4 bude následně písemně upravena dodatkem ke Smlouvě, a to o dobu, po kterou bude trvat oprávněné přerušení realizace Díla;
- (D) zhotovitel dále v souladu s čl. I. odst. 5 dodatku č. 1 přerušil v období od 10. 5. 2020 do 15. 5. 2020 realizaci Díla v části pokládky umělého trávníku III. generace z důvodu nevhodných klimatických podmínek (toto přerušení realizace díla bylo rovněž zaznamenáno ve stavebním deníku); v souladu s čl. I. odst. 5 dodatku č. 1 se o dobu přerušení prodlužuje doba realizace Díla;
- (E) ostatní části Díla nedotčené přerušením (citovaném v písm. B a D preambule tohoto dodatku č. 5 Smlouvy) zhotovitel dokončí v termínu sjednaném pro dokončení a předání Díla ve smyslu čl. 1 odst. 3 dodatku č. 4 Smlouvy, tj. konkrétně v termínu nejpozději do 1. 6. 2020.

DOHODLY SE STRANY TAKTO:**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III odst. 5 Smlouvy **se mění a nahrazuje první věta** ve znění. Smluvní strany se dohodly, že celkové dokončené dílo (viz čl. II odst. 2 smlouvy) bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 1. 6. 2020 (za podmínky zveřejnění smlouvy v Registru smluv viz čl. XIV. odst. 3 smlouvy).“ **tímto zněním:**

„Smluvní strany se dohodly, že celkové dokončené dílo (viz čl. II odst. 2 smlouvy) bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15. 6. 2020 (za podmínky zveřejnění smlouvy v Registru smluv viz čl. XIV. odst. 3 smlouvy).“

Ostatní ustanovení čl. III Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě nepodepsání tohoto Dodatku č. 5 v jeden den, nabude tento Dodatek č. 5 platnosti pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat uzavřené smlouvy včetně příslušných dodatků k těmto smlouvám, které jsou nedílnou součástí výše uvedených uzavřených smluv, v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento Dodatek č. 5 v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 5 do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tento Dodatek č. 5, na něhož se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 5 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 5 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 5 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto Dodatku č. 5 své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků č. 1, 2, 3 a 4, která nepodléhají změnám tímto Dodatkem č. 5, zůstávají beze změn.
5. Tento Dodatek č. 5 tvoří nedílnou součást Smlouvy.


V Praze dne 1.6.2020

V Plzni dne 29.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

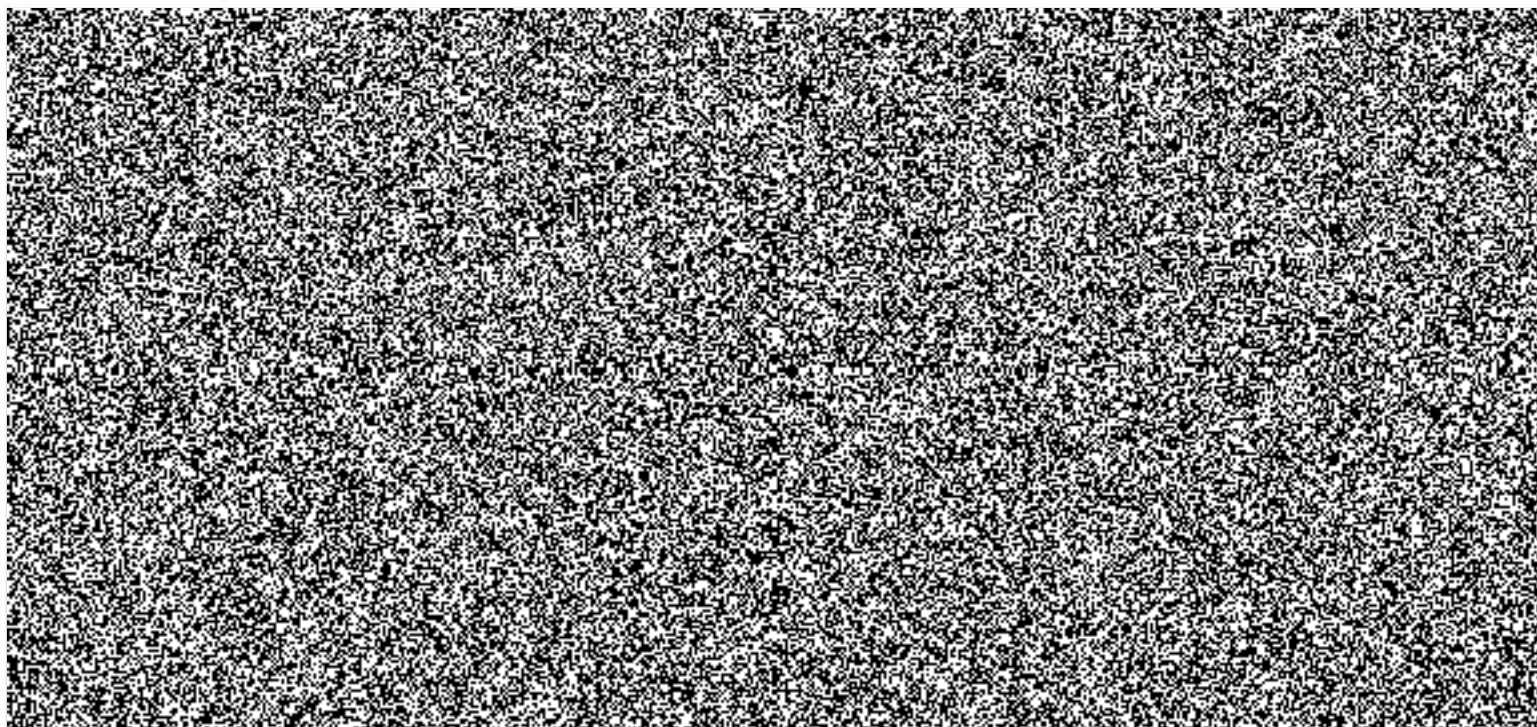

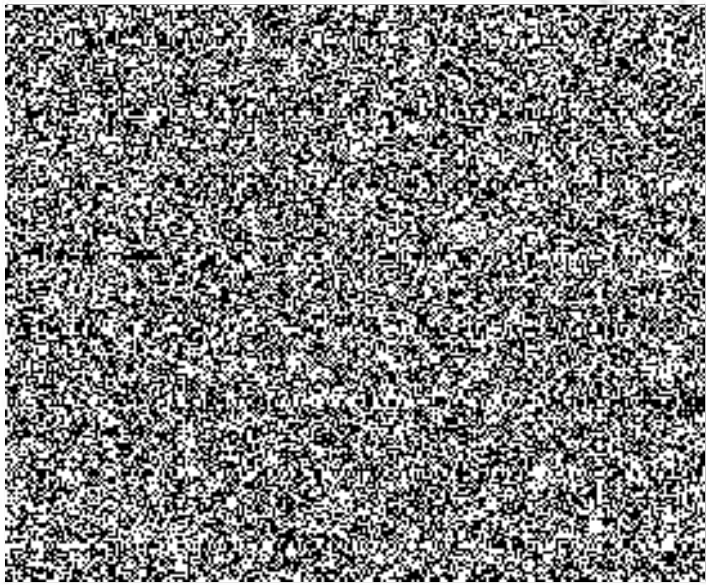

[Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.]
