



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 31</b>	
<b>ÚSEK: Zařízení pro vytápění staveb</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změna radiátorů		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM: 27.4.2020	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____ Mail	OSOBNĚ: _____	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny změna rozměrů radiátorů <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Zařízení pro vytápění staveb <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace pro výběr zhotovitele <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č. 31“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	6.318,- Kč	947,70 Kč	7.265,70Kč
Méněpráce:	-4.936,-Kč	-740,40 Kč	-5.676,40 Kč
Rozdíl:	1.382,- Kč	207,30 Kč	1.589,30 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> stavbyvedoucí, _____		<b>DATUM:</b>	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
OD: _____	PODPIS: _____	<b>DATUM:</b> 27.4.2020	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____			
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, _____		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
**DOD 6**  
**Objekt:** ZL 31 Změnový list č. 31 - Kolize radiátoru a parapetu  
**Rozpočet:** 031\_1 Změna radiátoru z důvodu kolize s parapetem - odpočtový

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:  
**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Jiří Spousta

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-4 936,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-4 936,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-4 936,00 CZK**

v

BRNE ✓

dne

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			-4 936,00	100
Cena celkem					-4 936,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 31	Změnový list č. 31 - Kolize radiátoru a parapetu
R:	031_1	Změna radiátoru z důvodu kolize s parapetem - odpočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>-4 936,00</b>
91	Pol_91	Deskové těleso spodní pravé připojení s integrovanou termostatickou vložkou 11-060060 , viz výkres 03,04,05,06,08	kus	-2,00000	2 468,00	-4 936,00
		2.NP m.č.:222 : -1		-1,00000		
		3.NP m.č.:322 : -1		-1,00000		

**Poznámka:**

**Jedná se o stávající položku z rozpočtu:  
S001\_S.1.4.2 Zařízení pro vytápění staveb.**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 31 Změnový list č. 31 - Kolize radiátoru a parapetu  
**Rozpočet:** 031\_2 Změna radiátoru z důvodu kolize s parapetem - přípočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Jiří Spousta

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	6 318,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>6 318,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**6 318,00 CZK**

v

BRNE

dne



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			6 318,00	100
Cena celkem					6 318,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 31	Změnový list č. 31 - Kolize radiátoru a parapetu
R:	031_2	Změna radiátoru z důvodu kolize s parapetem - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>6 318,00</b>
1	48457395.A	Těleso otopné des. Radik typ 11 VK v. 400 dl. 900	kus	2,00000	3 159,00	6 318,00

**Poznámka:** Jedná se o novou položku

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
**DOD 6**  
**Objekt:** ZL 31 Změnový list č. 31 - Kolize radiátoru a parapetu  
**Rozpočet:** 031\_3 Změna radiátoru z důvodu kolize s parapetem - rozdílový

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Jiří Spousta

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	1 382,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 382,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **1 382,00 CZK**

v

BRNE

dne

Brno

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			1 382,00	100
Cena celkem					1 382,00	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 31	Změnový list č. 31 - Kolize radiátoru a parapetu	
R:	031_3	Změna radiátoru z důvodu kolize s parapetem - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>1 382,00</b>
1	48457395.A	Těleso otopné des. Radik typ 11 VK v. 400 dl. 900	kus	2,00000	3 159,00	6 318,00
		2.NP m.č.:222 : 1		1,00000		
		3.NP m.č.:322 : 1		1,00000		
91	Pol_91	Deskové těleso spodní pravé připojení s integrovanou termostatickou vložkou 11-060060	kus	-2,00000	2 468,00	-4 936,00
		, viz výkres 03,04,05,06,08				
		2.NP m.č.:222 : -1		-1,00000		
		3.NP m.č.:322 : -1		-1,00000		

**Poznámka:** Položka č.1 je nová, položka č. 91 je původní z rozpočtu: SO01\_D.1.4.2 Zařízení pro vytápění staveb.





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 32</b>	
<b>ÚSEK: 799 Ostatní</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 Změna tl. materiálu kuchyňských linek      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:	Mail	_____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je změna tl. materiálu kuchyňských linek DOTČENÉ MÍSTO: 799 Ostatní ODKAZ NA VÝKRESY: revize výkresu – výpis prvků ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 32 – změna tl. materiálu kuchyňských linek“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	697 748 Kč	104 662,20 Kč	802 410,20 Kč
Méněpráce:	- 697 748 Kč	-104 662,20 Kč	802 410,20 Kč
Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ: _____			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 27.04.2020	
SCHVÁLIL: _____PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ I Magistrát města Brna, _____		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 32 Změnový list č. 32 - změna tl. materiálu kuchyňských linek  
**Rozpočet:** ZL 32 ZL 32 - odpočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabáková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-697 748,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-697 748,00</b>



### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-697 748,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-104 662,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-802 410,20 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			-697 748,00	100
Cena celkem					-697 748,00	100

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 32 Změnový list č. 32 - změna tl. materiálu kuchyňských linek  
**Rozpočet:** ZL 32 ZL 32 - odpočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabáková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-697 748,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-697 748,00</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-697 748,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-104 662,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-802 410,20 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			-697 748,00	100
Cena celkem					-697 748,00	100



## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 32	Změnový list č. 32 - změna tl. materiálu kuchyňských linek	
R:	ZL 32	ZL 32 - odpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-697 748,00</b>
290	799V00001	D+M Kuchyňská linka, délky 1,6 m		-1,00000	29 277,00	-29 277,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků :				
		X1: -1			-1,00000	
291	799V00002	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 3,3 m		-1,00000	67 133,00	-67 133,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků :				
		výsuvné horní skříňky a spodní skříňky na pojezdu :				
		X2: -1			-1,00000	
292	799V00003	D+M Kuchyňská linka, délky 2,1 m		-1,00000	39 728,00	-39 728,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků :				
		X3: -1			-1,00000	
293	799V00004	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 2,55 m		-2,00000	54 731,00	-109 462,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků :				
		výsuvné horní skříňky a spodní skříňky na pojezdu :				
		X4: -2			-2,00000	
294	799V00005	D+M Kuchyňská linka, délky 1,5 m		-12,00000	31 971,00	-383 652,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků :				
		X5: -12			-12,00000	
295	799V00006	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 1,5 m		-2,00000	34 248,00	-68 496,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků :				
		X6: -2			-2,00000	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 32 Změnový list č. 32 - změna tl. materiálu kuchyňských linek  
**Rozpočet:** ZL 32 ZL 32 - přípočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	697 748,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>697 748,00</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	697 748,00 CZK
Snížená DPH	15 %	104 662,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 802 410,20 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne





Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			697 748,00	100
Cena celkem					697 748,00	100

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 32	Změnový list č. 32 - změna tl. materiálu kuchyňských linek	
R:	ZL 32	ZL 32 - přepočít	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>697 748,00</b>
290	799V00001R	D+M Kuchyňská linka, délky 1,6 m		1,00000	29 277,00	29 277,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků revize :				
		X1R: : 1		1,00000		
291	799V00002R	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 3,3 m		1,00000	67 133,00	67 133,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků revize :				
		výsuvné horní skříňky a spodní skříňky na pojezdu :				
		X2R: : 1		1,00000		
292	799V00003R	D+M Kuchyňská linka, délky 2,1 m		1,00000	39 728,00	39 728,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků revize :				
		X3R: : 1		1,00000		
293	799V00004R	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 2,55 m		2,00000	54 731,00	109 462,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků :				
		výsuvné horní skříňky a spodní skříňky na pojezdu :				
		X4R: : 2		2,00000		
294	799V00005R	D+M Kuchyňská linka, délky 1,5 m		12,00000	31 971,00	383 652,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků :				
		X5R: : 12		12,00000		
295	799V00006R	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 1,5 m		2,00000	34 248,00	68 496,00
		D.1.1.b_15 Výpis prvků :				
		X6R: : 2		2,00000		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 32 Změnový list č. 32 - změna tl. materiálu kuchyňských linek  
**Rozpočet:** ZL 32 ZL 32 - rozdílový

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 32	Změnový list č. 32 - změna tl. materiálu kuchyňských linek	
R:	ZL 32	ZL 32 - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>						<b>0,00</b>
<b>Ostatní</b>						
290	799V00001	D+M Kuchyňská linka, délky 1,6 m		-1,00000	29 277,00	-29 277,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků :						
X1: : -1						
-1,00000						
290	799V00001R	D+M Kuchyňská linka, délky 1,6 m		1,00000	29 277,00	29 277,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků revize :						
X1R: : 1						
1,00000						
291	799V00002	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 3,3 m		-1,00000	67 133,00	-67 133,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků :						
výsuvné horní skříňky a spodní skříňky na pojezdu :						
X2: : -1						
-1,00000						
291	799V00002R	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 3,3 m		1,00000	67 133,00	67 133,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků revize :						
výsuvné horní skříňky a spodní skříňky na pojezdu :						
X2R: : 1						
1,00000						
292	799V00003	D+M Kuchyňská linka, délky 2,1 m		-1,00000	39 728,00	-39 728,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků :						
X3: : -1						
-1,00000						
292	799V00003R	D+M Kuchyňská linka, délky 2,1 m		1,00000	39 728,00	39 728,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků revize :						
X3R: : 1						
1,00000						
293	799V00004	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 2,55 m		-2,00000	54 731,00	-109 462,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků :						
výsuvné horní skříňky a spodní skříňky na pojezdu :						
X4: : -2						
-2,00000						
293	799V00004R	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 2,55 m		2,00000	54 731,00	109 462,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků :						
výsuvné horní skříňky a spodní skříňky na pojezdu :						
X4R: : 2						
2,00000						
294	799V00005	D+M Kuchyňská linka, délky 1,5 m		-12,00000	31 971,00	-383 652,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků :						
X5: : -12						
-12,00000						
294	799V00005R	D+M Kuchyňská linka, délky 1,5 m		12,00000	31 971,00	383 652,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků :						
X5R: : 12						
12,00000						
295	799V00006	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 1,5 m		-2,00000	34 248,00	-68 496,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků :						
X6: : -2						
-2,00000						
295	799V00006R	D+M Kuchyňská linka, výsuvné horní skříňky, délky 1,5 m		2,00000	34 248,00	68 496,00
D.1.1.b_15 Výpis prvků :						
X6R: : 2						
2,00000						



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>	<b>ZL 33</b>	
<b>ÚSEK: Konstrukce truhlářské</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Změna šířky dveří</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: SKR stav s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
<b>MAIL</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny je změna šířky dveří z 800 mm na 900 mm		
<b>DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce truhlářské</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace pro výběr zhotovitele		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ <b>Změna č. 33 – Změna šířky dveří</b> “		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Dne 10.3. bylo na KD stavby zjištěno, že šířka dveří 800 mm do místnosti 118 není dostatečná, aby se do místnosti dal umístit chladicí box. Z tohoto důvodu je nutné dveře šířky 800 mm včetně zárubní 800 mm (D8 – EI30, DP3) vyměnit za dveře šířky 900 mm včetně zárubní 900 mm (D13 – EI30, DP3), aby se do místnosti dal umístit chladicí box. Dne 10.3. byl vydán pokyn ke zpracování ZL.</p>		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b> [redacted]	<b>DATUM: 7.4.2020</b>	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>Magistrát města Brna,</b> [redacted]	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>	<b>ZL 33</b>
<b>ÚSEK: Konstrukce truhlářské</b>	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 Změna šířky dveří    PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB                      OD: SKR stav s.r.o.      DATUM:	
ODESLÁNO:    POŠTOU:                      KURÝR:                      FAX:                      OSOBNĚ:	
_____	_____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je výměna dveří do místností 118	
DOTČENÉ MÍSTO: <b>Konstrukce truhlářské</b>	
ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 33 – konstrukce truhlářské“	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	
	Cena bez DPH                      DPH                      Cena s DPH
Vícepráce:	18 959,76 Kč                      2 843,96 Kč                      21 803,72 Kč
Méněpráce:	-18 813,90 Kč                      -2 822,09 Kč                      -21 635,99 Kč
Rozdíl:	145,86 Kč                      21,87 Kč                      167,73 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____      DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ: _____	
OD: _____	PODPIS: _____      DATUM: 14.4. 2020
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 33 Změnový list č. 33 - změna šířky dveří  
**Rozpočet:** ZL 33 ZL 33 - odpočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-18 445,00
PSV	-368,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-18 813,90</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-18 813,90 CZK
Snížená DPH	15 %	-2 822,09 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -21 635,99 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766.1	Konstrukce truhlářské	HSV			-18 445,00	98
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-368,90	2
Cena celkem					-18 813,90	100

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 33	Změnový list č. 33 - změna šířky dveří
R:	ZL 33	ZL 33 - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766.1 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-18 813,90</b>
228	611653513R.P	dveře speciální protipožární, vnitřní, vnější, š = 800 mm, h = 1970 mm, laminátové, EI30, DP3, otevíravé, počet křídel 1, prosklení 1/3	kus	-1,00000	14 426,00	-14 426,00
		D8 - EI 30, DP3 : -1		-1,00000		
237	61181512R.P	Zárubeň obložková protipožární š. 80 cm/ st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	-1,00000	4 019,00	-4 019,00
		D8 - E130, DP3 : -1		-1,00000		
242	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstru., výšky do 24 m	%	-18 445,00000	2,00	-368,90
		-18445		-18 445,00000		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 33 Změnový list č. 33 - změna šířky dveří  
**Rozpočet:** ZL 33 ZL 33 - přípočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 588,00
PSV	371,76
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>18 959,76</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	18 959,76 CZK
Snížená DPH	15 %	2 843,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH**

**21 803,72 CZK**

v

dne

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766.1	Konstrukce truhlářské	HSV			18 588,00	98
766	Konstrukce truhlářské	PSV			371,76	2
Cena celkem					18 959,76	100

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 33	Změnový list č. 33 - změna šířky dveří	
R:	ZL 33	ZL 33 - přípočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766.1</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>18 959,76</b>
229	611653514R	dveře speciální protipožární, vnitřní, vnější, š = 900 mm, h = 1970 mm, laminátové, EI 30, DP3, otevíravé, počet křídel 1, prosklení 1/3	kus	1,00000	14 468,00	14 468,00
				<b>D13 - EI30, DP3: 1 ks : 1</b>	<b>1,00000</b>	
241	61181523R	Zárubeň obložková protipožární š. 90 cm/st. 18-25 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	1,00000	4 120,00	4 120,00
				<b>D13 EI30, DP3:1 ks : 1</b>	<b>1,00000</b>	
242	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstru., výšky do 24 m	%	18 588,00000	2,00	371,76
				<b>185,88</b>	<b>18 588,00000</b>	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
 DOD 6  
**Objekt:** ZL 33 Změnový list č. 33 - změna šířky dveří  
**Rozpočet:** ZL 33 ZL 33 - rozdílový

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	143,00
PSV	2,86
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>145,86</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	145,86 CZK
Snížená DPH	15 %	21,87 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 167,73 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne



Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766.1	Konstrukce truhlářské	HSV			143,00	98
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2,86	2
Cena celkem					145,86	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 33	Změnový list č. 33 - změna šířky dveří	
R:	ZL 33	ZL 33 - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766.1 Konstrukce truhlářské</b>						<b>145,86</b>
228	611653513R.P	dveře speciální protipožární, vnitřní, vnější, š = 800 mm, h = 1970 mm, laminátové, EI30, DP3, otevíravé, počet křídel 1, prosklení 1/3	kus	-1,00000	14 426,00	-14 426,00
				-1,00000		
229	611653514R	dveře speciální protipožární, vnitřní, vnější, š = 900 mm, h = 1970 mm, laminátové, EI 30, DP3, otevíravé, počet křídel 1, prosklení 1/3	kus	1,00000	14 468,00	14 468,00
				1,00000		
237	61181512R.P	Zárubeň obložková protipožární š. 80 cm/ st. 6-17 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	-1,00000	4 019,00	-4 019,00
				-1,00000		
241	61181523R	Zárubeň obložková protipožární š. 90 cm/st. 18-25 cm, CPL buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	1,00000	4 120,00	4 120,00
				1,00000		
242	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstru., výšky do 24 m	%	143,00000	2,00	2,86



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 34</b>
<b>ÚSEK: Konstrukce klempířské</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Atiky a konstrukce klempířské</b>		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
MAIL		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Předmětem změny je doplnění klempířských konstrukcí		
<b>DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce klempířské</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> projektová dokumentace pro výběr zhotovitele		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č. 34 – Atiky a konstrukce klempířské“		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Zhotovitel stavby zjistil, že ve smluvním VV chybí oplechování atiky šikmé střechy k č.p.36; dále boční lemování nadezdívky šikmé střechy k č.p. 36 a 40, boční lemování k pultovému vikýři, boční lemování nadezdívky šikmé střechy od č.p. 36 a 40 a lemování závětrné hrany krytiny z tašek. Dne 2.4.2020 vydal investor pokyn ke zpracování změnového listu.</p>		
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [redacted]		<b>DATUM:</b> 2.4.2020
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
[redacted]	DI Magistrát města Brna,	[redacted]



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ DOD 6 Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6

**Objekt:** ZL 34 Změnový list č. 34 - klempířské konstrukce

**Rozpočet:** ZL 34 klempířské konstrukce - odpočet

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-32 053,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-32 053,46</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-32 053,46 CZK
Snížená DPH	15 %	-4 808,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **-36 861,48 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  


Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  


Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-32 053,46	100
Cena celkem					-32 053,46	100

### Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 34	Změnový list č. 34 - klempířské konstrukce
R:	ZL 34	klempířské konstrukce - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-32 053,46</b>
196	764817143R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 430 mm dodávka a montáž	m	-31,50000	951,00	-29 956,50
		D.1.1.b_15 Výpis prvků :				
		K10: -(31,5)		-31,50000		
198	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-299,56500	7,00	-2 096,96

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ DOD 6 Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6

**Objekt:** ZL 34 Změnový list č. 34 - klempířské konstrukce

**Rozpočet:** ZL 34 klempířské konstrukce - připočet

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	70 196,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>70 196,54</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	70 196,54 CZK
Snížená DPH	15 %	10 529,48 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **80 726,02 CZK**

v

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			70 196,54	100
Cena celkem					70 196,54	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 34	Změnový list č. 34 - klempířské konstrukce	
R:	ZL 34	klempířské konstrukce - přípočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>70 196,54</b>
1	764430210R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš do 250 mm dodávka a montáž	m	30,60000	359,55	11 002,23
		Boční lemování nadezdívky šikmé střechy od č.p.36 :				
		K10: : 6,8*2		13,60000		
		Lemování závětné hrany krytiny z taškových tabulí :				
		6,5*2+1,0*4		17,00000		
2	764430220R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330-350 mm dodávka a montáž	m	40,80000	430,20	17 552,16
		Boční lemování nadezdívky rš 350 mm šikmé střechy od č.p.36 :				
		K10: : (6,8*2)		13,60000		
		Boční lemování nadezdívky rš 330 mm šikmé střechy od p.č. 36 a 40 :				
		K10: : (6,8*2)*2		27,20000		
3	764430230R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 450 mm dodávka a montáž	m	27,20000	467,10	12 705,12
		Boční lemování nadezdívky šikmé střechy k č.p.40 :				
		K10: : 6,8*2		13,60000		
		Boční lemování k pultovému vikýři :				
		K10: : 6,8*2		13,60000		
4	764817158R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 580 mm dodávka a montáž	m	13,60000	470,70	6 401,52
		Atika šikmé střechy k č.p. 36 :				
		K10: : 6,8*2		13,60000		
5	764817168R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 680 mm dodávka a montáž	m	13,60000	510,30	6 940,08
		Atika šikmé střechy k č.p.40 :				
		K10: : 6,8*2		13,60000		
6	764817175R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm dodávka a montáž	m	17,90000	614,70	11 003,13
		Atika ploché střechy :				
		K10: : 11+6,9		17,90000		
198	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	656,04240	7,00	4 592,30

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ DOD 6 Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
**Objekt:** ZL 34 Změnový list č. 34 - klempířské konstrukce  
**Rozpočet:** ZL 34 klempířské prvky - rozdílový

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
 Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	38 143,08
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>38 143,08</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	38 143,08 CZK
Snížená DPH	15 %	5 721,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH**

**43 864,54 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

  
 \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_

Za objednatele

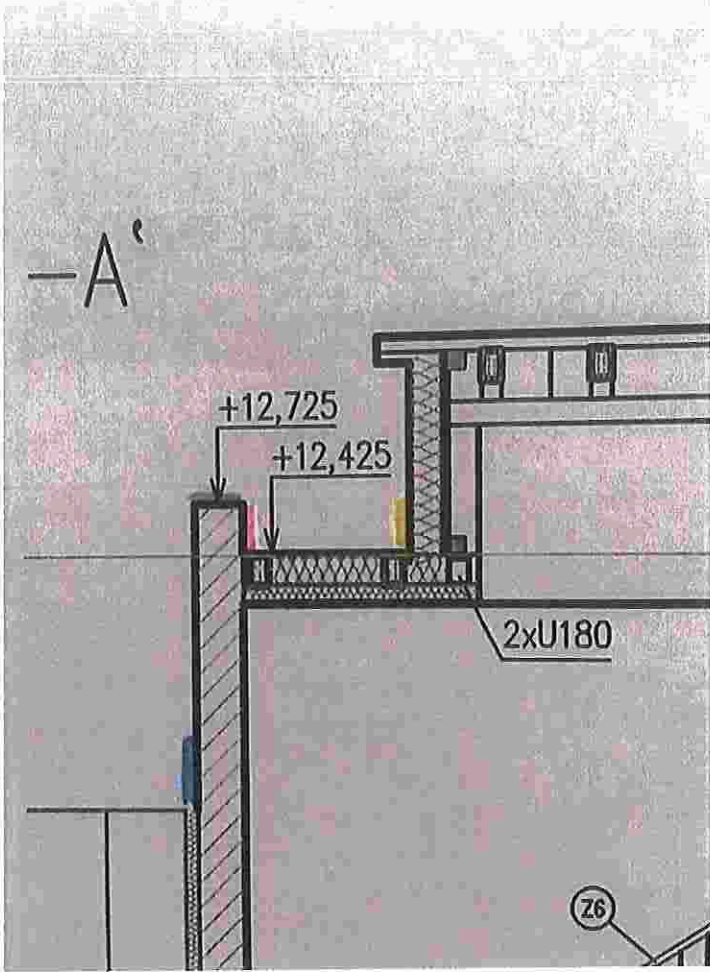
## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			38 143,08	100
Cena celkem					38 143,08	100

### Položkový rozpočet




S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6		
O:	ZL 34	Změnový list č. 34 - klempířské konstrukce	
R:	ZL 34	klempířské prvky - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>38 143,08</b>
1	764430210R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš do 250 mm dodávka a montáž	m	30,60000	359,55	11 002,23
		Boční lemování nadezdívky šikmé střechy od č.p.36 :				
		K10: : 6,8*2		13,60000		
		Lemování závětrné hrany krytiny z taškových tabulí :				
		6,5*2+1,0*4		17,00000		
2	764430220R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330-350 mm dodávka a montáž	m	40,80000	430,20	17 552,16
		Boční lemování nadezdívky rš 350 mm šikmé střechy od č.p.36 :				
		K10: : (6,8*2)		13,60000		
		Boční lemování nadezdívky rš 330 mm šikmé střechy od p.č. 36 a 40 :				
		K10: : (6,8*2)*2		27,20000		
3	764430230R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 450 mm dodávka a montáž	m	27,20000	467,10	12 705,12
		Boční lemování nadezdívky šikmé střechy k č.p.40 :				





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>	<b>ZL 36</b>	
<b>ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>SDK předstěny</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: SKR stav s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR: FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
	<b>MAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem změny je doplnění výměry SDK předstěn</b>		
<b>DOTČENÉ MÍSTO: Svislé a kompletní konstrukce</b>		
<b>ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele</b>		
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 36 – SDK předstěny“</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Dne 22.4. požádal zhotovitel o upřesnění výšek předsazených stěn na Geberity. Ve VV i projektové dokumentaci je počítáno ze standardní výškou 1,2 m a jelikož jsou v předstěnách vedené stupačky kanalizace až do stropní konstrukce, doporučil ADP protáhnutí předstěn od projektové výšky (1200 mm) až ke stropní konstrukci, což bylo následně odsouhlaseno zástupcem objednatele. Tímto dojde k celoplošnému zakrytí rozvodů ZTI probíhajících místností, od podlahy až ke stropu. Změnový list řeší přípočet výměry položky č. 61.</p>		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b> 	<b>DATUM: 24.4.2020</b>	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Bytový dům Nováčkova 38, Brno</b>		<b>ZL 36</b>	
<b>ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36</b>	
<b>SDK předstěny</b>			
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____ Mail	OSOBNĚ: _____	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Předmětem je doplnění výměry SDK předstěn</b>			
<b>DOTČENÉ MÍSTO: Svislé a kompletní konstrukce</b>			
<b>ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro výběr zhotovitele</b>			
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna 36 – SDK předstěny“</b>			
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	13 938,37 Kč	2 090,76 Kč	16 029,13,- Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	13 938,37 Kč	2 090,76 Kč	16 029,13,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: stavbyvedoucí, _____		DATUM: _____	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 27.4.2020	
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> DI Magistrát města Brna, _____		



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 19/328\_ZL\_ Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6  
DOD 6

**Objekt:** ZL 36 Změnový list č. 36 - přípočet SDK předstěn

**Rozpočet:** ZL 36 ZL 36 - přípočet předstěn

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
61400 Brno

**Vypracoval:** Veronika  
Hrabálková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 938,37
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>13 938,37</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	13 938,37 CZK
Snížená DPH	15 %	2 090,76 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**16 029,13 CZK**


v

\_\_\_\_\_

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 938,37	100
Cena celkem					13 938,37	100

## Položkový rozpočet

S:	19/328_ZL_DO Bytový dům Nováčkova 38 - ZL - DOD 6	
O:	ZL 36	Změnový list č. 36 - přípočet SDK předstěn
R:	ZL 36	ZL 36 - přípočet předstěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>13 938,37</b>
61	347016133R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5mm, impregnovaná, EI15	m2	22,55400	618,00	13 938,37

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Výkresy D.1.1.b\_3 Púdorys 1.NP, D.1.1.b\_4 Púdorys  
2.NP, D.1.1.b\_5 Púdorys 3.NP, D.1.1.b\_6 Púdorys 4.NP :

108,110 : 0,9*1,96	1,76400
206,209,212,215,221,224, 306,309,312,315,321,324 : 0,9*1,8*6*2	19,44000
404,407 : 0,9*1,5	1,35000
