


	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	101
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění vývodů do rozvaděčů, úpravy rozvodů Předmět změny: Doplnění vývodů do rozvaděčů, úpravy rozvodů Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě nového požadavku LP bylo nutné do stávajících i do nových rozvaděčů doplnit výzbroj pro napojení nových vývodů, které chyběly v rámci PD. Jednalo se o napájení vývodů pro EPS, EZS, EKV. Dále v rozvaděčích silnoproudů chybělo napájení relátek systému EPS, napájecí zdroje vč. jištění. Dále byla provedená úprava stávající elektroinstalace dotčené stavbou, které nebyly obsažené v PD.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Stavební deník			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		57 147,58 Kč	bez DPH
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 	Stav: rev02 Předáno: 15.1.2019	Objednatel: BYRD a.s. Letiště Praha, a.s. 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	106
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102_KOM Název ZL: Úpravy VZT a ÚT na základě revize PD Předmět změny: Úpravy VZT a ÚT na základě revize PD Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Revize projektové dokumentace dle Z04 Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Revize projektové dokumentace dle Z02 a Z04 - úpravy VZT a RTCH - odpočet neprováděných částí rozvodů RTCH (viz. příloha 2), přípočet odskoků pod průvlaky dle změny projektu (viz. příloha 3), - odpočet neprováděných částí rozvodů VZT (viz. příloha 4) a nové definice konkrétních výrobků, např. střešního ventilátoru POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika - nerealizace RTCH viz Příloha č. 3 - Grafika - revize PD (odskoky pod průvlaky) viz Příloha č. 4 - Výkaz výměr dle revize PD Z02 z 04/2017 Cena Celkové předpokládané náklady -280 822,62 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	107
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Řešení VZT výústek v chodbě za zázemím Předmět změny: Řešení VZT výústek v chodbě za zázemím Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Nebylo zahrnuto ve VV - požadavek investora. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění výústek VZT chybějících v PD ke stávajícím rozvodům v chodbě zázemí. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vyznačení pozic chybějící výústek v PD Z04 Cena Celkové předpokládané náklady 39 636,30 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev04 Předáno: 2.4.2019		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	108
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101 COB, SO 0102 KOM Název ZL: Úprava přefuku CHÚC Předmět změny: Úprava přefuku CHÚC Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Chyba v PD profese VZT. V PD byly naprojektovány uzavírací klapky se servopohonem , ale při realizaci vznikl požadavek ze strany LP na osazení uzavíracích klapek s regulací tlaku - požadavek pro CHÚC typu B. Navržené technické zařízení dle PD nesplnilo požadavky pro CHÚC typu B. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Zadání PD viz Příloha č. 3 - Vzorkovací protokol vč. přílohy (PV011_01) viz Příloha č. 4 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 45 143,50 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev03 	Předáno: 20.2.2019 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	109
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Požární uzávěry do rozvoden 2088 a 2089 Předmět změny: Požární uzávěry do rozvoden 2088 a 2089 Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Nové PO uzávěry do rozvoden 2088 a 2089 nad rámec SOD dle požadavku investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Dodatečné provedení požárních uzávěrů do rozvoden 2088 a 2089 po osazení stěnových obkladů. Nebylo předmětem PD ani SOD, vzniklo dle požadavku investora. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Zadání se strany investora / AD viz Příloha č. 3 - Vzorkovací protokol (PV011_05) viz Příloha č. 4 - Grafická příloha - změny oproti PD Cena Celkové předpokládané náklady 80 588,00 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev01 	Předáno: 22.11.2018 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

 Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	110
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO0102_KOM Název ZL: Servopohony s koncovým spínačem Předmět změny: Servopohony s koncovým spínačem Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Požadavek investora () na servopohony s havarijní funkcí a s koncovým spínačem. V SoD byl pouze požadavek na pohon s havarijní funkcí. Nebylo možné pouze "dovystrojit" nabízený servopohon, ale došlo tak ke změně výrobce, který takové typy servopohonů dodává.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Zadání VV			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		10 259,05 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			


 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	111
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Přesun splitů u policie Předmět změny: Přesun splitů u policie Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Přesun splitu, úprava připojení, nové dopojení a zprovoznění. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkres Cena Celkové předpokládané náklady 14 807,00 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	112
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění izolace a oplechování potrubí VZT 241A na střeše Předmět změny: Doplnění izolace a oplechování potrubí VZT 241A na střeše Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Jelikož potrubí VZT 241A je vedené na střeše ve venkovním prostředí, bylo nutné navýšit uvažovanou tl. tepelné izolace dle PD ze 40mm na 80mm. Dále bylo nutné provést oplechování tepelné izolace potrubí VZT. Nebylo předmětem smluvního rozpočtu. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 51 252,36 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	113
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: MaR_Doplnění řízení ventilátorů na WC a snímání ZOTK klapky, skutečnost Předmět změny: MaR_Doplnění řízení ventilátorů na WC a snímání ZOTK klapky, skutečnost Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Dodávka VZT s měničem a snímáním tlakové difference. Požadavek od ENG Letiště VH, aby bylo analogové ovládání součástí RS a ovládány ventilátory z vizualizace, včetně zavedení sichnállu "CHOD" od tlakové difference (nový požadavek). MaR_doplnění snímání ZOTK klapky: Nestandardní dodávka klapky ZOTK a tím vyžádané doplnění ENG od Letiště VH na snímání a vyhodnocení stavu otevřeno/zavřeno.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Emaily			
		Cena	
Celkové předpokládané náklady		-28 336,83 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u>  	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	121
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB / SO 0102_KOM Název ZL: Značení únikových cest Předmět změny: Značení únikových cest Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Instalace dodatečných fotoluminiscenčních tabulek dle požadavku investora (p. Turský) POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 7 834,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 12.4.2019		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	122
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Fasádní exteriérové rolety Předmět změny: Fasádní exteriérové rolety Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne		
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Rolety Hunter Douglas byly dány projektem jako referenční výrobek, nebyly však schopni garantovat odolnost proti větru danou projektem. Investor požadoval změnu velikosti a vlastností rolety, došlo ke změně specifikace řídicí jednotky. Výrobní dokumentace nového řešení byla odsouhlasená investorem.		
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol		
Cena Celkové předpokládané náklady -556 017,16 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev02 Předáno: 12.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		

	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	123
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Změna řešení sítě nad bezpečnostní kontrolou (tahokov) Předmět změny: Změna řešení sítě nad bezpečnostní kontrolou (tahokov) Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : - Důvod změny: Změna řešení "ochranné" sítě za rozebíratelný rastrovaný/kazetový tahokov - požadavek AD + LP Změna způsobu kotvení takokovu z důvodu jeho rozebíratelnosti - požadavek LP Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne		
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě AD a investora vznikl požadavek na dodávku a montáž rozebíratelného rastrovaného tahokovu z důvodu snadnějšího přístupu ke kabelovým rozvodům (pozn. v zadání VV dodávka ochranné sítě rozprostřená v prostoru, PD bez výkresu). Na základě tohoto požadavku byl GD zpracovaný kladečský plán, který do té doby neexistoval.		
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vzorkovací protokoly (PV017_01, PV017_02, PV017_03) viz Příloha č. 3 - Zadání ze strany AD viz Příloha č. 4 - Grafika tahokov - kotvení viz Příloha č. 5 - Dílenská dokumentace - tahokov		
Cena Celkové předpokládané náklady 461 907,34 Kč bez DPH		
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 	Stav: rev04 Předáno: 5.2.2019	Objednatel: BYRD a.s.  Letiště Praha, a.s. 
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		

	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	124
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Stanoviště validátor - dvoukřídlá branka, pult validátor, prosklená zástěna Předmět změny: Nové prvky vybavení celní kontroly - stanoviště validátor Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_102_2 nákres skleněné stěny Důvod změny: Investorem zadané provedení vybavení celní kontroly stanoviště validátor - dvoukřídlá branka, pult validátor, prosklená zástěna. Nebylo předmětem smluvního rozpočtu. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Nové prvky vybavení celní kontroly - dvoukřídlá branka, pult validátor, prosklená zástěna dle zadání investora. Nebylo součástí dodávky smluvního rozpočtu. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2a - Zadání PD dle SOD viz Příloha č. 2b - Zadání Letiště Praha viz Příloha č. 3a - Vzorkování stanoviště validátor (PV032, PV033, PV037) viz Příloha č. 3b - Dílenská dokumentace stanoviště validátor Cena Celkové předpokládané náklady 393 184,71 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	125
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102_KOM Název ZL: Požární ucpávky a utěsnění Předmět změny: Požární ucpávky a utěsnění Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Revize PD Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Provedení požárních ucpávek dle skutečnosti vč. zohlednění všech revizí PD. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Seznam požárních ucpávek Cena Celkové předpokládané náklady 204 984,60 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			


 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	126
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění hasicích přístrojů Předmět změny: Aktualizace počtu přenosných hasicích přístrojů v objektu Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : PBRS_grafika_1 Důvod změny: Aktualizace podle skutečného stavu Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): V zadávacím výkaze výměr byl oceněn pouze 1ks práškového PHP - celkový popis položky je zmatečný a nejednoznačný. V PBŘ znázorněné PHP nebyly rozlišené na "stávající" a "nové", položku nebylo z PD možné jednoznačně zkontrolovat. Předpoklad byl, že dojde převážně k využití stávajících hasicích přístrojů. Množství a typy nových PHP doplněny dle skutečnosti. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol Cena Celkové předpokládané náklady 24 126,46 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	129
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102_KOM Název ZL: Nerezové odpadkové koše Předmět změny: Doplnění odpadkových košů Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_S0102_100_102_02_Z4 Důvod změny: Doplnění odpadkových košů pod corian umyvadlové pulty - toalety Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění odpadkových košů - nerezových výsuvných, zakázková výroba na míru, vč. návrhu detailních řešení dodavatelem POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - DD - odpadkový nerez koš Cena Celkové předpokládané náklady 119 600,00 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> Letiště Praha, a.s. 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	131
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Otopná tělesa Předmět změny: Otopná tělesa Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0102_UTCHL_400_102_02 Důvod změny: VV definuje jiný typ než je požadováno v PD Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Investor potvrdil požadavek na dodání jiného typu otopných těles, než bylo v CN. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Zadání PD Cena Celkové předpokládané náklady 7 987,60 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev02 	Předáno: 2.11.2018 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	132
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101 CO, SO 0102 KOM Název ZL: Demontáže FCU a PKTM v prostoru Předmět změny: Demontáže FCU a PKTM v prostoru WC Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Demontáže prvků FCU a PKTM v prostorách toalet dle požadavku investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Demontáže prvků FCU a PKTM v prostorách toalet dle požadavku investora. Nebylo součástí VV. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika viz Příloha č. 3 - Fotodokumenace - požární klapky Cena Celkové předpokládané náklady 13 455,00 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev01 Předáno: 4.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			


	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	133
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Zaslepení stavajících rozvodů RTCH na WC Předmět změny: Oprava projektové dokumentace projektantem VIZ ŽOI 22 Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_102_1 Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě požadavku LP bylo nutné provést demontáž původních odboček k FCU a provést zaslepení stavajících rozvodů RTCH - nebylo součástí VV. Dále došlo k doplnění uzavíracích armatur a opravy izolací RTCH na WC. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 35 051,80 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			


	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	134
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: OTK - přeložky a úpravy Předmět změny: OTK - přeložky a úpravy Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Chybná koordinace PD Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Z důvodu nesouladu koordinace PD SOZ se stávajícími rozvody VZT bylo nutné provést úpravy a přeložky stávajících potrubí VZT. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 75 168,16 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev03 Předáno: 15.3.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	135
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Přemístění infotabulí a monitorů - celníci Předmět změny: Demontáž a montáž 2ks info tabulí, 2ks monitorů Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Přemístění monitorů a infotabulí celníků.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Stavební deník			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		12 099,90 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev02 Předáno: 28.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	136
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB			
Název ZL: Galerie 3.NP přepojení světel			
Předmět změny: Galerie 3.NP přepojení světel			
Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s., Letiště Praha, a.s.			
Odkazy na výkresy :			
Důvod změny: Požadavek investora			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):			
V rámci stavebních úprav místností ve 3NP u únikového schodiště ST16 se zdemontovala stávající svítidla, poté se namontoval nový podhled a původní svítidla se namontovala zpět. Nová nepoužitá svítidla byla předaná investorovi.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:			
viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Stavební deník viz Příloha č. 3 - Předávací protokol			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		4 892,50 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev04 Předáno: 18.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	137
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění osvětlení - nové únikové schodiště Předmět změny: Doplnění osvětlení - nové únikové schodiště Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Oproti návrhu v PD byl navýšen počet svítidel. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění světél do únikového schodiště. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Stavební deník viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 12 204,10 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev01 Předáno: 28.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		

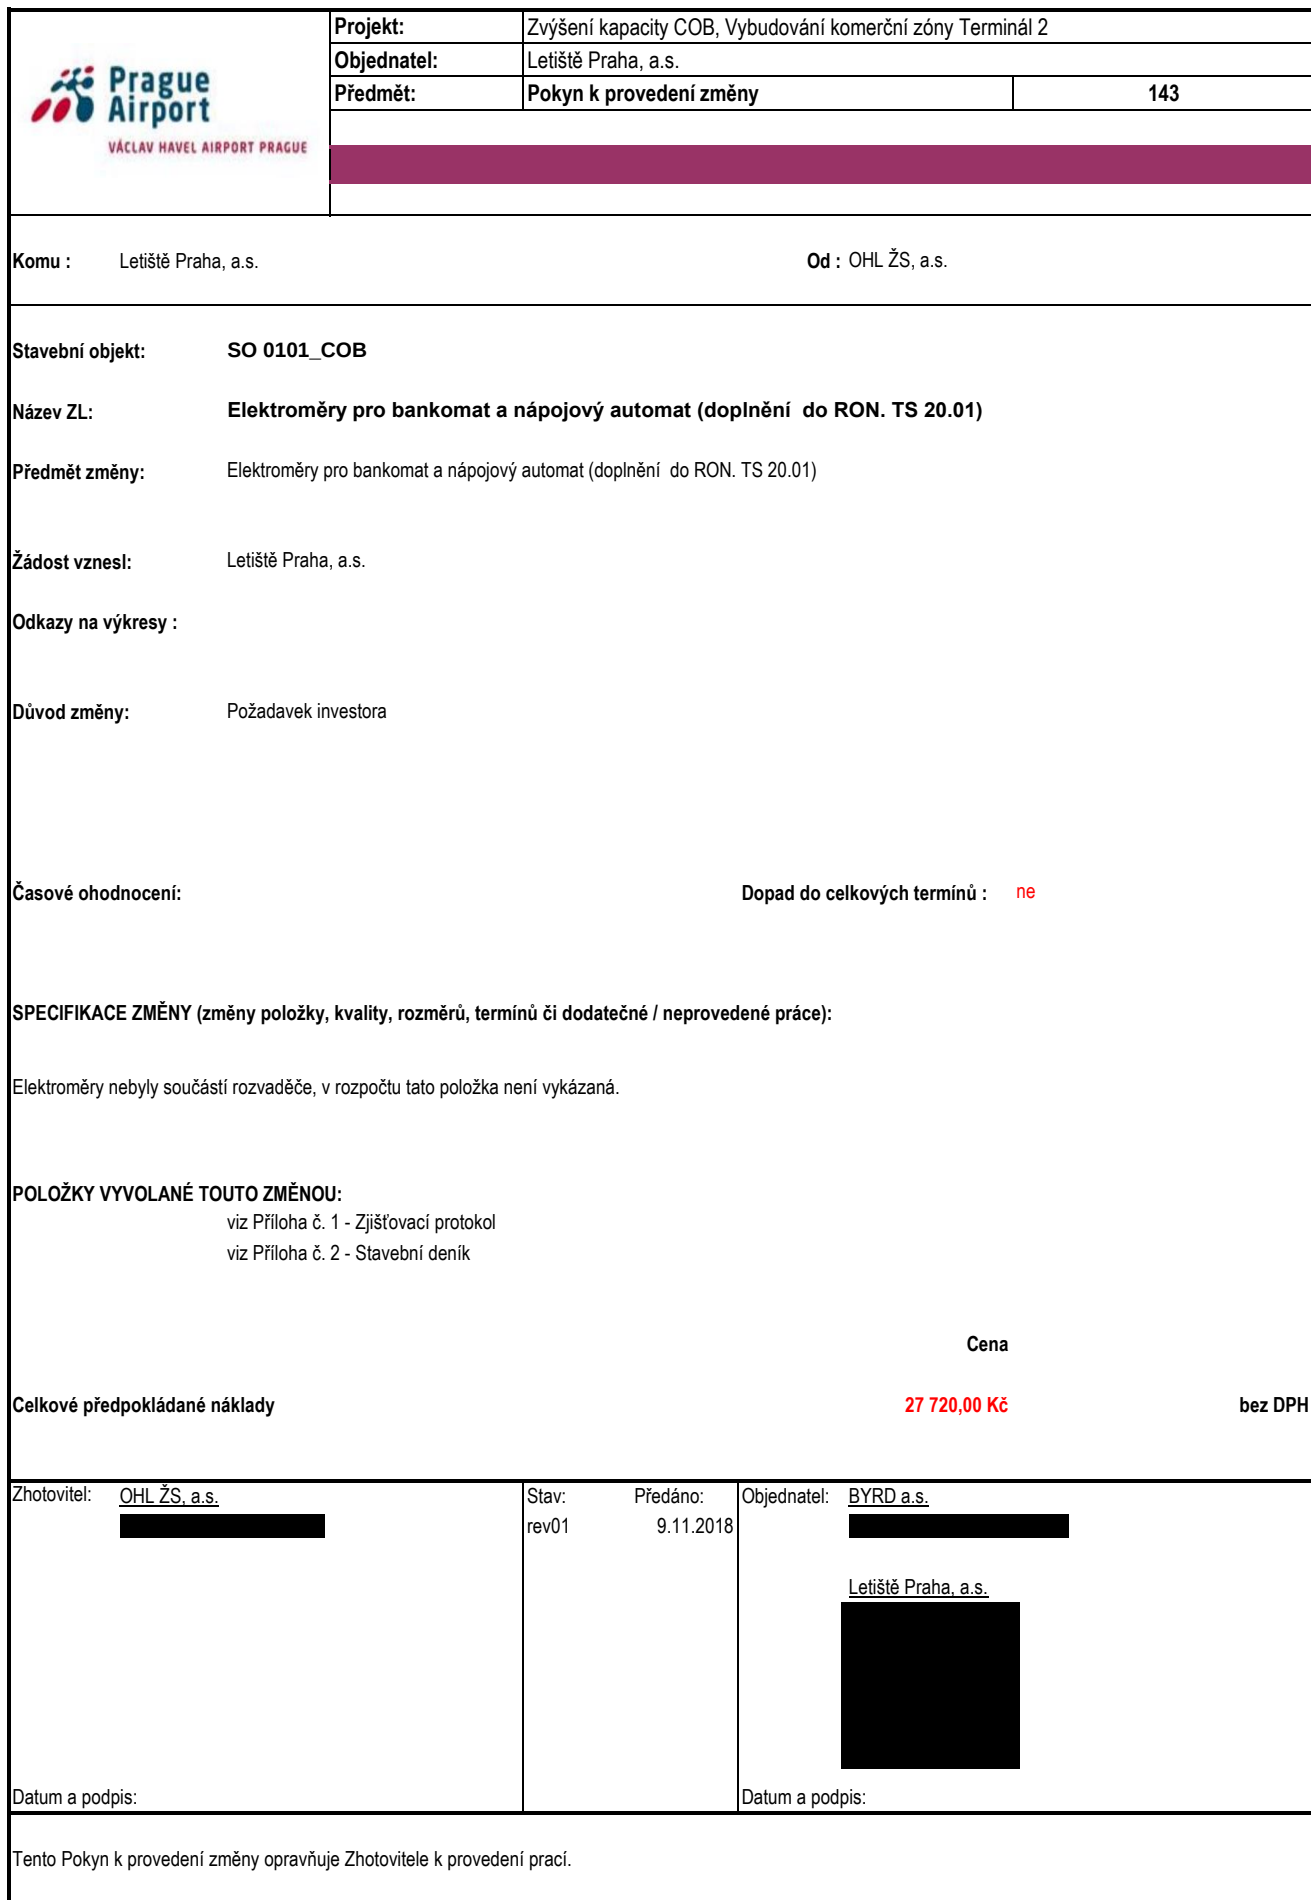
	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	138
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Tlačítka SOZ v hale, uzemnění suchovodu Předmět změny: Tlačítka SOZ v hale, uzemnění suchovodu Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Požadavek investora na dodávku a umístění tlačítek SOZ v hale a následné doplňující přemístění na nové pozice. Požadavek investora na provedení uzemnění suchovodu. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č.2 - Výkres, zápisy - tlačítka SOZ viz Příloha č.3 - Stavební deník - suchovod Cena Celkové předpokládané náklady 38 688,93 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev01 	Předáno: 30.11.2018 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				


	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	139
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Prvky k rozdělení osvětlení - galerie Předmět změny: Prvky k rozdělení osvětlení - galerie Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Dodatečné požadavky LP na umístění vypínače a čidla jasu nad rámec zadávací PD. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Změna umístění vypínače a doplnění čidla jasu. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Stavební deník viz Příloha č. 3 - Půdorys Cena Celkové předpokládané náklady 1 812,86 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev02 Předáno: 28.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	140
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Regulace intenzity osvětlení ve směnárnách Předmět změny: Regulace intenzity osvětlení ve směnárnách Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): D+M ovladače pro regulaci osvětlení ve směnárnách POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol Cena Celkové předpokládané náklady 32 842,86 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: rev02 27.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

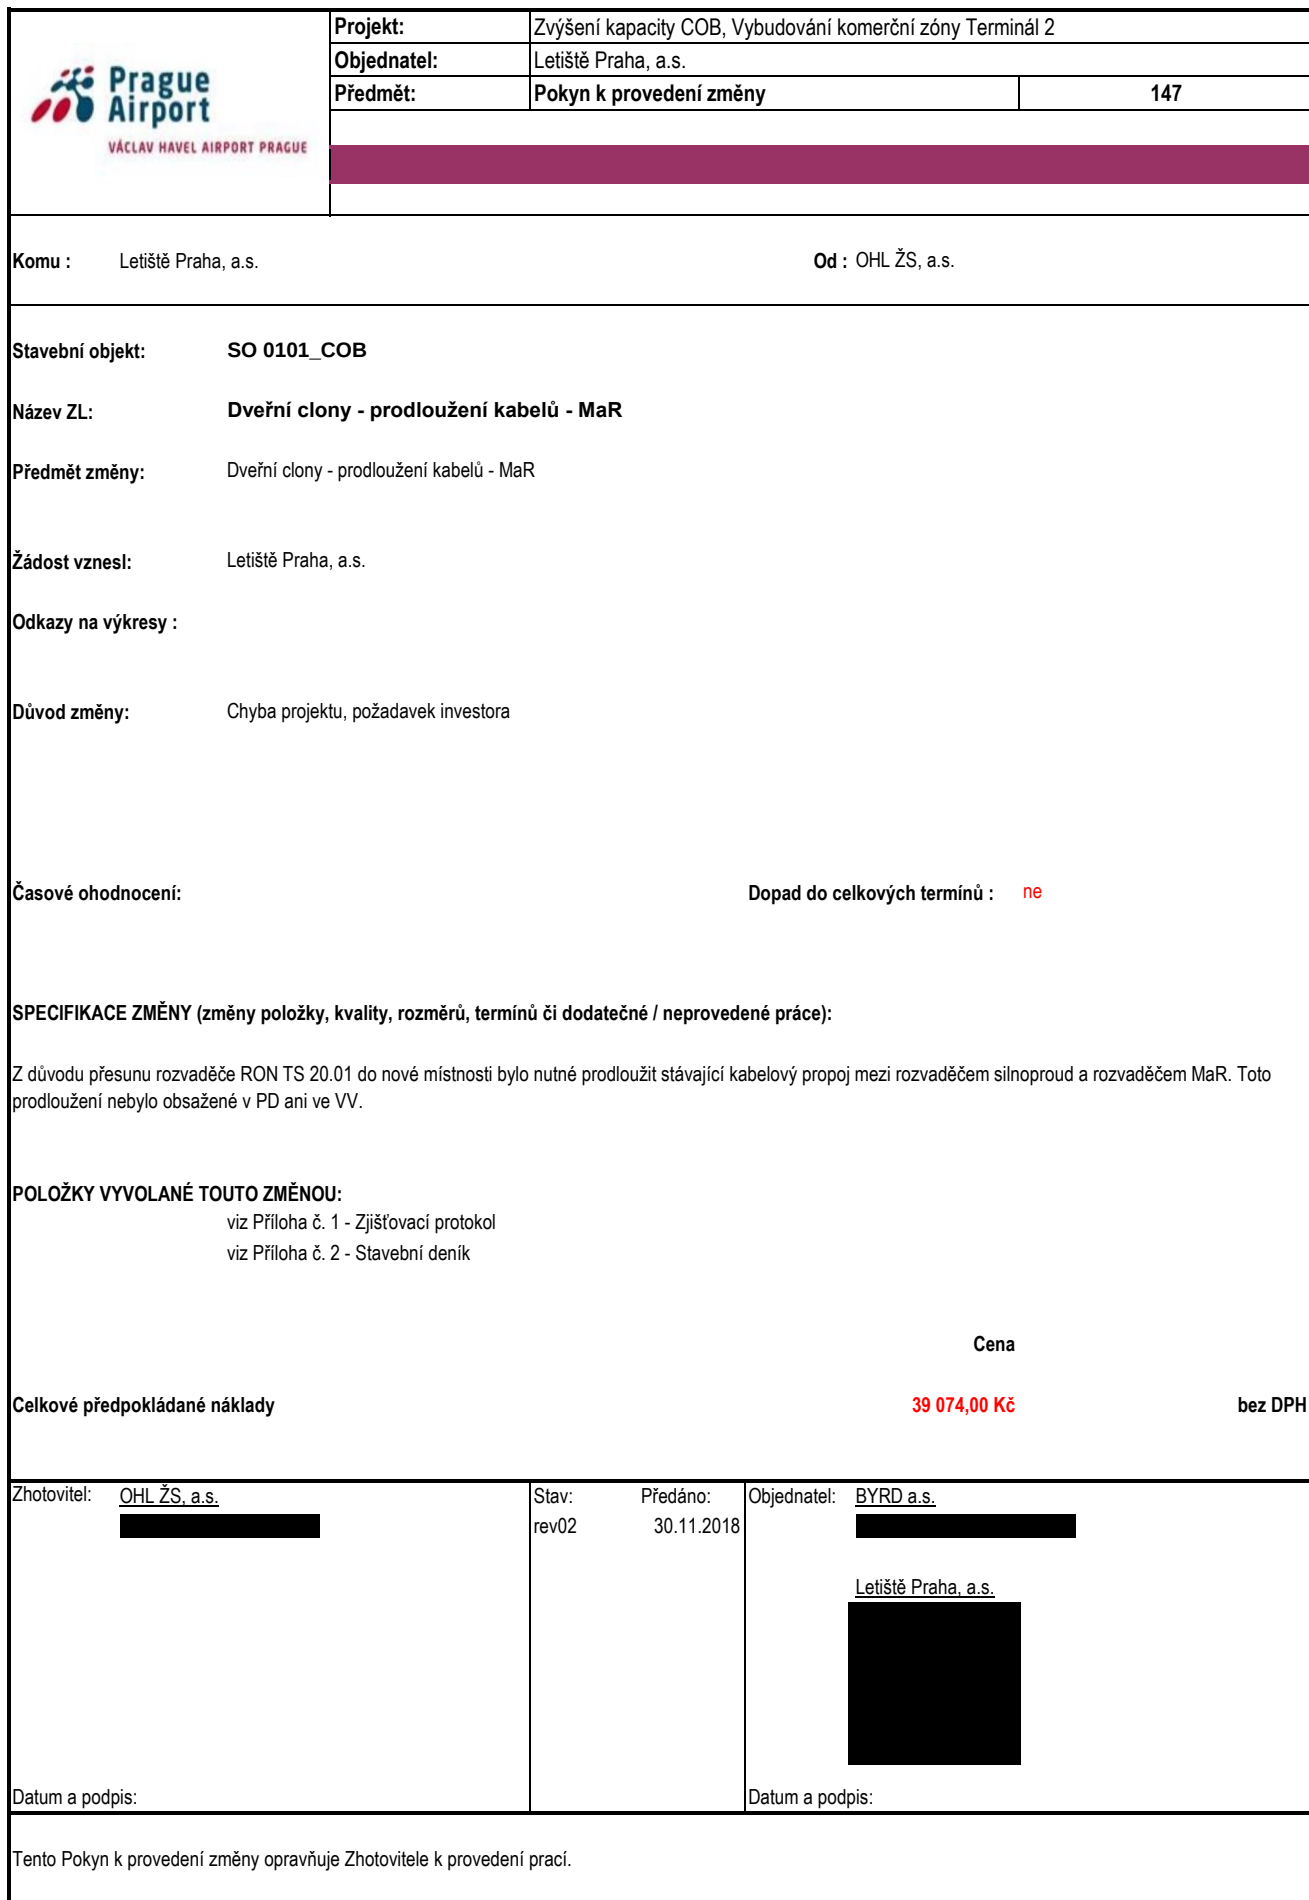
	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	141
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Úprava otevírání ROE.TS.20.102 Předmět změny: Záměna otevírání z levého na pravé Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Z důvodu doplnění 2.pole ROE TS20.102 vznikla kolize dveří rozvaděčů a proto bylo nutné, dle požadavku [REDACTED], u prvního pole otočit směr otvírání dveří rozvaděče. Dveře nebylo dle technických možností otočit, museli se vyrobit nové. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol Cena Celkové předpokládané náklady 27 178,50 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> [REDACTED] [REDACTED]	Stav: Předáno: 30.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> [REDACTED] <u>Letiště Praha, a.s.</u> [REDACTED]	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			



 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	142
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Kabeláž pro rolety na fasádě Předmět změny: Venkovní trasy kabeláže k roletám Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Chybně řešeno v PD. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění venkovní kabeláže k roletám na fasádě. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Projektová dokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 199 323,38 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 27.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			



	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	144
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Trasy pro požární ventilátory Předmět změny: Nová trasa vedení Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Úprava hlavní kabelové trasy v tranzitní hale a doplnění nových kabelových tras pro SOZ. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkresy viz Příloha č. 3 - Výpis materiálu viz Příloha č. 4 - Stavební deník Cena		
Celkové předpokládané náklady		91 200,00 Kč bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev03 Předáno: 30.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		


	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	146
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění zásuvek do instalačních sloupků Předmět změny: Doplnění zásuvek do instalačních sloupků Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Dodatečný požadavek fy LOGTECH Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Dodatečné doplnění zásuvek pro napojení tratí do instalačních sloupků vč. dopojení. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkres viz Příloha č. 3 - Stavební deník Cena Celkové předpokládané náklady 21 800,80 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev03 Předáno: 4.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		




 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	148
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění kabelů pro centrály SOZ Předmět změny: Doplnění kabelů pro centrály SOZ Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Doplnění kabeláže, která nebyla v projektu Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Chybějící přívodní kabeláž silnoproud k řídicím jednotkám pro centrály SOZ okna. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol Cena Celkové předpokládané náklady 19 010,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 22.11.2018		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2		
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	149	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Uzemnění únikové lávky Předmět změny: Uzemnění únikové lávky Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : - Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě požadavku investora bylo doplněné vodivé pospojení nově instalové ocelové lávky se stávající konstrukcí. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Stavební deník viz Příloha č. 3 - Protokol o měření spojitosti Cena Celkové předpokládané náklady 11 591,50 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:		Stav: Předáno: Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> rev02 30.11.2018 <u>Letiště Praha, a.s.</u> Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	150
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Přemístění instalačních sloupků - kolize s dvířky tratí Předmět změny: Přemístění instalačních sloupků - kolize s dvířky tratí Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Z důvodu kolize otevíravých dvířek pro kontrolu zavazadel s realizovanými instalačními sloupky provedených dle PD bylo tyto sloupky nutné posunout do nových pozic vč. úprav podhledů a kabeláže. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Zápis z KD Cena Celkové předpokládané náklady 72 374,10 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: Předáno: rev02 20.2.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			


	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	151
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění silových zásuvek do instalačních sloupků Předmět změny: Doplnění silových zásuvek do instalačních sloupků Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : - Důvod změny: Požadavek investora - dodatečná revize				
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Po instalaci technologie tratí LOGTECH vznikl požadavek na další doplnění silových zásuvek v instalačních sloupcích				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkresy				
Cena				
Celkové předpokládané náklady			34 003,20 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev02 Předáno: 18.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 		
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	152
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Přívod pro infotabule na PS 1.13 Předmět změny: Přívod pro infotabule na PS 1.13 Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Z důvodu nezkoordinovaného projektu informačního systému a elektro - silnoproud chybělo napájení pro informační tabule nad pasovou kontrolou - stanoviště validátory POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkres viz Příloha č. 3 - Revizní zpráva Cena				
Celkové předpokládané náklady			6 044,25 Kč	bez DPH
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 		Stav: rev02 Předáno: 20.2.2019	Objednatel: BYRD a.s.  Letiště Praha, a.s. 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				


 Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	153
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Centrály GEZE pro otevírání SOZ oken Předmět změny: Centrály GEZE pro otevírání SOZ oken Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Dle specifikace projektanta elektro byla zadána ústředna PAN ELEKTRO, která byla odsouhlasená a objednaná, po cca 3 týdnech po objednání byl vznesený nový požadavek provozem LP () ke změně ústředny na typ GEZE, které byly realizovány. Zároveň došlo k doplnění záložního zdroje, který v zadání nebyl, a k úpravě délky napojovací trasy ústředny, protože celý systém GEZE byl navíc k původnímu zadání hlídán přímo z velína.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkres			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		124 457,11 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev05 Předáno: 12.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	154
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Úprava tras v tranzitní hale 2005/D6 (kolize) Předmět změny: Úprava tras stávajících žlabů slaboproudu v tranzitní hale 2005 /D6 Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Kolize kabelových tras s trasami VZT Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Úprava tras stávajících žlabů slaboproudu v tranzitní hale 2005 /D6 POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Půdorys viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 51 555,91 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev01 	Předáno: 30.11.2018 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	155
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Pergola P3/P6, úprava tras pro detekční rámy Předmět změny: Vytvoření přípojovacího bodu pro detekční rámy Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek na základě vzorku [REDACTED]			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Po upřesnění polohy detekčních ráků bylo nutné tyto ráky dopojit na silnoproud. OMZ obsahuje dodávky a práce nutné k jejich realizaci. Vytvoření přípojovacího bodu pro napojení tras nad podhledem pro detekční ráky (kabeláž v ceně SOD).			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Fotodokumentace			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		53 636,10 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> [REDACTED]	Stav: rev03 Předáno: 4.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> [REDACTED] <u>Letiště Praha, a.s.</u> [REDACTED]	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			



 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	156
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: MaR - Rozdělení_ovládání_FCÚ Předmět změny: Změna ovládání FCÚ Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_DPS2_0101_AS_100_102_1 Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Změna (rozdělení) ovládání fan-coilů. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol Cena Celkové předpokládané náklady 11 416,96 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev01 Předáno: 30.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	157
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: MaR - doplnění kabeláže pro přesunuté teploměry Předmět změny: Doplnění kabeláže pro přesunuté teploměry Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora				
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Po realizaci umístění teploměrů dle PD byl vznesený nový požadavek LP () na přemístění teploměrů do jiné pozice. S ohledem na změnu pozice teploměrů bylo nutné prodloužit kabeláž.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol				
Cena Celkové předpokládané náklady 0,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 	Stav: rev03	Předáno: 5.2.2019	Objednatel: BYRD a.s. Letiště Praha, a.s. 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt: Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
	Předmět: Pokyn k provedení změny	159
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.		
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: MaR - Přesun servisního vypínače pro ventilátor do MaR - ÚSCH ST14 Předmět změny: Přesun servisního vypínače pro ventilátor do MaR - ÚSCH ST14 Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Po realizaci díla byl vznešený požadavek stranou servisu LP na přemístění servisního vypínače pro ventilátor větrání předsíně ÚSCH ST14 do jiné pozice, proto bylo nutné přetáhnout kabel pro sledování polohy vypínače do MaR. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Fotodokumentace		
Cena Celkové předpokládané náklady 3 268,50 Kč bez DPH		
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev01 Předáno: 16.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.		


	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	160
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102_KOM Název ZL: Elektro - slaboproudé rozvody (ER) - skutečné provedení - COB+KOM Předmět změny: Elektro - slaboproudé rozvody (ER) - skutečné provedení - COB+KOM Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Úprava rozsahu realizace SO 0101 COB Změna rozsahu realizace SO 0102 KOM Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Došlo ke 2 typům změn v instalaci evakuačního rozhlasu: 1) Změna/revize projektu s ozn. Z02 2) Změna standardu, tj. dodatečný požadavek na integritu. Požadavek měl dopad zejména do části požárního řešení kabelové trasy vedené k reproduktům. Pospojování v části nad hotovými podhledy (plně SDK i kazetové) muselo být doplněné o spojovací krabice a vše muselo být znovu uvedeno do původního stavu. Veškeré práce probíhaly v noci (2 pracovníci, 7 nočních směn). POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Reprouktory - skutečnost (ER) Cena Celkové předpokládané náklady -290 659,50 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:		Stav: Předáno: 30.9.2019 Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	162
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB				
Název ZL: Slaboproudá kabeláž pro posuvné dveře				
Předmět změny: Slaboproudá kabeláž pro posuvné dveře				
Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s.				
Odkazy na výkresy :				
Důvod změny: Doplnění rozvodů dle požadavku LP.				
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):				
Provedení slaboproudé kabeláže pro posuvné dveře dle požadavku investora - poloha ovladačů byla změněná provozem LP.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:				
viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Púdorys vedení kabeláže				
Cena				
Celkové předpokládané náklady			15 324,40 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 20.2.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	164
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Přesun SCS zásuvek ve sloupcích a úprava držáků Předmět změny: Přesun SCS zásuvek ve sloupcích a úprava držáků Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Přesun SCS zásuvek z důvodu posunu sloupků P2 - úpravy pro tratě (kabeláž vedená horní trasou) a úprava 11 držáků POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 61 543,40 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev04 Předáno: 12.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	165
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Bourání a bezpečnostní systémy - dveře D03 u výtahu Předmět změny: Bourání a bezpečnostní systémy - dveře D03 u výtahu Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Osazení a vybavení dveří D03 (u výtahu) bezpečnostním systémem - součástí zadání byly pouze dveře. Stavební práce se zřízením otvoru nebyly součástí zadání ve VV ani zakresleny na výkrese. Vybavení dveří čtečkou karet byl dodatečný požadavek.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Zadání LP - EKV viz Příloha č. 3 - Zadání LP - PD			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		34 920,76 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	170
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Přemístění dveří a repasovaného turniketu - vstup 26 Předmět změny: Přemístění dveří a repasovaného turniketu - vstup 26 Žádost vznesl: CMC Architects a.s., Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Přesun a repase turniketu a dveří D20 (služební vstup č. 26), cenová nabídka Colsys/Aryka. Nedošlo pouze k repasi turniketu, ale i k výměně některých částí turniketu za nové.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika - revize PD viz Příloha č. 3 - Grafika - zadání			
Cena Celkové předpokládané náklady 199 695,82 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	174
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Čištění stěn a konstrukcí horolezeckou technikou Předmět změny: Čištění stěn a konstrukcí horolezeckou technikou, vyčištění budov Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě požadavku LP ze dne 7.6.2018 na KD č.14. uplatňujeme spoluúčast na čištění OK včetně fasády skel. Konstrukce vykazovaly takový stupeň původního znečištění, že není možné určit rozhraní mezi stavem před zahájením prací OHL ŽS a jeho ukončení (především bourací práce). Vzhledem k tomu, že u znečištění stavbou se jedná pouze o volně "usedlý" prach, na rozdíl od pevně zachyceného prachu na konstrukcích z doby před stavbou, navrhuje GD podíl na čištění 30%.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkaz prací viz Příloha č. 3 - Grafika - rozsah čištění stávajících konstrukcí			
Cena Celkové předpokládané náklady 531 580,00 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev04 Předáno: 20.2.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	176
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Protipožární obklad instalačního kanálu Předmět změny: Protipožární obklad instalačního kanálu Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Realizace dodatečných požárních obkladů instalačního kanálu. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Realizace dodatečných požárních obkladů instalačního kanálu. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Fotodokumentace žlabu Promatec Cena Celkové předpokládané náklady 20 347,60 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev01 Předáno: 18.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	181
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102 KOM, SO 0103 LÁVKA Název ZL: Detekce výztuže Předmět změny: Detekce výztuže Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s., Odkazy na výkresy : - Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Kontrola stávajících konstrukcí - provedení detekce výztuže - estakáda Terminál 2, únikové schodiště u D6 POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Fotodokumentace z vyhledání předpínací výztuže estakády viz Příloha č. 3 - Protokol o vyhledání výztuže vč. schémat měřících míst - Schodiště u D6				
Cena Celkové předpokládané náklady 36 400,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev01 Předáno: 30.11.2018		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				


	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	183
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Interiérové žaluzie - horizontální - vestavek PČR Předmět změny: Interiérové žaluzie - horizontální - vestavek PČR Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Změna vybavení všech oken ve vestavku PČR horizontálními žaluziemi místo vertikálních, jak je uvedené ve VV. Okno v kuchyňce vertikální žaluzie v SOD nemělo, horizontální žaluzie je nová. Meziskelní žaluzie byly zrušeny úplně. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkaz výměr viz Příloha č. 3 - Vzorkovací protokol (PV008_01B) viz Příloha č. 4 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady -13 873,59 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev04 Předáno: 15.1.2019		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	189
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Venkovní úpravy Předmět změny: Venkovní úpravy Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : - Důvod změny: Dodatečný požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě požadavku investora GD provedl venkovní úpravy kolem ÚSCH ST16. Nebylo v zadání PD. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 9 284,47 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 4.12.2018		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	195
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Instalace kabeláže pro ventilátory ZOTK Předmět změny: Instalace kabeláže pro ventilátory ZOTK Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora nad rámec SOD Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Dodatečná kabeláž pro ventilátory ZOTK - instalace na opláštění ventilátorů POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 52 190,17 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 4.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	197
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Přemístění centrál GEZE a tlačítek Předmět změny: Přemístění centrál GEZE a tlačítek Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Při předání realizace GEZE ústředn a servisních tlačítek dle PD vznikl z důvodu snadnější obslužnosti nový požadavek ze strany investora () na přesun ústředn a tlačítek do nových pozic. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 26 049,48 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev03 Předáno: 20.2.2019		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	198
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Detekční rámy - přepojení kabelů v rozvaděči + dotažení koncové zásuvky Předmět změny: Detekční rámy - přepojení kabelů v rozvaděči + dotažení koncové zásuvky Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : - Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Úprava elektroinstalace silnoprůdu dle nového požadavku ESY - přepojení kabelu v rozvaděči + dotažení koncových zásuvek k detekčnímu rámu. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - E-mail korespondence viz Příloha č. 3 - Grafika viz Příloha č. 4 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 11 410,88 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:	Stav: rev02 Předáno: 4.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> Letiště Praha, a.s. Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	199	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Úprava zapojení a osazení instalačních sloupků Předmět změny: Úprava zapojení a osazení instalačních sloupků Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora				
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Úprava zapojení bodu P6 a P11 mechanické tratě a posunutí sloupku P6 ke stěně rozvodny.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - E-mail				
Cena				
Celkové předpokládané náklady 18 397,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02	Předáno: 12.4.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	200
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Stanoviště validátorů - úprava rozvodů, zásuvky Předmět změny: Stanoviště validátorů - úprava rozvodů, zásuvky Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění elektroinstalace stanoviště validátor - budka dle požadavku investora. Nebylo předmětem zadání smluvního rozpočtu. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Schéma - skutečný stav viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace - skutečný stav Cena Celkové předpokládané náklady 3 901,28 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 4.12.2018		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	201
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Pozice P6 - doplnění zásuvek Předmět změny: Pozice P6 - doplnění zásuvek Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora / Logtech Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění zásuvek dle požadavku dodavatele technologie tratí. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Výkres Cena Celkové předpokládané náklady 10 289,00 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev03 	Předáno: 2.4.2019 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	202
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102 KOM Název ZL: Pohybová čidla na WC - BAS a osvětlení Předmět změny: Pohybová čidla na WC - BAS a osvětlení Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora				
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě požadavku LP byly do prostoru WC COB a KOM doplněny 4ks pohybových senzorů (předsíně) zapojených do systému BAS. Dále byly na základě požadavku LP doplněny 4ks pohybových čidel do úklidových místností WC COB a KOM do části silnoproud-osvětlení (bez zapojení do systému BAS). Tato pohybová čidla slouží k zapojení svítidel pouze v prostoru úklidových místností.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika				
Cena				
Celkové předpokládané náklady			38 245,40 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev04 	Předáno: 13.2.2019 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

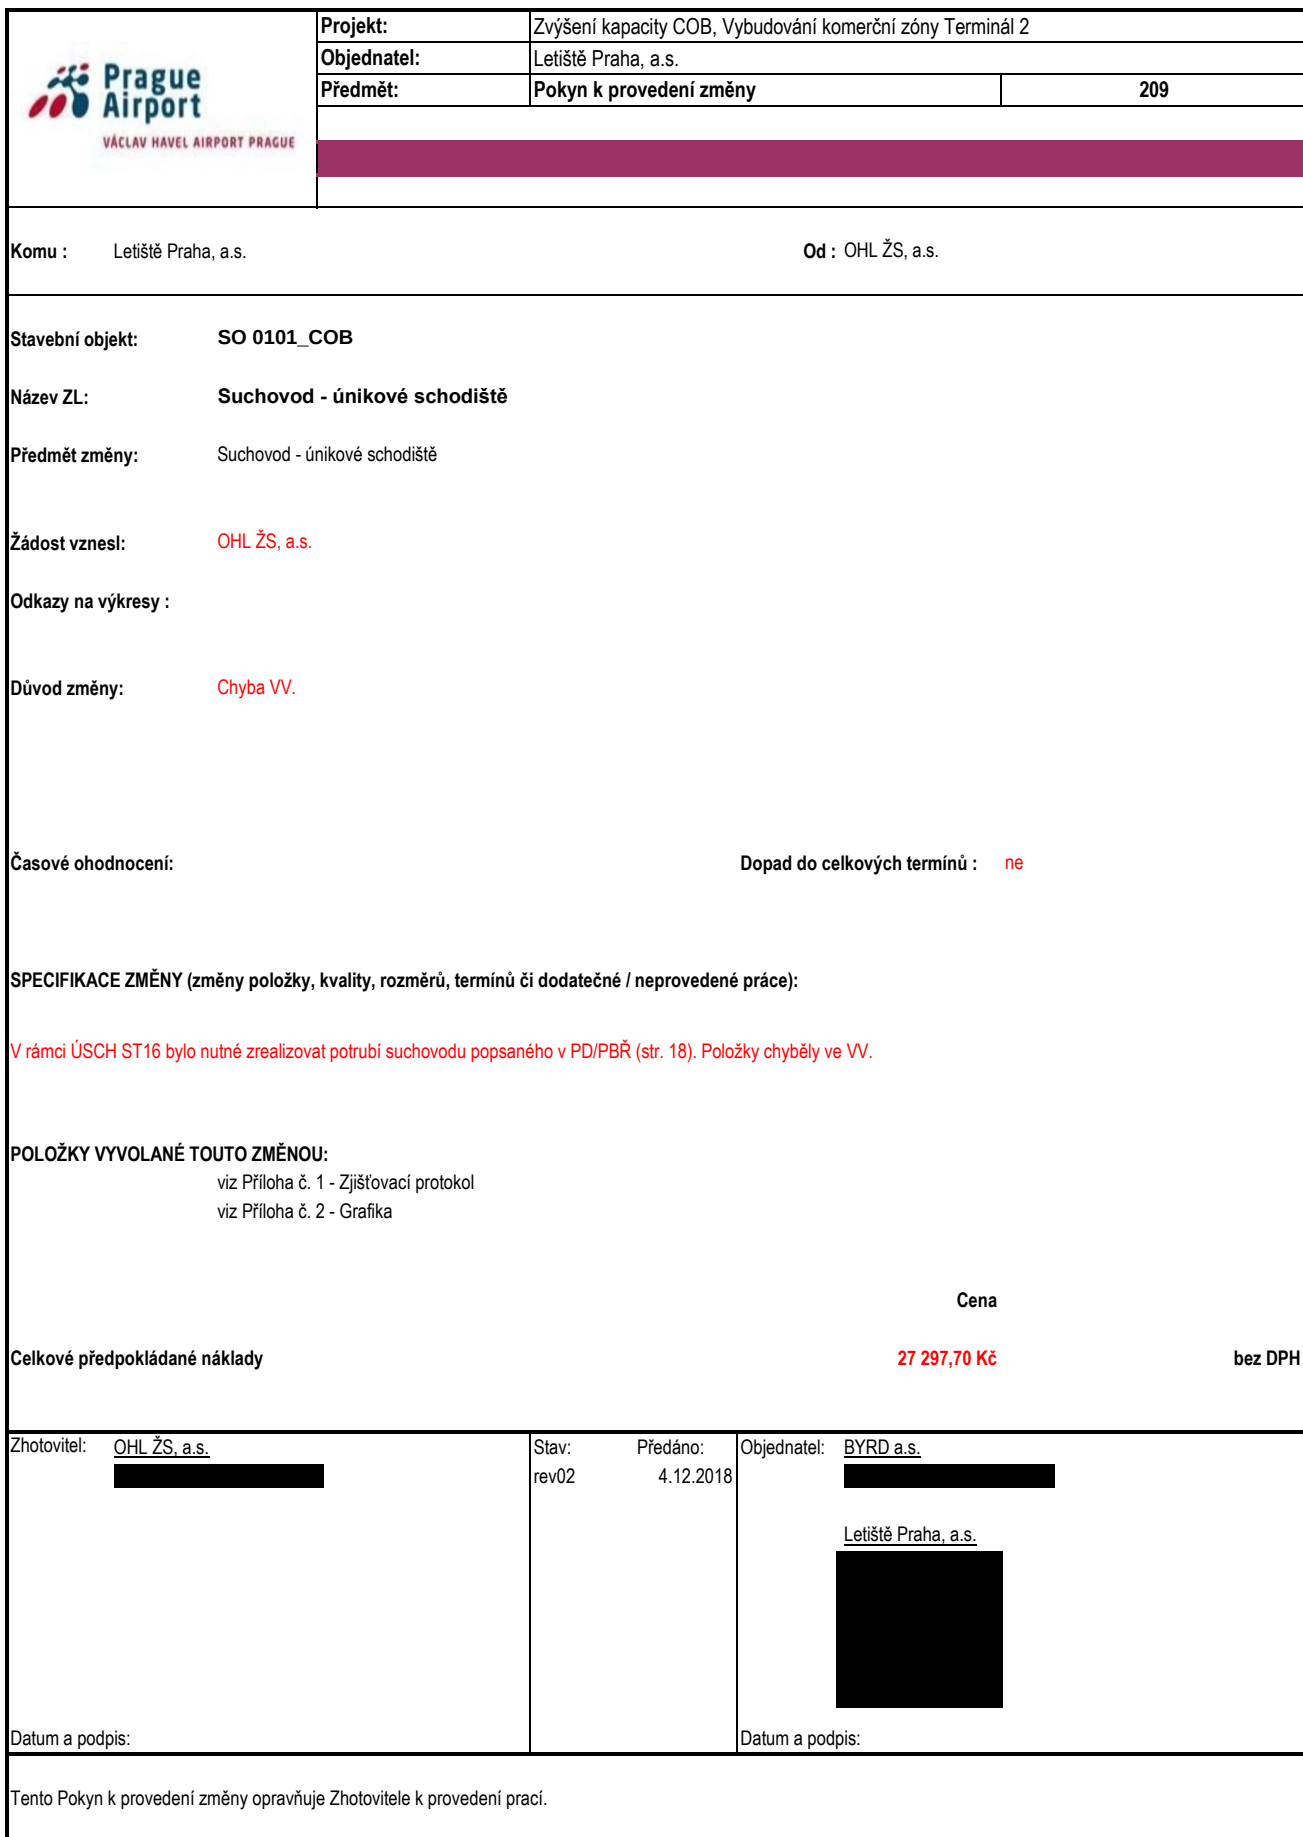
 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	203
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Zakrytování tras pro ovládání SOZ oken Předmět změny: Zakrytování tras pro ovládání SOZ oken Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě požadavku investora bylo nutné provést po instalaci přívodních kabelů k pohonům oken zakrytování parapetů pod okny u GATES D5, D6. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 21 919,20 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: rev02 4.12.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			


 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	204
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Úprava tras pro slaboproud - prostor D6 (chodba 2005) Předmět změny: Úprava tras pro slaboproud - prostor D6 (chodba 2005) Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Nutnost úpravy trasy z důvodu kolize se stávajícími rozvody Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Z důvodu kolize nasávacího potrubí SOZ a stávajícího žlabu elektro v odbavovacím prostoru D6 v hale 2005, který se nacházel před nasávacími mřížkami, bylo nutné stávající žlab přemístit (spustit) a doplnit o nové prvky. Práce ve výškách 5m. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 92 315,92 Kč bez DPH				
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 		Stav: rev03 Předáno: 12.4.2019	Objednatel: BYRD a.s.  Letiště Praha, a.s. 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	205
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: BAS - přemístění regulátoru jasu v rozvaděčích Předmět změny: BAS - přemístění regulátoru jasu v rozvaděčích Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Z důvodu chybějícího jasoměru v rozvaděči BAS 20.02 bylo dohodnuté s LP, že dojde k přemístění nevyužitého jasoměru v rozvaděči BAS 20.01 do rozvaděče BAS 20.02, kde chybělo v PD. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 3 326,60 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev02 	Předáno: 4.12.2018 	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	207
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Výměna mezipřírubových klapek Předmět změny: Výměna mezipřírubových klapek Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Žádost LP [REDACTED]				
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Pro odstavení stávajících rozvodu vody pro napojení nových rozvodů bylo nutné uzavřít stávající klapky. Došlo k výměně stávajících mezipřírubových klapek za nové z důvodu jejich nefunkčnosti (mč. 2225).				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol				
Cena Celkové předpokládané náklady 11 990,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. [REDACTED]		Stav: rev01 Předáno: 4.12.2018		Objednatel: BYRD a.s. [REDACTED] Letiště Praha, a.s. [REDACTED]
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	208
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Zdravotně technické instalace - skutečnost KOM Předmět změny: Zdravotně technické instalace - skutečnost KOM Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Úprava rozsahu realizace SO 0102 KOM Změna materiálu potrubí na základě předložení technických listů k potrubí a dopřesnění požadované specifikace ze strany LP Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Úprava množství dle skutečného stavu realizace. Během výstavby došlo ke změně standardů ze strany investora a materiál obsažený v původním projektu (PPR + Cu) musel být nahrazený novým materiálem - lisovaný Alpex VIEGA SmartPress. Záměna potrubí byla v rozsahu SV, TUV. V rozsahu stoupacího potrubí, ležatých rozvodů a přípojovacího potrubí.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Standardy LP 2018_záměna materiálu vodovod viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace_záměna materiálu vodovod			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		-46 248,60 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			



 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2		
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	210	
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Změna izolace kanalizace, vodovodu - pergola Předmět změny: Změna izolace kanalizace, vodovodu - pergola Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Požadavek investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Na základě požadavku specialisty LP bylo nutné stávající rozvody vody a kanalizace se skápávající izolací v prostoru mezi pergolou a galerií opatřit nehořlavou neskápávající izolací. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika Cena Celkové předpokládané náklady 13 866,77 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: Předáno: rev01 7.1.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	211
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102_KOM Název ZL: Izolace dešťového svodu - toalety Předmět změny: Izolace dešťového svodu - toalety Žádost vznesl: OHL ŽS, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Práce nad rámec VV. Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Jedná se o chybějící položku ve VV ZTI. Dešťové potrubí HDPe bylo nutné zaizolovat nenasákavou kaučukovou izolací bránící rosení potrubí a šíření hluku. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Grafika viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace Cena Celkové předpokládané náklady 24 174,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 5.12.2018		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u>
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	215
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101 COB, SO 0102 KOM Název ZL: Zařizovací předměty - ZTI Předmět změny: Zařizovací předměty - ZTI Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Doplnění chybějících položek ve VV v souladu se standardy LP a dle požadavku investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění chybějících položek ve VV v souladu se standardy LP a dle požadavku investora - dovybavení prvků invalid WC a pisoárových mezistěn (nebylo vykázáno v položkách jako ostatní zařizovací předměty)			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Vzorkovací protokol (PV021_02)			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		73 000,00 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: rev01 Předáno: 27.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			


 Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	216
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102_KOM			
Název ZL: Elektro - slaboproudé rozvody (EPS) - skutečnost COB+KOM			
Předmět změny: Elektro - slaboproudé rozvody (EPS) - skutečnost COB+KOM			
Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s.			
Odkazy na výkresy :			
Důvod změny: Úprava rozsahu realizace SO 0101 COB Změna rozsahu realizace SO 0102 KOM			
Časové ohodnocení:		Dopad do celkových termínů :	
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):			
Výměry upraveny dle skutečného stavu			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol			
		Cena	
Celkové předpokládané náklady		-628 438,11 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			


 Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	217
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0102_KOM			
Název ZL: Elektro - slaboproudé rozvody (SCS, MATV, STA, UT) - skutečné provedení - KOM			
Předmět změny: Elektro - slaboproudé rozvody (SCS, MATV, STA, UT) - skutečné provedení - KOM			
Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s.			
Odkazy na výkresy :			
Důvod změny: Úprava rozsahu realizace SO 0102 KOM			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):			
Úprava rozsahu realizace			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		-1 226 642,37 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			


 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	218
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102_KOM Název ZL: Elektro - bezpečnostní systémy (CCTV, PZTS, EKV) - skutečné provedení - COB+KOM Předmět změny: Elektro - bezpečnostní systémy (CCTV, PZTS, EKV) - skutečné provedení - COB+KOM Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Úprava rozsahu realizace SO 0101 COB Změna rozsahu realizace SO 0102 KOM Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Výměry upraveny dle skutečného stavu POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol Cena Celkové předpokládané náklady -390 001,80 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> Datum a podpis:	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

 Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	219
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0101_COB, SO 0102 KOM Název ZL: Dodatečné práce - slaboproud (nad rámec VV) Předmět změny: Dodatečné práce - slaboproud (nad rámec VV) Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : Důvod změny: Práce nad rámec VV požadované investorem.			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů :			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Práce nad rámec VV požadované investorem.			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2a - Seznam příloh ze SD viz Příloha č. 2b - SCAN Zápisy ve SD			
Cena			
Celkové předpokládané náklady		252 369,89 Kč	bez DPH
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: 30.9.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.			

 VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	Projekt:	Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	222
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.			
Stavební objekt: SO 0102_KOM Název ZL: Výměna EKV na GATES D4, D5, D6 Předmět změny: Výměna EKV na GATES D4, D5, D6 Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : 329_PP_0102_1003_102_00 Důvod změny: Požadavek investora			
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne			
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Původní záměr použít původní demontované komponenty EKV, nešlo realizovat, protože uvolňovač EffEff331, se již nedodává a byl nahrazen EffEff332, který je rozměrově výrazně menší. V případě poruchy uvolňovače 331 by tedy do budoucna nebylo možné vyměnit ho za nový typ, protože v zárubni by byl příliš velký otvor. Z tohoto důvodu byly na nové dveře dodány a instalovány nové uvolňovače EffEff332. Magnetické kontakty DC107 byly rovněž nahrazeny, z důvodu krátkého systémového kabelu. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: - viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol - viz Příloha č. 2 - Zadání PD dle SOD - viz Příloha č. 3 - Odsouhlasené EKV dveří investorem - viz Příloha č. 4 - E-mailová korespondence			
Cena Celkové předpokládané náklady 71 872,40 Kč bez DPH			
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 	Stav: Předáno: rev04 13.2.2019	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u> <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	224
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění PZTS - Instalace kabeláže pro tísňová tlačítka pod tratěmi Předmět změny: Doplnění PZTS - Instalace kabeláže pro tísňová tlačítka pod tratěmi Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : - Důvod změny: Změna zadání dle na doplnění dle požadavku investora Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Instalace kabeláže pro tísňová tlačítka pod tratěmi. Požadavek provozu BEK, na doplnění tísňových tlačítek na konec dráhy. Protahování kabeláže pod tratěmi. POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Zadání dle PD a dodatečného požadavku BEK Cena Celkové předpokládané náklady 12 050,00 Kč bez DPH				
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 29.11.2018	Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 	
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				

	Projekt:		Zvýšení kapacity COB, Vybudování komerční zóny Terminál 2	
	Objednatel:		Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:		Pokyn k provedení změny	226
Komu : Letiště Praha, a.s. Od : OHL ŽS, a.s.				
Stavební objekt: SO 0101_COB Název ZL: Doplnění sloupku a signalizačního světla pro validační čtečku - budka u validátorů (EKV) Předmět změny: Doplnění sloupku a signalizačního světla pro validační čtečku - budka u validátorů (EKV) Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s. Odkazy na výkresy : - Důvod změny: Požadavek investora				
Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů : ne				
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): Doplnění sloupku a signalizačního světla pro validační čtečku nad rámec SOD.				
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: viz Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol viz Příloha č. 2 - Zadání PD - smluvní viz Příloha č. 3 - Fotodokumentace				
Cena				
Celkové předpokládané náklady			16 119,30 Kč bez DPH	
Zhotovitel: <u>OHL ŽS, a.s.</u> 		Stav: rev02 Předáno: 27.3.2019		Objednatel: <u>BYRD a.s.</u>  <u>Letiště Praha, a.s.</u> 
Datum a podpis:		Datum a podpis:		
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.				




Od : OHL ŽS, a.s.

Dopad do celkových termínů :

bez DPH

Datum a podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Od : OHL ŽS, a.s.

Dopad do celkových termínů :

bez DPH

Datum a podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.
