

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. OR/19/20170

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš** nebo **Ing. Kristýna Boukalová**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Petr Mareš**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **222907724/0300**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **ELESTAV s.r.o.**
se sídlem: **Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto**
zastoupen: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDAKCE]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
č. ú.: **1287068399/0800**
IČ: 25993046
DIČ: CZ25993046
spisová značka rejstříkového soudu: **oddíl C, vložka 18867 vedeném
v Hradci králové**

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 29. 01. 2019 smlouvu o dílo č. OR/19/20170 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14. 06. 2019 a dodatkem č. 2 ze dne 01. 07. 2019 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy č. OR/19/20170 je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

30 501 164,96 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **6 405 244,64 Kč**.

Cena včetně DPH činí **36 906 409,60 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 8: Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 3“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnového listu č. 3


Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 8 smlouvy.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 25. 05. 2019 a schválen usnesením číslo **R/2668/20**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 12. 06. 2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:

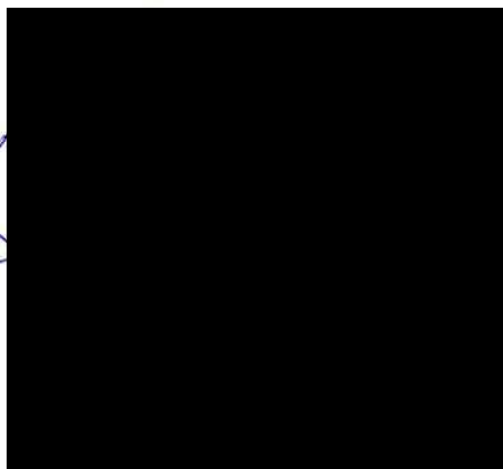



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	ELESTAV s.r.o., se sídlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 30. 04. 2020	
Název akce:	Realizace úspor energie – Gymnázium Vysoké Mýto		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ZL č. 03		
na jinou část smlouvy:	Příloha SOD č. 8 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr		
Předmět změny: <u>doplnění čidel CO2 a méněpráce na trubních vedeních a komunikacích</u>			
Popis a zdůvodnění změny: <p>Během provádění prací na el. instalacích vyšla najevo potřeba sjednotit množství instalovaných čidel CO2 mezi projektovou dokumentací, požadovaným stavem a aktuálním zasmulvněným počtem. Identifikované méněpráce na trubních vedeních a komunikacích jsou důsledkem změn způsobu provádění stavebních prací, které byly schváleny v předchozích dodatcích smlouvy.</p>			
Počet připojených listů specifikací			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: ELESTAV s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby:	SOULADNĚ		
Stanovisko projektanta stavby:	[REDACTED]		
Stanovisko energetického specialisty:	[REDACTED]		
Příloha:			

Č. O.
ny
0468
194



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	ELESTAV s.r.o., se sídlem Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046		
Změnový list vystavil:	zhotovitel		
Datum:	30. 04. 2020		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: <u>doplnění čidel CO2 a méněpráce na trubních vedeních a komunikacích</u>			
Popis a zdůvodnění změny: Během provádění prací na el. instalacích vyšla najevo potřeba sjednotit množství instalovaných čidel CO2 mezi projektovou dokumentací, požadovaným stavem a aktuálním zaslupněným počtem. Identifikované méněpráce na trubních vedeních a komunikacích jsou důsledkem změn způsobu provádění stavebních prací, které byly schváleny v předchozích dodatcích smlouvy.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
- 64 093,57 Kč	124 430,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
60 336,43 Kč	Zůstává beze změny		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis:		Podpis:	
Datum:		Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/039 Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto

Objekt: 1 gymnázium vysoké mýto

Rozpočet: 10 Dodatek č.2-elektroinstalace čidla CO2

Objednatel: Pardubický kraj IČO: 70892822
 Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822
 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: ELESTAV s.r.o. IČO: 25993046
 Vraclavská 237 DIČ: CZ25993046
 56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	124 430,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	124 430,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	124 430,00 CZK
Základní DPH	21 %	26 130,30 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 150 560,30 CZK

v Vysokém Mýtě dne 3.4.2020

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D4	SO01- BUDOVA - ČIDLA CO2 - MONTÁŽ	HSV			7 867,50	6
D6	SO01- BUDOVA - ČIDLA CO2 - MATERIÁL	HSV			116 562,50	94
Cena celkem					124 430,00	100

Položkový rozpočet

S:	18/039	Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto
O:	1	gymnázium vysoké mýto
R:	10	Dodatek č.2-elektroinstalace čidla CO2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D4		SO01- BUDOVA - ČIDLA CO2 - MONTÁŽ				-882,50
1	18.1	kabel CYKY 3Jx2,5 PO	ks	-25,00000	35,30	-882,50
Díl: D6		SO01- BUDOVA - ČIDLA CO2 - MATERIÁL				-487,50
2	24.1	kabel CYKY 3Jx2,5	ks	-25,00000	19,50	-487,50
Díl: D4		SO01- BUDOVA - ČIDLA CO2 - MONTÁŽ				8 750,00
3	18.1.O	Čidlo CO2 montáž	ks	25,00000	350,00	8 750,00
Díl: D6		SO01- BUDOVA - ČIDLA CO2 - MATERIÁL				117 050,00
4	24.1.O	čidlo CO2 interiérové, se zobrazením hodnot měření, napájení 230 V, včetně rámečku	ks	25,00000	4 682,00	117 050,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/039 Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto
Objekt: 1 gymnázium vysoké mýto
Rozpočet: 12 Dodatek č.2-měněpráce stavební

Objednatel: Pardubický kraj IČO: 70892822
 Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822
 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: ELESTAV s.r.o. IČO: 25993046
 Vraclavská 237 DIČ: CZ25993046
 56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-40 335,08
PSV	-23 758,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-64 093,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-64 093,57 CZK
Základní DPH	21 %	-13 459,65 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -77 553,22 CZK

v _____ dne _____

XXXXXXXXXX

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV			-32 876,08	51
8	Trubní vedení	HSV			-7 459,00	12
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			-23 758,49	37
Cena celkem					-64 093,57	100

Položkový rozpočet

S:	18/039	Realizace úspor energie - Gymnázium Vysoké Mýto
O:	1	gymnázium vysoké mýto
R:	12	Dodatek č.2-měněpráce stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-7 459,00
1	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-1,00000	1 710,00	-1 710,00
2	592238220	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5	kus	-1,00000	886,00	-886,00
3	592238260	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590 /skruž/ 59 x 50 x 5	kus	-1,00000	673,00	-673,00
4	592238730	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	-1,00000	2 343,00	-2 343,00
5	592238760	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm	kus	-1,00000	1 257,00	-1 257,00
6	592238750	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052,nízký, rám 500/300	kus	-1,00000	590,00	-590,00
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-23 758,49
7	721111111	Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 125	kus	-4,00000	320,00	-1 280,00
8	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	-14,00000	206,00	-2 884,00
9	721173316	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 125	m	-12,00000	710,00	-8 520,00
10	721173317	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 160	m	-2,00000	669,00	-1 338,00
11	72124211x	Lapače střešních splavenin litinový DN 125	kus	-4,00000	1 756,00	-7 024,00
12	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	-20,00000	132,00	-2 640,00
13	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,13600	533,00	-72,49
Díl: 5		Komunikace pozemní				-32 876,08
14	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	-54,83000	91,60	-5 022,43
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -54,83000	-54,83000	
15	596811220	Kladení dlažby zbetonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m složem zkameniva těženého tl. do 30 mm	m2	-54,83000	246,50	-13 515,60
16	592456000	Dlaždice betonové dlažba desková betonová 50 x 50 x 5	m2	-54,83000	261,50	-14 338,05
