



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		4									
ÚSEK: D.1.6-180219 Výtah											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 Vybourání žbet. základu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ											
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Tocháček spol. s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 1.6.2020</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL:</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 1.6.2020	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL:	
KOMU: OI MMB	OD: Tocháček spol. s.r.o.	DATUM: 1.6.2020									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:									
	MAIL:										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybourání železobetonového základu DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY : ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 04_ Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu _Méněpráce ZL 04_ Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu _Vícepráce ZL 04_ Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu _Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Změna byla vyvolána revizí zadávací projektové dokumentace zpracované na základě zjištěné situace základových podmínek stávajícího objektu v pozici u výtahové šachty zjištěné v rámci provádění zemních prací. Po posouzení základových poměrů ADP statikem bylo rozhodnuto o odstranění železobetonového základu. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 1.6.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402		4																
ÚSEK: D.1.6-180219 Výtah																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vybourání žbet. základu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Tocháček spol. s.r.o. DATUM: <u>1.6.2020</u> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybourání železobetonového základu DOTČENÉ MÍSTO: Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova ORG 5402 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 04_ Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu _Méněpráce ZL 04_ Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu _Vícepráce ZL 04_ Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu _Rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty</td><td style="text-align: right;">-71 466,71 Kč</td><td style="text-align: right;">-15 008,01 Kč</td><td style="text-align: right;">-86 474,72 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">126 911,32 Kč</td><td style="text-align: right;">26 651,38 Kč</td><td style="text-align: right;">153 562,70 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">55 444,61 Kč</td><td style="text-align: right;">11 643,37 Kč</td><td style="text-align: right;">67 087,98 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty	-71 466,71 Kč	-15 008,01 Kč	-86 474,72 Kč	Přípočty:	126 911,32 Kč	26 651,38 Kč	153 562,70 Kč	Rozdíl:	55 444,61 Kč	11 643,37 Kč	67 087,98 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty	-71 466,71 Kč	-15 008,01 Kč	-86 474,72 Kč															
Přípočty:	126 911,32 Kč	26 651,38 Kč	153 562,70 Kč															
Rozdíl:	55 444,61 Kč	11 643,37 Kč	67 087,98 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: <u>1.6.2020</u>																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: PODPIS: DATUM: <u>1.6.2020</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
Objekt:	ZL 04	Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu	
Rozpočet:	01	Měněpráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-71 466,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-71 466,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-71 466,71 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-71 466,71 CZK
v  _____ Za zhotovitele dne  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-27 515,15	39
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-43 951,56	61
Cena celkem					-71 466,71	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 04	Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-27 515,15
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	-3,01250	242,00	-729,03
rozpočet D.1.6 Výtah		Pro výtah : -(3,50*3,15*1,20)		-13,23000		
		NR : 3,5*3,15*(1,7-0,2)		16,53750		
		NR : -(3,50*1,1*1+1,9*1,3*1)		-6,32000		
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	-1,50625	10,00	-15,06
rozpočet D.1.6 Výtah		50 % : -(13,23*0,50)		-6,61500		
		NR-50% : 3,5*3,15*(1,7-0,2)*0,5		8,26875		
		NR : -(3,50*1,1*1+1,9*1,3*1)*0,5		-3,16000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-12,24390	226,00	-2 767,12
rozpočet D.1.6 Výtah		Vytěžená zemina : -(13,23+3,6297+7,8936)		-24,75330		
		Zemina určená k zásypu : -(4,464)		4,46400		
		NR-vytěžená zemina : 3,5*3,15*(1,7-0,2)		16,53750		
		-(3,50*1,1*1+1,9*1,3*1)		-6,32000		
		NR-zemina k zásypu : -2,1721		-2,17210		
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	-122,43900	13,00	-1 591,71
rozpočet D.1.6 Výtah		Celkem do 20 km : -20,2893*10		-202,89300		
		NR : 8,0454*10		80,45400		
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	-12,24390	135,00	-1 652,93
rozpočet D.1.6 Výtah		Vytěžená zemina : -(13,23+3,6297+7,8936)		-24,75330		
		Zemina určená k zásypu : -(4,464)		4,46400		
		NR : 8,0454		8,04540		
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m ³	-2,29190	319,00	-731,12
rozpočet D.1.6 Výtah		Kolem výtahové šachty : -(3,15*0,80*1,20)		-3,02400		
		-(2,00*0,60*1,20)		-1,44000		
		NR-vykop : 3,5*3,15*(1,7-0,2)		16,53750		
		NR-odpočet zákla : -(3,50*1,1*1+1,9*1,3*1)		-6,32000		
		NR-odpočet šachty : -2,120*2,530*1,5		-8,04540		
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	-12,24390	240,00	-2 938,54
rozpočet D.1.6 Výtah		-(20,2893)		-20,28930		
		NR : 8,0454		8,04540		
7	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m ³	-7,89360	2 165,00	-17 089,64
rozpočet D.1.6 Výtah		U základů výtahové šachty : -(2,90+2,60)*0,92*1,56		-7,89360		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-43 951,56
25	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25	m ³	-7,89360	5 568,00	-43 951,56
rozpočet D.1.6 Výtah		U základů výtahové šachty : -(2,90+2,60)*0,92*1,56		-7,89360		
Celkem						-71 466,71

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
Objekt:	ZL 04	Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu	
Rozpočet:	02	Vícepráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Tocháček spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno		IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			121 503,94
PSV			5 407,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			126 911,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		126 911,32 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			126 911,32 CZK
v		dne	
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			85 035,60	67
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 407,38	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			36 468,34	29
Cena celkem					126 911,32	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno	
O:	ZL 04	Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				85 035,60
1	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	6,32000	6 910,00	43 671,20
		1,1*3,5*1		3,85000		
		1,3*1,9*1		2,47000		
2	961_R1	Bourání základů z betonu prostého chemickým rozpojováním směsí CEVAMIT	m3	6,32000	6 545,00	41 364,40
		1,1*3,5*1		3,85000		
		1,3*1,9*1		2,47000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 407,38
3	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	109,24000	49,50	5 407,38
		I160 3 ks dl.1,1 m : 17,9*1,1*3		59,07000		
		I160 1 ks dl.1,5 m : 17,9*1,5*1		26,85000		
		U 100 2 ks dl.1,1 : 10,6*1,1*2		23,32000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				36 468,34
4	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	0,10924	-3 635,43	-397,13
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,10924		0,10924		
5	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	15,16800	1 245,00	18 884,16
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 15,16800		15,16800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,00000				
6	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	15,27724	843,00	12 878,71
51	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,27724	163,00	2 490,19
rozpočet D.1.6 Výtah						
52	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	290,26756	9,00	2 612,41
rozpočet D.1.6 Výtah						
Celkem						126 911,32

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	851-2019_VCP	Rekonstrukce a adaptace podkrovní budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno
Objekt:	ZL 04	Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu
Rozpočet:	03	Rozdílový rozpočet

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	Tocháček spol. s r.o.	IČO: 44961367
	Slovinská 36	DIČ: CZ44961367
	61200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			50 037,23
PSV			5 407,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 444,61

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 444,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	55 444,61 CZK
----------------------------	----------------------

v	dne	
		
Za zhotovitele	Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-27 515,15	-50
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-43 951,56	-79
96	Bourání konstrukcí	HSV			85 035,60	153
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 407,38	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			36 468,34	66
Cena celkem					55 444,61	100

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podkroví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno		
O:	ZL 04	Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu	
R:	03	Rozdílový rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-27 515,15
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-3,01250	242,00	-729,03
rozpočet D.1.6 Výtah		Pro výtah : $-(3,50 \times 3,15 \times 1,20)$		-13,23000		
		NR : $3,5 \times 3,15 \times (1,7 - 0,2)$		16,53750		
		NR : $-(3,50 \times 1,1 \times 1 + 1,9 \times 1,3 \times 1)$		-6,32000		
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-1,50625	10,00	-15,06
rozpočet D.1.6 Výtah		50 % : $-(13,23 \times 0,50)$		-6,61500		
		NR-50 % : $3,5 \times 3,15 \times (1,7 - 0,2) \times 0,5$		8,26875		
		NR : $-(3,50 \times 1,1 \times 1 + 1,9 \times 1,3 \times 1) \times 0,5$		-3,16000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-12,24390	226,00	-2 767,12
rozpočet D.1.6 Výtah		Vytěžená zemina : $-(13,23 + 3,6297 + 7,8936)$		-24,75330		
		Zemina určená k zásypu : $-(4,464)$		4,46400		
		NR-vytěžená zemina : $3,5 \times 3,15 \times (1,7 - 0,2)$		16,53750		
		$-(3,50 \times 1,1 \times 1 + 1,9 \times 1,3 \times 1)$		-6,32000		
		NR-zemina k zásypu : $-2,1721$		-2,17210		
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-122,43900	13,00	-1 591,71
rozpočet D.1.6 Výtah		Celkem do 20 km : $-20,2893 \times 10$		-202,89300		
		NR : $8,0454 \times 10$		80,45400		
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-12,24390	135,00	-1 652,93
rozpočet D.1.6 Výtah		Vytěžená zemina : $-(13,23 + 3,6297 + 7,8936)$		-24,75330		
		Zemina určená k zásypu : $-(4,464)$		4,46400		
		NR : $8,0454$		8,04540		
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	-2,29190	319,00	-731,12
rozpočet D.1.6 Výtah		Kolem výtahové šachty : $-(3,15 \times 0,80 \times 1,20)$		-3,02400		
		$-(2,00 \times 0,60 \times 1,20)$		-1,44000		
		NR-vykop : $3,5 \times 3,15 \times (1,7 - 0,2)$		16,53750		
		NR-odpočet zákla : $-(3,50 \times 1,1 \times 1 + 1,9 \times 1,3 \times 1)$		-6,32000		
		NR-odpočet šachty : $-2,120 \times 2,530 \times 1,5$		-8,04540		
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-12,24390	240,00	-2 938,54
rozpočet D.1.6 Výtah		$-(20,2893)$		-20,28930		
		NR : $8,0454$		8,04540		
7	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m3	-7,89360	2 165,00	-17 089,64
rozpočet D.1.6 Výtah		U základů výtahové šachty : $-(2,90 + 2,60) \times 0,92 \times 1,56$		-7,89360		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-43 951,56
25	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25	m3	-7,89360	5 568,00	-43 951,56
rozpočet D.1.6 Výtah		U základů výtahové šachty : $-(2,90 + 2,60) \times 0,92 \times 1,56$		-7,89360		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				85 035,60
10	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	6,32000	6 910,00	43 671,20
		1,1*3,5*1		3,85000		
		1,3*1,9*1		2,47000		

Položkový rozpočet

S:	851-2019_VCP Rekonstrukce a adaptace podklíví budovy Scio školy, Sokolova 4, Brno				
O:	ZL 04	Vybourání základu ve výkopu pro výtahovou šachtu			
R:	03	Rozdílový rozpočet			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	961_R1	Bourání základů z betonu prostého chemickým rozpojováním směsí CEVAMIT	m3	6,32000	6 545,00	41 364,40

1,1*3,5*1

3,85000

1,3*1,9*1

2,47000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					5 407,38
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

12	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	109,24000	49,50	5 407,38
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

I160 3 ks dl.1,1 m : 17,9*1,1*3

59,07000

I160 1 ks dl.1,5 m : 17,9*1,5*1

26,85000

U 100 2 ks dl.1,1 : 10,6*1,1*2

23,32000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					36 468,34
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

13	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	0,10924	-3 635,43	-397,13
----	--------------	--	---	---------	-----------	---------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,10924

0,10924

14	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	15,16800	1 245,00	18 884,16
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 15,16800

15,16800

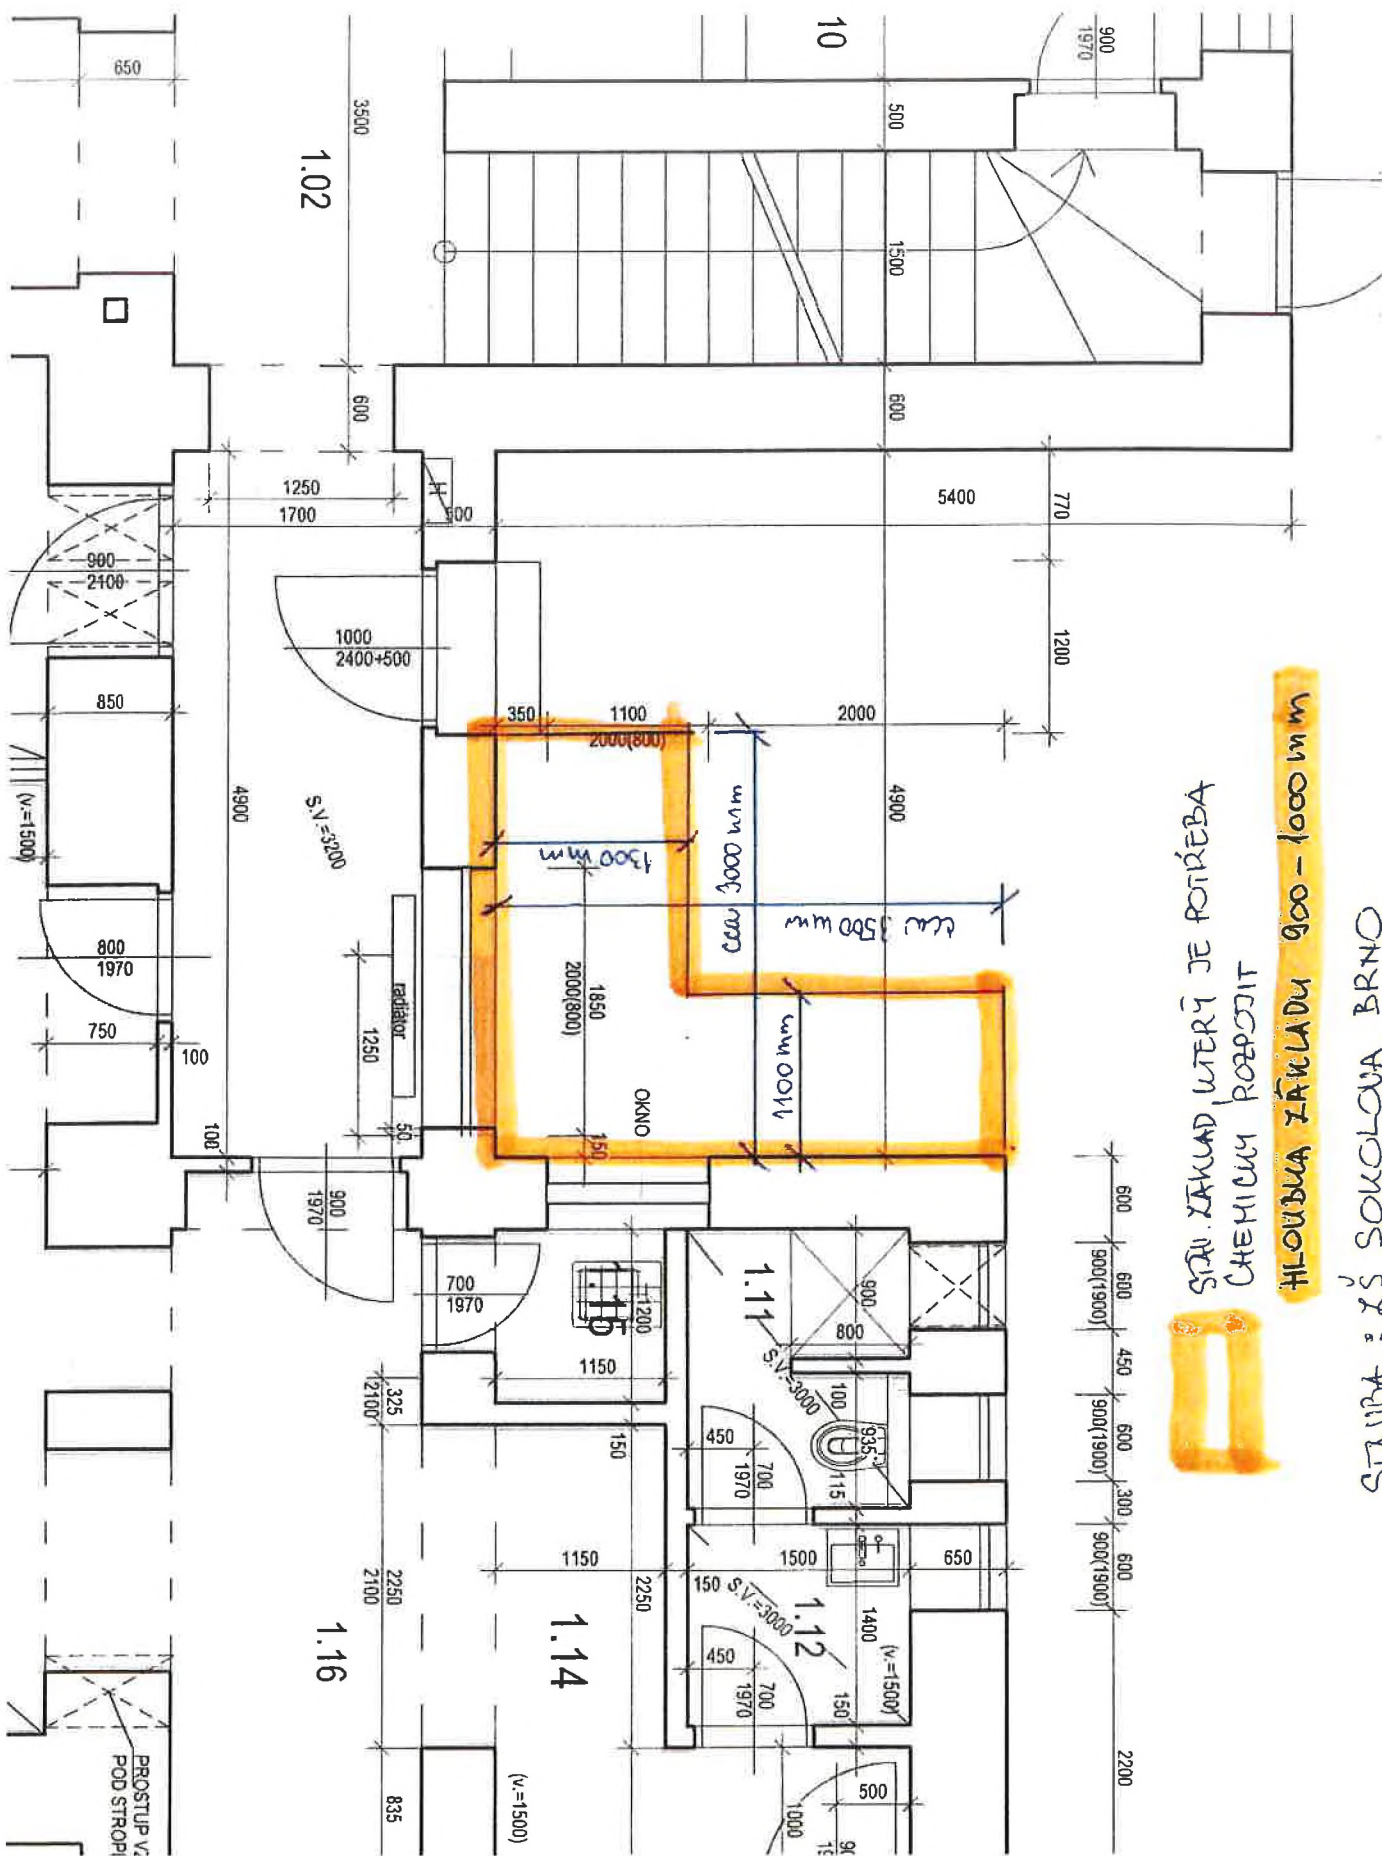
15	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	15,27724	843,00	12 878,71
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

51	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,27724	163,00	2 490,19
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

52	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	290,26756	9,00	2 612,41
----	--------------	--	---	-----------	------	----------

rozpočet D.1.6 Výtah

Celkem						55 444,61
---------------	--	--	--	--	--	------------------



STAV ZÁKLAD, KTERÝ JE POTŘEBA
CHEMICKY ROZPOJIT



HLAVNÍ ZÁKLAD - 600 mm 600 mm

STAV SOKLOVA BRNO
STAV SOKLOVA BRNO





