

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

STL přípojky Svatopetrská - Dornych

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 500.10.10/1

Číslo ZBV:

2/29.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 2/29.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/29.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/29.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/29.3	0,00	225 108,33	225 108,33

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/29.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/29.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/29.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2/29	0,00	225 108,33	225 108,33

ZBV - krycí list

Číslo paré:

7

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 2/29.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 500.10.10/1
Název SO/PS:	STL přípojky Svatopetrská - Dornych

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	330 292,70 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	225 108,33 Kč, 68,15 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 176 757 231,58 Kč, 98,27 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.10.10.

Při realizaci plynovodních přípojek ve stavebním objektu SO 500.10.10 bylo zjištěno, že na stávající plynovodní řad byly napojeny přípojky z nemovitostí Dornych 126, 128 a firmy Vezeko s.r.o. Tyto přípojky nebyly součástí VD-ZDS, ale bylo nutné je přepojit na nově budovaný plynovodní řad SO 500.10.01, který nahrazuje řad stávající.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nevznikají.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.10.10.

Při realizaci plynovodních přípojek ve stavebním objektu SO 500.10.10 bylo zjištěno, že na stávající plynovodní řad byly napojeny přípojky z nemovitostí Dornych 126, 128 a firmy Vezeko s.r.o. Tyto přípojky nebyly součástí VD-ZDS, ale bylo nutné je přepojit na nově budovaný plynovodní řad SO 500.10.01, který nahrazuje řad stávající.

Jelikož v době, kdy byla projektována zadávací dokumentace, nebyly přípojky zaneseny v podkladech od správce plynovodních sítí. Proto nemohly být zaneseny do zadávací projektové dokumentace. Z tohoto důvodu nemohl projektant ani Zhotovitel výskyt těchto přípojek předpokládat.

Změněné množství položek souvisejících se Změnou v rozpočtu SO 500.10.10 STL přípojky Svatopetrská - Dornych:

2	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	změna množství: 5,640 m3	62,67 %
4	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ	změna množství: 16,760 m3	31,04 %
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	změna množství: 16,760 m3	31,04 %
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	změna množství: 7,800 m3	26,53 %
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	změna množství: 8,960 m3	36,42 %
8	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	změna množství: 31,000 m2	57,41 %

9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	
	změna množství:	24,000 m ²	40,00 %
11	87315	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2")	
	změna množství:	10,000 m	18,87 %
15	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	
	změna množství:	30,000 m	50,00 %
16	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	
	změna množství:	30,000 m	50,00 %
17	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	
	změna množství:	31,000 m	58,49 %
19	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	
	změna množství:	5,000 ks	125,00 %
20	900 R 002	HZS - nezměřitelné práce (práce RWE na propojích)	
	změna množství:	9,000 hzs	75,00 %
21	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací)	
	Změna množství:	6,000 hzs	100,00 %
22	900 R 004	HZS – revize	
	změna množství:	6,500 hzs	65,00 %
23	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	
	změna množství:	28,000 m	280,00 %
25	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	
	změna množství:	28,000 m	280,00 %
501	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	
	změna množství:	24,000 m ²	100,00 %
502	86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	
	změna množství:	2,400 m	100,00 %
503	87814	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY	
	změna množství:	2,400 m	100,00 %
504	891815	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM (PŘÍPOJKOVÁ PE TVAROVKA PRO PE	
32, 40, 50, 63)	změna množství:	3,000 ks	100,00 %
505	87314	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 40MM (6/4")	
	změna množství:	16,500 m	100,00 %
506	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM (PE 90)	
	změna množství:	14,500 m	100,00 %
507	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY	
	změna množství:	14,500 m	100,00 %
508	891114	ŠOUPÁTKA DN DO 45MM (PE KK DN 50 + ZS)	
	změna množství:	1,000 ks	100,00 %
509	624451	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY	
	změna množství:	3,600 m ²	100,00 %
510	723145	VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 50MM	
	změna množství:	1,000 m	100,00 %
511	72321.3	PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 5/4"	
	změna množství:	2,000 ks	100,00 %
512	72321.8	PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B25	
	změna množství:	1,000 ks	100,00 %
513	72321.9	PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B40	
	změna množství:	1,000 ks	100,00 %
514	899304	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ (SKŘÍŇ) HUP	
	změna množství:	2,000 ks	100,00 %
515	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	
	změna množství:	0,390 m ³	100,00 %
516	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 80MM	
	změna množství:	3,500 m	100,00 %

Změněné množství položek souvisejících se Změnou v rozpočtu B.2.1.6 Poplatek za uložení na skládku:

1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	
	Změna množství:	26,816 t	31,04 %

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: 

Podpis: 

18. 03. 2019
datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno
Jméno:

Podpis:



datum:4..04..2019

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL přípojky Svatopetrská - Dornych	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.10.10/1	Číslo ZBV: 2/29.3
--	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.10.10/1

Při realizaci plynovodních přípojek ve stavebním objektu SO 500.10.10 bylo zjištěno, že na stávající plynovodní řad byly napojeny přípojky z nemovitostí Dornych 126, 128 a firmy Vezeko s.r.o. Tyto přípojky nebyly součástí VD-ZDS, ale bylo nutné je přepojit na nově budovaný plynovodní řad SO 500.10.01, který nahrazuje řad stávající.

Jelikož v době, kdy byla projektována zadávací dokumentace, nebyly přípojky zaneseny v podkladech od správce plynovodních sítí. Proto nemohly být zaneseny do zadávací projektové dokumentace. Z tohoto důvodu nemohl projektant ani Zhotovitel výskyt těchto přípojek předpokládat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	225 108,33	225 108,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14. 3. 2019	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum		podpis
Supervize	jméno	datum		
Správce stavby	jméno	datum	18. 03. 2019	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)		datum	4 - 04 - 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	07. 03. 2019	
				Číslo paré:
				7

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 2/29.3

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.10.10/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL přípojky Svatopetrská - Dorných		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
330 292,70

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	330 292,70	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	225 108,33	225 108,33	68,15%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	555 401,03	225 108,33	68,15%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

07. 03. 2019

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM
14. 3. 2019

Správce stavby

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

18. 03. 2019

7 4 -04- 2019

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2/29.3										
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4										
Číslo a název SO/PS: SO 500.10.10 STL přípojky Svatopetrská - Dorných										
Číslo a název rozpočtu: Rekapitulace SO 500.10.10										
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název rozpočtu:	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Příloha č. 9.1	SO 500.10.10	STL přípojky Dorných, 1. část	313 681,60	0,00	222 158,57	535 840,17	222 158,57	70,82%		
Příloha č. 9.2	B.2.1.6	Poplatek za uložení na skládce	16 611,10	0,00	2 949,76	19 560,86	2 949,76	17,76%		
		Celkem	330 292,70	0,00	225 108,33	555 401,03	225 108,33	68,15%		

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2/29.3

ZMENA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 500.10.10/1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 500.10.10 STL přípojky Svatopetrská - Dorných

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
01		Zemní práce											
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	9,000	9,000	0,000	1 787,00	16 083,00	0,00	0,00	16 083,00	0,00	0,00%
2	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM přípojky Dorných 126 a 128: 1,92 m3 přípojka Vezeko: 2,88 m3 OPZ Vezeko: 0,84 m3	M3	9,000	14,640	5,640	1 553,00	13 977,00	0,00	8 758,92	22 735,92	8 758,92	62,67%
3	113348	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	12,000	12,000	0,000	2 007,00	24 084,00	0,00	0,00	24 084,00	0,00	0,00%
4	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 DO 5KM	M3	54,000	70,760	16,760	601,00	32 454,00	0,00	10 072,76	42 526,76	10 072,76	31,04%
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	54,000	70,760	16,760	16,00	864,00	0,00	268,16	1 132,16	268,16	31,04%
6	17411	přípojky Dorných 126 a 128: 4,48 m3 přípojka Vezeko: 10,32 m3 OPZ Vezeko: 1,96 m3	M3	29,400	37,200	7,800	89,00	2 616,60	0,00	694,20	3 310,80	694,20	26,53%
7	17581	přípojky Dorných 126 a 128: 1,92 m3 přípojka Vezeko: 5,04 m3 OPZ Vezeko: 0,84 m3	M3	24,600	33,560	8,960	825,00	20 295,00	0,00	7 392,00	27 687,00	7 392,00	36,42%
8	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ přípojky Dorných 126 a 128: 10 m2 přípojka Vezeko: 17 m2 OPZ Vezeko: 4 m2	M2	54,000	85,000	31,000	21,00	1 134,00	0,00	651,00	1 785,00	651,00	57,41%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01		Zemní práce						111 507,60	0,00	27 837,04	139 344,64	27 837,04	24,96%
05		Komunikace											
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI přípojky Dorných 126 a 128: 8 m2 přípojka Vezeka: 12 m2 OPZ Vezeka: 4 m2	M2	60,000	84,000	24,000	164,00	9 840,00	0,00	3 936,00	13 776,00	3 936,00	40,00%
10	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	9,000	9,000	0,000	470,00	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00%
05		Komunikace						14 070,00	0,00	3 936,00	18 006,00	3 936,00	27,97%
08		Potrubi											
11	87315	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAR DN DO 50MM (2")	M	53,000	63,000	10,000	1 369,00	72 557,00	0,00	13 690,00	86 247,00	13 690,00	18,87%
12	87327	přípojky Dorných 126 a 128: 10 m POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 100MM	M	7,000	7,000	0,000	1 866,00	13 062,00	0,00	0,00	13 062,00	0,00	0,00%
13	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	16,500	16,500	0,000	1 617,00	26 680,50	0,00	0,00	26 680,50	0,00	0,00%
14	87827	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČEK	M	16,500	16,500	0,000	1 369,00	22 588,50	0,00	0,00	22 588,50	0,00	0,00%
15	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ	M	60,000	90,000	30,000	18,00	1 080,00	0,00	540,00	1 620,00	540,00	50,00%
16	899309	přípojky Dorných 126 a 128: 10 m přípojka Vezeka: 16,5 m OPZ Vezeka: 3,5 m	M	60,000	90,000	30,000	13,00	780,00	0,00	390,00	1 170,00	390,00	50,00%
17	899611	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE přípojky Dorných 126 a 128: 10 m přípojka Vezeka: 16,5 m OPZ Vezeka: 3,5 m	M	53,000	84,000	31,000	31,00	1 643,00	0,00	961,00	2 604,00	961,00	58,49%
18	899621	přípojky Dorných 126 a 128: 10 m přípojka Vezeka: 16,5 m doplnění domovních instalací Dorných 126 a 128: 1 m	M	7,000	7,000	0,000	49,00	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00%
19	899901	OPZ Vezeka: 3,5 m TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KS	4,000	9,000	5,000	6 666,00	26 664,00	0,00	33 330,00	59 994,00	33 330,00	125,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč		Rozdíl cen celkem v %
											12	13	
20	900 R 002	přípojky Dorných 126 a 128: 2 ks přípojka Vezeko: 1 ks dopojení domovních instalací Dorných 126 a 128: 2 ks	HZS	12,000	21,000	9,000	855,00	10 260,00	0,00	7 695,00	17 955,00	7 695,00	75,00%
21	900 R 003	HZS - nezměřitelné práce (práce RWE na propojích) přípojky Dorných 126 a 128: 6 hzs přípojka Vezeko: 3 hzs	HZS	6,000	12,000	6,000	425,00	2 550,00	0,00	2 550,00	5 100,00	2 550,00	100,00%
22	900 R 004	HZS - nezměřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací) přípojky Dorných 126 a 128: 4 hzs přípojka Vezeko: 2 hzs	HZS	10,000	16,500	6,500	581,00	5 810,00	0,00	3 776,50	9 586,50	3 776,50	65,00%
08		HZS - revize přípojky Dorných 126 a 128: 3 hzs přípojka Vezeko: 1,5 hzs dopojení domovních instalací Dorných 126 a 128: 2 hzs											
		Potrubi						184 018,00	0,00	62 932,50	246 950,50	62 932,50	34,20%
23	96931	Ostatní práce VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	10,000	38,000	28,000	92,00	920,00	0,00	2 576,00	3 496,00	2 576,00	280,00%
		přípojky Dorných 126 a 128: 11 m přípojka Vezeko: 17 m											
24	96932	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH	M	16,000	16,000	0,000	131,00	2 096,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00%
25	96941	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	10,000	38,000	28,000	35,00	350,00	0,00	980,00	1 330,00	980,00	280,00%
		přípojky Dorných 126 a 128: 11 m přípojka Vezeko: 17 m											
26	96942	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM	M	16,000	16,000	0,000	45,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00%
09		Ostatní práce						4 086,00	0,00	3 556,00	7 642,00	3 556,00	87,03%
999		Nové položky											
501	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	0,000	24,000	24,000	59,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
502	86627	připojky Dorných 126 a 128: 8 m2 připojka Vezeke: 12 m2 OPZ Vezeke: 4 m2	M	0,000	2,400	2,400	1 369,00	0,00	0,00	3 285,60	3 285,60	3 285,60	100,00%
503	87814	připojky Dorných 126 a 128: 2,4 m NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY	M	0,000	2,400	2,400	622,00	0,00	0,00	1 492,80	1 492,80	1 492,80	100,00%
504	891815	připojky Dorných 126 a 128: 2,4 m NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM (PŘIPOJKOVÁ PE TVAROVKA PRO PE 32, 40, 50, 63)	KS	0,000	3,000	3,000	6 221,00	0,00	0,00	18 663,00	18 663,00	18 663,00	100,00%
505	87314	připojky Dorných 126 a 128: 2 ks připojka Vezeke: 1 ks POTR. Z TRUB PE TLAK SVAŘ DN DO 40MM (6/4")	M	0,000	16,500	16,500	1 245,00	0,00	0,00	20 542,50	20 542,50	20 542,50	100,00%
506	87626	připojka Vezeke: 16,5 m CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM (PE 90)	M	0,000	14,500	14,500	622,00	0,00	0,00	9 019,00	9 019,00	9 019,00	100,00%
507	87815	připojka Vezeke: 14,5 m NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY	M	0,000	14,500	14,500	622,00	0,00	0,00	9 019,00	9 019,00	9 019,00	100,00%
508	891114	připojka Vezeke: 14,5 m ŠOUPÁTKA DN DO 45MM (PE KK DN 50 + ZS)	KS	0,000	1,000	1,000	13 062,00	0,00	0,00	13 062,00	13 062,00	13 062,00	100,00%
509	624451	připojka Vezeke: 1 ks ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY dopojení domovních instalací Dorných 126 a 128: 3,6 m2	M2	0,000	3,600	3,600	622,00	0,00	0,00	2 239,20	2 239,20	2 239,20	100,00%
510	723145	VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 50MM	M	0,000	1,000	1,000	1 369,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	100,00%
511	72321.3	dopojení domovních instalací Dorných 126 a 128: 1 m PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 5/4"	KS	0,000	2,000	2,000	809,00	0,00	0,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	100,00%
512	72321.8	dopojení domovních instalací Dorných 126 a 128: 2 ks PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B25	KS	0,000	1,000	1,000	6 221,00	0,00	0,00	6 221,00	6 221,00	6 221,00	100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdí cen celkem v Kč 13	Rozdí cen celkem v % 14
513	72321.9	PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B40 dopojení domovních instalací Darných 126 a 128: 1 ks	KS	0,000	1,000	1,000	8 086,00	0,00	0,00	8 086,00	8 086,00	8 086,00	100,00%
514	899304	DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ (SKŘÍŇ) HUP 128: 2 ks	KS	0,000	2,000	2,000	10 574,00	0,00	0,00	21 148,00	21 148,00	21 148,00	100,00%
515	96813	dopojení domovních instalací Darných 126 a 128: 2 ks VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU 128: 0,39 m3	M3	0,000	0,390	0,390	1 587,00	0,00	0,00	618,93	618,93	618,93	100,00%
516	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 80MM OPZ Vezeka: 3,5 m Nové položky	M	0,000	3,500	3,500	1 742,00	0,00	0,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	100,00%
999								0,00	0,00	123 897,03	123 897,03	123 897,03	100,00%
		Celkem						313 681,60	0,00	222 158,57	535 840,17	222 158,57	70,82%

501	567326	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	cenová hladina:			pol.č. 12, SO 500.11.01						
502	86627	CHRÁNICÍKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	cenová hladina:			pol.č. 16, SO 500.11.10						
503	87814	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNICÍKY	M	cenová hladina:			pol.č. 17, SO 500.11.10						
504	891815	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM (PŘÍPOJKOVÁ PE TVAROVKA PRO PE 32, 40, 50, 63)	KS	cenová hladina:			pol.č. 19, SO 500.11.10						
505	87314	POTR. Z TRUB PE TLAK SVAR DN DO 40MM (6/4")	M	cenová hladina:			pol.č. 14, SO 500.11.10						
506	87626	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM (PE 90)	M	cenová hladina:			pol.č. 14, SO 500.20.10						
507	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNICÍKY	M	cenová hladina:			pol.č. 15, SO 500.20.10						
508	891114	ŠOUPÁTKA DN DO 45MM (PE KK DN 50 + ZS)	KS	cenová hladina:			pol.č. 16, SO 500.20.10						
509	624451	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY	M2	cenová hladina:			pol.č. 1, SO 500.20.20-37						
510	723145	VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 50MM	M	cenová hladina:			pol.č. 4, SO 500.20.20-37						
511	72321.3	PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 5/4"	KS	cenová hladina:			pol.č. 7, SO 500.20.20-37						

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512	72321.8	PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B25	KS	cenová hladina:		pol.č. 11, SO 500.20.20-37							
513	72321.9	PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B40	KS	cenová hladina:		pol.č. 12, SO 500.20.20-37							
514	899304	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PÍLIČ (SKŘÍŇ) HUP	KS	cenová hladina:		pol.č. 15, SO 500.20.20-37							
515	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	M3	cenová hladina:		pol.č. 18, SO 500.20.20-37							
516	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 80MM	M	cenová hladina:		pol.č. 11, SO 500.20.11							

Za Zhotovitele:

Za Objednatatele:

Datum:

07. 03. 2019

Datum:

18. 03. 2019

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2/29.3														
ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)														
č. SO 500.10.10/1														
Skupina Změni: 3														
Poř. č.	Katalogové číslo	Název odpadu	m.j.	Množství ve Smlouvě	6	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	9	10	11	12	13	14
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3) přípojky Dorných 126 a 128: 4,48 m ³ *1,6 = 7,168 t	t	86,400	113,216	26,816	110,00	9 504,00	0,00	0,00	2 949,76	12 453,76	2 949,76	31,04%
1a	17 05 04	přípojka Vezeko: 10,32 m ³ *1,6 = 16,512 t OPZ Vezeko: 1,96 m ³ *1,6 = 3,136 t	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	17 05 03	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	17 05 08	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	17 05 07	šetrk čistý	t	37,800	37,800	0,000	80,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00%
5	17 05 07	šetrk kontam. ropnými látkami - biodegradace	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	17 01 07	lokálně zneč. šetrk (výhybky) / skládka stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady (z interiéru budov)	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	17 01 01	beton z demolic objektů, základů TV	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	17 01 06	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	17 01 06	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	18,000	18,000	0,000	230,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00%
12	17 02 01	dřevo po stav.použití, z demolic	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	17 09 02	stavební suť a zemina s PCB	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	02 01 03	smýčené stromy a keře	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	17 02 04	železniční pražce dřevěné	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	17 01 01	železniční pražce betonové	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	17 01 01	kůly a sloupy betonové	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	17 02 04	kůly a sloupy dřevěné	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	17 04 04	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	0,241	0,241	0,000	-500,00	-120,50	0,00	0,00	0,00	-120,50	0,00	0,00%
21	12 01 01	piliny ze železných kovů	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název odpadu	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen. celkem v Kč	Rozdíl cen. celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	12 01 03	piliny z neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	17 04 07	šrot neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	17 04 09	výhybky znečištěné mazadly	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	17 04 02	odpad hliníku	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	17 04 01	odpad mědi a jejích slitin	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	17 04 11	zbytky kabelů vodičů	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28	17 03 01	dehtové izolace proti víhku	t	0,053	0,053	0,000	1 200,00	63,50	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00%
29	17 03 02	asf.stavební nátěry	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	08 01 11	odpadní nátěr.hmoty	kg	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	08 01 17	odpadní ředidla, zbytky	kg	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	08 01 17	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	15 01 10	obaly od nátěrových hmot	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	15 01 02	obaly plastové	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	15 01 01	obaly papírové	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	15 01 03	obaly dřevěné	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	16 02 14	transformátory bez PCB	kg	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	16 02 14	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	16 02 14	ostatní vyřazené zařízení	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	16 06 01	olověné akumulátory	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	16 06 02	Ni-Cd akumulátory	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	17 01 03	izolátory porcelánové	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	17 01 03	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	07 02 99	pryžové podložky	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	17 02 03	PE podložky	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
46	17 05 05	stavební materiály s obsahem azbestu	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47	17 02 04	rámy oken se skleněnou výplní	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48	02 01 03	pařezy	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
								16 611,10	0,00	2 949,76	19 560,86	2 949,76	17,76%

Za Zho

Za Objednatatele:

Datum:

07. 03. 2019

Datum:

18. 03. 2019

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotni - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1-19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 176 757 231,58
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	98,27%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(18/1)*100	Sledování limitů 15% pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	3,86% ABS


6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-20 929 222,73	bez ABS
7=(8/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,75%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 3	4,85%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15%	0,03%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	348 748,42 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	148 875 251,58	

RD	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -			
							Y	Z	24=Z+Y	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36		37	38=(36/1)*100	39= 36 +37
	16	17	18	19=22+25+28+32+38	20=23+26+29+33+37+41	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(36/1)*100	39= 36 +37	40
				43 619 990,50	23 120 078,74	-20 899 313,85	0,00	0,00	0,00	-5 531 008,48	5 450 493,70	-92 315,78	-38 238 182,11	17 358 959,38	-20 929 222,73	55 647 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 748,42	0,03%	348 748,42	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

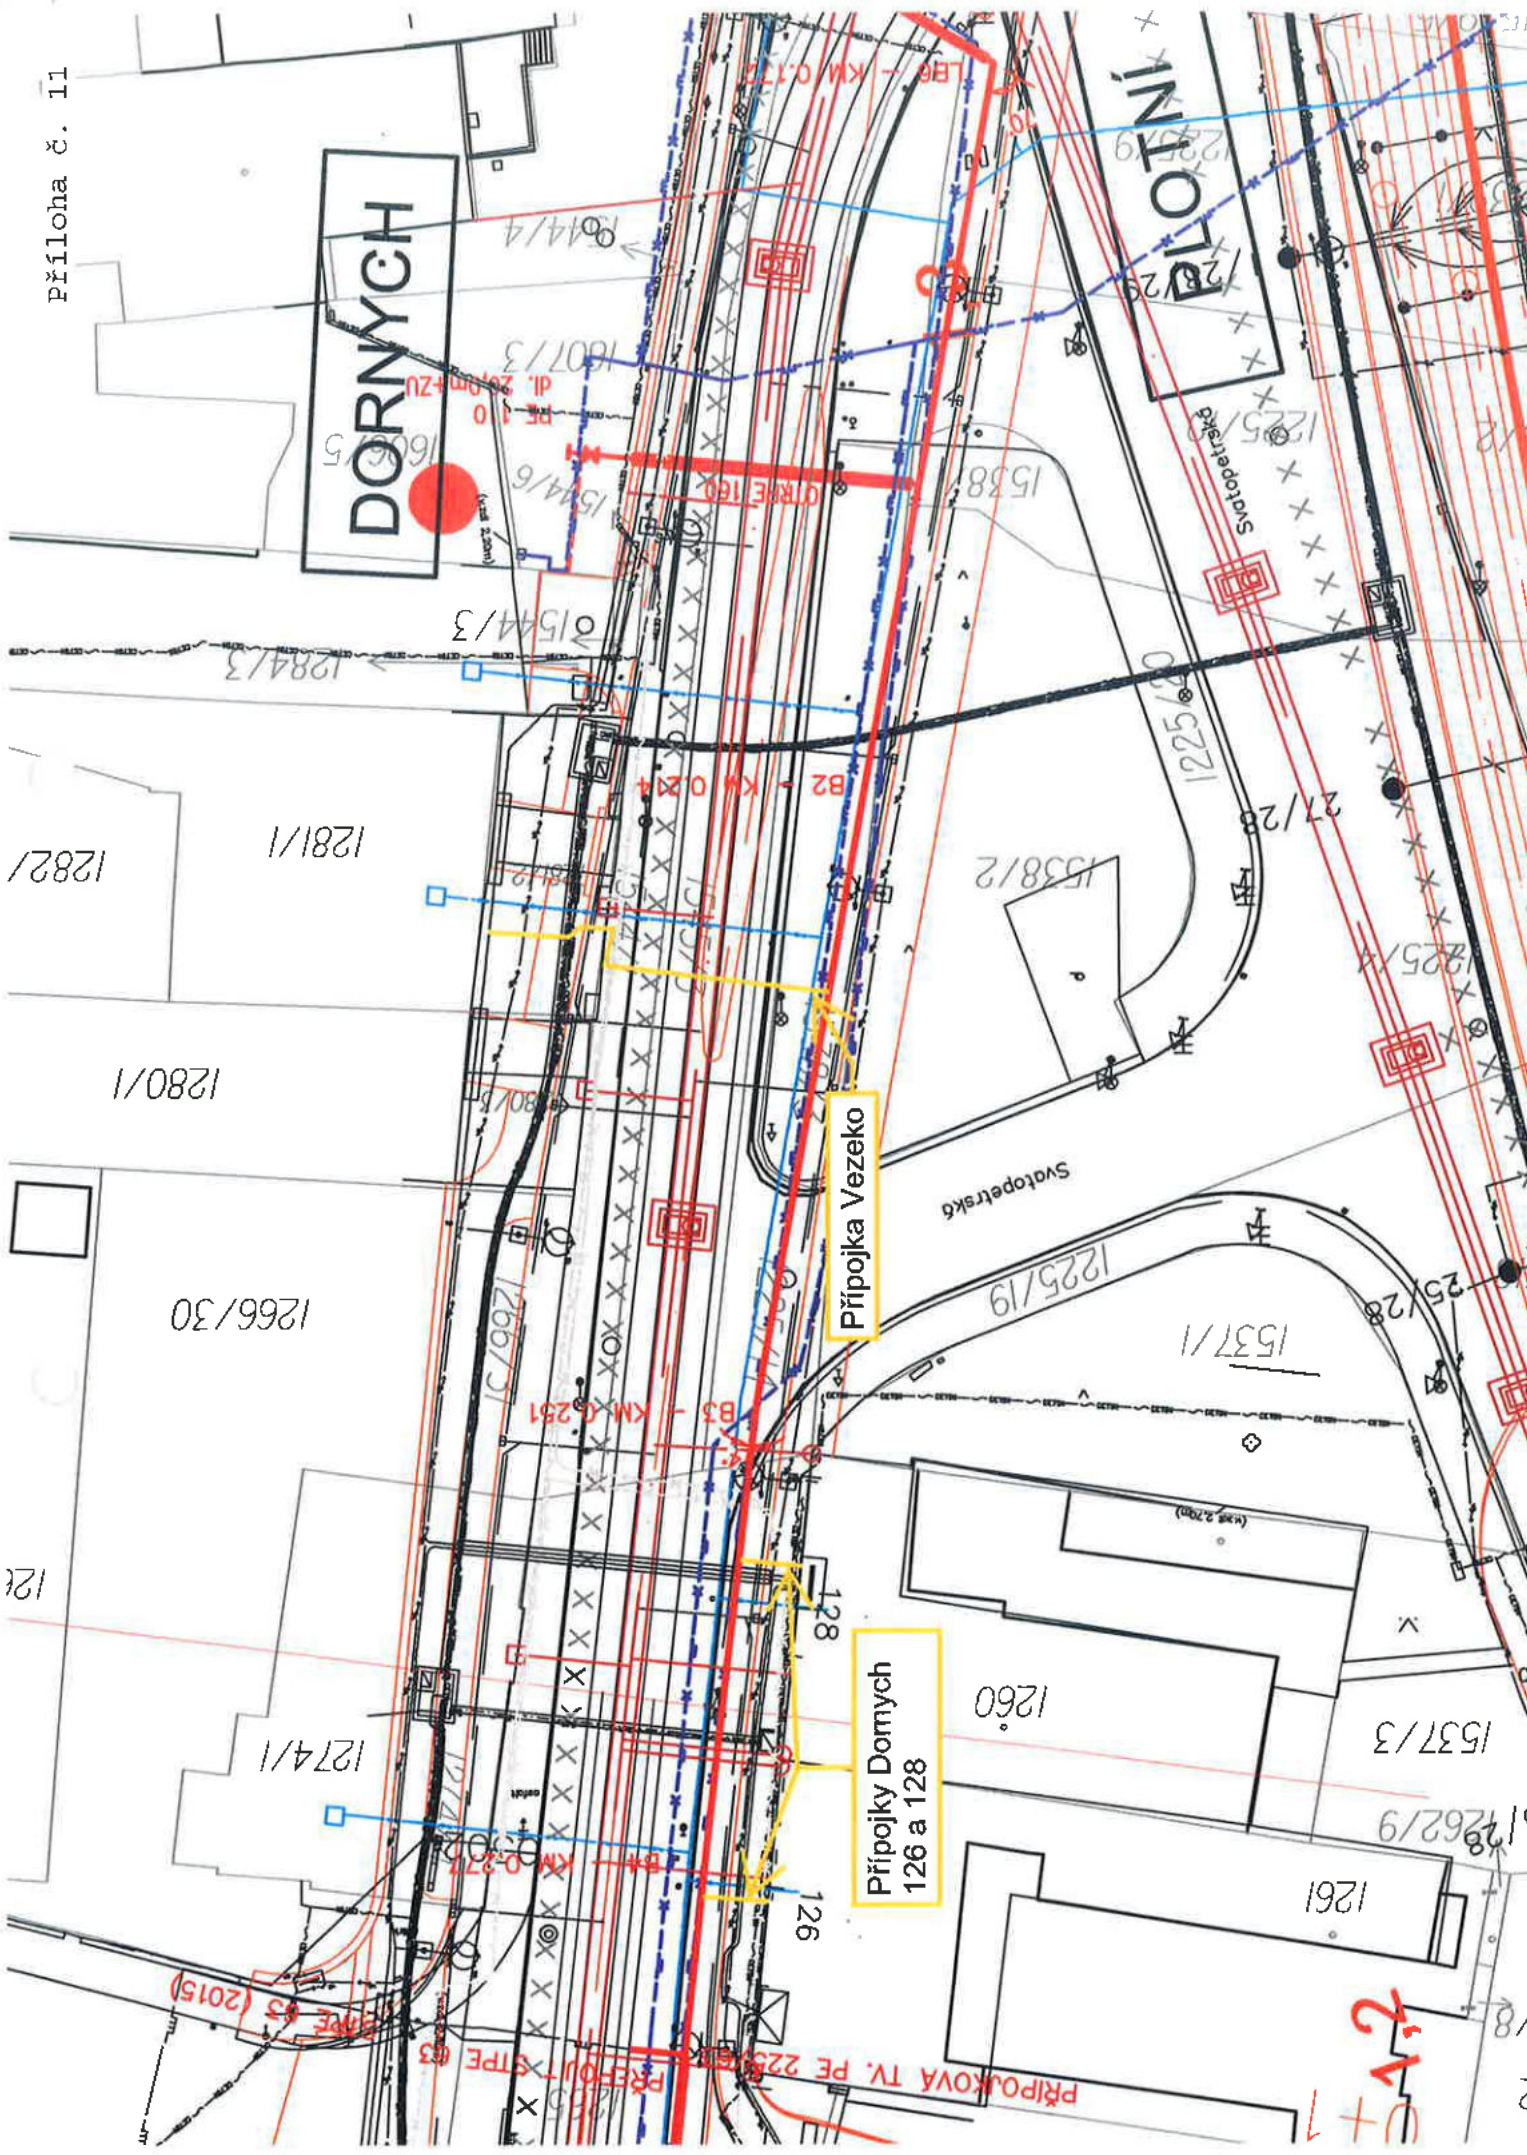

DORNYCH

PRÍPOJKOVÁ TV. PE 225/19

Prípojka Vezeko

Prípojky Dornych 126 a 128

PRÍPOJKOVÁ TV. PE 225/19
PREJOU STPE 03
STPE 03 (2015)

0+1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
