

Dodatek č. 3

č.j.: KRPL-3841-29/ČJ-2019-1800VZ

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-3841-18/ČJ-2019-1800VZ

uzavřená

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem KŘPL - L
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 84548881/0710
 Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek krajského ředitele
 Tel.: 974 461 551
 Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
 Tel.: 974 461 245
 E-mail: david.pokorny2@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

Setertix Group s.r.o.

zastoupený:  – jednatel společnosti
 se sídlem: Za Pasáží 1609 Pardubice 530 02
 IČ: 28831438
 DIČ: CZ 28831438
 bankovní spojení: KB - Pardubice
 číslo účtu: 0100/107- 4420530217
 Tel.: 
 E-mail: setertixgroup@seznam.cz
 Fax:
 Zapsaný: u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 31750

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve změnových listech č. 4, 5, 6, 7 a 10, které vznikly během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 3 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 4, 5, 6, a 10 (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 4, 5, 6 a 10, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

IV. V Článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	2.704.970,85 Kč
DPH 21%:	568.043,88 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	3.273.014,73 Kč

slovy: třímilionydvěstěsedmdesátřítisícečtrnáctkorunsedmdesátřihaléře

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 2.805.731,69 Kč

DPH 21%: 589.203,66 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 3.394.935,35 Kč

slovy: Třímilionytřístadevadesátčtyřitisícdevětsetřicetpětkoruntřicetpěthaléřů

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 3, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 3 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.




V Liberci dne: 08. 07. 2020

objednatel:



V Pardubicích dne: - 3. 07. 2020

zhotovitel:



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 4

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Setertix Group s.r.o.
Projektant:	Zefraprojekt, s.r.o.

Předmět změnového listu

oprava nesourodých částí fasády

Část díla dotčená změnovým listem

fasáda do ulice 28. října

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace navrhovala provedení nových omítek pouze lokálně v místech, kde byla stávající omítka opadaná nebo nesoudržná.

Nové řešení :

Esteticky nejvíce nesourodé části fasády byla opravena přetažením strukturovanou omítkou zrnitostí 1,5 mm.

Zdůvodnění změny :

Zhotovitel před zahájením prací provedl několik vzorků způsobu opravy fasády. Z nabízených vzorků vybral objednatel ve spolupráci s památkovou péčí konkrétní způsob opravy fasády. Aplikovaný způsob opravy se v části fasády do ulice 28. října ukázal jako neestetický - v některých místech provedených oprav působil finální nátěr nestejným odstínem oproti jiný částem fasády (fasáda měla nesourodý odstín). Důvodem byla různá zrnitost jednotlivých částí fasády složené z původních omítek, omítek z předchozích oprav a nově provedených omítek. Zhotovitel po dohodě s objednatelem provedl opravu nejvíce zjevných nesourodých částí fasády formou přetažení strukturovanou omítkou se zrnitostí 1,5 mm.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Stavební deník strana 021004 ze dne 2.8.2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, došlo ke zlepšení estetické stránky díla.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	19 680,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	19 680,00 Kč
DPH:	4 132,80 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	23 812,80 Kč

Setertix
Za Pasáží 1809
DIČ: CZ

datu

2020

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 680,00				
CELKEM OBJEKT	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			19 680,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

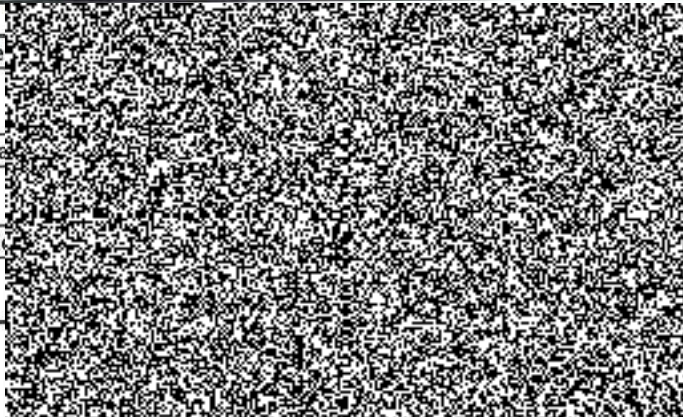


Za zhotovitele		
Za projektanta		
Za objednatel		

**ZMĚNOVÝ LIST č. 4
PŘÍPOČTY**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				19 680,00
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 680,00
IK	1	IK-ZL04-1	Ochranný nátěr prováděný z montážní plošiny	hod	12,00000	550,00	6 600,00
URS	2	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka II. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	24,00000	245,00	5 880,00
IK	3	IK-ZL04-2	Mikroarmovací nátěr omítek silikonový	m2	24,00000	300,00	7 200,00
Celkem změnový list							19 680,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		Zefraprojekt, s.r.o. 400 01 Ústí nad Labem IČ: CZ06686982
Za objednatele:		

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 5

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Setertix Group s.r.o.
Projektant:	Zefraprojekt, s.r.o.

Předmět změnového listu

oprava nesourodých částí fasády

Část díla dotčená změnovým listem

fasáda ve dvoře

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace navrhovala provedení nových omítek pouze lokálně v místech, kde byla stávající omítka opadaná nebo nesoudržná. Tyto lokální opravy měly být provedeny jádrovou omítkou.

Nové řešení :

Vrchní strukturovaná omítka je provedena silikonovou omítkovou směsí se zrnitostí 1,5mm.

Zdůvodnění změny :

Zhotovitel před zahájením prací provedl několik vzorků způsobu opravy fasády. Z nabízených vzorků vybral objednatel ve spolupráci s památkovou péčí konkrétní způsob opravy fasády. Fasáda ve dvorní části byla velice nesourodá. Původní části omítek byly často i opakovaně opravovány. Část omítek byla opadaná či nesoudržná. Po zkušenostech z fasády do ulice 28. října provedl zhotovitel po dohodě s objednatelem sjednocení zjevných nesourodých částí fasády formou přetažení strukturovanou omítkou se zrnitostí 1,5 mm.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zapsáno ve stavebním deníku strana 021363 ze dne 7.5.2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, došlo ke zlepšení estetické stránky díla.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	42 752,50 Kč
-------------------------------	--------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
------------------------------	------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	42 752,50 Kč
--	--------------

DPH:	8 978,03 Kč
------	-------------

Celková cena díla:	51 730,53 Kč
--------------------	--------------

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 752,50				
CELKEM OBJEKT	42 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			42 752,50	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

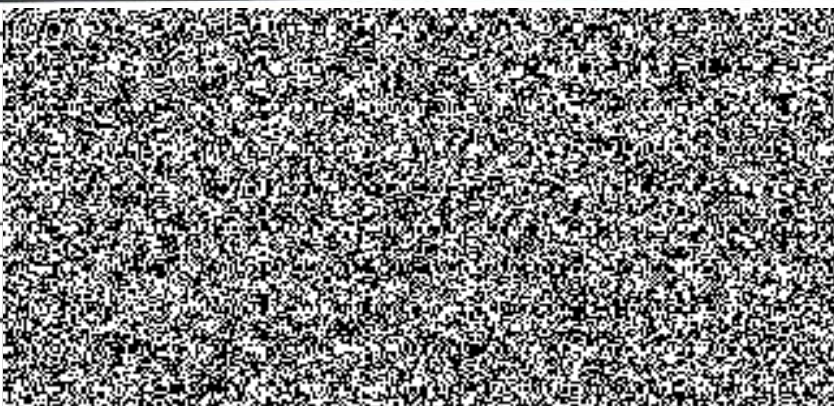Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		

ZMĚNOVÝ LIST č. 5
PŘÍPOČTY POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				42 752,50
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 752,50
URS	1	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	174,500	245,00	42 752,50
			stěna ke garáži	m2	113,000		
			stěna v suterénu dvora	m2	61,500		
Celkem změnový list							42 752,50

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

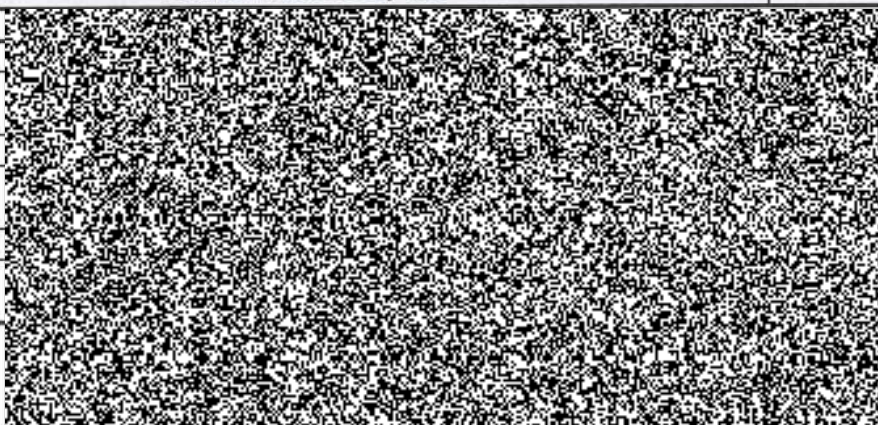

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 6**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Setertix Group s.r.o.
Projektant:	Zefraprojekt, s.r.o.

Předmět změnového listu

změna klempířských prvků

Část díla dotčená změnovým listem

celá stavba

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Zadání požadovalo dodávku a montáž veškerého oplechování z pozinkovaných, resp. TiZn plechů.

Nové řešení :

Veškeré venkovní oplechování bylo provedeno z měděného plechu, případně ponecháno původní.

Zdůvodnění změny :

Po postavení lešení bylo provedeno podrobné prověření stavu klempířských prvků (oplechování), způsobu jejich kotvení (vazba na fasádu) a kvalita omítek kolem oplechování.

Ve spolupráci s památkovou péčí objednatel vyhodnotil jako neefektivní nahrazovat původní měděné oplechování některých říms či zdobných prvků, když toto oplechování bylo v dobrém či opravitelném stavu a ja pevně zakotveno pod omítkou, která nevykazuje žádné poruchy. Výměna těchto klempířských prvků by znamenala jen navýšení rozsahu opravy omítek.

Poškozené klempířské prvky musely být vyměněny. S ohledem na ponechání části stávajících měděných prvků, byly i nové prvky provedeny z měděného plechu, aby nedocházelo ke vzniku koroze pozinkovaných či TiZn plechů vlivem elektrochemické reakce ve styku s měděnými plechy, resp. při stékání vody z měděných prvků na pozinkované/TiZn.

Nově osazené parapetní plechy objednatel požadoval zapustit do špalet. Špalety se proto musely v dolní části odříznout, parapetní plech zapustit a špaletu zpětně zednický začistit.

Ponechané části klempířské prvky bylo nutné očistit, případně opravit.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

st. deník strana 021378 ze dne 2.7.2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, použitím trvanlivějšího materiálu došlo ke zvýšení kvality díla.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	30 328,34 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	30 328,34 Kč
DPH:	6 368,95 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	36 697,29 Kč

Setertix
Za Pasáží 100

DIČ: 0000000000

datum: 16-2020

16-2020

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 223,34				
764 Konstrukce klempířské		14 105,00			
CELKEM OBJEKT	16 223,34	14 105,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			30 328,34	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele				
Za projektanta				
Za objednatele				

ZMĚNOVÝ LIST č. 6
PŘÍPOČTY POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				30 328,34
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 223,34
URS	1	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	252,700	64,20	16 223,34
		764	Konstrukce klempířské				14 105,00
URS	2	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	35,000	403,00	14 105,00
Celkem změnový list							30 328,34


Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:

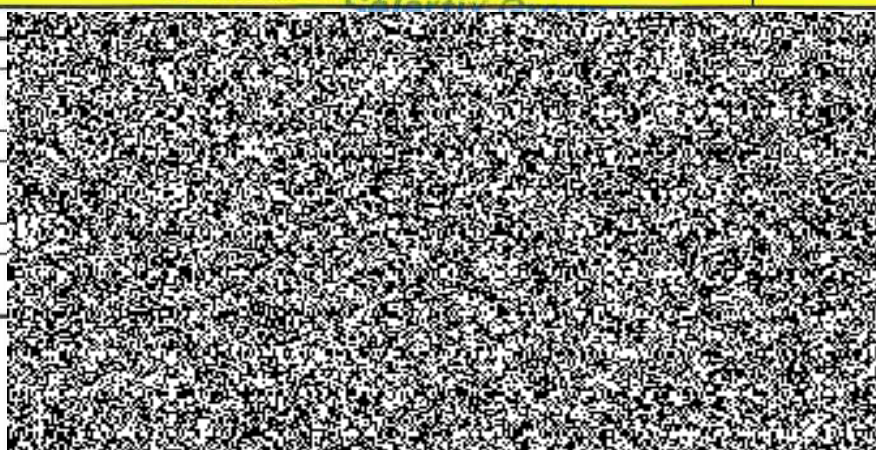

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 10

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Setertix Group s.r.o.
Projektant:	Zefraprojekt, s.r.o.

Předmět změnového listu

stříška nad vstupem

Část díla dotčená změnovým listem

fasáda ve dvoře

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Zadání předpokládalo demontáž a likvidaci stávající stříšky bez náhrady.

Nové řešení :

Demontovaná stříška byla opravena, doplněna o oplechování a krytinu a namontována zpět.

Zdůvodnění změny :

Stříška nad vstupem slouží jako ochrana osob proti případnému padajícímu sněhu a ledu ze střechy objektu. Z hlediska BOZP nebylo možné ponechat vstup bez ochranné stříšky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Práce byly řešeny na žádost EO Jablonec n/N. O změně nebyl proveden zápis do st. deníku či KD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne, kvalita díla nebyla dotčena.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	8 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	8 000,00 Kč
DPH:	1 680,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	9 680,00 Kč

le:

6-2020

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot, spojovací	8 000,00				
CELKEM OBJEKT	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			8 000,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Setertix Group s.r.o.
 Projektant: Zefraprojekt, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele				
Za projektanta				
Za objednatele				

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října, č. p. 424 – oprava fasády
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Setertix Group s.r.o.
Zefraprojekt, s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				8 000,00
		767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot, spojovacího a kotvicího materiálu				8 000,00
IK	1	IK-ZL08-01	Zpětná montáž ocelové konstrukce ve dvoře, doplnění OSB desky, střešní krytiny, oplechování vč. pomocného lešení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
Celkem změnový list							8 000,00

Za zhotovitel

Za projektanta

Za objednatele

