

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

I.1. Objednatel

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov

zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou města

IČO: 00259586

DIČ: CZ00259586

bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“),

a

I.2. Zhotovitel

BPO spol. s r.o.

se sídlem: Lidická 1239, 363 17 Ostrov

zastoupen: Ing. Pavlem Kylišem, jednatelem společnosti

IČO: 182 24 920

DIČ: CZ18224920

bankovní spojení: 

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29954

(dále jen „zhotovitel“),

se dohodly, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením odst. XIII.2. Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov“, č. smlouvy u objednatele: 26/16-ORM, č. smlouvy u zhotovitele 0334, ze dne 01.08.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“) na uzavření tohoto

Dodatku č. 1

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby

„Parkoviště v ul. Marie Majerové, Sokolov“

(dále též „Dodatek č. 1)

A.

Ze smlouvy se vypouští

a) odstavec uvedený v čl. VI.1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. v rozsahu a obsahu dle čl. III. v těchto termínech:

- předání studie **do 45 dnů od předání podkladů dle odst. III.3.a**
- předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby **do 130 dnů od předání podkladů dle odst. III.3.a**
- inženýrská činnost a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby **do 160 dnů od předání podkladů dle odst. III.3.a**
- předání pracovní verze projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby (1 paré) **do 60 dnů od obdržení rozhodnutí o umístění stavby**
- předání projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby **do 90 dnů od právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby**
- inženýrská činnost a podání žádosti o vydání stavebního povolení **do 120 dnů od právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby**

B.

Do smlouvy o dílo se vkládá

a) odstavec uvedený v čl. VI.1 smlouvy o dílo:


- předání studie **do 16.01.2017**
- předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby **do 90 dnů od odsouhlasení předané studie**
- inženýrská činnost a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby **do 120 dnů od odsouhlasení předané studie**
- předání pracovní verze projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby (1 paré) **do 60 dnů od obdržení rozhodnutí o umístění stavby**
- předání projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby **do 90 dnů od právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby**
- inženýrská činnost a podání žádosti o vydání stavebního povolení **do 120 dnů od právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby**

C.

Závěrečná ujednání

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
- b) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
- c) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a jejím uveřejněním dle platné legislativy, což provede objednatel.

d) Obě strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a prohlašují, že tento plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

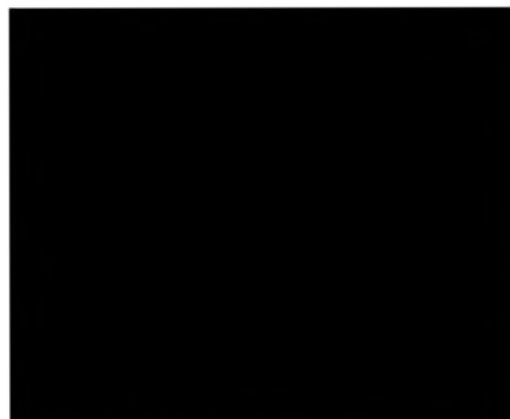

Projekty/Štavy/Inženýring

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JA'.
