

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A STAVBY

**Název zakázky: „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu
P3148 v km 8,016 na trati Hradec Králové - Turnov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1004/2019

ISPROFIN: 3273514800

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 001-PVO/2019

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „**Dodatek č. 5**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto
Dotatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě probíhajícího změnového řízení dle čl. 17 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“) a na základě změnového listu stavby č. 1, 2 dohodly na ukončení změnového řízení v termínu do 12.8.2020, a to vzhledem k jejich administrativní náročnosti. Následně po provedení řádného změnového řízení bude uzavřen dodatek č. 6, kterým bude změněn předmět plnění Díla, a to v souladu se shora uvedenými změnovými listy.
- 1.2 V souladu s ustanoveními článků 3.7.5.1 Obchodních podmínek se smluvní strany z důvodů administrace dosud neukončených změnových řízení podle článku 17. Obchodních podmínek, jejichž předmětem jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení předmětu plnění, dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací včetně následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje do 12.8.2020.
- 1.3 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně Smlouvy v termínech pro provedení Díla, kdy čl. 3.8. Smlouvy nově nahrazují v plném rozsahu následujícím zněním:

- 3.8. Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **dnem nabytí účinnosti Smlouvy.**

Zpracování a předání Projektové dokumentace stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **20.3.2020**. Zhotovitel je povinen neprodleně kontaktovat TDS o vydání stavebního povolení Drážním úřadem.

Dokončení stavebních prací včetně následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude provedeno do 12.8.2020. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **27.8.2020**. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 1.4 V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná příloha č. 5 - Harmonogram postupu prací je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku ukončení změnového řízení ve shora uvedeném termínu, stejně tak jako v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení stavebních prací včetně následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 2.3 Součástí Dodatku č. 5 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 30.6.2020

V Praze dne 13.7.2020


.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.
na základě plné moci

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací


Harmonogram časového plnění

Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P3148 v km 8,016 na trati Hradec Králové - Turnov

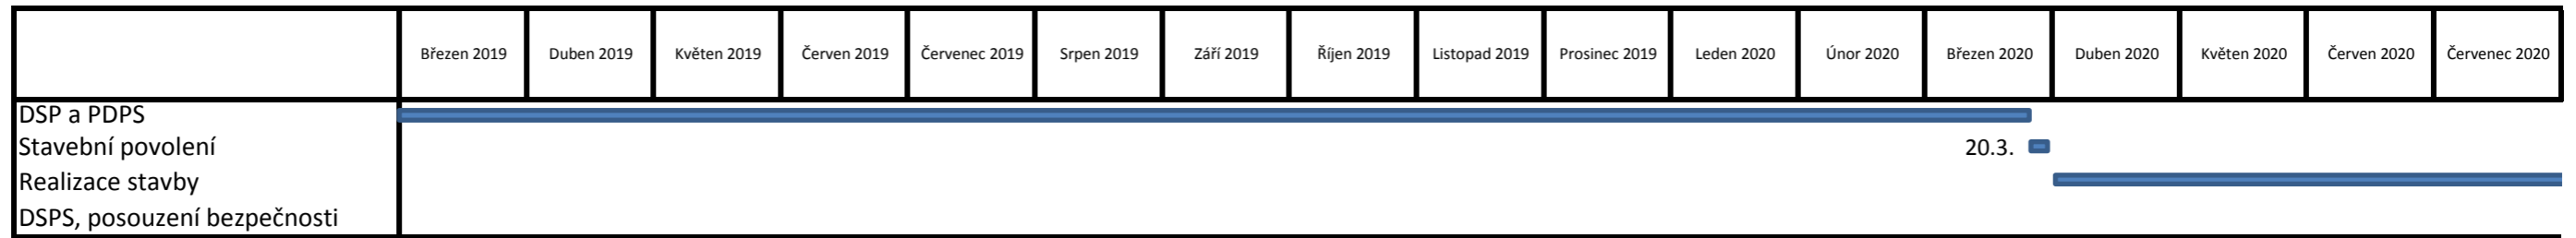

Fin:

16 910 355,53 Kč



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 981729

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb8e15ab-c29e-4426-973c-b4231c623737

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.07.2020 11:23:00



5d8e2a89-2f69-48c9-a356-c94afe44b152
